

2017 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

2. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2017-30 Haziran 2017 Dönemi)


Strateji Geliştirme Başkanlığı

15.07.2017

BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2017 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	731.633.000,00	731.632.000,00	365.234.575,62	% 49,9
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	128.503.000,00	128.504.000,00	62.110.519,09	% 48,3
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.958.000,00	92.062.954,60	38.961.198,64	% 42,3
05	CARİ TRANSFERLER	401.010.000,00	434.302.915,60	249.559.749,56	% 57,5
06	SERMAYE GİDERLERİ	292.780.000,00	761.333.315,79	241.312.962,60	% 31,7
	Bakanlık Yatırım Programı	273.752.000,00	264.043.692,25	42.997.123,75	% 16,3
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.028.000,00	19.028.000,00	783.000,00	% 4,1
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	478.261.623,54	197.532.838,85	% 41,3
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	154.071.000,00	654.381.000,00	550.930.811,68	% 84,2
	Bakanlık Yatırım Programı	33.105.000,00	32.805.000,00	998.553,80	% 3,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	120.966.000,00	120.966.000,00	49.322.257,88	% 40,8
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	500.610.000,00	500.610.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	35.959.000,00	35.959.000,00	6.778.286,00	% 18,9
GENEL TOPLAM		1.823.914.000,00	2.838.175.185,99	1.514.888.103,19	% 53,4


BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

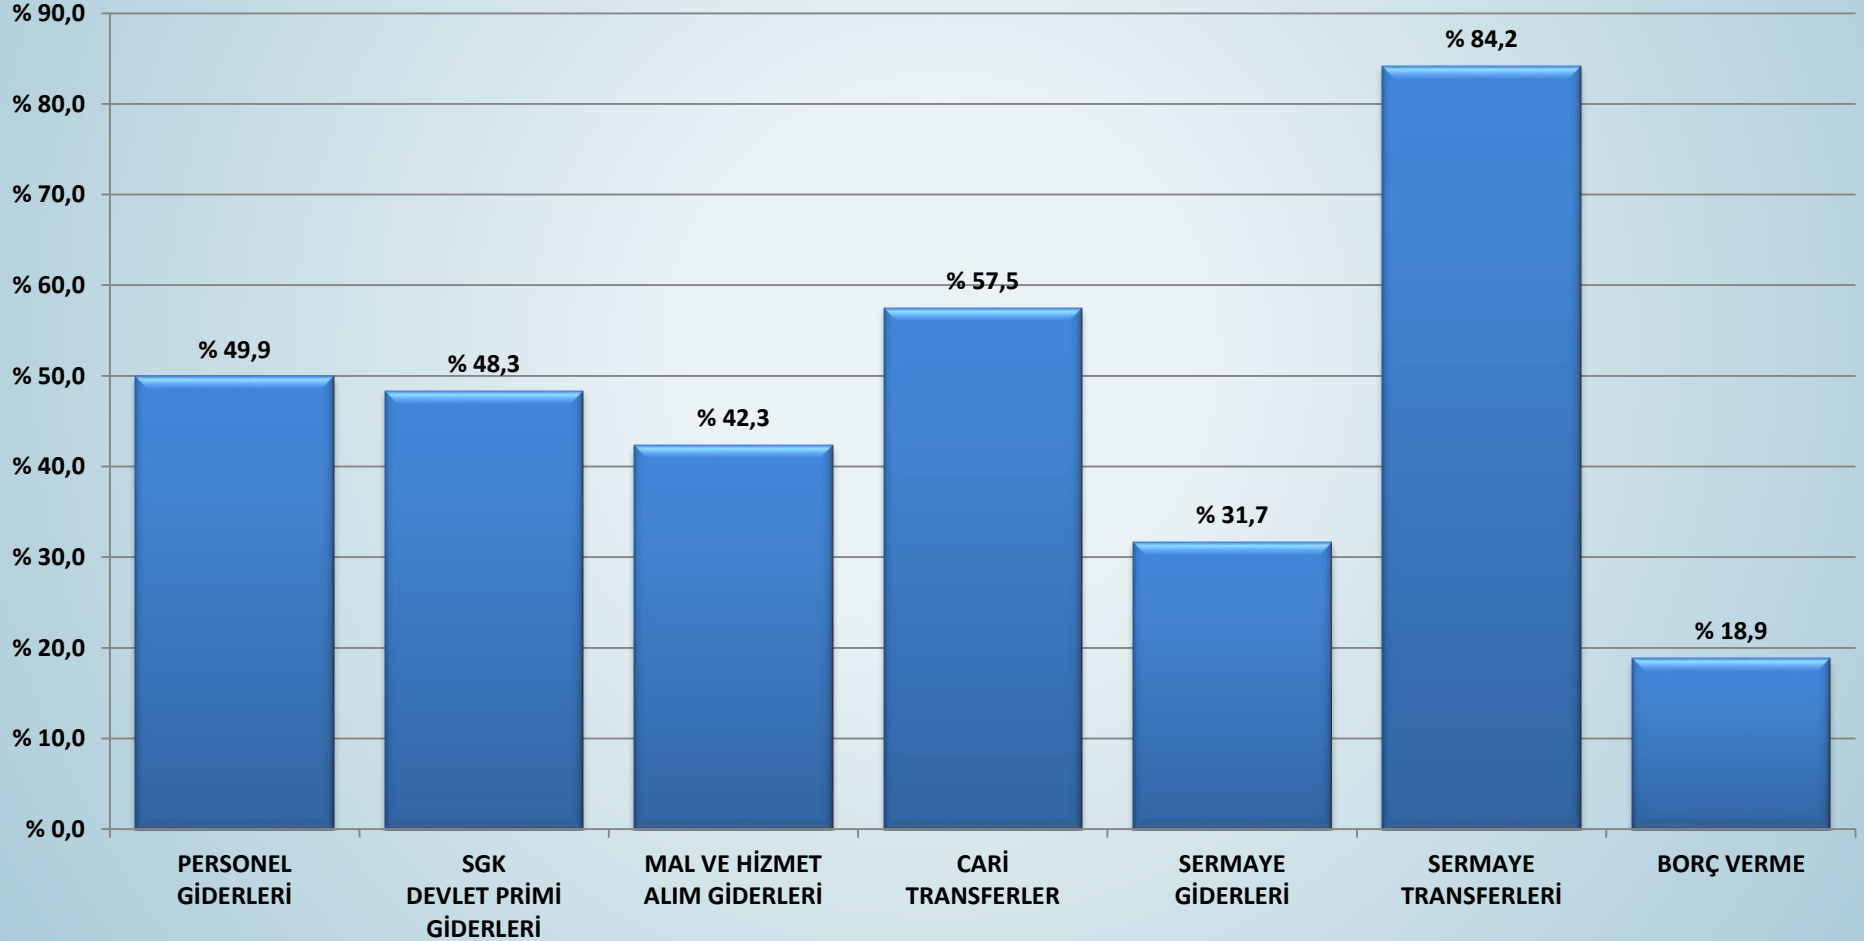

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	30.06.2017 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	26.878.000,00	29.054.000,00	9.024.270,65	% 31,1
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	202.631.000,00	204.396.915,60	60.154.943,93	% 29,4
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	52.613.000,00	54.763.158,75	14.142.170,23	% 25,8
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	210.882.000,00	274.736.968,55	93.246.185,36	% 33,9
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	347.934.000,00	873.546.000,00	743.762.717,14	% 85,1
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	20.431.000,00	20.431.000,00	7.579.248,70	% 37,1
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	48.577.000,00	49.261.481,68	5.735.219,74	% 11,6
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	83.821.000,00	43.839.635,91	6.118.693,55	% 14,0
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	8.393.000,00	8.393.000,00	4.043.423,42	% 48,2
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	4.323.000,00	4.334.000,00	2.622.741,59	% 60,5
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.943.000,00	1.943.000,00	979.867,63	% 50,4
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4.023.000,00	4.023.000,00	1.952.482,73	% 48,5
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.749.000,00	22.871.250,00	13.416.878,44	% 58,7
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.575.000,00	5.575.000,00	1.793.753,79	% 32,2
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.409.000,00	2.415.000,00	579.544,40	% 24,0
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.082.000,00	4.082.000,00	2.181.312,33	% 53,4
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	37.555.000,00	39.555.000,00	18.762.663,66	% 47,4
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	751.000,00	751.000,00	374.475,39	% 49,9
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	25.214.000,00	25.216.350,00	13.011.464,30	% 51,6
İL MÜDÜRLÜKLERİ	721.130.000,00	1.168.987.425,50	515.406.046,21	% 44,1
TOPLAM	1.823.914.000,00	2.838.175.185,99	1.514.888.103,19	% 53,4


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

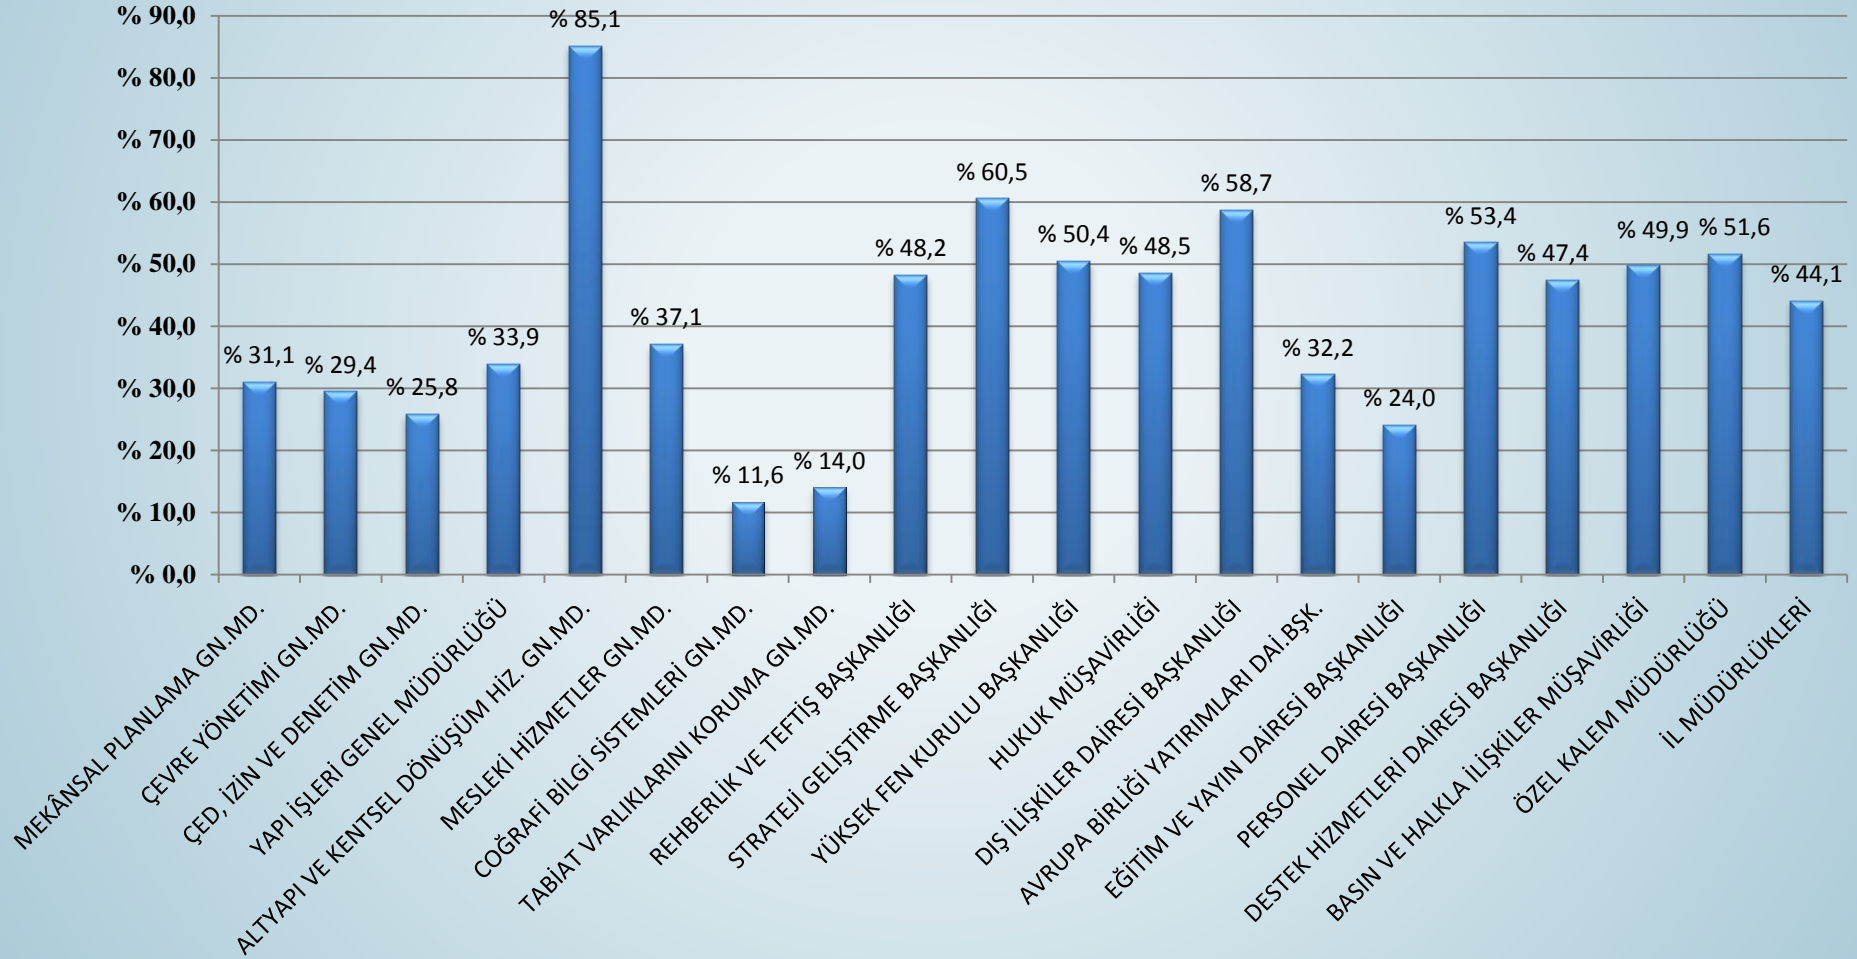

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	30 Haziran 2017		Gerçekleşme ORANI (%)
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	20.515.000,00	10.876.000,00	226.766,50	% 2,1
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	127.467.000,00	51.389.000,00	1.875.869,41	% 3,7
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	6	135.946.000,00	45.329.000,00	934.152,90	% 2,1
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	19	823.426.000,00	176.789.000,00	30.327.499,11	% 17,2
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn.Md. (DETAY)	5	15.650.000,00	5.600.000,00	1.053.150,00	% 18,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	42.470.000,00	8.304.000,00	888.976,68	% 10,7
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	14	77.457.000,00	37.492.000,00	530.167,80	% 1,4
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	12	104.594.000,00	68.939.000,00	53.182,60	% 0,1
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	12.172.000,00	2.542.000,00	347.010,15	% 13,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	3	173.838.000,00	69.942.000,00	14.165.995,62	% 20,3
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	3.708.000,00	3.708.000,00	376.192,78	% 10,1
Hukuk Müşavirliği (DETAY)	1	525.000,00	155.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	98	1.537.768.000,00	481.065.000,00	50.778.963,55	% 10,6
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	93	1.376.972.000,00	382.319.000,00	32.406.963,55	% 8,5
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	5	160.796.000,00	98.746.000,00	18.372.000,00	% 18,6

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

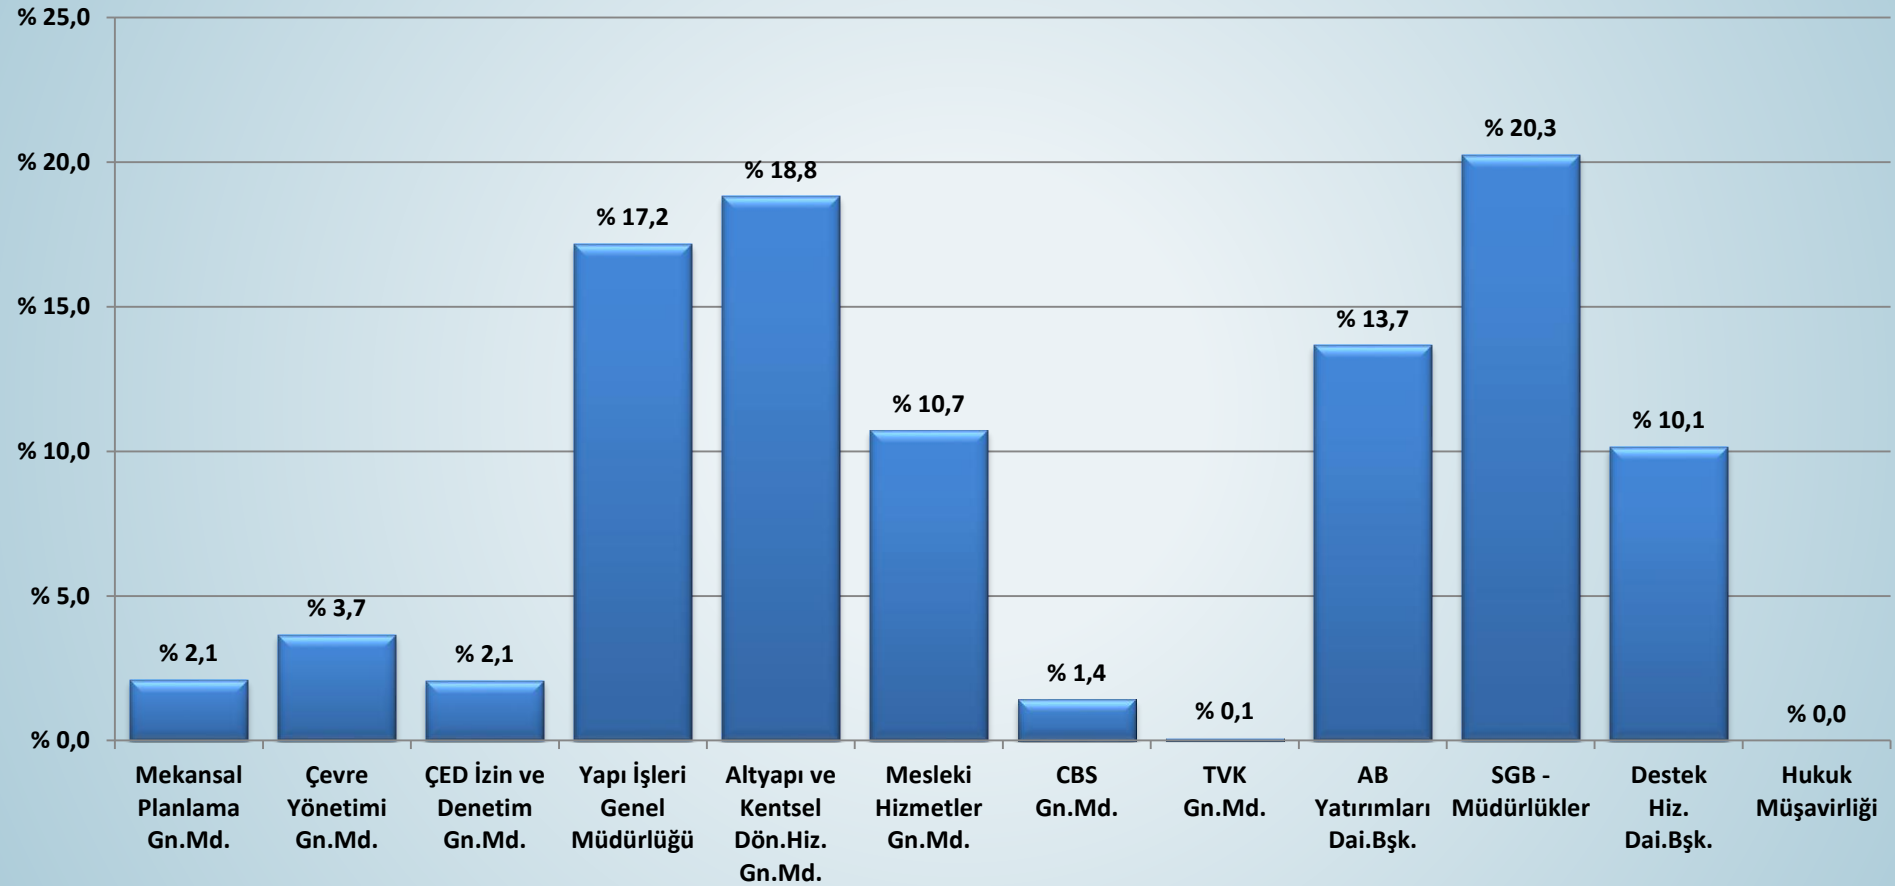

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	2.000	200	1.200	0	% 0,0	
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2018	3.860	2.860	500	127	% 25,4	Kilis İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı İşi için, 1 nolu hakediş bedeli olarak KDV Dahil 84.311,00 TL, 2 nolu hakediş bedeli olarak KDV dahil 42.155,50 TL olmak üzere toplam 126.466,50 TL ödeme yapılmıştır.
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2017	2.915	1.315	1.600	0	% 0,0	
2015K090010	Özel Proje Alanları Atatürk Kültür Merkezi Alanı Kentsel Tasarım Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	2.100	600	1.500	0	% 0,0	
2016K090020	GAP ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.640	64	1.576	100	% 6,3	Konya Meram İmar Uygulama Danışmanlık Hizmet alımı işi için 1 nolu hakediş bedeli olarak KDV dahil 100.300,00 TL ödeme yapılmıştır.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.000	0	% 0,0	
2017K090030	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.000	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	4.000	0	2.500	0	% 0,0	
	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2017	1.000		1.000	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2018	1.500		500	0	% 0,0	
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2018	1.500		1.000	0	% 0,0	
8 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.515	5.039	10.876	227	% 2,1	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K060210	Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2017	2.993	1.693	1.300	0	% 0,0	TÜBİTAK ile 3/e kapsamında 09.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında atıksu ve alıcı ortam örneklemelerinin analiz sonuçları üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca pilot sağlık kuruluşlarında kullanılan tüm analizörler ve bu analizörlerde kullanılan sıvı kimyasallar değerlendirilmektedir. Sağlık kuruluşlarında kullanılan ve geri kazanım potansiyeli olan, ayrı toplanarak yakmaya gönderilmesi öngörülen ve kanalizasyona deşarj edilmesi öngörülen kimyasallar/çözeltiler ile ilgili değerlendirmelerde bulunulması amacıyla 24.05.2017 tarihinde Gebze'de bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Projeye ait nihai raporun 2017 yılı temmuz ayı sonunda Bakanlığımıza sunulması beklenmektedir.
2016K060210	Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	3.500	300	1.770	0	% 0,0	Proje Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 28.07.2017 tarihinde imzalanan protokolle başlamıştır. Söz konusu projenin süresi ve bütçesi 14 Ocak 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 3 Ekim 2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekim 2017 Yılı Yatırım Programı" ile değiştirilmiştir. Ancak bahse konu yatırım programında yer alan 2017 yılı proje bütçesi yetersiz olduğu için ödeme yapılamamıştır. Bu kapsamda 13.02.2017 tarihinde ek bütçe talebi yapılmış ve 01.06.2017 tarihinde ödenek aktarımı yapılmıştır. Bu itibarla 28.06.2017 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yapılan Ek Protokolle projenin iş kapsamı artırılmış, süresi 2018 yılı sonuna ve proje bütçesi ise 3.500.000 TL'ye (KDV dahil) çıkarılmış olup, hazırlanan II. Ara Rapor inceleme aşamasındadır.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	2.500	445	826	413	% 50,0	Proje kapsamında 04-05.04.2017 tarihleri arasında Çevresel Kalite Standartları ve Uygulanması konulu eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 1. Ara Rapor 06.04.2017 tarihinde Bakanlığa sunulmuş olup ödemeleri yapılmıştır. Proje kapsamında havzaya özgü kirleticilerin belirlenmesi amacıyla Nilüfer Çayı Alt Havzası ve Yeşilirmak Havzasında belirlenen istasyonlarda mevsimsel izleme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bahse konu havzalarda noktasal kaynakların tespiti ve karakteristiğinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2018	1.000		150	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	99.000		40.000	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Belediyeler/Birliklerden tesis talepleri toplanma aşamasındadır.
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	915	472	443	443	% 100,0	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile 30.09.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve ilk ödeme olan 468,400 TL Aralık 2015 te ödenmiştir. Final Raporu'nun onaylanmasını müteakip 468,400 TL Ocak 2017 de ödenmiştir. Proje süresi içerisinde 20 Ocak 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100050	İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2017	3.839	2.494	1.345	0	% 0,0	3. Ara Rapor 02.06.2017 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş ve incelenmiş olup, proje bedelinin %25 oranında (958.750,00 TL) ödeme yapılmasına ilişkin işlemler yapılmış olup, henüz ödeme gerçekleştirilmemiştir.
2016K100040	Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2017	600	300	300	0	% 0,0	Söz konusu proje kapsamında 2017 yılında Haziran ayı sonuna kadar herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Projenin 2017 yılında sonlandırılması planlandığından bu yıl içinde 302.050 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (4*) (Çevre Sektörü)	2016-2019	3.000	0	1.000	0	% 0,0	Proje Teknik Şartnamesi hazırlanmış olup ihale aşamasındadır.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	0	1.000	500	% 50,0	2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi ile 03.02.2017 tarihinde protokol imzalanmış ve proje başlamıştır. Proje Başlangıç Raporu yüklenici tarafından süresi içinde teslim edilmiş, İdare tarafından onaylanmıştır. Nisan ayı içerisinde ilk ödeme gerçekleştirilmiştir.
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2017	1.071	410	661	0	% 0,0	12 Nisan 2017 tarihinde yapılan Kapanış Konferansı ile Proje tamamlanmıştır.
AB KATKISI	9.639		4.337	5.302	0	% 0,0		

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100080	Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB)	2014-2017	893	357	536	0	% 0,0	Proje devam etmekte olup, 2017 yılı içerisinde herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu proje 2018 yılının Şubat ayında biteceğinden 2017 yılında herhangi bir ödeme ön görülmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		8.033	4.016	4.017	0	% 0,0	
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB)	2014-2017	893	357	536	520	% 97,0	Bahse konu proje 8 Mart 2017 tarihinde Point Otel (Ankara) düzenlenen kapanış etkinliği ile sonlandırılmıştır. Süreç içerisinde, projeye kapsamında hazırlanan ve görüşlerimiz doğrultusunda revize edilen raporlar hakkındaki görüşlerimiz ve raporlara ilişkin çekincelerimiz Merkezi İhale ve Finans Birimi’ne gönderilmiştir. Proje Final Raporu henüz onaylanmamış olup, konuya ilişkin süreç devam etmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		8.033	4.016	4.017	3.900	% 97,1	
2015K100150	Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması (AB)	2015-2017	357	142	215	0	% 0,0	Proje 16 Aralık 2015 tarihinde başlamış olup açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’ndan harcama talebi olmadığından, 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Temmuz 2017 tarihine kadar 5 eğitim, 2 çalışma ziyareti, 2 çalıştay gerçekleştirilmiş olup, projeye ilişkin yasal boşluk analizi tamamlanmış ve internet sitesi, düzenleyici etki analizi, taslak yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		3.213	1.428	1.785	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100060	Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2019	0	0	0			22.06.2017 tarihinde YATIRIM PROGRAMINDAN ÇIKARTILDI
AB KATKISI			0	0	0			
2017K100040	Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	4.106		1.307	0	% 0,0	
AB KATKISI			36.948		12.316	0	% 0,0	
15 Proje	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	714		238	0	% 0,0	Projenin başlangıç toplantısı 16 Ağustos 2017 tarihinde yapılacaktır. Henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	714		238	0	% 0,0	Proje ihale süreci tamamlanmış olup, Proje 29 Mayıs 2017 tarihinde başlamış olup, henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	714		181	0	% 0,0	Projenin ihale süreci tamamlanmış olup, proje başlangıç toplantısı 14 Ağustos 2017’de yapılacaktır. Henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	1.964		650	0	% 0,0	Programın ihale süreci tamamlanmış olup, program resmi olarak 15 Eylül 2017’de başlayacaktır. Henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
			17.670		5.890	0	% 0,0	
06 ve 07 TOPLAM			127.467	6.970	51.389	1.876	% 3,7	
AB KATKISI			65.866	13.797	27.437	3.900	% 14,2	

(4*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2017	9.594	7.673	1.921	0	% 0,0	Diyarbakır Ön Değerlendirme Projesi iptal edilmiştir. Söz konusu ödeneğin kullanılmayacağı bilgisi Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmiştir.
2017K100010	Atıkların Tehlikelilik Vasıflarının Belirlenmesi Projesi (Döner Sermaye-3.000.000 TL ödenek eklendi) (Çevre Sektörü)	2017-2017	10.421		10.421	0	% 0,0	Atıkların Tehlikelilik Vasıflarının Belirlenmesi Projesi kapsamında ihale işi tamamlanmış olup, sözleşmeler imzalanmıştır. Alım işine ait teslim süreci devam etmektedir.
2017K10110	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binaları Yapımı Kesin Hesap Farkı	2017-2017	370	0	370	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı tarafından 22.06.2017 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Temmuz ayı içerisinde ödemeler yapılacaktır.
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu	2015-2017	3.000	1.000	2.000	0	% 0,0	Projenin ara raporları haziran ayında gelmiş olup muayene ve kabul işlemleri devam etmektedir, Haziran 2017 sonuna ödeme yapılmamıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	51.278	12.108	9.100	934	% 10,3	Labaratuvur Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili; Sarf-yedek malzame alımı teknik şartnamesi çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamlanınca ihale süreci başlatılacaktır. 2016 yılı son hakediş ödeme işlemleri ile İlk ay ödemesi yapılmıştır. (İlk 6 ayda toplam harcama: 494.272,50 TL.)) Diğer taraftan,Marmara Temiz hava Merkezi tarafından yürütülen proje ile ilgili; Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne İşletilen 54 Adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarında Bulunan Cihaz ve Ekipmanların, 2017-2019 Yılları arası(3 Yıl) Bakım-Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı işine ait Ocak -Haziran Ayları Ödeme Toplamı(682.016,40 TL.) ödemesi yapılmıştır.(İlk 6 ayda toplam harcama 439.880,40 TL.)
	Döner Sermaye	2015-2019	60.693	14.975	21.045	0	% 0,0	Labaratuvur Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili; Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi' ne bağlı illerde istasyon kurulumu projesi kapsamında ihale yapılmış ve sözleşme aşamasına gelinmiştir. Diğer taraftan,Marmara Temiz hava Merkezi tarafından yürütülen proje ile ilgili; Marmara Bölgesinde Bulunan İl/İlçelere 7 Adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulumu işine ait ihale sonuçlandırılmış 28.03.2017 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 29.03.2017 tarihinde firma işe başlamıştır. Tahminen 2017 Ağustos sonu 2.436.000,00 TRY (Türk Lirası)(KDV Hariç) ödemesi yapılacaktır.
2016K100080	Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2016-2018	590	0	472	0	% 0,0	Projenin teknik yardım hizmet sözleşmesi kapsamında avans ödemesi AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından ilk 6 aylık dönemde yapılmıştır. Katkı payı ödeme talebi AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı'nın 29.06.2017 tarihli yazısı ile Genel Müdürlüğümüzdən talep edilmiştir. Ödeme Temmuz ayı içerisinde yapılmıştır. Bu yüzden ilk 6 aylık dönemde katkı payı ödemesinde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Projenin ilerleme raporları göz önüne alındığında sözleşmenin 2017 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Bu durumda, 2018 yılına sarkan ödemenin 2017 yılında yapılması beklenmektedir. Tablodaki verilen rakam Avro bazındadır. Avro kurundaki artıştan dolayı da ödenek talebinin artırılması gerekecektir.
AB KATKISI			3.338	0	2.671	0	% 0,0	
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	72.253	20.781	21.284	934	% 4,4	
		DÖNER SERMAYE	63.693	14.975	24.045	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	135.946	35.756	45.329	934	% 2,1	
		AB KATKISI	3.338	0	2.671	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	11.000		11.000	6.277	% 57,1	Kesin Kabul işlemleri tamamlanmış olup,Kesin Hesap çalışmaları devam etmektedir.
2015K090010	Özel Proje Alanları Diyarbakır Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İnşaatı Projesi (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	28.466		28.466	10.807	% 38,0	17.04.2017 tarihinde yatırım programına alınmıştır. İhalesi yapılmış olup, iş başlamıştır.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	2.670	1.370	1.300	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüzce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usül ve Esasları değerlendirme analizleri kitapçığı hazırlanmıştır. ADD-On yazılımı ve yazılım kurum son haline getirilmiştir. Konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi (genelge vb...) ve yayımlanması için hazırlıklar ve devam etmektedir.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	3.500	1.512	1.988	186	% 9,4	Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme ve Geliştirilmesi işi ihalesi 03.04.2017 tarihinde , 175.000,00 TL+ KDV bedelli olarak yapılmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425.000,00 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve pilot illerde uygulanması devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	1.100	600	500	54	% 10,8	
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü)	2015-2017	3.000	2.000	1.000	0	% 0,0	
2017K140090	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Alımı (Afetler Sektörü)	2017-2017	1.760		1.760	0	% 0,0	
2006K070010	İşkan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2019	6.700	3.000	1.500	75	% 5,0	Karaman-Merkez-Güldere Köyü (73 hak sahibi) Karamanda proje çalışmaları devam etmektedir. İşkan konutlarının yapılacağı alanlarla ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir.Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt gibi işlerde kullanılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2018	25.622	11.966	2.138	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2018	5.649	3.513	2.136	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlandı. Yaklaşık 80 konutun güçlendirme ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2018	11.135	3.389	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2018	8.838	5.064	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2019	159.281	0	13.519	0	% 0,0	
	Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı	2009-2019	63.361	0	3.519	0	% 0,0	İlisu Barajı İskanı için iskan duyurusuna çıkılmış olup başvurular alınmıştır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2019	95.920	0	10.000	0	% 0,0	Yusufeli Barajında hak sahipliği başvuruları alınmış olup inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir.Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2019	13.935	2.533	5.881	4.104	% 69,8	Kütahya-Arslanapa İlçesi-Kureyşler köyü (30 hak sahibi)işlerin ihalesi yapılmış olup işler devam etmektedir.Kütahya-Arslanapa-Kureyşler köyünde üstyapı inşaatları tamamlanmıştır. Altyapı işin ihalesi yapılmış olup geçici kabul aşamasındadır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	5.400	1.800	1.500	22	% 1,5	Diyarbakır İli Sur İlçesi Ali Paşa ve Lalebey Mahalleleri 1. Bölgedeki Yeni Yapıların Proje İşine öncelik tanınmıştır. Ödenek durumu dikkate alındığında 10 adet pilot ilde örnek kırsal konut projelerinin elde edilebileceği görülmektedir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	3.553	1.826	500	0	% 0,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	189.686	108.143	2.000	0	% 0,0	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2016	3.718	3.718	0	0	#SAYI/0!	İş Bitirilmiştir.
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2018	177.098	104.425	2	0	% 0,0	Üst yapı işi tamamlandı. Altyapı işine başlandı. Yaklaşık 33.000.000.-TL ödenek harcanmış olup bütçesi DSİ den karşılandığı için gerçekleşmemizde görünmemektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2019	8.870		1.998	0	% 0,0	İşin yer teslimi yapılmış olup çalışmalara yeni başlanmıştır. Gerçekleşmeler ileriki aylarda görülecektir.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	3.367	1.000	550	87	% 15,8	2017 Yılı içerisinde 30 Haziran tarihine kadar; Antalya, Ankara, Adıyaman ve Erzurum da 4 adet de bölgesel eğitim yapılmıştır. Yıl sonuna doğru 1 adet de genel eğitim yapılması planlanmaktadır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2019	125.801	0	40.000	0	% 0,0	Yer teslimi haziran ayında yapılmıştır. İşler süratle devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2011-2019	126.223	109.430	15.905	3.831	% 24,1	
	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (06.5-Ödeneği)		43.000	12.500	27.228	1.936	% 7,1	Kırsal dönüşüm projelerinden ihaleli olarak yapılacak olan projelerdir. 1 köyde çalışmalar devam etmekte olup bunlar; Kırsal Dönüşüm kapsamında; Kahramanmaraş-Göksun İlçesi-Güçüksü köyü (76 hak sahibi) Kahramanmaraşta inşaatlar devam etmektedir.
2011K070050 (**)	<i>Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2011-2019	5.532	2.800	54	0	% 0,0	Vatandaşlardan talep gelmesi halinde harcanmaktadır.
2011K070020 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2016-2020	63.830	2.000	20.000	2.948	% 14,7	
19 Proje		06 ve 07 TOPLAM	588.375	148.250	101.364	6.464	% 6,4	
		08 TOPLAM	195.585	114.230	35.959	6.779	% 18,9	
		DÖNER SERMAYE	39.466	0	39.466	17.084	% 43,3	
		GENEL TOPLAM	823.426	262.480	176.789	30.327	% 17,2	

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	6.500	650	2.400	0	% 0,0	Bu proje kapsamında, 07.03.2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ile bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde, 30.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, protokolün ilk üç aylık süreci başlamıştır. Bu süreçte, yüklenici firma, yeni bir yerleşim birinin Bakanlığımızca daha evvelden hazırlanmış olan Süperkent Mahalle Standartlarına uygunluğunu sağlayacak teknolojilerin belirlenmesi işini yapacaktır. Yüklenici firma, 16.06.2017 tarihinde söz konusu iş kapsamında belirledikleri teknolojilere ilişkin olarak ilk raporlarını teslim etmiş olup, gelinen tarih itibarıyla Bakanlığımızca bu teknolojiler incelenmektedir. Bakanlığımızca uygulanması uygun bulunan teknolojiler belirlenecek ve bu teknolojilerin Bakanlığımızca belirlenecek bir pilot alanda uygulanmasına yönelik daha detaylı analizler yüklenici firma tarafından yapılacak ve uygulama projeleri çizilecektir.
2015K090050	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.500	2.450	1.050	1.050	% 100,0	Proje 09/01/2017 tarihinde tamamlanarak, 27/02/2017 tarihinde son hakediş ödemesi yapılarak proje tamamlanmıştır.
2017K090110	Plan Tadilatlarında ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kentsel Altyapı Etki Analizi Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	750		750	4	% 0,5	Proje kapsamında 05/05/2017 tarihinde Bakanlığımız ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 230 gün süreli 600.000 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden hizmet alım protokolü imzalanmıştır. Projenin 1. aşamasında Mevcut Durum Raporu teslim edilmiş olup ödemeye esas işlemler devam etmektedir.
2017K090120	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.200	0	% 0,0	Proje kapsamında riskli alan ilan edilen muhtelif yerlerde anket yapılması işi için 22.03.2017 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş olup ihale uhdesinde kalan ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Limited Şirketi saha çalışmalarını yürütmektedir. Mardin/Nusaybin ve Şırnak/Cizre ilçeleri için ilçede bulunan kanaat önderleri ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Proje kapsamında olan diğer alanlardaki saha çalışmaları ise halihazırda devam etmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilecek veriler firma tarafından raporlaştırılarak tarafımıza teslim edilecektir.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2018	2.900	2.600	200	0	% 0,0	Proje kapsamında, Bakanlığımıza sunulan iş paketi 4 kapsamında ki iş ve işlemlere yönelik test ve kontrol süreçleri devam etmektedir.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	15.650	5.700	5.600	1.054	% 18,8	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015D000020	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü)	2015-2017	1.369	1.190	179	131	% 73,2	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi 2017 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanmıştır.
AB KATKISI			10.710	9.996	714	530	% 74,2	
2012D100020	Yeşil Bina ve Binalarda Enerji Performansı Yazılımları (Enerji Sektörü)	2012-2017	4.033	3.278	755	2	% 0,3	<p>* Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen dört etaplı "Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması İşİ"nin II. etabı 2017 yılını Haziran ayı içinde tamamlanmıştır. Kalan etap çalışmalarının 2017 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Tüm etapların tamamlanmasının ardından Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımı geliştirilecektir.</p> <p>* 6 ay süreli Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-Tr) Projesi 2017 Yılı Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşine ait sözleşme 02/03/2017 tarihinde iki taksitte ödenecek 50.000 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.</p>

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2017	2.620	2.400	220	8	% 3,6	<p>* 11-12/01/2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına katılım sağlanmış olup, katılım sağlayan personellerin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde İzmir Yaşar Üniversitesi gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Günleri Etkinliğine katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 20- 21 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılan Yapı Denetimi Uygulamaları Eğitimine katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 22-25 Mart 2017 tarihinde düzenlenen 3. Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri CNR EXPO Fuarı ile 23-26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen 15. Uluslararası Asansör TÜYAP İstanbul Fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 2. Etap Raporu Değerlendirme Toplantısına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 19-21 Nisan 2017 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon-Sodex Fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında 09-12 Mayıs 2017 tarihinde Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* 11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Yangın Güvenliği ve İtfaiye - Belediye Hizmet Araçları Fuarı ve panel, seminerine katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p> <p>* Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi Projesi (BEA) kapsamında 9 Haziran 2017 tarihinde Eskişehir İlinde gerçekleştirilen seminere katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.</p>
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2017	844	574	270	10	% 3,7	Yapı Kooperatifleri Yazılım Sistemi (E-Kooperatif) 2017 Yılı Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme Ve Destek Hizmetleri Alımı İşinin 06.04.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	12.594	12.094	500	36	% 7,2	Mart 2017 tarihinde düzenlenen, PGD Elemanları İleri seviye eğitimi kapsamında organizasyon ve yolluk ödemeleri gerçekleştirilmiş olup, buna ilişkin tahmini harcama miktarı belirlenmiştir. Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmıştır. Ayrıca YMDS yazılım 1. hakediş ödemesi yapılmıştır.
2015K010070	Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	1.250	750	500	68	% 13,6	Otopark yönetmeliği için Japonya'ya teknik gezi yapılmıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği revizyonuna ilişkin Komisyon marifetiyle yürütülen çalışmalar tamamlanmış ve Yönetmelik 03/07/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2016K010080	Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Bakım ve İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	600	250	350	136	% 38,9	23.12.2016 tarihinde Doğru Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşmeye bağlanan proje kapsamında 01.03.2017 tarihli ilk hak edişle 38.556,00-TL (KDV Hariç), 01.06.2017 tarihli 2. hak ediş ile 52.164,00 TL , toplamda 90.720,00 TL toplamda ödenmiştir.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	4.270	2.200	1.000	15	% 1,5	13.12.2016 tarihli sözleşme ile 2 adet Optik Emisyon Spektrometre Cihazı ile Numune Hazırlama Ekipmanları Hatay ve Karabük İl Müdürlüğü laboratuvarlarımıza alınmış ve cihaz teslimleri yapılmış olup, serbest ödenek yetersizliği nedeniyle ödeme işlemleri gerçekleştirilmemiştir.
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.900	1.277	1.000	2	% 0,2	Proje kapsamında usta eğitim almak için 30255 kişi İl Müdürlüklerine başvuru yapmıştır. Ustaların bilgilendirmesi ve eğitimlere çağrılması amacıyla İl Müdürlüklerimizce ustalara SMS eğitimi sağlanmıştır. Diğer taraftan halihazırda toplam 1505 adet usta Kurs Bitirme Belgesi almıştır.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.800	2.100	1.500	20	% 1,3	<p>1) Ömer Halisdemir Üniversitesi ile yürütülen "Doğal Kayaların Oyuması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirme Tasarım ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında hazırlanan Yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine 05.12.2016 tarihinde gönderilmiş olup toplanan görüşler değerlendirilmektedir. Yönetmelik hazırlama çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>2) İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 27.05.2016 tarihinde imzalanan "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Kapsamında Uygulama Kılavuzu Hazırlanması Projesi" hizmet uygulaması protokolü kapsamında Uygulama Kılavuzunun Bakanlığımızca basılı ve dijital olarak çoğaltılması işi tamamlanmıştır. Bakanlığımız ve diğer kamu kurumlarında çalışan teknik personeller ve çelik yapıların tasarım, yapım ve denetim alanlarını da kapsayan tüm sektör çalışanlarına kaynak Kılavuz olarak dağıtım sağlanmıştır.</p> <p>3) "Kayadan Oyuma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği" nin 2017 yılı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.</p> <p>4) 2017 yılının ilk yarısında Bakanlığımızın planlı eğitimleri kapsamında 26-28 Nisan 2017 tarihlerinde İl müdürlüklerinde görevli teknik personele "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları"na dair eğitim verilmiştir.</p> <p>5) 2017 yılının 2. yarısında "Aşşap Yapıların Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" imzalanması planlanmaktadır.</p> <p>6) 2017 yılının 2. yarısında "Hafif Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" imzalanması planlanmaktadır.</p> <p>7) 23-24 Mart 2017 Tarihinde İstanbul'da düzenlenen İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2017 "Hedef Sıfır , Pratik Çözümler" konulu Eğitime Eğitici olarak katılım sağlanmıştır.</p> <p>8) 3 Kasım 2015 tarih ve 29521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik" kapsamında bisiklet yolu yapacak yerel yönetimlerce yol gösterici olması amacıyla "Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu" hazırlanmış olup internet sitemizde yayımlanmıştır. Paydaşlara dağıtımının sağlanması için basım çalışmaları devam etmektedir.</p>
2015K010100	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	1.750	550	550	0	% 0,0	Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi ile, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 58'inci maddesinin 8'inci fıkrasında hükme bağlandığı üzere, fenni mesullerin inşaat alanı sınırlamalarına ilişkin m ² , yapı yeri ile fenni mesulün işyeri arasındaki mesafe ile fenni mesullerin denetime ilişkin iş ve işlemlerinin internet ortamında izlenmesi ve bu şekilde bürokrasinin azaltılması ve sayısal ortamda belge üretimi hedeflenmektedir.
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	450	150	150	20	% 13,3	Brüksel-Belçika'da 17.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen 12. Yapı Daimi Komitesine katılım masrafları bu projeden karşılanmıştır. 03-06 Haziran 2017 tarihinde Fizik Mühendisleri Odası'nda 10 personelin katılımı ile Mühendislik Akustikliği Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	990	330	330	5	% 1,5	Projede Muayene ve Önkabul işlemleri tamamlanmıştır.
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000	0	500	206	% 41,2	Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile 18/01/2017 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol üç aşamadan ibaret olup, literatür taraması ve analizi içerikli ilk aşama tamamlanmıştır. Uygulama Rehberinin hazırlanacağı ikinci aşamanın çalışmaları devam etmektedir ve Ağustos 2017 de sunulacaktır. Protokolün üçüncü aşamasını oluşturan iki pilot tasarımın ilki için Kayseri ili belirlenmiş ve ön çalışmalarına başlanılmıştır. Kalkınma Bakanlığı ile yapılan istişarelerde; kadim şehirlerin seçimi ve belirlenmesine ilişkin kriterlerin tespit edilmesi ve bir sertifikasyon sisteminin tasarlanması hususunda görüş birliğine varılmasını müteakip, bu hususun da eklenmesi suretiyle hazırlanan "Revize Proje Teklifi Formu" Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere Bakanlığımız Strateji ve Geliştirme Başkanlığına iletilmiştir. Ayrıca, projenin süresinin 2016-2018 olacak şekilde revize edilmesi talep edilmiştir.
2016K090050	Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000	500	500	230	% 46,0	Proje için, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile 24.01.2017 tarihinde protokol imza edilmiştir. Protokolün bedeli kdv hariç 390,000-TL olup, süresi 180 (yüzseksen) gündür. Protokol iki aşamadan ibaret olup, ilk aşama tamamlanmıştır. Protokolün 1. Aşama Raporu, 25/04/2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüze sunulmuş ve rapor genel hatlarıyla uygun bulunmuştur. Akıllı kodların oluşturulacağı ikinci aşamanın çalışmaları devam etmektedir ve Eylül 2017 de sunulacaktır. Projenin tahminen Ekim 2017 gibi tamamlanması planlanmaktadır.
15 Proje		06 ve 07 TOPLAM	42.470	27.643	8.304	889	% 10,7	
		AB KATKISI	10.710	9.996	714	530	% 74,2	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090440	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.200	2.700	500	183	% 36,6	Proje kapsamında devam eden iki adet hizmet alımı işi vardır. - 2016 yılında ihalesi yapılan "Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek Gruplarına Yönelik Belgelendirme Sınav Merkezi ve Yetkilendirme Süreçleri Hizmet Alımı İşi"nin III.hakedişi yapılacaktır. (Sözleşme Bedeli 469.300,63TL+KDV olup %30 luk ödemesi yapılacaktır.) - "Uzaktan Eğitim Portal Yazılımı ilave modüllerin geliştirilmesi ve mevcut modüllerin güncellenmesi işi" ninin ödemesi gerçekleştirilmiştir. (İhale Bedeli 155.000TL+KDV)
2015K090500	e-Plan Otomasyonu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	4.000	3.300	700	0	% 0,0	Pilot çalışma kapsamında yürütülen çalışmalarda %16 oranında fiili gerçekleşme sağlanmış olup kontrol ve ödeme süreci devam etmektedir.
2016K090420	Hali hazır Harita Üretimine Yönelik 1/1000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	3.000	1.500	1.500	63	% 4,2	Proje kapsamında 9 adet ihale yapılmış olup sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu ihaleler kapsamındaki işlerin tamamlanmasına müteakip ödeme yapılacaktır. 63 bin TL tutarında ortofoto verilerinin depolanması amacıyla store, kartuş ve temizleme kartuşu alımı gerçekleştirilmiş olup ödemesi yapılmıştır.
2016K090430	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.400	700	700	0	% 0,0	% 10 Oranında fiili gerçekleşme sağlanmış olup ödeme süreci devam etmektedir.
2016K090440	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	2.600	2.000	600	0	% 0,0	Projenin sağlıklı işlemesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi kapsamında yapılacak çalışmaların yapılması amacı ile 2017 bütçesine ek olarak Bakanlık Döner Sermaye Bütçesinden 2.500.000 TL kullanılması talep edilmiştir.
2015K090410	Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	500	2.450	0	% 0,0	Mali gerçekleşme sağlanmamıştır. İşin yapımına ilişkin ihale süreci devam etmektedir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	500	2.450	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığına gönderilen 30/06/2017 tarihli ve 3305 sayılı yazı ile bütçe revizyonu talep edilmiş olup onay sürecine müteakiben çalışmalara başlanacaktır.
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (4*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	5.000	0	3.000	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı'nın 05/06/2017 tarihli ve 2574 sayılı yazısında Proje için Fizibilite Etüdü yapılmasına başlanacağı belirtilmiş olup bu doğrultuda hazırlık çalışmaları başlatıldığından harcama gerçekleşmemiştir.
2017K090360	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000		11.300	284	% 2,5	299 bin TL Proje kapsamında DMOdan iş istasyonu alımı avans yoluyla temin edilmiştir.DMOdan gelecek faturaya istinaden avans kapatılacaktır. 284 bin TL tutarında mal ve hizmet alımı gerçekleşmiş olup ödemesi yapılmıştır.
2017K090370	Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi ve Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000		4.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlığı devam etmektedir.
2017K090380	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000		4.800	0	% 0,0	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının Modernizasyonu işi öncesi İller Ağ Altyapı Keşif İşi ihalesi yapılmıştır. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmış olup, toplam 63 İl Müdürlüğünde keşif işi başlamıştır. Keşif işi bittikten sonra hazırlanacak raporlara göre ana iş kalemi olan Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının Modernizasyonu projesine başlanacaktır.
2017K090390	Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının İyileştirilmesi Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	6.000		5.000	0	% 0,0	Proje formu Kalkınma Bakanlığına sunulmuş olup, Kalkınma Bakanlığı projede değişiklik talep ederek ödeneye bloke koymuştur. İlgili projenin proje fişi güncellenerek Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş olup, gelecek cavaba istinaden ihaleye çıkılacaktır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu	2015-2017	1.000	510	490	0	% 0,0	Proje ihalesi 2015 yılında yapılmış olup 2017 yılında işin kabulünden sonra ödeme ödemesi yapılacaktır.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)		1.257	502	2	0	% 0,0	Projede %67 fiili gerçekleşme sağlanmıştır. Sözleşme başında 2016 yılı bütçesinden %40 oranında ödeme gerçekleştirilmiş olup sözleşme bitiminde %60 oranında ödemenin 2018 yılı bütçesinden yapılması planlanmaktadır.
AB KATKISI			11.297	4518	2	0	% 0,0	
14 Proje		06 ve 07 TOPLAM	77.457	12.212	37.492	530	% 1,4	
		AB KATKISI	11.297	4.518	2	0	% 0,0	

(4*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. Fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip pilot uygulama yapılabilecektir.

(6*) Yeni proje formu hazırlanacaktır. Proje formu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000300	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi Projesi (Turizm Sektörü)	2014-2017	1.663	1.208	455	0	% 0,0	Mersin Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi Kamera ile İzleme Projesi ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2017F000110	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi (Turizm Sektörü)	2017-2017	19.500		19.500	0	% 0,0	
	Köyceğiz Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	2.000		2.000	0	% 0,0	Köyceğiz Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
	Beypazarı İnözü Vadisi Peyzaj Projesi Yapımı	2017-2017	4.000		4.000	0	% 0,0	Beypazarı Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
	Uzungöl Çevre Düzenleme Projesi (DOKAP)	2017-2017	2.000		2000	0	% 0,0	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
	Pamukkale Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	3.000		3.000	0	% 0,0	Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır.
	Yerköprü Şelalesi Peyzaj Projesi Yapımı (KOP)	2017-2017	5.000		5.000	0	% 0,0	Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
	İnsuyu Mağarası Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	1.000		1.000	0	% 0,0	Burdur İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birlik Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
	Beşşehir Gölü Çevre Düzenleme Projesi (KOP)	2017-2017	1.500		1.500	0	% 0,0	Beşşehir Belediye Başkanlığının, proje alanının sit statüsünün değişmesinden dolayı yapılacak olan plan çalışmalarının tamamlanmasına müteakip projenin 2018 yılında gerçekleştirilmesi talebi üzerine ödenek revizyonu Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmiştir.
	Ürgüp Dağıstanlı Sokak Düzenleme Projesi (KOP)	2017-2017	1.000		1.000	0	% 0,0	Ürgüp (Nevşehir) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci,Ürgüp Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP) (Turizm Sektörü)	2017-2019	6.000		2.900	0	% 0,0	Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
2017K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçmesuyu Sektörü)	2017-2017	3.100		3100	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz ile Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Projesi için Eşmekaya Belediye Başkanlığı arasında, Selime (Aksaray) İçmesuyu Projesi için Selime Belediye Başkanlığı arasında, Çamlıhemşin (Rize) İlçesi Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Hattı Projesi için Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Her üç projede sözleşme imzalanmış olup işler devam etmektedir. Selime (Aksaray) İçmesuyu Projesi 405.130,17 TL tutarlı 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır.
2016K090060	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	2.000	825	675	0	% 0,0	İhale işlemleri devam ediyor.
2017K090260	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	800		600	0	% 0,0	Muhtelif Yerleşim yerlerinde yapılacak Halihazır Harita Alımı işi ile ilgili gelen talepler değerlendirilerek, işe ait teknik şartnameler hazırlanmış ve Genel Müdürlük Makam Olurları alınmıştır.Firmalardan teklifler alınarak yaklaşık maliyet hesabı yapılmış ve evraklar ihale yapılmak üzere ihale birimine iletilmiştir.Süreç devam etmektedir.
2017K090270	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	600		300	0	% 0,0	Protokoller imzalandı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090280	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	800		700	0	% 0,0	Belediyelerce yapılacak imar uygulamalarına maddi katkı sağlanması ile ilgili Genel Müdürlüğümüze yapılan talepler değerlendirilerek, Genel Müdürlük Makam Olurları alınmıştır. İlgili Belediyeler ile Genel Müdürlüğümüz arasında protokoller düzenlenerek, imzalanmıştır. Bu protokoller doğrultusunda, Belediyeler ile işi yapacak yüklenici firmalar arasında imzalanan sözleşme örnekleri Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Firmalar çalışmalarına devam etmektedir. Serik Belediyesinde (1) düzenleme sahasında yapılacak imar uygulaması ile ilgili henüz Genel Müdürlüğümüze sözleşme örneği iletilmemiştir.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2018	63.368	12.368	38.884	0	% 0,0	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 15.07.2016 tarihinde yapılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlenmesi İşbirliği protokolü" kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Göl dip ve yüzey alanından su bitkileri toplama çalışmalarına Haziran ayı başı itibari ile başlanılmıştır. Susuzlaştırma tesisi altyapı çalışmaları tamamlanmış, gölde çamur tarama çalışmalarına başlanmıştır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2018	3.713	2.603	625	53	% 8,5	Proje numarası altında yer alan Belek, Patara, Göksu Deltası ve Köyceğiz-Dalyan kumsal alanlarında Deniz kaplumbağalarının popülasyonlarının korunması ve izlenmesi, Gölbaşı ÖÇKB sevgi çiçeği, koruma ve izleme projesi, Tuz Gölü ÖÇKB'de Filamingo türü koruma ve izleme projesi, Foça ÖÇKB'de Akdeniz Foku koruma ve izleme projesi ihaleleri tamamlanmış, projelerin 1. Ara raporları teslim alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu proje altında yer alan Pamukkale ÖÇKB Yönetim Planı hazırlama projesi ihalesi Temmuz ayı içinde yapılacaktır. Projeler Kasım ayı itibariyle tamamlanacaktır.
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.250		500	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.800		700	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	104.594	17.004	68.939	53	% 0,1	

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2017	6.247	5.147	1.100	132	% 12,0	Proje devam etmektedir.31.03.2017-30.06.2017 tarihleri arasındaki harcamalar AB Katkısı tarafından yapılmış olup; ulusal bütçeden bu dönemde harcama olmamıştır.Tabloda belirtilen AB katkısı, yapılan ödemeler dikkate alınarak; Ulusal katkı ise Bakanlık bütçesinden aktarılan tutarlar dikkate alınarak hesaplanmıştır.
AB KATKISI			34.897	29.162	5.735	3.672	% 64,0	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2018	5.925	4.268	1.442	215	% 14,9	Proje devam etmektedir.31.03.2017-30.06.2017 tarihleri arasındaki harcamalar AB Katkısı tarafından yapılmış olup; ulusal bütçeden bu dönemde harcama olmamıştır.Tabloda belirtilen AB katkısı, yapılan ödemeler dikkate alınarak; Ulusal katkı ise Bakanlık bütçesinden aktarılan tutarlar dikkate alınarak hesaplanmıştır.
AB KATKISI			56.306	33.910	20.046	3.209	% 16,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	12.172	9.415	2.542	347	% 13,7	
		AB KATKISI	91.203	63.072	25.781	6.880	% 26,7	

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090820	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	1.000		1.000	890	% 89,0	İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Bölgesel Seminerlerine 2016 yılında 5 bölge ve 52 ilden toplam 1429 kişi katılmıştır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.000	0	1.000	890	% 89,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2019	110.139	33.704	28.645	11.411	% 39,8	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.923	2.923	100	94	% 94,0	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde KDV dahil 2.922.860,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2015 yılında HİZMETE AÇILMIŞTIR . 2017 yılında kesin hesap farkı ödenmiştir.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	7.796	4.796	3.500	3.461	% 98,9	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde KDV dahil 8.362.660,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %98' dir. 2017 Ağustos ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	4.717	2.217	2.500	1.134	% 45,4	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde KDV dahil 6.613.900,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR .
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	11.259	10.859	400	270	% 67,5	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde KDV dahil 9.140.280 TL 'ye ihale edilmiştir. 2016 yılında HİZMETE AÇILMIŞTIR . 2017 yılında kesin hesap farkı ödenmiştir.
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.293	2.793	2.500	1.910	% 76,4	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde KDV dahil 6.872.320,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %98' dir. 2017 Ağustos ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	8.824	6.324	2.500	1.778	% 71,1	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde KDV dahil 8.555.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %98' dir. 2017 Ağustos ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.292	3.792	1.700	1.647	% 96,9	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde KDV dahil 4.794.340,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Fiziki gerçekleşme %100' dür. Geçici kabul yapılmıştır. 2017 Ağustos ayında hizmete açılması planlanıyor.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.407	0	2.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde ihale edilmiş olup, ihale komisyonunun değerlendirmeleri devam etmektedir.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.345	0	2.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. Proje hazırlıkları tamamlanmak üzere.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.383	0	3.420	956	% 28,0	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde KDV dahil 6.652.840,00 TL'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %15' dir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	7.267	0	1.201	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. Proje hazırlıkları tamamlanmak üzere.
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	17.003	0	3.900	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. Proje hazırlıkları tamamlanmak üzere.
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	5.888	0	1.500	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. Proje hazırlıkları tamamlanmak üzere.
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	7.043	0	1.500	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. Proje hazırlıkları tamamlanmak üzere.
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2017-2018	1.699	0	1.000	161	% 16,1	Hizmet binası yapım işi 27.03.2017 tarihinde KDV dahil 1.335.760,00 TL'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 14.04.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %20' dir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Döner Sermaye		45.170	0	22.768	0	% 0,0	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	35.320		19.768	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 23.08.2016 tarihinde KDV dahil 30.599.760,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 07.07.2017 tarihinde imzalandı, yapım işi henüz başlamamıştır.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	5.100		1.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.Arsa tahsisi sağlanıyor.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	4.750		1.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. Proje hazırlıkları tamamlanmak üzere.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2017-2017	243		243	0	% 0,0	3 adet T5 (Minibüs) tipi aracın DMO dan temini için 243.000 TL tutarında kredi açılmıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı (Döner Sermaye-6.500.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	7.880		7.880	1.704	% 21,6	2017 yılında Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, İl Müdürlüklerine 6.222.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
	Hizmet Binası Onarımı (Döner Sermaye-3.500.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	5.300		5.300	500	% 9,4	2017 yılında Hizmet binası onarımı için, İl Müdürlüklerine 5.250.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
2017G000130	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2017-2017	5.106		5.106	550	% 10,8	2017 yılında Lojman binası onarımı için, İl Müdürlüklerine 4.800.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	118.668	33.704	37.174	12.877	% 34,6	
		DÖNER SERMAYE	55.170	0	32.768	1.288	% 3,9	
		GENEL TOPLAM	173.838	33.704	69.942	14.165	% 20,3	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017G000130	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2017-2017	1.345		1.345	15	% 1,1	Sincan/Fatih de bulunan 58/5 ve 64/2 Kamu Konutlarının Pis ve Temiz Su Borularının değiştirilmesi işi yapılmıştır. Çankaya 2. Devlet Mh. 5/4-11, 7/3-4 ve 9/4 nolu Kamu Konutlarına Hermetik Şöbhen Takılması, Montaj ve Demontaj ile Doğalgaz Proje İşleri Yapılmıştır.
2017K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taahhüt Alımı	2017-2017	141		141		% 0,0	
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2017-2017	1.722		1.722	157	% 9,1	Bakanlığımız Spor Salonunda Kullanılmak Üzere Koşu Bandı ve Bakanlığımız Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Geri Dönüşüm Atık Ünitesi Alınmıştır. Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Bilişim Makinaları, Kontrol ve Güvenlik Makinaları ile Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Alınmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2017-2017	500		500	205	% 41,0	Bakanlığımız Matbaasına Havalandırma Sistemi ile Merkez Hizmet Binası 18. Kat Tadilatı Yapılmıştır. Geçici Atık Depolama Alanı İnşaatı ile Kafes Yapım ve İmalat İşleri Yapılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.241	0	1.241	377	% 30,4	
		DÖNER SERMAYE	2.467	0	2.467	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	3.708	0	3.708	377	% 10,2	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 30.06.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100160	Çevre Sorumluluk Direktifinin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	525	370	155	0	% 0,0	Proje kapsamında 2017 yılı için ödeme çağrısı henüz gelmemiştir. Bu nedenle herhangi bir harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında; 26 -31 Mart 2017 tarihleri arasında İspanya'da (5) günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			4.723	3.170	1.553	0	% 0,0	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	525	370	155	0	% 0,0	
		AB KATKISI	4.723	3.170	1.553	0	% 0,0	
