

01 Ocak 2015-30 Eylül 2015 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

Strateji Geliştirme Başkanlığı


01 Ekim 2015

BAKANLIĞIMIZ 2015 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2015 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	601.346.000	601.345.000	477.232.001	% 79,4
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	100.562.000	100.563.000	79.421.970	% 79,0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	71.118.000	86.258.560	55.280.439	% 64,1
05	CARİ TRANSFERLER	199.522.000	279.672.000	152.473.712	% 54,5
06	SERMAYE GİDERLERİ	218.100.000	832.156.940	432.005.776	% 51,9
	Bakanlık Yatırım Programı	201.300.000	276.942.922	127.979.155	% 46,2
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.800.000	16.800.000	1.296.500	% 7,7
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0	538.414.018	302.730.121	% 56,2
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	142.537.000	143.523.000	63.577.039	% 44,3
	Bakanlık Yatırım Programı	36.140.000	37.126.000	6.750.791	% 18,2
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	106.397.000	106.397.000	56.826.248	% 53,4
08	BORÇ VERME	25.731.000	41.234.000	17.494.095	% 42,4
GENEL TOPLAM		1.358.916.000	2.084.752.500	1.277.485.032	% 61,3

BAKANLIĞIMIZ 2015 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

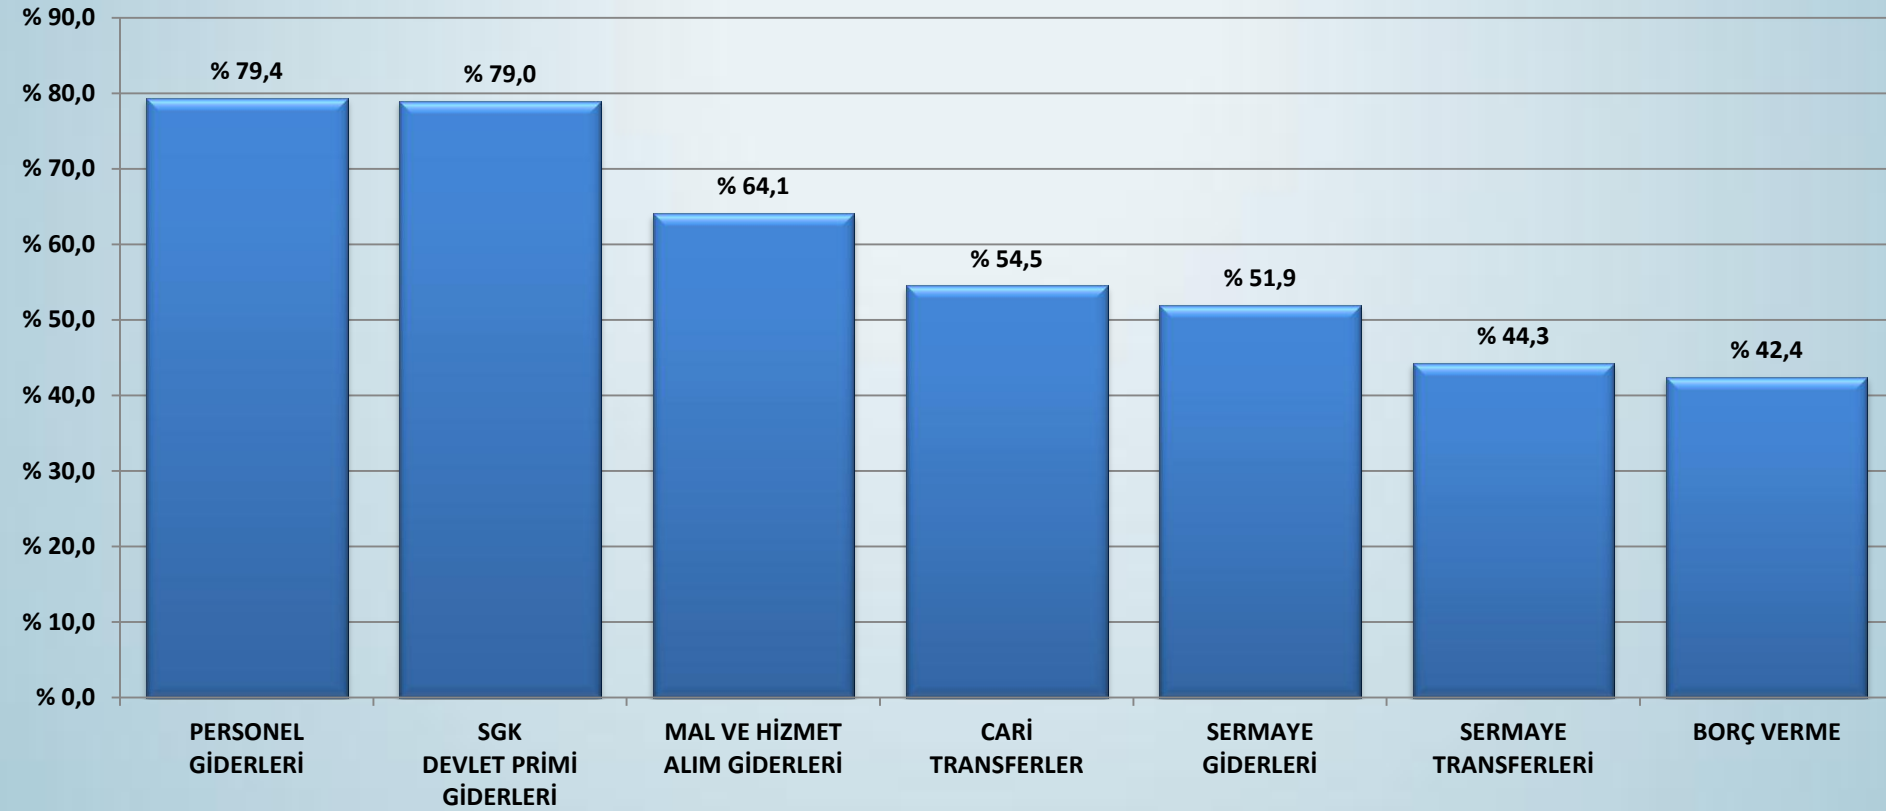


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2015 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	30.09.2015 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	30.186.000	31.066.606	13.381.896	% 43,1
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	177.148.000	184.301.000	69.657.015	% 37,8
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	47.817.000	46.271.800	24.862.124	% 53,7
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	139.644.000	233.452.828	141.784.132	% 60,7
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	159.831.000	237.652.460	156.626.574	% 65,9
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	17.374.000	17.374.000	11.034.394	% 63,5
COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	48.467.000	50.543.100	8.706.433	% 17,2
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	46.569.000	45.476.400	14.902.581	% 32,8
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	8.160.000	8.160.000	5.371.722	% 65,8
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	4.124.000	4.124.000	2.948.442	% 71,5
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.143.000	1.143.000	1.085.905	% 95,0
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.400.000	3.827.400	2.491.081	% 65,1
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.555.000	10.555.000	9.090.233	% 86,1
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.774.000	4.776.800	2.752.575	% 57,6
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.595.000	10.216.000	8.024.462	% 78,5
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.571.000	3.581.000	2.611.717	% 72,9
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	30.353.000	30.675.700	20.508.697	% 66,9
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	711.000	706.800	413.936	% 58,6
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	25.921.000	25.946.000	16.694.541	% 64,3
İL MÜDÜRLÜKLERİ	595.573.000	1.134.902.605	764.536.574	% 67,4
TOPLAM	1.358.916.000	2.084.752.500	1.277.485.032	% 61,3

(*) Veriler e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2015 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

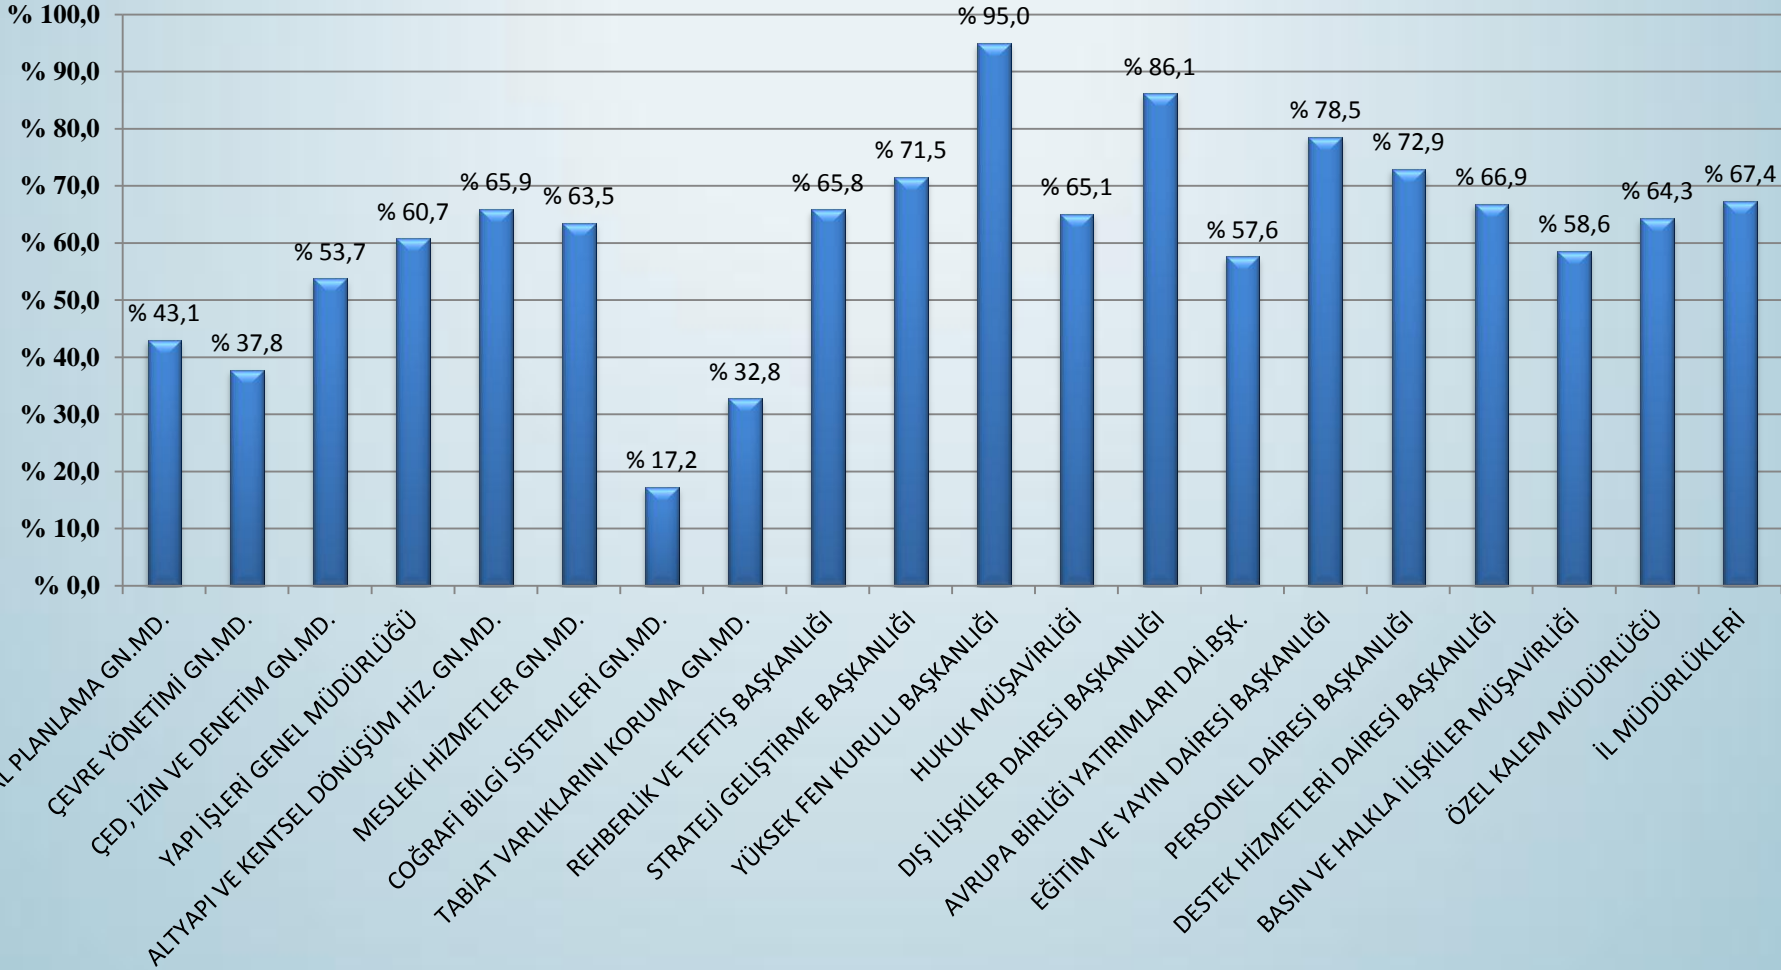

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	30 Eylül 2015		Gerçekleşme ORANI (%)
			REVİZE ÖDENEĞİ	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	7	74.291.000	14.845.000	2.089.898	% 14,1
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	20	28.248.000	11.246.000	1.480.782	% 13,2
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	10	81.891.000	30.838.000	9.486.372	% 30,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	18	1.022.188.000	153.552.000	100.648.809	% 65,5
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Gn. Md. (DETAY)	6	22.308.000	12.150.000	2.191.782	% 18,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	13	41.180.000	7.150.000	3.232.487	% 45,2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	22	64.130.000	45.203.000	2.025.807	% 4,5
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	11	43.120.000	36.528.000	7.035.002	% 19,3
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	15.552.000	2.889.000	753.669	% 26,1
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY)	1	700.000	700.000	0	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri (DETAY)	5	92.899.000	47.470.000	24.004.878	% 50,6
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	3.725.000	3.725.000	8.555	% 0,2
Hukuk Müşavirliği (DETAY)	1	444.000	178.000	0	% 0,0
GENEL TOPLAM	115	1.490.676.000	366.474.000	152.958.041	% 41,7
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	109	1.219.186.000	263.226.000	73.867.041	% 28,1
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	6	271.490.000	103.248.000	79.091.000	% 76,6

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

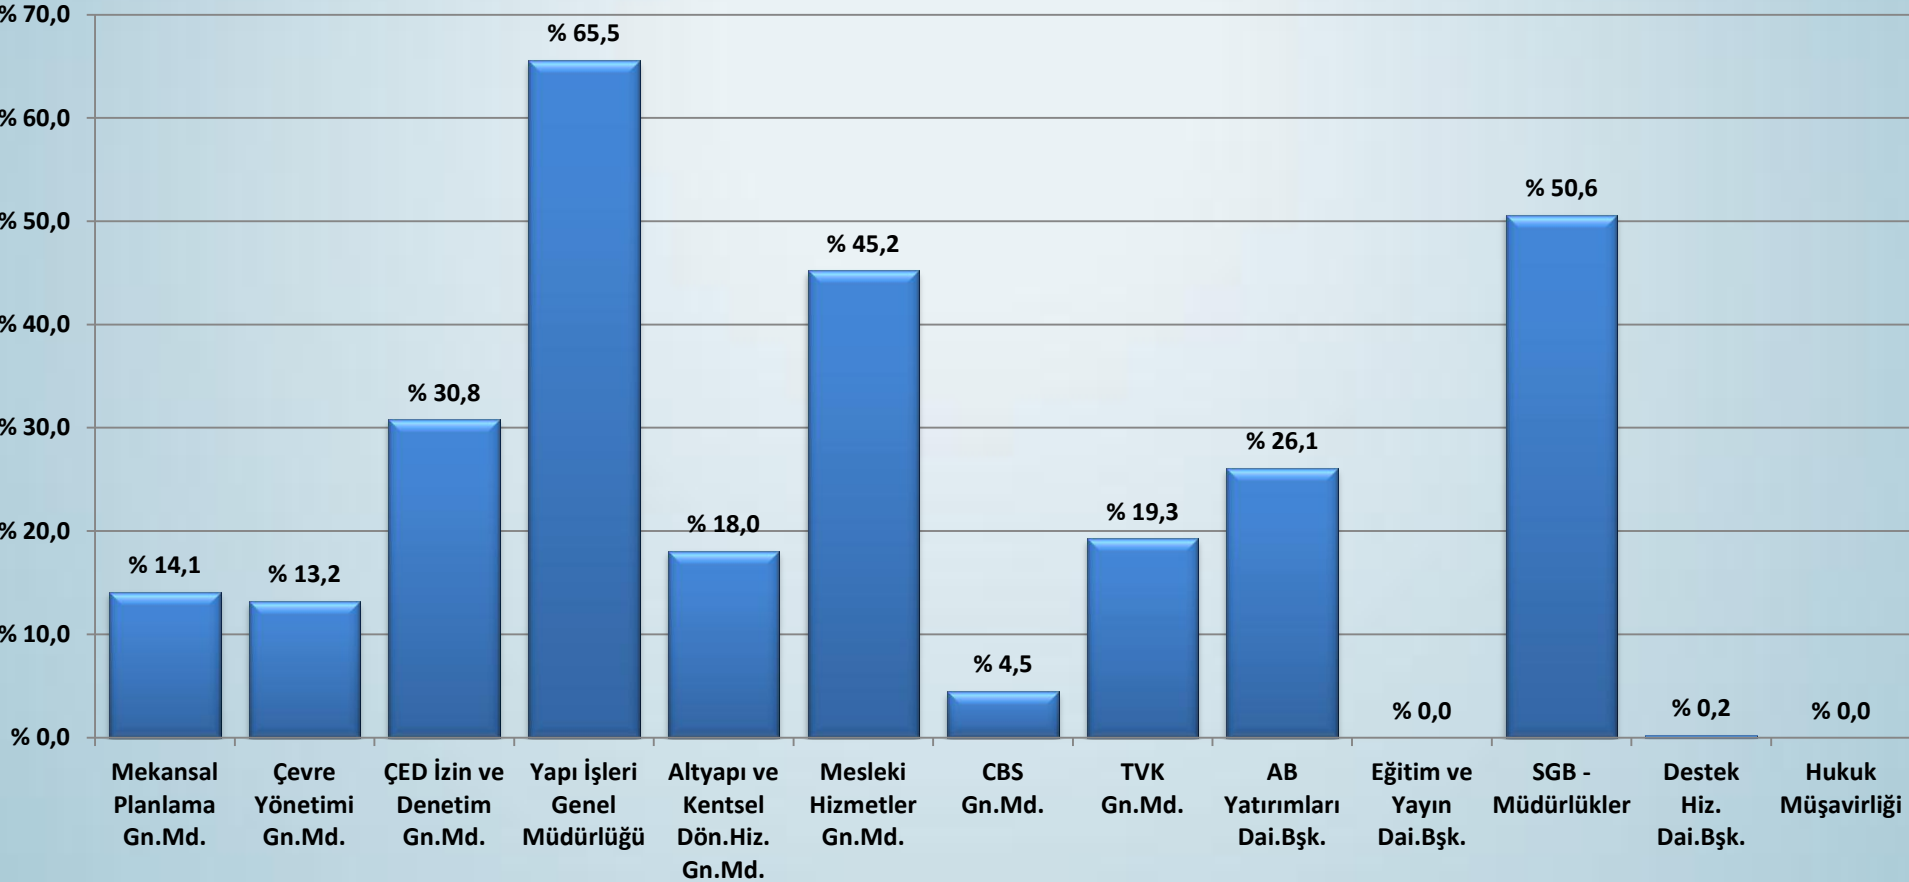

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2016	2.000	200	1.000	0	% 0,0	İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2015	62.291	53.646	8.645	1.855	% 21,5	1-İhalesi 2014 yılında yapılan "İstanbul İli 6ncı Etap Mikrobölgeleme" işi için toplam 632.480 TL' nin ödeme gerçekleştirilmiştir. 2- İhalesi 2014 yılında yapılan "İstanbul İli 5nci Etap Mikrobölgeleme" işi için 705.404 TL nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. 3-İhalesi 2014 yılında yapılan "Diyarbakır İli Sur İlçesi Jeolojik - Jeoteknik Etüt" işi için 2. aşama 17.641,00 TL'nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. 4- BİMTAŞ ile yapılan Kurumsal İş Birliği Protokolü kapsamında ödenmesi gereken %10'luk dilim olarak 500.025 TL'nin ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2015	3.350	2.150	1.200	189	% 15,8	1-Proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılarak işe başlanılan Afyon-Uşak-Kütahya Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı işinin KDV Dahil 188.800 TL hakediş ödemesi yapılmıştır. 2-Proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılarak işe başlanılan Afyon-Uşak-Kütahya Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı işinin kalan 283.200,00 TL nin ödemesi 2015 yılı sonu itibariyle yapılacaktır. 3- 2014 yılında tamamlanması öngörülen ancak plan onay süreçleri nedeniyle tamamlanamayan Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı işlerinin kalan ödemeleri olan sözleşme bedellerinin %5 lik kısımları 2015 yılı içinde ödenecektir.
2014K090060	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.000	1.000	1.000	0	% 0,0	İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (5*) (Şehirleşme Sektörü)	2013-2016	2.650	0	1.000	0	% 0,0	İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2015K090010	Özel Proje Alanları (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.600		1.600	46	% 2,9	Proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılan "AKM Alanı Etüt" işinin KDV Dahil 45.548 TL hakedişi ödenmiştir.
2015K090020	Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	400		400	0	% 0,0	2015 yılı yatırım programında bulunan "Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi"ne ilişkin çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce başlatılmış olup, toplam 1.100.000,00 TL (Bir milyon yüz bin Türk Lirası) bedeli olan söz konusu projeye ilişkin 21.05.2015 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılmış ancak ön yeterlilik şartnamesinin "İhalenin iptali" başlıklı 22'nci maddesinin 1 nolu bendinde belirtilen; "Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilecektir." hükmüne istinaden ihale iptal edilmiştir. Bu çerçevede projenin niteliği de göz önünde bulundurulurken, Genel Müdürlüğümüzce daha önceden böyle bir işin yapılmamış olması sebebiyle bundan sonraki çalışmalara da örnek teşkil edebilecek nitelikte olması ve Kalkınma Bakanlığında söz konusu projeye ilişkin Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneğin yılsonuna kadar kullanılması gerektiğinden, söz konusu projeye ilişkin bir protokol metni taslağı hazırlanmış ve Genel Müdürlük Makamının görüşüne sunulmuştur.
7 Proje		06 ve 07 TOPLAM	74.291	56.996	14.845	2.090	% 14,1	

(5*) Projenin kapsamı ve maliyetine ilişkin Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra harcama yapılabilir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K060210	Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2016	3.000		1.600	0	% 0,0	Proje için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Hastanesi ile 28.05.2015 tarihinde protokol imzalanmış olup; Yüklenici tarafından proje miktarının revize edilmesi talep edilmiş ve tarafımızca kabul edilmemiştir. Bu kapsamda projenin karşılıklı olarak feshedilmesi amacıyla hazırlanmış olan protokol imzalanmıştır. Ayrıca proje kapsamında yeniden TÜBİTAK-MAM 'dan fiyat teklifi istenmiş olup, sözleşme imzalanma aşamasındadır.
2015K080010	Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2016	1.500		400	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış, satın alma işlemlerine başlanmıştır. İhale işlemlerinin 3/e yöntemi ile TÜBİTAK'la sözleşme yapılarak tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda proje sözleşme aşamasına gelmiştir.
2015K080020	Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2016	3.000		900	0	% 0,0	İhale işlemleri 4734 sayılı İhale Kanununun 3/f yöntemi ile tamamlanmış olup, Düzensiz depolama sahaları envanter projesi ile ilgili Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 05/10/2015 tarihinde protokol imzalanmış olup Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile proje yürütülecektir.
2015K080030	Katı Atık Ana Planının Güncellenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2016	2.000		200	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış, satın alma işlemlerine başlanmıştır. İhale işlemlerinin 3/e yöntemi ile TÜBİTAK'la sözleşme yapılarak tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda proje sözleşme aşamasına gelmiştir.
2013K100030	İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	2.475	1.175	1.300	345	% 26,5	<ul style="list-style-type: none"> TÜBİTAK tarafından 2.Taslak Ulusal Bildirim Bakanlığımıza teslim edilmiştir. 3. Proje İlerleme Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş olup TÜBİTAK'a 344.990,70 TL hak ediş ödemesi yapılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100050	Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	212	112	100	100	% 100,0	Projenin ilk ara raporu 2014 yılında, ikinci ara raporu, üçüncü ara raporu ve nihai (final) raporu ise 2015 yılında süresi içerisinde Bakanlığımıza sunulmuş olup; Ağustos 2015 sonu itibarıyla proje tamamlanmış ve son ödemesi yapılmıştır.
2012K100070	Çevresel Açından Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü)	2012-2015	1.563	1.164	399	0	% 0,0	Proje kapsamında 2014 yılında 930.000 TL ödeme yapılmıştır. Projede sonuç raporu 2015 yılı Haziran ayı sonunda teslim edilmiş olup, inceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu bağlamda sonuç raporunun kabulü 2015 yılı 4. çeyreği içerisinde yapılması ön görülmekte olup kabulünden sonra 399.000 TL. ödeme yapılacaktır.
2013K100080	Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.457	1.427	30	27	% 90,0	Proje 2015 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla tamamlanmış olup nihai kalan ödemesi Temmuz ayında ödemesi yapılmıştır.
2014K100100	Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	848	348	500	0	% 0,0	Aralık 2014 tarihi itibarı ile ihale edilmiş ve 300.000 TL ödeme yapılmıştır. Yazılım konfigürasyon araçlarının ve geliştirme ortamının kurulması ile yazılım geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Test, kabul ve eğitim işlemleri sonrası hazırlanacak sonuç raporunun kabulünden sonra 500.000 TL ödeme gerçekleştirilecektir.
2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.944	510	1.434	399	% 27,8	Şubat ayında Çalışma grubu toplantıları düzenlenmiş, Mayıs ayında Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Haziran ayında I. İlerleme Raporunun Nihai hali teslim edilmiş olup ödemesi gerçekleştirilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100050	İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2016	4.000		1.800	0	% 0,0	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile hizmet alım protokolü imzalanma aşamasındadır.
	İklim Değişikliği Konusunda Öğrenci ve Öğretmen Adaylarının Farkındalığının Geliştirilmesi	2015-2016	2.000		900	0	% 0,0	
	Yerel Yönetimlere Yönelik Kapasite Geliştirme	2015-2016	2.000		900	0	% 0,0	
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2016	1.933	0	870	0	% 0,0	Proje, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bakanlığımız arasında yapılan protokolün 30.09.2015 tarihinde imzalanması ile başlatılmıştır.
	Çimento Tesisleri	2014-2016	933	0	480	0	% 0,0	
	Otomotiv Tesisleri	2015-2016	1.000		390	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2015	250	191	59	0	% 0,0	Proje halen devam etmekte olup, 2015 Aralık ayında tamamlanacaktır. 2014 yılı itibari ile toplam 29.000 TL ödeme yapılmıştır. Kalan miktar 27.533,35 Avro olup, 2015 yılı yatırım programına konulmuştur. 2015 yılı ile ilgili Merkezi Finans ve İhale Kurumundan ödeme ile ilgili yazı gelmediği için henüz ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			15.434	11.266	4.168	0	% 0,0	
2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2012-2015	321	191	130	128	% 98,5	Proje 26 Haziran 2015 tarihi ile sona bitmiştir. Projenin çıktıları olan Ulusal Uygulama Planı,, Sektörel ve Düzenleyici Etki Analizi ile Taslak Yönetmelik çalışmaları tamamlanmıştır.
AB KATKISI			2.456	1.748	708	690	% 97,5	
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	886	0	443	0	% 0,0	2013K100090 Nolu 'Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesinin' toplam proje tutarı 7.236.000 TL olup bütçesi 3.000.000 Avro'dur. Söz konusu projenin ulusal katkısı 804.000 TL olup proje süresi iki yıldır (2014-2016). Proje 25 Aralık 2014 tarihinde başlamış olup proje için 120.000 Avro yatırıldığı kur üzerinden 344.832,00 TL tutarındaki ulusal katkı payı yatırılmıştır.13/02/2015 tarihinde ulusal katkı olarak 97.431,2 €, AB katkısı olarak 876.880,8 € yüklenici firmaya ödenmiştir. Projenin genel amacı, sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve raporlanması ile ilgili tespit edilen boşlukların giderilmesi, Ulusal Sera Gazı Envanterinin, sera gazı projeksiyonlarının ve iklim değişikliği ulusal bildirimlerinin hazırlanması konusunda teknik düzeyde kapasitenin artırılması amaçlanmaktadır. Proje açılış raporu onaylanmıştır. Hazine Müsteşarlığı'ndan ödeme ile ilgili yazı gelmediğinden henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			7.966	0	3.585	0	% 0,0	
2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	295	0	148	0	% 0,0	Proje halen devam etmektedir. Projenin Temmuz 2016'da tamamlanması planlanmaktadır. 2015 yılı ile ilgili Merkezi Finans ve İhale Kurumundan ödeme ile ilgili yazı gelmediği için henüz ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			2.655	0	1.328	0	% 0,0	
2014K100080	Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	738	0	350	345	% 98,6	Projenin AB ihale usulleri kapsamında ihale aşaması halen devam etmektedir.Bu sebeple 2015 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Projenin 2015 yılı son çeyreğinde başlaması planlanmaktadır.2015 yılı ilk altı ay dönemi için Hazine Müsteşarlığı'ndan harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Proje için ödemelerin 2015 yılı son çeyreği veya 2017 ilk çeyreğinde ödeme yapılması öngörülmektedir.
AB KATKISI			6.638	0	3.319	3.280	% 98,8	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	738	0	295	0	% 0,0	Proje 12 Mart 2015 tarihi itibariyle başlamıştır. Proje 2 yıl sürecek olup, 2015 yılı ile ilgili Merkezi Finans ve İhale Kurumundan ödeme ile ilgili yazı gelmediği için henüz ödeme yapılmamıştır. 287,360 TL tutarındaki ulusal katkı payı, 2014 yılı içerisinde Ulusal Katkı Ana Hesabı'na aktarılmıştır. 2015 yılı ilk dokuz ay dönemi için Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.
AB KATKISI			6.638	0	3.319	0	% 0,0	
2015K100060	Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	738	0	148	0	% 0,0	2012 yılı ESEİ programlaması kapsamındaki projeye ilişkin Proje Fişi onaylanmış ve Teknik Şartname hazırlığı tamamlanmış olup, Merkezi Finans İhale Birimi tarafından İhale sürecinin ilk aşaması 27 Nisanda başlatılıp Bakanlığımızın katılımı ile tamamlanmıştır. Proje yürütücüsünün seçileceği ikinci değerlendirme süreci Merkezi Finans İhale birimi koordinasyonunda yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 2015 yılı itibari ile projenin başlayacağı Merkezi finans İhale Birimi tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir. 2015 yılı ilk altı ay dönemi için Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. İhal değerlendirme için ikinci aşama Eylül 2015 sonu itibariyle başlaması planlanmakla birlikte, henüz ihale Merkezi Finans İhale birimi tarafından daha sonra başlatılacağı hususunda bilgi alınmıştır. İhale henüz başlatılmamıştır.
AB KATKISI			6.638	0	1.328	0	% 0,0	
2015K100150	Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	350	0	140	138	% 98,6	Söz konusu projenin ihale süreci tamamlanmış olup yüklenici firma belirlenmiştir. Projenin Kasım 2015 tarihinde başlaması planlanmaktadır.
AB KATKISI			3.150	0	788	779	% 98,9	
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	28.248	5.118	11.246	1.482	% 13,2	
		AB KATKISI	51.575	13.014	18.543	4.749	% 25,6	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100020	Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2016	1.500		750	0	% 0,0	Projenin sözleşmesi TÜBİTAK-MAM ile 14.07.2015 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.268.000,00 TL (KDV hariç)dir. Yüklenici iş termin planını sunmuştur. İş termin planının muayene kabulü yapılmış olup, 2015 yılı içerisinde iş termin planı için %20'lik ödeme işlemi için (253.600 TL) hakediş süreci devam etmektedir (TÜBİTAK'dan faturalar beklenmektedir). Proje bütçesinin 2015 yılı için 600.000 TL, 2016 yılı için 900.000 TL olmasına dair Kalkınma Bakanlığında 25.08.2015 tarihinde yapılan toplantıda revizyon talebinde bulunulmuştur.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	592	383	209	57	% 27,4	Projenin % 20' lik ikinci ödemesi Eylül ayında yapılmıştır. Proje' nin sözleşmedeki süresi 03.10.2015 tarihi itibarıyla bitmiştir. Muayene Kabul İşlemlerine başlanacak olup; sözleşme tutarının son ödemesi olan % 20' lik kısmının ödemesi yapılacaktır.
2014K100110	İl Müdürlüklerinin Denetim Kapasitesinin Artırılması (Çevre Sektörü)	2014-2015	1.284	0	1.284	0	% 0,0	Projenin iptal edilmesine ilişkin olarak Kalkınma Bakanlığı'na talep yazısı gönderilmiştir.
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2016	9.556	3.726	4.000	1.208	% 30,2	Proje iki bileşenden oluşmaktadır. I. Bileşen: hava kalitesi ön değerlendirme projesi kapsamında Ankara THM, Konya THM, Adana THM ve Diyarbakır THM bağlı illeri içermektedir. II. Bileşen: mevcut hava kalitesi ölçüm araçlarının yenilenmesini içermektedir. Bu kapsamda hiç bir proje önerilmemiştir. Ankara THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi; 2 hakediş yapılmıştır.3.Ara Rapor; 4.Ara Rapor ödendi.Nihai rapor tamamlandı. Konya THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi;I. Ara raporun ve II ara rapor hakedişi ödendi. Adana THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi;I. Ara raporun ve II ara rapor hakedişi ödendi. Diyarbakır THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi; proje haziran 2015 tarihi itibarı ile başladı. Ancak şuan itibarıyla herhangi bir saha çalışması yapılamamaktadır. Ayrıca belirtilen proje kapsamında kullanılmak üzere yedek malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü)	2011-2016	7.420	0	3.650	1.040	% 28,5	
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2016	5.720	0	1.950	0	% 0,0	17.06.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli; 3.911.700,00 TL (KDV Dahil)dir. 2016 Eylül Ayında Temiz Hava Merkezinin inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	1.700	0	1.700	1.040	% 61,2	Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası İşi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası tadilat projeleri hazırlanmış, ihale talimatı verilerek ihale işlemleri tamamlanarak yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.154.000TL (KDV Dahil) dir.
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü)	2012-2016	22.156	1.793	8.700	4.508	% 51,8	
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.156	856	3.300	1.832	% 55,5	06.03.2014 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yüklenici ile sözleşme imzalanmış olup ihale bedeli 3.296.000 TL'dir. (KDV Dahil),2015 yılı 9. Ayı itibari ile itibari ile binanın %95 oranında fiziki gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2015 yılı Ekim ayı itibari ile Temiz Hava Merkezinin teslimi planlanmaktadır.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	6.140	0	1.300	286	% 22,0	03.06.2015 tarihinde ihalesi yapılmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli;4.657.460,00 TL (KDV Dahil)dir. 2015 yılı Temmuz ayında sözleşme imzalanması beklenmektedir. 2016 Eylül Ayında Temiz Hava Merkezinin inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	7.823	0	1.000	0	% 0,0	İl Müdürlüğü tarafından uyulama Projeleri avan projeler hazırlanmıştır Söz konusu iş için tespit edilen muhammen bedel 7.842.627 TL (KDV Hariç) olarak tespit edilmiş olup . 2015 yılı Diyarbakır Temiz hava merkezi için ayrılan ödenek artışı sağlanmış ihale talimatı verilmiştir.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.037	937	3.100	2.390	% 77,1	03.07.2014 tarihinde ihalesi yapılmış, yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.119.900 (KDV Dahil) olup 2015 yılı eylül ayı itibari ile binanın fiziki olarak fiziki gerçekleşme oranı %95 dir. 2015 yılı Ekim ayında binanın teslimi planlanmaktadır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu	2015-2016	3.000		998	0	% 0,0	Projede yer alan hava kalitesi modelleme çalışmalarının halihazırda KAMAG projesi ile yürütülmesi sonucunda proje çalışmalarını mükerrerlik teşkil etmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar durdurularak KAMAG projesinin sonuçlarının beklenmesi, proje sonucunda eksik kalan hususların söz konusu yazılım projesi ile tamamlanması, 2015 yılında harcama yapılmaması, projenin 2015-2017 yıllarını kapsayacak şekilde bir yıl süre uzatımı ihtiyacı Genel Müdürlüğümüzce hasıl olmuştur. Bu kapsamda 25.08.2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığında yapılan toplantıda proje bütçesinin 2015 yılında 998.000 TL'lik ödeneğinin 2016 yılına 1.000.000 TL olarak, 2016 yılında 2.002.000 TL'lik ödeneğinin ise 2017 yılına 2.000.000 TL olarak revize edilmesi Genel Müdürlüğümüzce talep edilmiştir. İhtiyaçlar bakımından değişiklik gösterdiği için proje fişinde değişiklik yapılması hususu Kalkınma Bakanlığı yetkililerince bildirilmiştir. Proje fişi revize edilerek bütçe çalışması yapılmış, gerekçe ve revize proje fişi Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Bu kapsamda 01.01-30.09.2015 tarihinde bir harcama yapılmamıştır.
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	15.879	6.392	5.100	2.595	% 50,9	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması (Samsun THM); Samsun THM bağlı illerde 11 adedi Aralık 2014 tarihinde tamamlanan istasyondan 9 adedi Haziran 2015 tarihinde tamamlanmış olup toplam 20 istasyonun kurulumu gerçekleştirilmiştir. Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Bakım-Onarım Projesi; 2014 yılına ait bakım onarım projesi ile ilgili son hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Şubat 2015 tarihinde başlayan ve aylık olarak bakım-onarım ve kalibrasyon hizmeti hakedişlerinin düzenlendiği projede 5. hakediş ödemiş olup 6. hakediş inza aşamasındadır.
	Döner Sermaye	2015-2016	19.280		6.000	0	% 0,0	İzmir ve Erzurum Temiz Hava Merkezlerine Bağlı İllerde Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ile ilgili 31.08.2015 tarihinde ihaleye ilişkin sözleşme imzalanmış olup ilk ödeme 2016 yılı Şubat ayında, ikinci ödeme Haziran ayında, üçüncü ödeme ise Eylül ayında yapılması planlanmaktadır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2015	885	740	145	77	% 53,2	Seveso II Direktifi'nin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi, 17/11/2014 tarihinde tamamlanmıştır.. 2014 yılında ödenecek olan ulusal katkı payı ödenek yetersizliği sebebi ile ödenememiş olup sözkonusu ulusal katkı ödemesi 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. *Ödemeleri Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından yapılan proje ile ilgili olarak, MFİB'den "19/3/2015 tarihinde; 602.115,24 Euro AB katkısı, 66.901,69 Euro TR katkısı olmak üzere toplamda 669.016,93 Euro nihai ödeme yapılmıştır"şeklinde bilgi alınmıştır.
AB KATKISI			7.965	7.522	443	232	% 52,4	
2014K100070	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	339	136	2	0	% 0,0	SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi 12 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla başlamış olup halihazırda proje faaliyetleri devam etmektedir. Proje çerçevesinde 2015 yılı için ulusal katkı payı ödemesi bulunmamaktadır.
AB KATKISI			3.054	1.145	1.069	0	% 0,0	
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	62.611	13.170	24.838	9.486	% 38,2	
		DÖNER SERMAYE	19.280	0	6.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	81.891	13.170	30.838	9.486	% 30,8	
		AB KATKISI	11.019	8.667	1.512	232	% 15,3	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binası İnşaatı (Döner Sermaye)	2010-2015	197.000	180.000	43.766	39.650	% 90,6	Geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.
	Bakanlık Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler (Döner Sermaye)	2014-2015	38.405	0	38.405	36.057	% 93,9	Geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü)	2015-2015	1.000		1.000	0	% 0,0	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı İşi ihalesi 28.08.2015 tarihinde yapılmış olup, 675000 TL+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. Afet Müdahale Çantası işinin yüklenici firması " Baytaş Proje Haf. Taah. Peyz. Müh.TIC.LTD.ŞTİ." arasında ayakkabı no. ve giysi bedenleri ile ilgili görüşmeler devam etmektedir.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	1.150	0	1.150	360	% 31,3	Proje arşivinin taranması işi 16.12.2014 tarihinde KDV dahil 859.630,00 TL'ye ihale edilmiştir. Arşiv tarama programı kapsamında 2015 yılında 100 adet projenin taranarak dijital arşive katılması hedeflenmektedir. Ocak-Haziran döneminde 60 adet proje taranarak dijital arşive eklenmiştir. Proje kapsamında Yapım İşlerinde Tasarım ve Asbuid Projelerin Süreçsel Yönetimine İlişkin CAD Standartlarının Oluşturulması ve İş Süreçleri ve Kontrol Mekanizmasının Analizi ve Dokümantasyonu İşi ile ilgili yüklenici tarafından hazırlanan tasarı ve snama raporları incelenmektedir.
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2016	2.990	850	1.500	378	% 25,2	2015 yılı içerisinde Bakanlığımızca, "4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları Eğitimi" ve "TS EN ISO/ICE 17025 Temel Eğitimi ile TS EN ISO/ICE 17025 İç Tetkik Kalite Eğitimi" adı altında eğitimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2016	3.500	200	2.000	107	% 5,4	Yapı Denetim Sistemi Uygulama, Bakım, Destek, İyileştirme, Bakanlık Merkezine Taşınması ve Merkez Bilgi İşlem Altyapısına Entegrasyonu İşi ihalesi 20.01.2015 tarihinde yapılmış olup, 142500 TL+KDV bedelli sözleşme 22.01.2015 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425000 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve pilot illerde uygulama aşamasındadır. Ayrıca mevcut yazılım bakımının ve yeni yazılım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2016	1.300	400	600	40	% 6,7	Yatırım Takip Sistemi (YTS) Yazılım Bakımı, AFET Yazılımı, İSKAN Yazılım ve Bakımı,donanım,bilgisayar alımı,makine teçhizat alımı yapılmaktadır.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2017	6.030	2.300	1.500	82	% 5,5	Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan amaçlarında kullanılmak üzere uygulama projeleri üretmek amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak bilinmemekle beraber şu ana kadar ödenek problemi yaşanmamıştır.
2011K070020	Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	30.485	27.520	2.965	2.738	% 92,3	Bulanık Alparslan I Barajı İskanı kapsamında toplam 252 konutun inşaatı tamamlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2016	24.500	8.453	5.312	2.941	% 55,4	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2015	5.310	0	5.310	2.941	% 55,4	İhalesi yapılmıştır. İş devam etmektedir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2016	10.467	3.389	1	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2016	8.723	5.064	1	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2018	194.200	11.559	165	99	% 60,0	
	Tahtalı Barajı İskanı	2009-2015	11.720	11.559	161	99	% 61,5	İş tamamlanmış kuraları çekilmiştir. 103 kişiye anahtarları teslim edilmiştir.. Bpçlandırma sözleşmelerini imzalayan ailelere anahtar teslimi yapılacaktır.
	Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı	2009-2018	91.240	0	2	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2018	91.240	0	2	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskan isteyen aile çıkmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2017	10.500	3.000	500	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	5.400	668	1.500	18	% 1,2	2015 yılında 33 adet pilot ilde, 35 adet kırsal konut projesi elde edilmesi planlanmaktadır. Ocak-Haziran döneminde, 6 ilde (Kars, Erzurum, Iğdır, Denizli, Uşak ve Muğla) kırsal konut projesi elde edilmiştir. Proje kapsamında, 24 tip örnek kırsal konut projesi üretilmiştir. Ayrıca, tüm İl Müdürlüklerimizle, illerinde bulunan ve yöresel mimari özellikleri yansıtan konutlara ait rapor hazırlanması hususunda iletişime geçilmiş olup, 51 İl Müdürlüğümüzün hazırlanmış olduğu çalışmalar Bakanlığımıza ulaşmıştır. 7 il (Amasya, Balıkesir, Bursa, Edirne, Karabük, Rize, Trabzon) ait projeler ve araştırma raporları kitap haline dönüştürülmüştür. Projeler tamamlandıkça kitap haline dönüştürme çalışmaları da devam edecektir. (Kayseri, Niğde, Nevşehir) ait projelerin elde edilme süreci devam ediyor. 6 il (Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Antalya, Burdur, Isparta) ait projeler için ihale çalışmaları devam etmektedir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2017	3.340	1.826	2	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2016	214.620	112.000	3.705	685	% 18,5	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2016	6.618	0	3.703	685	% 18,5	02.03.2015 tarihi itibari ile yer teslimi yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2015	208.002	112.000	2	0	% 0,0	Konutlar tamamlanmış bprçlandırma sözleşmeleri imzalanmıştır. Sözleşmeleri imzalayan haksahiplerine anahtarları teslim edilmiş olup süreç devam etmektedir.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	3.165	1.000	550	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2011-2016	27.403		7.698	0	% 0,0	İşler devam etmekte olup ödenek dahilinde işler tamamlanacaktır.
	Borç Verme (08.1 Ödeneği)		113.000	64.000	40.232	17.494	% 43,5	
1995K070030 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	1995-2015	139.000	138.000	1.000	0	% 0,0	İşler devam etmekte olup yıl içerisinde tüm işler tamamlanacaktır.
2011K070050 (**)	<i>Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2011-2017	5.200	2.800	2	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
18 Proje		06 ve 07 TOPLAM	529.583	169.776	30.147	7.448	% 24,7	
		08 TOPLAM	257.200	204.800	41.234	17.494	% 42,4	
		DÖNER SERMAYE	235.405	180.000	82.171	75.707	% 92,1	
		GENEL TOPLAM	1.022.188	554.576	153.552	100.649	% 65,5	

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2012-2015	1.850	1.350	500	180	% 36,0	Bakanlığımız ve Amasya Belediyesi ile proje kapsamında 13-15.02.2015 tarihleri arasında Amasya ilinde "Şehir Kimliği Çalıştayı" düzenlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz görevli ilgili personele 04-05 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul İlinde "Sosyal Etki Tasarım çalıştayı" katılımı sağlanarak Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım, Sosyal Yenilik Tasarımı, Sosyal Etki Değerlendirmesi eğitimleri verilmiştir.
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2016	7.308	3.000	2.500	305	% 12,2	Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan "İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin kullanım kriterlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında 13.04.2015 tarihinde İstanbul İlinde "İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi Tanıtım Çalıştayı" düzenlenmiştir. Bu Proje altında; Tübitak MAM ile yapılan Protokol-1 kapsamında yol performans izleme çalışmaları tamamlandı. Gazi Üniversitesi ile yapılan Protokol-2 kapsamında; 01.06.2015 Tarihinde İş Paketi -1 ile ilgili Rapor No: 1 fiziki ve mali olarak tamamlandı Rapor No:2 aşamasına geçildi.
2013K080050	Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2016	4.900	1.500	2.500	1.707	% 68,3	Proje kapsamında; Mevcut Durum Raporu, Öneri Raporu ve Sektörler Bazında Usul ve Esaslar Kitapçıkları hazırlanarak teslim edilmiştir. Ayrıca proje sürecinde paydaşların katılımlarıyla Ortak Akıl Çalıştayı ve Odak Toplantıları düzenlenmiştir.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090050	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	3.000		3.000	0	% 0,0	Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanması projesi için pilot olarak belirlenen Elazığ ve Kilis illerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, söz konusu strateji belgesinin hazırlanması için Elazığ ilinde Valilik tarafından yürütülen ihale çalışmalarında, önyeterlilik aşamasına yapılan başvurular sonrası düzenlenen ihaleye yeterli sayıda teklif gelmemiştir ve bu sebeple ihale çalışmaları devam etmektedir. Kilis ilinde Belediyeyle imzalanan protokol ve bu protokol kapsamında geliştirilen teknik şartname doğrultusunda çalışmalara başlanmış ve söz konusu işin %40'lık bölümü tamamlanmış olup henüz ödemesi yapılmamıştır.Söz konusu işin %60lık bölümünün tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (3*) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2016	3.000		1.400	0	% 0,0	Proje kapsamında henüz belirli bir oranda gerçekleşme sağlanamamıştır.
2014E060030	Çamlıca Özel Proje Alanında Altyapı Tesisleri Etüd ve Proje İşlerinin Yapılması Projesi (Döner Sermaye) (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2014-2015	2.250	0	2.250	0	% 0,0	
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.058	5.850	9.900	2.192	% 22,1	
		DÖNER SERMAYE	2.250	0	2.250	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	22.308	5.850	12.150	2.192	% 18,0	

(3*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir. (PROJEDEN HARCAMA YAPILMASINA İZİN VERİLMİŞTİR.)

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı (Enerji Sektörü)	2012-2016	4.033	1.298	380	152	% 39,9	BEP-TR II: Mozaik Yazılım firması ile yapılmaktadır. Sözleşme tarihi 14/11/2014 ve toplam götürü bedeli 597.000 TL olan projenin % 10 luk bedeli 31/03/2015 tarihli hakediş raporu ile ödenmiştir. Geri kalan miktar kabul yapıldıktan sonra 2016 da ödenecektir. BEP-TR I Bakım Onarımı gerçekleştirilmiş ve 68.000 TL İntersan firmasına Ödenmiştir.
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2017	2.450	1.700	500	148	% 29,6	23-25 Mart 2015 tarihlerinde Marmaris'te merkez ve taşra teşkilatı teknik personeline BEP ve MISGP Yönetmeliği Kapsamında Eğitim verilmiştir. Bu işe ilişkin yolluklar gönderilmiştir. 2) Bina ısıtma ve Soğutma Enerji Gereksinimlerini sınırlandıran U değerlerinin tespiti protokolü 16.10.2014 tarihinde Karabük Üniversitesi ile imzalanmış ve 1. rapor sunuldu,kabulünü müteakip 70.800 TL ödendi. 2. rapor ise 15.04.2015 tarihinde sunulmuştur. 284.000 TL ödeme gerçekleştirilecektir.
2015D000020	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü)	2015-2016	1.010	0	620	590	% 95,2	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bakanlığımızın ana faydalanıcı olduğu TR2011/0315.20 nolu "Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi" NİRAS IC Sp. Z.o.o. ul. başkanlığındaki konsorsiyum yürütücülüğü ile 13.04.2015 tarihinde başlamıştır. Proje süresi 2 yıldır. 03.04.2015 tarihli ve 77000511-212.01.09/10345 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığından 133.400 Avro Ulusal Katkı payının ödenmesi istenmiştir. Bu ödeme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 62855 Avro daha ödeme gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI	8.850		0	8.835	0	% 0,0		
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2015	638	338	300	63	% 21,1	13.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 1., 2. ve 3. hakediş ödemeleri olarak 63.000 TL ödenmiştir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	660	550	110	21	% 19,2	UDK Denetimi yollukları (22 adet UDKdenetimi yapıldı.). Türkak eğitimler gerçekleştirilmiş ve bunları ödemeleri yapılmıştır.
2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	336	186	150	62	% 41,5	Gürültü kontrolü mevzuat çalışması projesi kapsamında 1.aşama raporu onay yazısı 13.11.2014'de, 2.aşama onay yazısı 02.04.2015'de yazıldı. Bu aşamaların ödemeleri 48.000 TL yapıldı.
2013K010080	Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2015	939	559	380	67	% 17,6	YAMBİS yazılımı ihale yapılarak 139.870 TL lik sözleşme imzalanmış, proje kapsamında iş ve işlemler devam etmektedir. 43.000 TL ödenmiştir.
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	13.894	9.264	1.430	1.068	% 74,7	İl Müdürlüklerimizin PGD kapsamındaTSE'ye yaptırmış olduğu test ve deneyler ile Merkez personelinin PGD Görevi kapsamında yapılan yolluklar ödenmiştir. YMDS (Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi) 2014 yılı bakım bedeli ile 2015 yılı 1. ve 2. aşama ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mobil PGD ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 110 adet Tablet bilgisayar ve yazıcı alımı ile 10 adet arazi tipi PGD aracı alımları DMO aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	4.270		700	289	% 41,3	Merkez laboratuvarına 1 adet Servo Kontrollü Beton Basınç Presi ve 1 adet Servo Kontrollü Çelik Çekme Cihazı alınmıştır.
2015K010070	Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	1.250		500	181	% 36,2	1) Otopark Yönetmeliğinin hazırlanmasına yönelik hizmet uygulaması protokolü Gazi Üniversitesi ile 05.11.2014 tarihinde başlatılmış olup; 121.000 TL ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2) 06-09/04/2015 tarihleri arasında Antalya'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personeline (251 katılımcı) yönelik olarak "İmar Uygulamalarına İlişkin Mevzuat Eğitimi" verilmiştir. 3) 28-30/04/2015 tarihleri arasında Çorum ilinde Kıyı Mevzuatı ve İmar Uygulamaları ile Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti ,Kamulaştırma İş ve İşlemleri,Hali hazır Harita Yapımı ve Onayı Eğitimine 2 personel katılmıştır. 4) İmar Mevzuatı Çalıştayları Ankara'da yapılmış olup, duyuru ve çalıştaylar için ödemeler gerçekleştirilmiştir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	4.900		1.000	100	% 10,0	03/04/2015 tarihinde ihale yapılmış, ancak ihale iptal edildiğinden bir işlem yapılamamıştır. Yapı Ustalarının belgelendirmesi faaliyet açılışı ile tanıtım filmi yapılmıştır.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.800		830	307	% 37,0	Gazi Üniversitesi ile yapılan "Ahşap Dış Cephe İş İskelelerinin Özellikleri, Detay Çizimleri, Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında 59.000,00-TL ödeme yapılarak protokol tamamlanmıştır. İTÜ ile yapılan "Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında I. Aşama için 47.200,00-TL ödeme yapılmıştır. II. Aşama devam etmektedir. Niğde Üniversitesi ile yapılan "Doğal Kayaların Oyulması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirilme Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" 02.04.2015 tarihinde imzalanmıştır. 1. aşama olarak 191.160 TL ödenmiştir.
2015K010100	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	2.000		250	183	% 73,3	Teknik şartname hazırlanma aşamasındadır.
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	41.180	13.895	7.150	3.231	% 45,2	
		AB KATKISI	8.850	0	8.835	0	% 0,0	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090130	Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.000	1.000	1.000	195	% 19,5	2014 yılında ihalesi yapılan işin taşra teşkilatına yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Destek işleri hakkındaki ödemeleri 3 ayda bir 88.500 TL olarak devam etmektedir. Kullanıcıların E-imza teminleri yapılmaktadır. 1 adet iş için şartname çalışmaları devam etmektedir.
2014K090160	Fiziksel ve Dijital Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.500	0	2.500	15	% 0,6	3.000.000 Adet Zaman Damgası temini yapılmıştır.
2014K090320	Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	3.000	2.000	1.000	80	% 8,0	2015 Yılı için ayrılan ödenek Bakanlık Coğrafi Verilerinin ve Metaverilerinin Güncellenmesi ve Entegrasyonu İş kapsamında kullanılmaktadır. Ödemeler devam etmektedir. Diğer işler için Teknik Şartname çalışmaları devam etmektedir.
2014K090300	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.500	1.500	3.000	94	% 3,1	İhale Süreci devam etmektedir.
2014K090310	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	3.000	1.000	2.000	125	% 6,3	Dönüşüm Projeleri Özel Dönüşüm Hesabından karşılanan iş kapsamında Proje ile ilgili analiz ve tasarım işleri tamamlanmış, yazılım geliştirme işleri devam etmektedir. Veri uyumlaştırma işleri başlatılacaktır.
2014K090170	1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2016	4.500	0	4.000	0	% 0,0	2015 Yılı için ayrılan ödenek Ortofoto ve Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi İş için ihale yapılmış, sözleşme imzalanmış ve proje başlatılmıştır. İş planı ve metodoloji uyarınca yürütülmektedir. Diğer işler için teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2015K090410	Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.500		1.500	0	% 0,0	İhale Süreci devam etmektedir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090420	Üç Boyutlu Topografya ve Kent Veri Modelinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.200		1.200	153	% 12,8	İhalesi yapılmıştır. Proje ile ilgili analiz, tasarım ve yazılım geliştirme işleri kısmi olarak tamamlanmıştır.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.000		1.000	0	% 0,0	İhale Süreci devam etmektedir.
2015K090480	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mobil Platform Altyapısı Oluşturma Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	1.000		1.000	0	% 0,0	İhale süreci başlatılmıştır.
2015K090440	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	1.500		700	0	% 0,0	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına yönelik 3 adet işin ihalesi yapılmıştır. 1 adet işin ihalesi de Ekim ayında yapılacaktır.
2015K090450	Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının Bulut Bilişim Tabanlı Geliştirilmesi Projesi (7*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	9.000		7.599	0	% 0,0	İşin ihalesi yapılmıştır.
2015K090460	Siber Güvenlik Alt Yapısı Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	2.200		1.100	0	% 0,0	İşin ihalesi yapılmıştır.
2015K090470	Kimlik Yönetim Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	1.300		900	0	% 0,0	İşin ihalesi yapılmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090490	Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı Üretiminin Gerçekleştirilmesi Projesi (8*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	4.100		4.000	114	% 2,9	2015 Yılı için ayrılan ödenekten e-Cognition developer görüntü analiz yazılımı alımı yapılmış olup, kalan ödenek Ortofoto Haritaları Kullanarak Coğrafi Veri Altyapısı Üretiminin Gerçekleştirilmesi (Bina- Yol Kodlama) işi ve Raster Verilerinin Damgalanması, Arşivlenmesi ve Web Tabanlı Siparişlenmesi işi 'nde kullanılacaktır. Diğer işler için teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2015K090600	Bulut Bilişim Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (9*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	5.000		1	0	% 0,0	İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip harcama yapılabilecektir.
2015K090500	e-Plan Otomasyonu Projesi (8*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	2.900		2.600	0	% 0,0	Dönüşüm Projeleri Özel Dönüşüm Hesabından karşılanan iş kapsamında Proje ile ilgili analiz ve tasarım işleri tamamlanmış, yazılım geliştirme işleri devam etmektedir.
2015K090510	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	4.950		4.900	1.250	% 25,5	7 adet işin ihalesi yapılmıştır.
2014K090150	Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı Güncelleştirme ve Optimizasyon Projesi (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.900	1.600	3.300	0	% 0,0	Şartname çalışmaları devam etmektedir.
2015K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Bakanlık Yazıcı ve Baskı Süreçleri Yönetim Sistemi	2015-2015	1.900		1.900	0	% 0,0	DMO Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu	2015-2016	1.000		2	0	% 0,0	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonuna ilişkin şartname çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak projenin 2015 yılı için iz bedelli olarak çıkması sebebiyle ihale aşamasına geçilememiştir.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	1.180	0	1	0	% 0,0	Proje değişikliği ve şartname değişikliği yapılarak Merkezi Finans İhale birimine gönderildi. Merkezi Finans İhale Biriminin (CFCU) ihale süreci devam etmektedir.
AB KATKISI	10.620		0	5.310	0	% 0,0		
22 Proje		06 ve 07 TOPLAM	59.230	5.500	41.903	2.026	% 4,8	
		DÖNER SERMAYE	4.900	1.600	3.300	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	64.130	7.100	45.203	2.026	% 4,5	
		AB KATKISI	10.620	0	5.310	0	% 0,0	

(6*) Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.

(7*) Kuruluş tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben ihalesine çıkılabilecek ve harcama yapılabilecektir.

(8*) Pilot uygulama projesine ait fizibilite etüdü Kalkınma Bakanlığına iletildikten sonra proje tutarı revize edilecektir.

(9*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. İçişleri Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip uygulama yapılabilecektir. Proje tutarı fizibilite çalışması sonrasında netleştirilecektir.2015K080060 no'lu proje ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000300	Korunan Alanlarda Çevre-Cephe-Yol-İskele-Kıyı Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2014-2017	2.163	500	500	71	% 14,2	Yenikent (Aksaray) Park Düzenlemesi Projesi tamamlanmıştır. Göksu(Mersin)ÖÇKB Kuş Gözetim Kulesi ve İrtibat Bürosu Yapım işi için sözleşme 170.873,86 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.
2015F000150	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı-Uygulama (Turizm Sektörü)	2015-2015	25.999		25.999	2.152	% 8,3	22 adet projeye ilişkin protokoller toplam 23.000.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2015K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçme Suyu Sektörü)	2015-2015	4.848		4.848	2.568	% 53,0	4 adet projeye ilişkin protokoller toplam 4.848.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.
2015K060200	Korunan Alanlar Atıksu Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2015	1		1	0	% 0,0	Projenin ödeneği Turizm Sektöründeki "Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı-Uygulama" projesine aktarılmıştır.
2015K090030	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	355		355	0	% 0,0	4 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış ve sözleşmeler toplam 354.472,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.
2015K090040	Hali hazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	800		800	0	% 0,0	6 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış ve sözleşmeler toplam 746.055,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090070	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	285		285	0	% 0,0	5 adet projeye ilişkin protokoller toplam 184.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2015K090080	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	500		500	0	% 0,0	6 adet projeye ilişkin protokoller toplam 500.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2016	4.831	1.970	2.050	1.240	% 60,5	Türkiye'nin tamamında ihale çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi çalışmaları devam etmektedir. 22 adet sözleşme imzalanmıştır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2016	2.478	1.600	458	272	% 59,4	7 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış ve sözleşmeler imzalanmıştır.
2014K100140	Mogan Gölü Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2014-2015	860	128	732	732	% 100,0	Projeye ilişkin ihale yapılmış ve sözleşme 731.600,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.

11 Proje

06 ve 07 TOPLAM	42.260	4.070	35.796	6.303	% 17,6
DÖNER SERMAYE	860	128	732	732	% 100,0
GENEL TOPLAM	43.120	4.198	36.528	7.035	% 19,3

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2015	3.517	3.165	352	0	% 0,0	Proje kapsamındaki 3 adet sözleşmenin sürelerinin Kasım 2016 tarihine kadar uzatılması ve sözleşme bedellerinde artışa gidilmesi zarureti doğmuştur. Proje için belirlenen yeni bütçe 11.500.000 Avro'dur. Bu doğrultuda, AB'den uygun görüş alınmıştır. Bu artış 2016 ve 2017 yılı bütçesine yansıtılacaktır.
AB KATKISI			19.930	17.937	1.993	0	% 0,0	
2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2009-2016	3.491	2.275	1.100	333	% 30,3	Proje kapsamındaki 2 adet sözleşmenin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
AB KATKISI			19.773	13.253	5.868	887	% 15,1	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2017	8.544	2.194	1.437	421	% 29,3	Toplaştırılmış bir projedir. Bütçenin büyük bir bölümü Başkanlığımızın kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılmaktadır. IPA 1 döneminin sonu olan 2017 yılsonuna kadar devam edecek olan projedir.
AB KATKISI			48.397	11.110	8.133	1.378	% 16,9	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	15.552	7.634	2.889	754	% 26,1	
		AB KATKISI	88.100	42.300	15.994	2.265	% 14,2	

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090820	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2015	700		700	0	% 0,0	İhale aşamasındadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	700	0	700	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	24.864	4.957	16.370	10.946	% 66,9	
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2016	5.975	1.500	3.970	3.134	% 78,9	Hizmet binası yapım işi 16.12.2013 tarihinde KDV dahil 5.244.443,92 TL'ye ihale edilmiştir. Geçici kabul aşamasında. 2015 YILI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAKTIR.
	Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.557	1.957	2.000	1.954	% 97,7	Hizmet binası yapım işi 30.10.2013 tarihinde KDV dahil 3.556.520,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %85' dir. Bina 2016 yılında tamamlanabilecektir.
	Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	6.153	500	4.700	2.398	% 51,0	Hizmet binası yapım işi 27.05.2014 tarihinde KDV dahil 5.027.980 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %80' dir. 2015 YILI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAKTIR.
	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	3.516	500	2.700	1.252	% 46,4	Hizmet binası yapım işi 28.05.2014 tarihinde KDV dahil 2.466.200 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %85' dir. 2015 YILI İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAKTIR.
	Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	5.663	500	3.000	2.208	% 73,6	Hizmet binası yapım işi 04.06.2014 tarihinde KDV dahil 4.189.000 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %60' dir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090100	Hizmet Binaları İnşaatı-2 (Döner Sermaye Katkısı Var) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2016	24.581	2.000	9.023	4.546	% 50,4	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.923	2.000	1.923	1.894	% 98,5	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde KDV dahil 2.922.860,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100' dür. BİNA HİZMETE AÇILMAYA HAZIRDIR.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2016	7.749	0	250	0	% 0,0	Yapım işi 03.12.2015 tarihinde ihale edilecektir.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2016	4.764	0	850	0	% 0,0	İhalesi İl Müdürlüğünce 2 defa yapılmış ve iptal edilmiştir. İhale Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Döner Sermaye Katkısı Var)	2014-2016	9.145	0	6.000	2.652	% 44,2	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde KDV dahil 9.140.280 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %40' dır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090810	Hizmet Binaları İnşaatı-3 (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	25.707	0	4.330	87	% 2,0	
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.293		530	80	% 15,1	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde KDV dahil 6.872.320,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme imzalanma aşamasındadır.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	6.298		100	0	% 0,0	Tahsis edilen arsanın zemin etüd sonuçlarına göre zeminde iyileştirme yapılması gerektiği için projenin uygulanmasının ekonomik olmadığı kanaatine varılmıştır. Yeni arsa tahsisi için çalışma yapılmaktadır.
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	8.824		2.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde KDV dahil 8.555.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım devam ediyor.
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.292		1.700	7	% 0,4	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde KDV dahil 4.794.340,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım devam ediyor. (Temel atıldı ve bodrum kat bitmek üzere)

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2015-2015	651		651	0	% 0,0	Taşıt alımına yönelik 11.02.2015 tarihli ve 2015/7276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.06.2014 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 7 adet T8 (Pick-up) tipi araç alımı için çalışmalara başlanılmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2015-2015	7.050		7.050	2.766	% 39,2	Hizmet binası onarımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 53 adet ihale talimatı gönderilmiştir. ÖDENEĞİN TAMAMI KULLANILACAKTIR.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2015-2015	4.246		4.246	3.159	% 74,4	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 86 adet ihale talimatı gönderilmiştir. ÖDENEĞİN TAMAMI KULLANILACAKTIR.
2015G000150	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2015-2015	5.800		5.800	2.500	% 43,1	Lojman binası onarımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 35 adet ihale talimatı gönderilmiştir. ÖDENEĞİN TAMAMI KULLANILACAKTIR.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	86.899	6.957	41.470	21.352	% 51,5	
		DÖNER SERMAYE	6.000	0	6.000	2.652	% 44,2	
		GENEL TOPLAM	92.899	6.957	47.470	24.004	% 50,6	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015G000150	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2015-2015	200		200	9	% 4,5	Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 62/1 Sincan adresinde bulunan Kamu Konutunun onarımı.
2015K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binası Onarımı	2015-2015	250		250	0	% 0,0	Bakanlığımız yeni hizmet binasının ihale kapsamı dışında bulunan yapılması zorunluluk arz eden tadilat ve değişiklikler için çalışmalar devam etmektedir.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2015-2015	480		480	0	% 0,0	Bakanlığımız yeni hizmet binasının ihale kapsamı dışında bulunan ve binaya geçiş süreci tamamlandıktan sonra çalışmalar başlatılacaktır.
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (Döner Sermaye)	2015-2015	2.795		2.795	0	% 0,0	Bakanlığımız yeni hizmet binasının ihale kapsamı dışında bulunan çalışma büroları perdeleri ve yemekhane terası tavan perde sistemleri ihalesi çalışmaları başlatılmış olup, 18. kat çok amaçlı salon ve diğer mefruşat alımı çalışmaları devam etmektedir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	930	0	930	9	% 1,0	
		DÖNER SERMAYE	2.795	0	2.795	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	3.725	0	3.725	9	% 0,2	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2015 30.09.2015 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100160	Çevre Sorumluluk Direktifinin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	444		178	0	% 0,0	
AB KATKISI			3.996		1.050	0	% 0,0	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	444	0	178	0	% 0,0	
		AB KATKISI	3.996	0	1.050	0	% 0,0	

Arz Ederim...

Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkanı
