

01 Ocak – 30 Haziran 2015 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkanı


21.07.2015

BAKANLIK 01 OCAK 2015 – 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

| KOD | AÇIKLAMA | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | REVİZE ÖDENEĞİ | 30.06.2015 İtibariyle HARCAMA | Gerçekleşme ORANI |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 601.346.000 | 601.345.000 | 312.003.712 | % 51,9 |
| 02 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 100.562.000 | 100.563.000 | 51.808.980 | % 51,5 |
| 03 | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 71.118.000 | 83.997.560 | 38.695.571 | % 46,1 |
| 05 | CARİ TRANSFERLER | 199.522.000 | 199.277.000 | 79.228.557 | % 39,8 |
| 06 | SERMAYE GİDERLERİ | 218.100.000 | 714.325.657 | 244.354.567 | % 34,2 |
| | Bakanlık Yatırım Programı | 201.300.000 | 245.992.598 | 62.338.352 | % 25,3 |
| | Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği | 16.800.000 | 16.800.000 | 746.500 | % 4,4 |
| | Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği | 0 | 451.533.059 | 181.269.715 | % 40,1 |
| 07 | SERMAYE TRANSFERLERİ | 142.537.000 | 142.937.000 | 42.165.761 | % 29,5 |
| | Bakanlık Yatırım Programı | 36.140.000 | 36.540.000 | 830.855 | % 2,3 |
| | Çevre Katkı Payı Ödeneği | 106.397.000 | 106.397.000 | 41.334.906 | % 38,8 |
| 08 | BORÇ VERME | 25.731.000 | 31.432.000 | 5.836.920 | % 18,6 |
| GENEL TOPLAM | | 1.358.916.000 | 1.873.877.217 | 774.094.068 | % 41,3 |

(*) Veriler e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

BAKANLIK 01 OCAK 2015 – 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

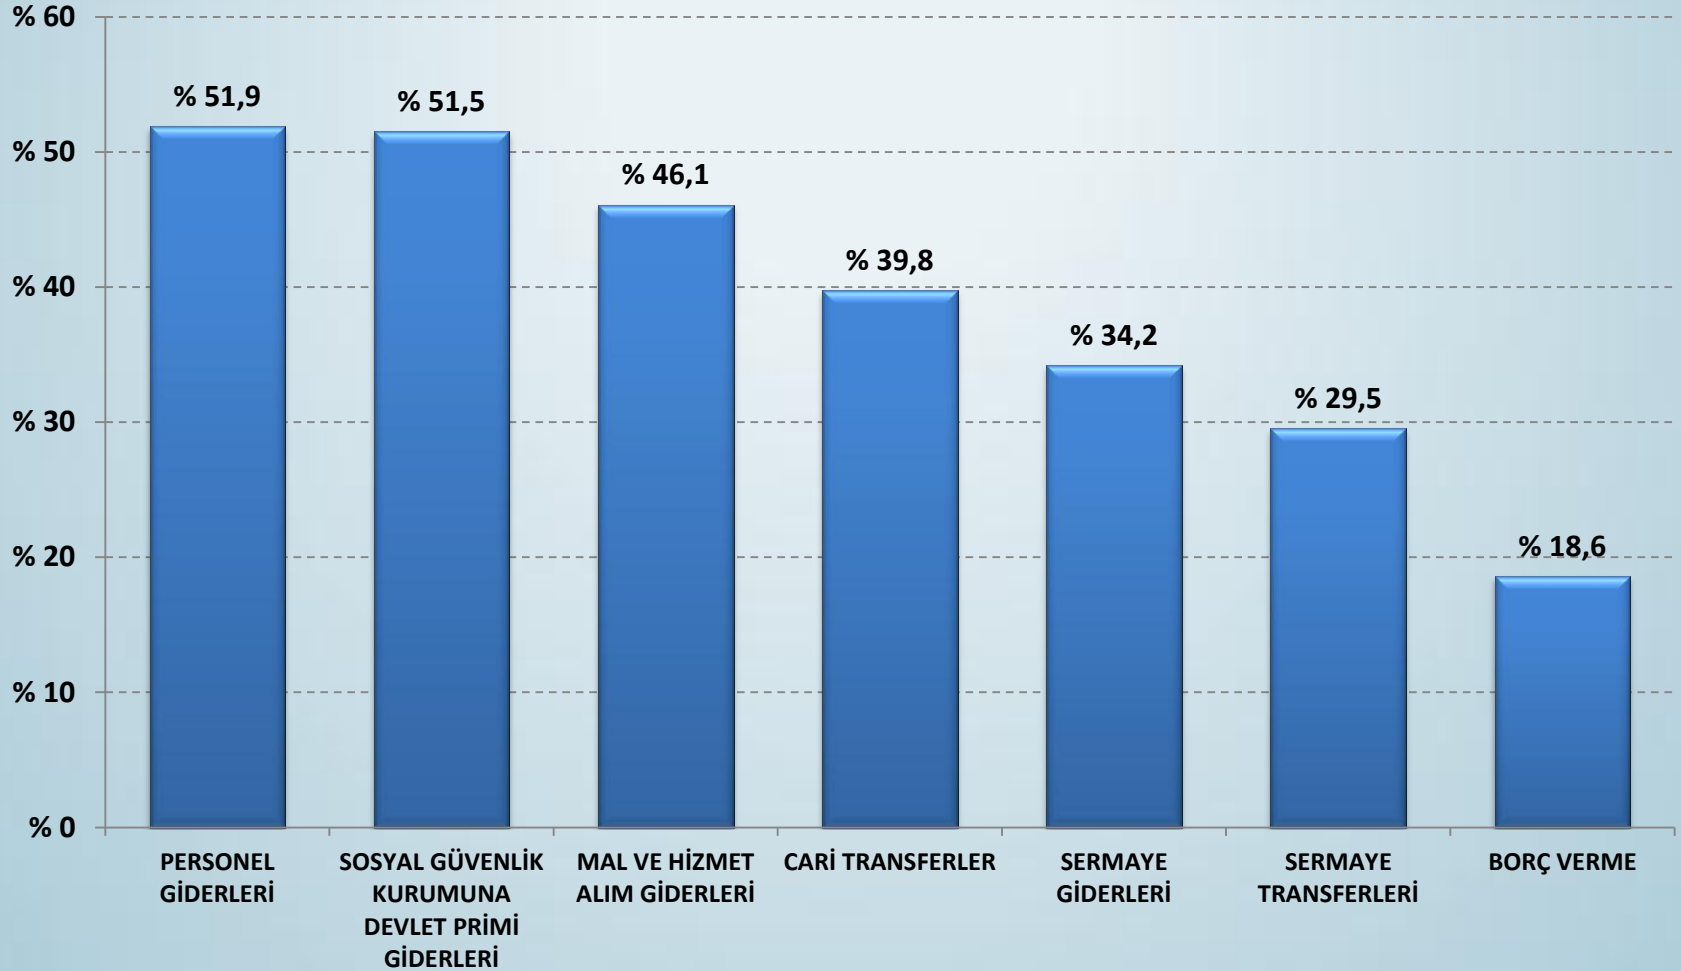


BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK 2015 – 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

| Harcama Birimi | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | REVİZE ÖDENEĞİ | HARCAMA | Gerçekleşme ORANI |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü | 30.186.000 | 32.966.606 | 8.238.721 | % 25,0 |
| Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü | 177.148.000 | 179.508.000 | 48.924.923 | % 27,3 |
| Çed, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü | 47.817.000 | 47.023.200 | 14.003.376 | % 29,8 |
| Yapı İşleri Genel Müdürlüğü | 139.644.000 | 197.494.505 | 72.948.565 | % 36,9 |
| Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Gn. Md. | 159.831.000 | 161.423.460 | 83.152.135 | % 51,5 |
| Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü | 17.374.000 | 17.374.000 | 6.469.822 | % 37,2 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü | 48.467.000 | 50.483.100 | 5.513.537 | % 10,9 |
| Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü | 46.569.000 | 45.259.000 | 6.384.296 | % 14,1 |
| Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı | 8.160.000 | 8.160.000 | 3.631.546 | % 44,5 |
| Strateji Geliştirme Başkanlığı | 4.124.000 | 4.124.000 | 2.212.549 | % 53,7 |
| Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı | 1.143.000 | 1.143.000 | 711.845 | % 62,3 |
| Hukuk Müşavirliği | 3.400.000 | 3.495.000 | 1.653.219 | % 47,3 |
| Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı | 10.555.000 | 10.555.000 | 5.577.489 | % 52,8 |
| Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı | 4.774.000 | 4.776.800 | 2.077.218 | % 43,5 |
| Eğitim Ve Yayın Dairesi Başkanlığı | 3.595.000 | 10.216.000 | 7.284.209 | % 71,3 |
| Personel Dairesi Başkanlığı | 3.571.000 | 3.571.000 | 1.748.439 | % 49,0 |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | 30.353.000 | 30.375.700 | 13.036.592 | % 42,9 |
| Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği | 711.000 | 706.800 | 297.776 | % 42,1 |
| Özel Kalem Müdürlüğü | 25.921.000 | 25.921.000 | 11.296.409 | % 43,6 |
| İl Müdürlükleri | 595.573.000 | 1.039.301.047 | 478.931.401 | % 46,1 |
| TOPLAM | 1.358.916.000 | 1.873.877.217 | 774.094.068 | % 41,3 |

(*) Veriler e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.


BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK 2015 – 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

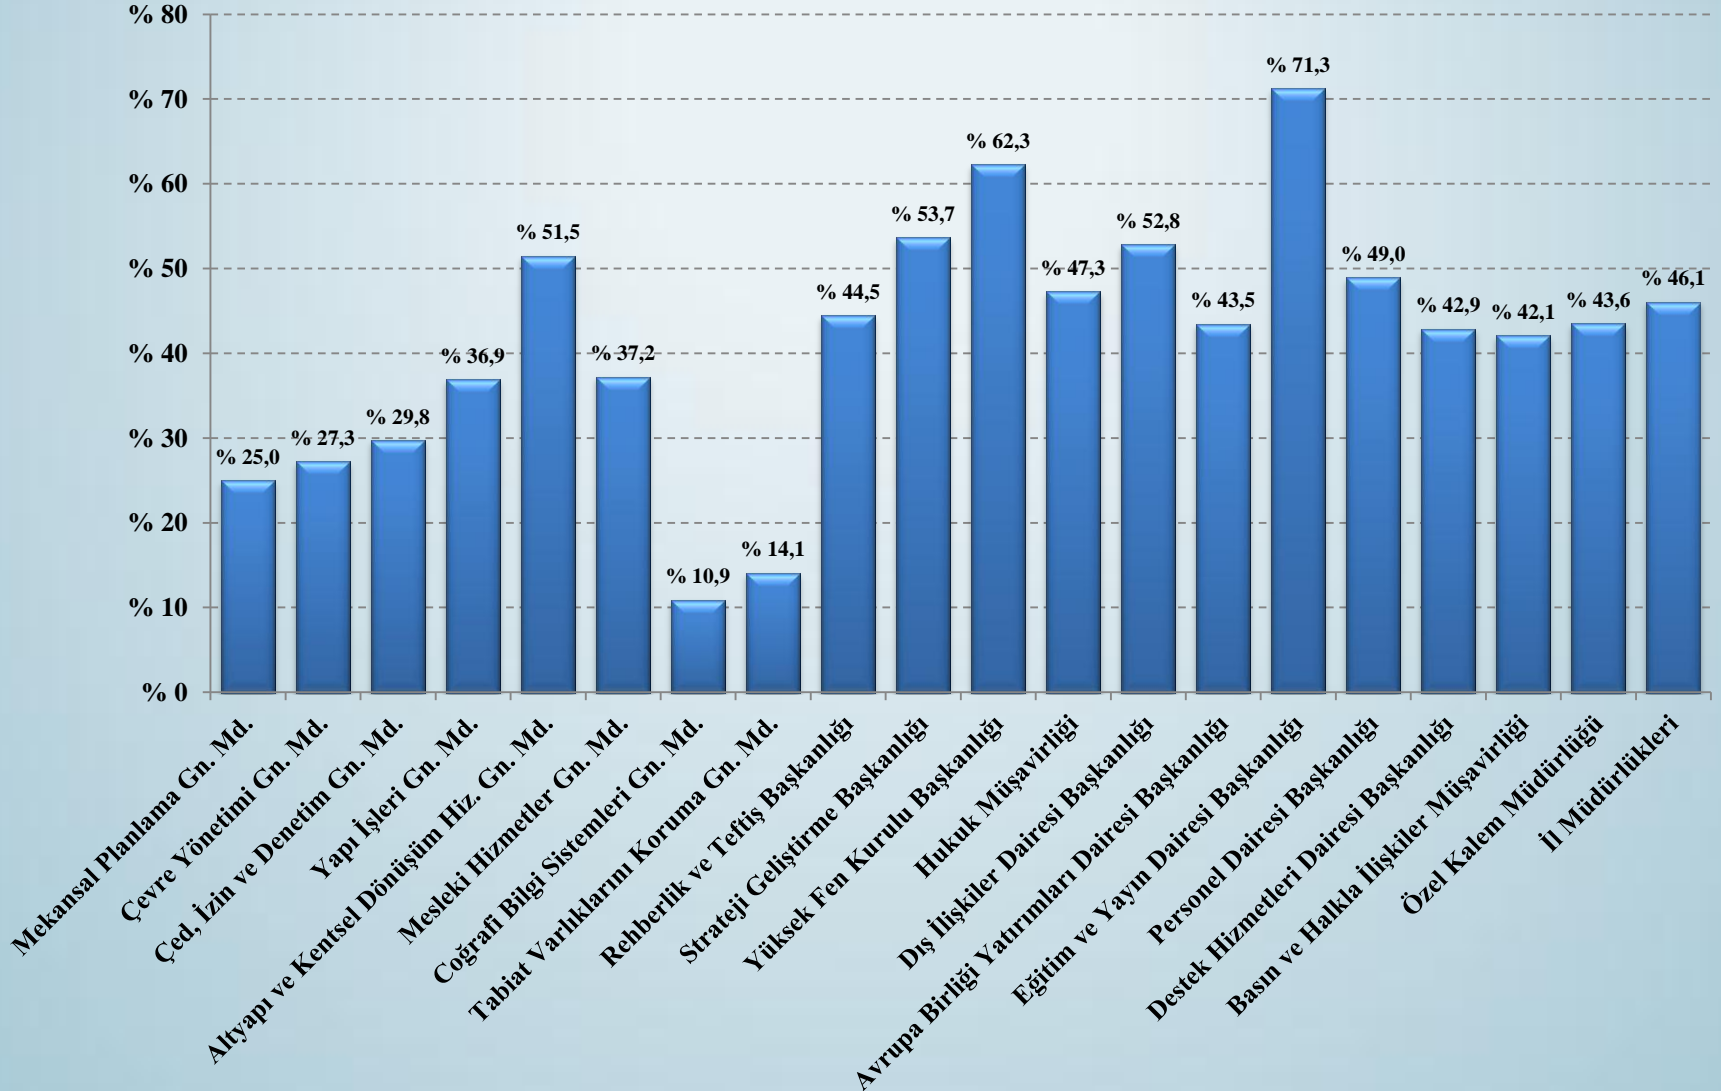

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

| BİRİM ADI | Proje Sayısı | REVİZE PROJE TUTARI | 30 Haziran 2015 | | Gerçekleşme Oranı (%) |
|--|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | REVİZE ÖDENEĞİ | HARCAMA | |
| Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY) | 7 | 76.291.000 | 16.845.000 | 550.588 | % 3,3 |
| Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY) | 19 | 27.850.000 | 11.003.000 | 344.991 | % 3,1 |
| ÇED, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY) | 10 | 79.425.000 | 31.554.000 | 3.477.169 | % 11,0 |
| Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY) | 18 | 1.022.188.000 | 126.786.000 | 50.409.929 | % 39,8 |
| Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn. Md. (DETAY) | 6 | 25.308.000 | 12.150.000 | 661.385 | % 5,4 |
| Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY) | 13 | 41.180.000 | 7.150.000 | 1.236.932 | % 17,3 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY) | 22 | 64.130.000 | 45.203.000 | 1.064.692 | % 2,4 |
| Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY) | 11 | 43.120.000 | 36.178.000 | 1.280.118 | % 3,5 |
| Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY) | 3 | 15.552.000 | 2.889.000 | 753.669 | % 26,1 |
| Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY) | 1 | 700.000 | 700.000 | 0 | % 0,0 |
| Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri (DETAY) | 5 | 91.199.000 | 45.770.000 | 9.803.099 | % 21,4 |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY) | 3 | 3.425.000 | 3.425.000 | 8.555 | % 0,2 |
| GENEL TOPLAM | 113 | 1.490.368.000 | 339.653.000 | 69.591.127 | % 20,5 |
| GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER | 107 | 1.218.878.000 | 263.171.000 | 28.592.127 | % 10,9 |
| DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER | 6 | 271.490.000 | 76.482.000 | 40.999.000 | % 53,6 |

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

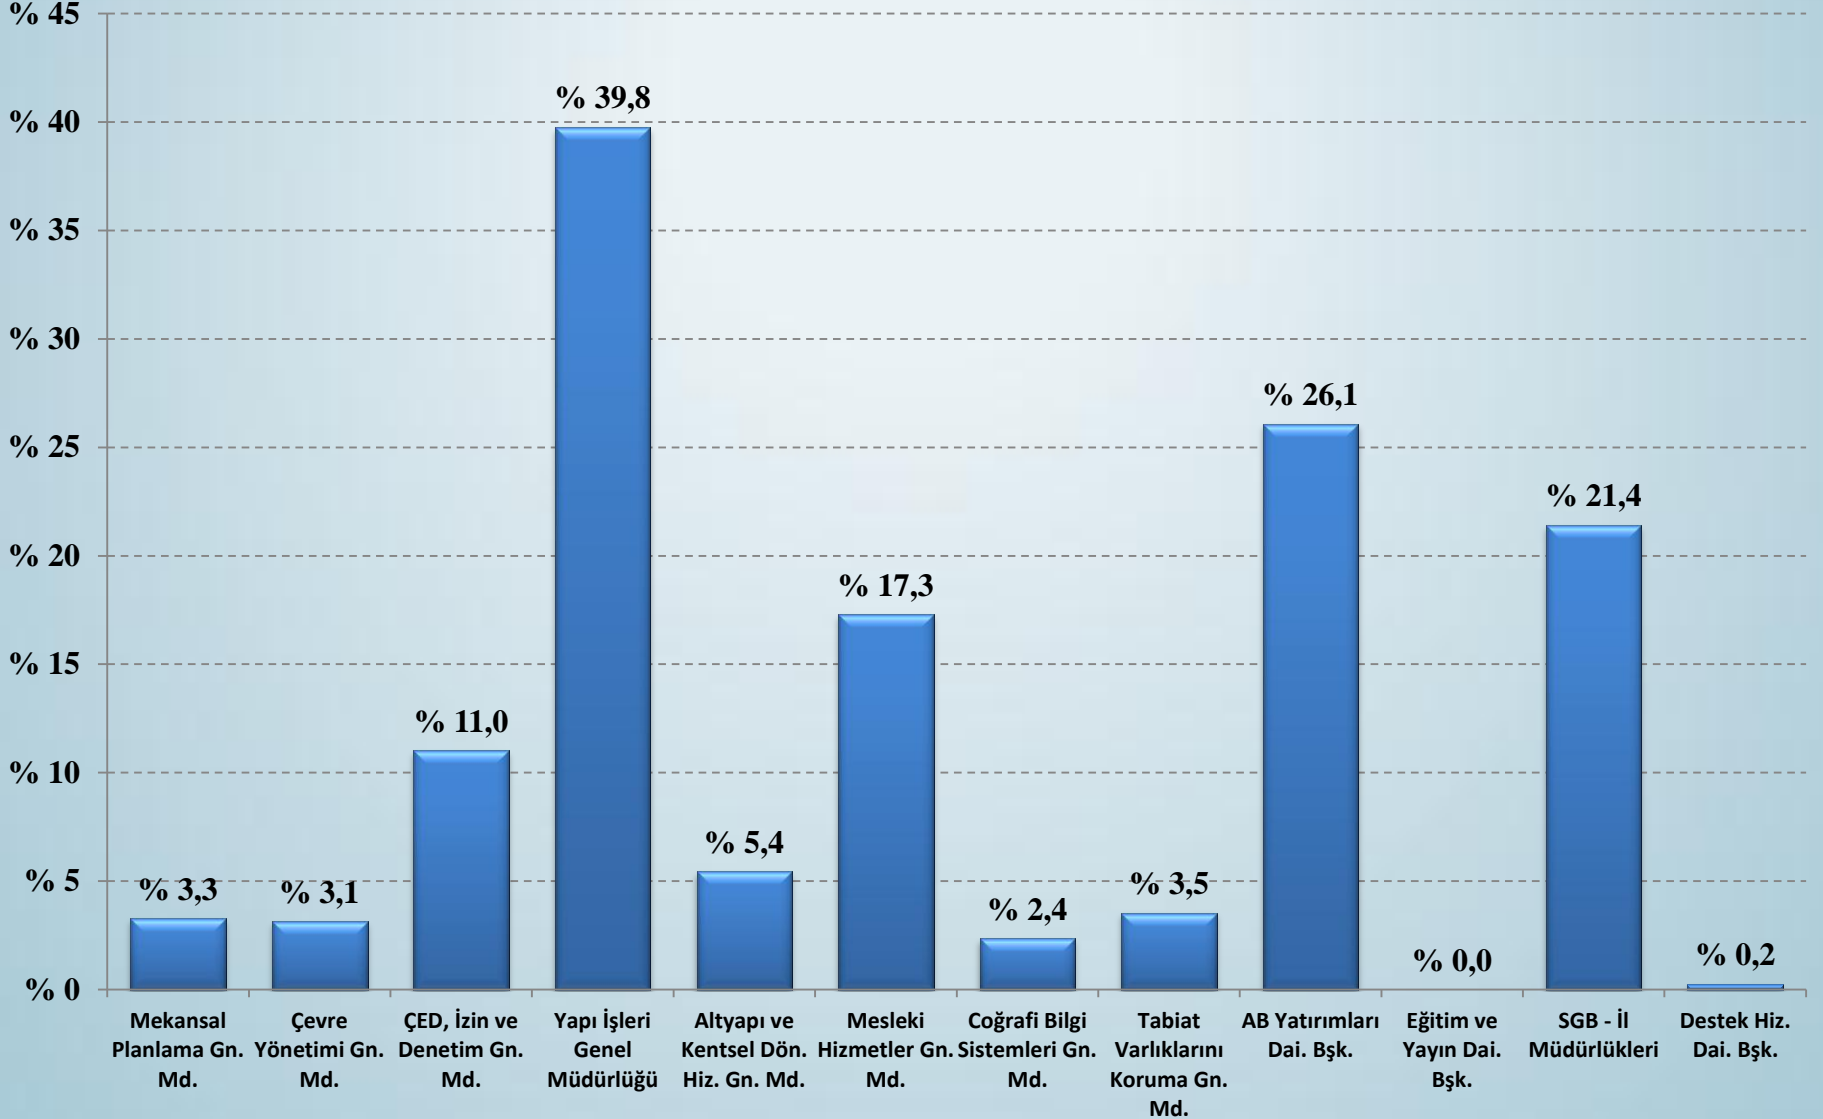

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 2013K070030 | Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2013-2016 | 2.000 | 200 | 1.000 | 0 | % 0,0 | İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir. |
| 2012K090090 | Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü) | 2012-2015 | 62.291 | 53.646 | 8.645 | 315 | % 3,6 | 1-İhalesi 2014 yılında yapılan "İstanbul İli 6ncı Etap Mikrobölgeleme" işi için 1. aşama 94.872,00 TL nin ve 2. aşama olarak 221.368,00 TL nin ödemesi yapılarak, toplamda 316.240,00 TL nin ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2-İhalesi 2014 yılında yapılan "İstanbul İli 6ncı Etap Mikrobölgeleme" işi için 3. aşama 316.240,00 TL nin ödemesi gerçekleştirilecektir. 3-İhalesi 2014 yılında yapılan "İstanbul İli 5nci Etap Mikrobölgeleme" işi için 705.404 TL nin ödemesi gerçekleştirilecektir. |
| 2013K090030 | Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü) | 2013-2015 | 3.350 | 2.150 | 1.200 | 189 | % 15,8 | 1-Proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılarak işe başlanılan Afyon-Uşak-Kütahya Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı işinin KDV Dahil 188.800 TL hakediş ödemesi yapılmıştır. 2-Proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılarak işe başlanılan Afyon-Uşak-Kütahya Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı işinin kalan 283.200,00 TL nin ödemesi 2015 yılı sonu itibarıyla yapılacaktır. |
| 2014K090060 | Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2015 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | % 0,0 | İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir. |

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|----------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2013K090110 | Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (5*) (Şehirleşme Sektörü) | 2013-2016 | 2.650 | 0 | 1.000 | 0 | % 0,0 | İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir. |
| 2015K090010 | Özel Proje Alanları (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 2.900 | | 2.900 | 46 | % 1,6 | Proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılan "AKM Alanı Etüt" işinin KDV Dahil 45.548 TL hakedişi ödenmiştir. |
| 2015K090020 | Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 1.100 | | 1.100 | 0 | % 0,0 | 2015 yılı yatırım programında bulunan "Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi"ne ilişkin çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce başlatılmış olup, toplam 1.100.000,00 TL (Bir milyon yüz bin Türk Lirası) bedeli olan söz konusu projeye ilişkin 21.05.2015 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılmış ancak ön yeterlilik şartnamesinin "İhalenin iptali" başlıklı 22'nci maddesinin 1 nolu bendinde belirtilen; "Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilecektir." hükmüne istinaden ihale iptal edilmiştir. Bu çerçevede projenin niteliği de göz önünde bulundurularak, Genel Müdürlüğümüzce daha önceden böyle bir işin yapılmamış olması sebebiyle bundan sonraki çalışmalara da örnek teşkil edebilecek nitelikte olması ve Kalkınma Bakanlığından söz konusu projeye ilişkin Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneğin yılsonuna kadar kullanılması gerektiğinden, söz konusu projeye ilişkin bir protokol metni taslağı hazırlanmış ve Genel Müdürlük Makamının görüşüne sunulmuştur. |
| 7 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 76.291 | 56.996 | 16.845 | 550 | % 3,3 | |

(5*) Projenin kapsamı ve maliyetine ilişkin Kalkınma Bakanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra harcama yapılabilir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 2015K060210 | Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü) | 2015-2016 | 3.000 | | 1.600 | 0 | % 0,0 | Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi için İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Tıp fakültesi Hastanesi ile 28.05.2015 tarihinde protokol imzalanmış Haziran'da başlangıç raporu sunulmuştur. Başlangıç Raporu ödemesinin Temmuz sonunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
| 2015K080010 | Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü) | 2015-2016 | 1.500 | | 400 | 0 | % 0,0 | Teknik şartname hazırlanmış olup, ihale işlemlerine başlanacaktır.İhale işlemlerinin 3/f yöntemi ile protokol yapılarak tamamlanması planlanmaktadır. |
| 2015K080020 | Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışmasının Hazırlanması (Belediye Hizmetleri Sektörü) | 2015-2016 | 3.000 | | 900 | 0 | % 0,0 | Teknik şartname hazırlanmış olup, ihale işlemlerine başlanacaktır.İhale işlemlerinin 3/f yöntemi ile protokol yapılarak tamamlanması planlanmaktadır. |
| 2015K080030 | Katı Atık Ana Planının Güncellenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü) | 2015-2016 | 2.000 | | 200 | 0 | % 0,0 | Teknik şartname hazırlanmış olup, ihale işlemlerine başlanacaktır.İhale işlemlerinin 3/f yöntemi ile protokol yapılarak tamamlanması planlanmaktadır. |
| 2013K100030 | İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü) | 2013-2015 | 2.475 | 1.175 | 1.300 | 345 | % 26,5 | <ul style="list-style-type: none"> TÜBİTAK tarafından 1.Taslak Ulusal Bildirim Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Nisan ayı sonunda Proje kapsamında oluşturulan web sitesi veri girişine hazır hale getirilmiştir. Nisan ayında TÜBİTAK tarafından sunulan Proje 2. İlerleme Raporu tarafımızca revize edilmesi istenerek, Mayıs ayında Revize 2. Proje İlerleme Raporu Bakanlığımıza sunulmuş olup TÜBİTAK'a 344.990,70 TL hak ediş ödemesi yapılmıştır. Mayıs ayında 2.Taslak Ulusal Bildirim Bakanlığımıza teslim edilmiş olup, nihai raporun oluşturulması için Bakanlığımız ilgili birimlerine ve Kurum/Kuruluşlara sunulmuş ve görüş / öneriler alınarak TÜBİTAK'a iletilmiştir. Ağustos ayında 3. Proje İlerleme Raporu Bakanlığımıza teslim edilecek olup TÜBİTAK'a 344.990,70 TL hak ediş ödemesi yapılacaktır. |
| 2014K100050 | Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü) | 2014-2015 | 212 | 112 | 100 | 0 | % 0,0 | Projenin ilk ara raporu 2014 yılında, ikinci ve üçüncü ara raporları ise 2015 yılında süresi içerisinde Bakanlığımıza sunulmuş olup; nihai (final) rapor çalışmaları devam etmektedir. Proje Ağustos 2015 sonunda tamamlanacak olup; 100.000 TL nihai ödeme projenin tamamlanmasını müteakip yapılacaktır. |

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 2012K100070 | Çevresel Açından Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü) | 2012-2015 | 1.563 | 1.164 | 399 | 0 | % 0,0 | Proje kapsamında 2014 yılında 930.000 TL ödeme yapılmıştır. Projede sonuç raporu 2015 yılı Haziran ayı sonunda teslim edilmiş olup, inceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu bağlamda sonuç raporunun kabulü 2015 yılı III. çeyreği içerisinde yapılması ön görülmekte olup kabulünden sonra 399.000 TL. ödeme yapılacaktır. |
| 2013K100080 | Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü) | 2013-2015 | 1.457 | 1.427 | 30 | 0 | % 0,0 | Proje 2015 yılı Nisan ayı sonu itibariyle tamamlanmış olup, nihai kalan ödemesi Temmuz ayında ödenecektir. |
| 2014K100100 | Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi (Çevre Sektörü) | 2014-2015 | 848 | 348 | 500 | 0 | % 0,0 | Aralık 2014 tarihi itibari ile ihale edilmiş ve 300.000 TL. Ödeme yapılmıştır. Proje ekibi oluşturularak çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonunda tamamlanacaktır. 490.600 TL nihai ödeme projenin tamamlanmasını müteakip yapılacaktır. |
| 2013K100170 | Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü) | 2013-2015 | 1.944 | 510 | 1.434 | 0 | % 0,0 | Şubat ayında Çalışma grubu toplantıları düzenlenmiş, Mayıs ayında Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Haziran ayında I. İlerleme Raporunun Nihai hali teslim edilmiş olup Temmuz sonu itibariyle ödeme yapılması planlanmaktadır. |
| 2015K100050 | İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü) | 2015-2016 | 4.000 | | 1.800 | 0 | % 0,0 | 2015 Yılı Yatırım Programına iki ayrı proje olarak başvuru yapılmış, ancak faaliyet alanlarının örtüşmesi sebebiyle bu iki proje birleştirilerek 2015 yılı yatırım programında tek proje olarak yayımlanmıştır. Daha sonra proje için alt projelerin ödenek dağılımlarının belirlenmesine yönelik Bakan Oluru alınarak Projelerin Detay Programı Kalkınma Bakanlığı'na iletilmiştir. Bu kapsamda, projenin alt bileşenleri için tek bir ihale yapılarak satın alma yapılması mümkün olabildiği gibi her iki bileşen için ayrı satın alma yapılması da mümkündür. |
| | İklim Değişikliği Konusunda Öğrenci ve Öğretmen Adaylarının Farkındalığının Geliştirilmesi | 2015-2016 | 2.000 | | 900 | 0 | % 0,0 | Mevcut durumda projenin bileşenleri için tek bir satın alma yapılması uygun görülmüştür. Satın alma komisyonu oluşturulmuş, Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Akdeniz Üniversitesinden projeye ilişkin fiyat teklifi istenmiştir. Ayrıca, protokol taslağı hazırlanmıştır. |
| | Yerel Yönetimlere Yönelik Kapasite Geliştirme | 2015-2016 | 2.000 | | 900 | 0 | % 0,0 | |
| 2014K100130 | Entegre Çevre İznine Tabi Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü) | 2014-2016 | 1.933 | 0 | 870 | 0 | % 0,0 | |
| | Çimento Tesisleri | 2014-2016 | 933 | 0 | 480 | 0 | % 0,0 | Projenin ihalesi tamamlanmış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır. |
| | Otomotiv Tesisleri | 2015-2016 | 1.000 | | 390 | 0 | % 0,0 | Projenin şartnamesi hazırlanmış olup, Bakan Oluru alınması aşamasındadır. |

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2010K100070 | Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü) | 2010-2015 | 250 | 191 | 59 | 0 | % 0,0 | Proje halen devam etmektedir. 2015 Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. 2015 yılı ile ilgili Merkezi Finans ve İhale Kurumundan ödeme ile ilgili yazı gelmediği için henüz ödeme yapılmamıştır. |
| AB KATKISI | | | 15.434 | 11.266 | 4.168 | 0 | % 0,0 | |
| 2012K100060 | AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirlenmeler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü) | 2012-2015 | 273 | 191 | 82 | 0 | % 0,0 | Proje 26 Haziran 2015 tarihi ile sona bitmiştir. Projenin çıktıkları olan Ulusal Uygulama Planı, Sektörel ve Düzenleyici Etki Analizi ile Taslak Yönetmelik çalışmaları tamamlanmıştır. 2015 yılı ilk altı ay dönemi için Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. |
| AB KATKISI | | | 2.456 | 1.748 | 708 | 0 | % 0,0 | |
| 2013K100090 | Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü) | 2013-2016 | 886 | 0 | 443 | 0 | % 0,0 | 2013K100090 Nolu 'Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesinin' toplam proje tutarı 7.236.000 TL olup bütçesi 3.000.000 Avro'dur. Söz konusu projenin ulusal katkısı 804.000 TL olup proje süresi iki yıldır (2014-2016). Proje 25 Aralık 2014 tarihinde başlamış olup proje için 120.000 Avro yatırıldığı kur üzerinden 344.832,00 TL tutarındaki ulusal katkı payı yatırılmıştır. Projenin genel amacı, sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve raporlanması ile ilgili tespit edilen boşlukların giderilmesi, Ulusal Sera Gazı Envanterinin, sera gazı projeksiyonlarının ve iklim değişikliği ulusal bildirimlerinin hazırlanması konusunda teknik düzeyde kapasitenin artırılması amaçlanmaktadır. Hazine Müsteşarlığı'ndan ödeme ile ilgili yazı gelmediğinden henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır. |
| AB KATKISI | | | 7.966 | 0 | 3.585 | 0 | % 0,0 | |
| 2013K100180 | Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü) | 2013-2016 | 295 | 0 | 148 | 0 | % 0,0 | Proje halen devam etmektedir. Projenin Temmuz 2016'da tamamlanması planlanmaktadır. 2015 yılı ile ilgili Merkezi Finans ve İhale Kurumundan ödeme ile ilgili yazı gelmediği için henüz ödeme yapılmamıştır. |
| AB KATKISI | | | 2.655 | 0 | 1.328 | 0 | % 0,0 | |
| 2014K100080 | Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü) | 2014-2016 | 738 | 0 | 295 | 0 | % 0,0 | Projenin AB ihale usulleri kapsamında ihale aşaması halen devam etmektedir. Bu sebeple 2015 ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Projenin 2015 yılı son çeyreğinde başlaması planlanmaktadır. 2015 yılı ilk altı ay dönemi için Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. |
| AB KATKISI | | | 6.638 | 0 | 3.319 | 0 | % 0,0 | |

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-----------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2014K100090 | Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü) | 2014-2016 | 738 | 0 | 295 | 0 | % 0,0 | Proje 12 Mart 2015 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje 2 yıl sürecek olup, 2015 yılı ile ilgili Merkezi Finans ve İhale Kurumundan ödeme ile ilgili yazı gelmediği için henüz ödeme yapılmamıştır. 287,360 TL tutarındaki ulusal katkı payı, 2014 yılı içerisinde Ulusal Katkı Ana Hesabı'na aktarılmıştır. 2015 yılı ilk altı ay dönemi için Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. |
| AB KATKISI | | | 6.638 | 0 | 3.319 | 0 | % 0,0 | |
| 2015K100060 | Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü) | 2015-2017 | 738 | 0 | 148 | 0 | % 0,0 | Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından nihai onay verilen, 2012 yılı ESEI programlaması kapsamındaki "Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi" başlıklı projeye ilişkin Proje Fişi onaylanmış ve Teknik Şartname hazırlığı tamamlanmış olup, Merkezi Finans İhale Birimi tarafından İhale sürecinin ilk aşaması 27 Nisanda başlatılıp Bakanlığımızın katılımı ile tamamlanmıştır. Proje yürütücüsünün seçileceği ikinci değerlendirme süreci Merkezi Finans İhale birimi koordinasyonunda yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 2015 yılı itibarı ile projenin başlayacağı Merkezi Finans İhale Birimi tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir. 2015 yılı ilk altı ay dönemi için Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. |
| AB KATKISI | | | 6.638 | 0 | 1.328 | 0 | % 0,0 | |
| 19 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 27.850 | 5.118 | 11.003 | 345 | % 3,1 | |
| | | AB KATKISI | 48.425 | 13.014 | 17.755 | 0 | % 0,0 | |

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2015K100020 | Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi (Çevre Sektörü) | 2015-2016 | 1.500 | | 750 | 0 | % 0,0 | Projenin TÜBİTAK-MAM ile yürütülmesi hususunda sözleşme süzreci devam etmektedir. |
| 2013K100070 | Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü) | 2013-2015 | 592 | 383 | 209 | 0 | % 0,0 | Projenin muayene kabulü 2015 Ekim ayında yapılacak olup kalan ödeme muayene kabul sonrasında yapılacaktır. |
| 2014K100110 | İl Müdürlüklerinin Denetim Kapasitesinin Artırılması (Çevre Sektörü) | 2014-2015 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | % 0,0 | Projenin iptal edilmesine ilişkin olarak Kalkınma Bakanlığı'na talep yazısı gönderilmiştir. |
| 2010K100030 | Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü) | 2010-2016 | 9.556 | 3.726 | 4.000 | 548 | % 13,7 | *.Proje iki bileşenden oluşmaktadır. I. Bileşen: hava kalitesi ön değerlendirme projesi kapsamında Ankara THM, Konya THM, Adana THM ve Diyarbakır THM bağlı illeri içermektedir. II. Bileşen: mevcut hava kalitesi ölçüm araçlarının yenilenmesini içermektedir. Bu kapsamda hiç bir proje önerilmemiştir. *.Ankara THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi; 2 hakedişi yapılan projenin.3.Ara Rapor; 4.Ara Rapor hakedişleri ödenmiş olup Nihai Rapor imza aşamasındadır. *.Konya THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi;I. Ara raporun hakedişi ödendi, II ara rapor değerlendirilmektedir. *.Adana THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi;I. Ara raporun hakedişi ödendi, II ara rapor değerlendirilmektedir. *.Diyarbakır THM Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi; proje haziran 2015 tarihi itibari ile başladı. |
| 2011K100290 | Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü) | 2011-2016 | 7.420 | 0 | 5.350 | 252 | % 4,7 | |
| | Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı | 2011-2016 | 6.237 | 0 | 4.167 | 0 | % 0,0 | 17.06.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, Ekonomik açıdan en uygun teklif yapan yüklenici ile sözleşme için davet edilmiştir. Ekonomik açıdan en uygun teklif 3.911.700,00 TL (KDV Dahil) olarak tespit edilmiştir. 2015 yılı Temmuz ayında sözleşme imzalanması beklenmektedir. 2016 Eylül ayında Temiz Hava Merkezinin inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. |
| | Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı | 2011-2015 | 1.183 | 0 | 1.183 | 252 | % 21,3 | Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası İşi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası tadilat projeleri hazırlanmış, ihale talimatı verilerek ihale işlemleri tamamlanarak yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.154.000TL (KDV Dahil) dir. |

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2012K100120 | Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü) | 2012-2016 | 18.974 | 4.134 | 7.000 | 2.160 | % 30,9 | |
| | Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı | 2012-2015 | 4.740 | 2.300 | 2.440 | 833 | % 34,1 | 06.03.2014 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yüklenici ile sözleşme imzalanmış olup ihale bedeli 3.296.000 TL' dir. (KDV Dahil).2015 yılı 6. Ayı itibari ile itibari ile binanın %80 oranında fiziki gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2015 yılı Eylül ayında Temiz Hava Merkezinin teslimi planlanmaktadır. |
| | İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı | 2012-2016 | 6.140 | 0 | 1.300 | 0 | % 0,0 | 03.06.2015 tarihinde ihalesi yapılmış, ekonomik açıdan en uygun teklif yapan firma sözleşme için davet edilmiştir. Ekonomik açıdan en uygun teklif 4.657.460,00 TL (KDV Dahil) olarak tespit edilmiş, 2015 yılı Temmuz ayında sözleşme imzalanması beklenmektedir. 2016 Eylül ayında Temiz Hava Merkezinin inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. |
| | Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı | 2012-2016 | 4.000 | 0 | 1.000 | 0 | % 0,0 | İl Müdürlüğü tarafından uyulama Projeleri avan projeler hazırlanmıştır Söz konusu iş için tespit edilen muhammen bedel 7.842.627 TL (KDV Hariç) olarak tespit edilmiş olup . 2015 yılı Diyarbakır Temiz hava merkezi için ayrılan ödenek 4.000.000 TL dir. İhale talimatının verilebilmesi için muhammen bedel üzerinde bir ödenek temini çalışması yürütülmektedir. |
| | Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı | 2012-2015 | 4.094 | 1.834 | 2.260 | 1.327 | % 58,7 | 03.07.2014 tarihinde ihalesi yapılmış, yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.119.900 (KDV Dahil) olup 2015 yılı haziran ayı itibari ile binanın fiziki olarak fiziki gerçekleşme oranı %60-70 dir. 2015 yılı Eylül ayında binanın teslimi planlanmaktadır. |
| 2015K100040 | Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü) | | | | | | | |
| | Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu | 2015-2016 | 3.000 | | 998 | 0 | % 0,0 | Projeyle ilgili teknik şartname taslağı hazırlanmış olup; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne görüş için gönderilmiştir. |

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2014K100040 | Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü) | 2014-2017 | 15.879 | 6.392 | 5.100 | 440 | % 8,6 | *.Proje iki bileşenden oluşmakta olup, I. bileşen Bakanlığa ait toplam 108 adet hava kalitesi izleme aracının bakım onarım ve kalibrasyon işi, II. bileşen hava kalitesi izleme istasyon kurulumu işi (2014-2015 döneminde Samsun THM bağlı toplam 8 ilde 20 istasyon kurulumu projesi gerçekleştirilmiştir.) *.Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması (Samsun THM); Samsun THM bağlı illerde toplam 20 istasyonun 11 adedi Aralık 2014 tarihinde tamamlanmıştır. 9 adet istasyon ise Haziran 2015 tarihinde tamamlanmış olup tahakkuk tutarı 1.707.578 TL. 1.07.2015 tarihinde Ödeme Emrine bağlandığından harcamaya tutar yansıtılmamıştır. Samsun THM bağlı illerde toplam 20 istasyonun kurulumu gerçekleştirilmiştir. *.Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Bakım-Onarım Projesi ; Şubat 2015 tarihinde başlayan ve aylık olarak bakım-onarım ve kalibrasyon hizmeti hakedişlerinin düzenlendiği projede Şubat-Mart-2 hakedişi ödemesi gerçekleştirilmiş olup Nisan ayı hakedişi imzadadır. |
| | Döner Sermaye | 2015-2016 | 19.280 | | 6.000 | 0 | % 0,0 | Erzurum ve İzmir Temiz Hava Merkezlerine ait istasyonların kurulumu için döner sermaye kullanılacaktır. Ancak Erzurum-İzmir istasyon kurulumu ihalesine 02.07.2015 tarihinde çıktığından 01.01-31.06.2015 tarihleri arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır. |

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2010K100100 | Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü) | 2010-2015 | 885 | 740 | 145 | 77 | % 53,1 | Seveso II Direktifi'nin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması İçin Teknik Yardım Projesi 17/11/2014 tarihinde tamamlanmıştır. Ödemeleri Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından yapılan projenin, MFİB'den alınan bilgiler doğrultusunda 19/3/2015 tarihinde; 602.115,24 Euro AB katkısı, 66.901,69 Euro TR katkısı olmak üzere toplamda 669.016,93 Euro nihai ödemesi yapılmıştır. 2014 yılında ödenecek olan ulusal katkı payı ödenek yetersizliği sebebi ile ödenememiş olup sözkonusu ulusal katkı ödemesi 2015 yılında gerçekleştirilmiştir |
| AB KATKISI | | | 7.965 | 7.522 | 443 | 0 | % 0,0 | |
| 2014K100070 | Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü) | 2014-2016 | 339 | 136 | 2 | 0 | % 0,0 | SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi 12 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla başlamış olup halihazırda proje faaliyetleri devam etmektedir. 2015 yılının ilk yarısında proje faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmüştür; 2015 yılının Ocak ayında tarım, su yönetimi, enerji ve bölgesel kalkınma SÇD Pilot uygulamaları kapsamında ilk olarak Ocak ayında merkezdeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Mart ve Nisan ayları içerisinde dört pilot SÇD çalışması kapsamında Çanakkale, Aydın, Konya ve Ankara'da saha ziyaretleri, bilgilendirme ve kapsamaştırma toplantıları yereldeki ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, STK'lar ve meslek odalarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilerek hazırlanan pilot Kapsamaştırma Raporları'na dair görüş ve önerileri alınmıştır. 17/2/2015 tarihinde Proje 3.Yönelendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Projenin "paydaşların SÇD farkındalıklarının arttırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi" faaliyetleri kapsamında Ankara'da, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Belediyeler, STK'lar, Meslek Odalarından temsilcilerin katılımı ile 25-27-29 Mayıs 2015 tarihinde 3 adet SÇD Çalıştayı, 1-3-4 Haziran 2015 tarihinde 3 adet SÇD Semineri düzenlenmiştir. Proje çerçevesinde 2015 yılı için ulusal katkı payı ödemesi bulunmamaktadır. |
| AB KATKISI | | | 3.054 | 1.145 | 1.069 | 0 | % 0,0 | |
| 10 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 60.145 | 15.511 | 25.554 | 3.477 | % 13,6 | |
| | | DÖNER SERMAYE | 19.280 | 0 | 6.000 | 0 | % 0,0 | |
| | | GENEL TOPLAM | 79.425 | 15.511 | 31.554 | 3.477 | % 11,0 | |
| | | AB KATKISI | 11.019 | 8.667 | 1.512 | 0 | % 0,0 | |

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2010K091030 | Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü) | | | | | | | |
| | Hizmet Binası İnşaatı (Döner Sermaye) | 2010-2015 | 197.000 | 180.000 | 17.000 | 23.035 | % 135,5 | İmalat devam etmektedir. |
| | Bakanlık Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler (Döner Sermaye) | 2014-2015 | 38.405 | 0 | 38.405 | 16.442 | % 42,8 | İmalat devam etmektedir. |
| 2015K140150 | Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü) | 2015-2015 | 1.000 | | 1.000 | 0 | % 0,0 | DMO ile görüşmeler yapıldı. Teknik Şartname hazırlandı. Yaklaşık Maliyet çalışmaları devam ediyor. |
| 2010K010070 | Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü) | 2010-2015 | 1.150 | 0 | 1.150 | 360 | % 31,3 | Proje arşivinin taranması işi 16.12.2014 tarihinde KDV dahil 859.630,00 TL'ye ihale edilmiştir. Arşiv tarama programı kapsamında 2015 yılında 100 adet projenin taranarak dijital arşive katılması hedeflenmektedir. Ocak-Haziran döneminde 60 adet proje taranarak dijital arşive eklenmiştir. |
| 2010K010090 | Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü) | 2010-2016 | 2.990 | 850 | 1.500 | 266 | % 17,7 | 4708 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarın denetiminde görev alan değerlendirme heyetindeki personellerin bilgilendirilmesi amacıyla "TS EN ISO/ICE 17025 Temel Eğitimi ile TS EN ISO/ICE 17025 İç Tetkik Kalite Eğitimi" ile 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata ilişkin İl Müdürlükleri personellerinin bilgilendirilerek konuya ilişkin uygulamaların daha etkin ve verimli şekilde sağlanması amacıyla "4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları Eğitimi" adlı eğitimlerin 2015 yılının ikinci yarısında yapılması planlanmaktadır. |

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2012K010460 | Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü) | 2012-2016 | 3.500 | 200 | 2.000 | 62 | % 3,1 | Yeni Yapı Denetim Sistemi yazılımına ilişkin ihale sonuçlandırılarak, 425000 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmış, yazılım çalışmalarına başlanılmış ve yeni yazılımın analiz-tasarım çalışmaları tamamlanarak Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında pilot iller olan Düzce, Karaman ve Afyonkarahisar illerinde uygulama aşamasına gelinmiştir.Ayrıca Yapı Denetim Sistemi Uygulama, Bakım, Destek, İyileştirme, Bakanlık Merkezine Taşınması ve Merkez Bilgi İşlem Altyapısına Entegrasyonu İşi ihalesi 20.01.2015 tarihinde yapılmış ve 142500 TL+KDV bedelli sözleşme 22.01.2015 tarihinde imzalanmış olup, yazılımın bakım çalışmaları devam etmektedir. |
| 2012K010470 | Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü) | 2012-2016 | 1.300 | 400 | 600 | 37 | % 6,2 | Bu proje kapsamında İskan yazılımının bakım çalışması ile Hasar Tespiti için yazılım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.Afet Bilgi Sistemi Yazılımı şartname çalışmaları devam etmektedir.Yatırım Takip Sistemi (YTS) yazılımının kamu kurum ve kuruluşlarına yaygınlaştırılması kapsamında fizibilite çalışmaları devam etmektedir. |
| 2006K070010 | İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2006-2017 | 6.030 | 2.300 | 1.500 | 59 | % 3,9 | Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak bilinmemekle beraber şu ana kadar ödenek problemi yaşanmamıştır. |
| 2011K070020 | Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2011-2015 | 30.485 | 27.520 | 2.965 | 1.037 | % 35,0 | Devam etmektedir.Bu sene içerisinde tamamlanıp kuraları çekilecektir. Çevre düzenleme imalatları devam etmektedir. Trafo yapılacaktır. |

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 1992K070040 | Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 1992-2016 | 24.500 | 8.453 | 5.312 | 2.799 | % 52,7 | |
| | Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı | 2013-2015 | 5.310 | 0 | 5.310 | 2.799 | % 52,7 | İhalesi yapılmıştır. İş devam etmektedir. |
| | Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı | 1992-2016 | 10.467 | 3.389 | 1 | 0 | % 0,0 | Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır. |
| | Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı | 1994-2016 | 8.723 | 5.064 | 1 | 0 | % 0,0 | Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır. |
| 2009K070020 | Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2009-2018 | 194.200 | 11.559 | 165 | 99 | % 60,0 | |
| | Tahtalı Barajı İskanı | 2009-2015 | 11.720 | 11.559 | 161 | 99 | % 61,5 | İş tamamlanmış, kuraları çekilmiştir. 103 kişiye anahtarları teslim edilmiştir.. Bpçlandırma sözleşmelerini imzalayan ailelere anahtar teslimi yapılacaktır. |
| | Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı | 2009-2018 | 91.240 | 0 | 2 | 0 | % 0,0 | Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. |
| | Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı | 2009-2018 | 91.240 | 0 | 2 | 0 | % 0,0 | Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskan isteyen aile çıkmamıştır. |

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2010K070040 | İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2010-2017 | 10.500 | 3.000 | 500 | 0 | % 0,0 | İhtiyaç duyuldukdça harcama yapılmaktadır. |
| 2011K070010 | Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2011-2016 | 5.400 | 668 | 1.500 | 0 | % 0,0 | 2015 yılında 33 adet pilot ilde, 35 adet kırsal konut projesi elde edilmesi planlanmaktadır. Ocak-Haziran döneminde, 6 ilde (Kars, Erzurum, Iğdır, Denizli, Uşak ve Muğla) kırsal konut projesi elde edilmiştir. Proje kapsamında, 24 tip örnek kırsal konut projesi üretilmiştir. Ayrıca, tüm İl Müdürlüklerimizle, illerinde bulunan ve yöresel mimari özellikleri yansıtan konutlara ait rapor hazırlanması hususunda iletişime geçilmiş olup, bugün itibariyle 51 İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu çalışmalar Bakanlığımıza ulaşmıştır. 2015 yıl sonu itibariyle bu çalışmalarının tamamının Genel Müdürlüğümüze ulaşması ve hazırlanan raporların, elde edilen projelerle birlikte kitap haline dönüştürme çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır. |
| 2011K070030 | Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2011-2017 | 3.340 | 1.826 | 2 | 0 | % 0,0 | İhtiyaç duyuldukdça kesin hesap farkları için harcama yapılmaktadır. |

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2013K070010 | Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2013-2016 | 214.620 | 112.000 | 3.705 | 377 | % 10,2 | |
| | Gördes-Gördes Barajı İskanı | 2013-2016 | 6.618 | 0 | 3.703 | 377 | % 10,2 | 02.03.2015 tarihi itibari ile yer teslimi yapılmış olup inşaat çalışmaları başlamıştır. |
| | Anamur- Alaköprü Barajı İskanı | 2013-2015 | 208.002 | 112.000 | 2 | 0 | % 0,0 | Konutlar tamamlanmış bprçlandırma sözleşmeleri imzalanmıştır. Sözleşmeleri imzalayan haksahiplerine anahtarları teslim edilmiş olup süreç devam etmektedir. Tarım arazileri için DSI'den ödenek talep edilmiş olup henüz Bakanlık bütçemize ödenek gönderilmemiştir.2015 yılında hakediş bulunmamaktadır. |
| 2013K070020 | İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) | 2013-2017 | 3.165 | 1.000 | 550 | 0 | % 0,0 | İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır. |

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2011K070040 (**) | <i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i> | 2011-2016 | 27.403 | | 7.698 | 0 | % 0,0 | İşler devam etmekte olup ödenek dahilinde işler tamamlanacaktır. |
| | Borç Verme (08.1 Ödeneği) | | 113.000 | 64.000 | 40.232 | 5.837 | % 14,5 | |
| 1995K070030 (**) | <i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i> | 1995-2015 | 139.000 | 138.000 | 1.000 | 0 | % 0,0 | İşler devam etmekte olup yıl içerisinde tüm işler tamamlanacaktır. |
| 2011K070050 (**) | <i>Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i> | 2011-2017 | 5.200 | 2.800 | 2 | 0 | % 0,0 | İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır. |
| 18 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 529.583 | 169.776 | 30.147 | 5.096 | % 16,9 | |
| | | 08 TOPLAM | 257.200 | 204.800 | 41.234 | 5.837 | % 14,2 | |
| | | DÖNER SERMAYE | 235.405 | 180.000 | 55.405 | 39.477 | % 71,3 | |
| | | GENEL TOPLAM | 1.022.188 | 554.576 | 126.786 | 50.410 | % 39,8 | |

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2012K080030 | Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü) | 2012-2015 | 1.850 | 1.350 | 500 | 94 | % 18,8 | Bakanlığımız ve Amasya Belediyesi ile proje kapsamında 13-15.02.2015 tarihleri arasında Amasya ilinde "Şehir Kimliği Çalıştayı" düzenlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz görevli ilgili personele 04-05 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul İlinde "Sosyal Etki Tasarım çalıştayı" katılımı sağlanarak Sosyal Etkiye Duyarlı Tasarım, Sosyal Yenilik Tasarımı, Sosyal Etki Değerlendirmesi eğitimleri verilmiştir. |
| 2013K080040 | İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü) | 2013-2016 | 7.308 | 3.000 | 2.500 | 44 | % 1,8 | Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan "İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin kullanım kriterlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ortak Hizmet Uygulaması Protokolu" kapsamında 13.04.2015 tarihinde İstanbul İlinde "İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi Tanıtım Çalıştayı" düzenlenmiştir. TÜBİTAK MAM ile yapılan Protokol -1 kapsamında yol performans izleme çalışmaları tamamlandı. Gazi Üniversitesi ile yapılan Protokol-2 kapsamında; 01.06.2015 Tarihinde İş Paketi -1 ile ilgili Rapor No: 1'in tamamlandığını belirten dilekçe Gazi Üniversitesi tarafından verildi. Söz konusu rapora ilişkin, Kontrol teşkilatınca tespit edilen eksik ve düzeltmeler 25.06.2015 Tarih ve 5654 sayı numarasıyla Gazi Üniversitesine gönderilmiştir. |
| 2013K080050 | Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü) | 2013-2016 | 4.900 | 1.500 | 2.500 | 523 | % 20,9 | Protokol kapsamında Mevcut Durum Raporu ve Öneri Raporu Üniversite tarafından hazırlanarak teslim edilmiştir. Proje kapsamında paydaşlarla Ortak Akıl Çalıştayı ve Odak Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Sektörler bazında usul ve esasların belirlenmesi çalışmaları devam etmekte olup İçmesuyu, Atıksu ve yağmur suyu ile ilgili raporlar teslim edilmiştir. Raporların inceleme süreci devam etmektedir. |
| 2015K090050 | Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 3.000 | | 3.000 | 0 | % 0,0 | Kilis ve Elazığ illerine yönelik hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi için, Kilis Belediyesi'ne para aktarılması için işlem başlatılmış olup, Elazığ ili için yapılan ihaleye yeterli katılım sağlanamamasından dolayı yeniden ihale süreci başlatılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. |

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2015K140160 | Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (3*) (Belediye Hizmetleri Sektörü) | 2015-2016 | 3.000 | | 1.400 | 0 | % 0,0 | 2015 yılı yatırım programlarında "Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması" isimli proje Kalkınma Bakanlığı'nın "Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir." notu ile kabul edilmiş olup, söz konusu notun kaldırılmasına yönelik olarak Kalkınma Bakanlığı ile yürütülen müzakereler neticesinde nihai şekli verilen ilâve rapor 04/05/2015 tarihli ve 3469 sayılı yazımız ile Kalkınma Bakanlığı'na iletilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı'na sunulmuş, ancak Kalkınma Bakanlığı'nın 04/06/2015 tarihli ve 2378 sayılı yazısı ile projeye ilişkin yeni bilgiler talep edilmiştir. Bu talebe ilişkin cevap hazırlanmakta olup, söz konusu notun kaldırılmasını müteakip projeye başlanacaktır. |
| 2014E060030 | Çamlıca Özel Proje Alanında Altyapı Tesisleri Etüd ve Proje İşlerinin Yapılması Projesi (Döner Sermaye) (Kentiçi Ulaşım Sektörü) | 2014-2015 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | % 0,0 | |
| 6 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 20.058 | 5.850 | 9.900 | 661 | % 6,7 | |
| | | DÖNER SERMAYE | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | % 0,0 | |
| | | GENEL TOPLAM | 25.308 | 5.850 | 12.150 | 661 | % 5,4 | |

(3*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı onayına tabidir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2012D100020 | Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı (Enerji Sektörü) | 2012-2016 | 4.033 | 1.298 | 500 | 37 | % 7,4 | BEP-TR II: Mozaik Yazılım firması ile yapılmaktadır. Sözleşme tarihi 14/11/2014 ve toplam götürü bedeli 597.000 TL olan projenin % 10 luk bedeli 31/03/2015 tarihli hakediş raporu ile ödenmiştir. Geri kalan miktar kabul yapıldıktan sonra 2016 da ödenecektir. BEP-TR I Bakım Onarımı gerçekleştirilmiş ve 37.000 TL İntersan firmasına Ödenmiştir. |
| 2012D100030 | Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü) | 2012-2017 | 2.450 | 1.700 | 500 | 0 | % 0,0 | 23-25 Mart 2015 tarihlerinde Marmaris'te merkez ve taşra teşkilatı teknik personeline BEP ve MISGP Yönetmeliği Kapsamında Eğitim verilmiştir. Bu işe ilişkin yolluklar gönderilmiştir. 2) Bina ısıtma ve Soğutma Enerji Gereksinimlerini sınırlandıran U değerlerinin tespiti protokolü 16.10.2014 tarihinde Karabük Üniversitesi ile imzalanmış ve 1. rapor sunuldu, incelenmektedir. 2. rapor ise 15.04.2015 tarihinde sunulmuştur. 354.000 TL ödeme gerçekleştirilecektir. |
| 2015D000020 | Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü) | 2015-2016 | 1.010 | 0 | 500 | 0 | % 0,0 | Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bakanlığımızın ana faydalanıcı olduğu TR2011/0315.20 nolu "Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi" NİRAS IC Sp. Z.o.o. ul. başkanlığındaki konsorsiyum yürütücülüğü ile 13.04.2015 tarihinde başlamıştır. Proje süresi 2 yıldır. 03.04.2015 tarihli ve 77000511-212.01.09/10345 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığından 133.400 Avro Ulusal Katkı payının ödenmesi istenmiştir. Bu ödeme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 62855 Avro daha ödeme gerçekleştirilecektir. |
| AB KATKISI | 8.850 | | 0 | 8.835 | 0 | % 0,0 | | |
| 2013G000520 | Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü) | 2013-2015 | 638 | 338 | 300 | 38 | % 12,7 | 13.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 1. ve 2. hakediş ödemeleri olarak 38.198 TL ödenmiştir. |

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2010K010120 | Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü) | 2010-2015 | 660 | 550 | 110 | 21 | % 19,1 | UDK Denetimi yollukları (22 adet UDKdenetimi yapıldı). Türkak eğitimler gerçekleştirilmiş ve bunları ödemeleri yapılmıştır. |
| 2010K010130 | Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü) | 2010-2015 | 336 | 186 | 150 | 48 | % 32,0 | Gürültü kontrolü mevzuat çalışması projesi kapsamında 1.aşama raporu onay yazısı 13.11.2014'de, 2.aşama onay yazısı 02.04.2015'de yazıldı. Bu aşamaların ödemeleri 48.000 TL yapıldı. |
| 2013K010080 | Yapı Mütahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü) | 2013-2015 | 939 | 559 | 380 | 43 | % 11,3 | YAMBİS yazılımı ihale yapılarak 139.870 TL lik sözleşme imzalanmış, proje kapsamında iş ve işlemler devam etmektedir. 43.000 TL ödenmiştir. |
| 2010K010110 | Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü) | 2010-2017 | 13.894 | 9.264 | 1.430 | 144 | % 10,1 | İl Müdürlüklerimizin PGD kapsamındaTSE'ye yaptırmış olduğu test ve deneyler ile Merkez personelinin PGD Görevi kapsamında yapılan yolluklar ödenmiştir. YMDS (Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi) 2014 yılı bakım bedeli ile 2015 yılı 1. ve 2. aşama ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mobil PGD ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 110 adet Tablet bilgisayar ve yazıcı alımı ile 10 adet arazi tipi PGD aracı alımı için DMO ile işlemler sürdürülmektedir. |
| 2015K010060 | Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü) | 2015-2017 | 4.270 | | 700 | 285 | % 40,7 | Merkez laboratuvarına 1 adet Servo Kontrollü Beton Basınç Presi ve 1 adet Servo Kontrollü Çelik Çekme Cihazı alınmıştır. |
| 2015K010070 | Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü) | 2015-2017 | 1.250 | | 250 | 215 | % 86,0 | 1) Otopark Yönetmeliğinin hazırlanmasına yönelik hizmet uygulaması protokolü Gazi Üniversitesi ile 05.11.2014 tarihinde başlatılmış olup; 121.000 TL ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2) 06-09/04/2015 tarihleri arasında Antalya'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personeline (251 katılımcı) yönelik olarak "İmar Uygulamalarına İlişkin Mevzuat Eğitimi" verilmiştir. 3) 28-30/04/2015 tarihleri arasında Çorum ilinde Kıyı Mevzuatı ve İmar Uygulamaları ile Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti ,Kamulaştırma İş ve İşlemleri,Hali hazır Harita Yapımı ve Onayı Eğitimine 2 personel katılmıştır. 4) 07 Mayıs 2015 tarihlerinde İmar Mevzuatı Çalıştayı Ankara'da yapılmış olup, duyuru ve çalıştay için ödemeler gerçekleştirilmiştir. |

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-----------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2015K010080 | Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü) | 2015-2017 | 4.900 | | 1.000 | 100 | % 10,0 | 03/04/2015 tarihinde ihale yapılmış, ancak ihale iptal edildiğinden bir işlem yapılamamıştır. Yapı Ustalarının belgelendirmesi faaliyet açılışı ile tanıtım filmi yapılmıştır. |
| 2015K010090 | Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü) | 2015-2019 | 4.800 | | 830 | 306 | % 36,9 | Gazi Üniversitesi ile yapılan "Ahşap Dış Cephe İş İskelelerinin Özellikleri, Detay Çizimleri, Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında 59.000,00-TL ödeme yapılarak protokol tamamlanmıştır. İTÜ ile yapılan "Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında I. Aşama için 47.200,00-TL ödeme yapılmıştır. II. Aşama devam etmektedir. Niğde Üniversitesi ile yapılan "Doğal Kayaların Oyulması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirilme Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" 02.04.2015 tarihinde imzalanmıştır. 1. aşama olarak 191.160 TL ödenmiştir. |
| 2015K010100 | Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü) | 2015-2019 | 2.000 | | 500 | 0 | % 0,0 | Teknik şartname hazırlanma aşamasındadır. |
| 13 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 41.180 | 13.895 | 7.150 | 1.237 | % 17,3 | |
| | | AB KATKISI | 8.850 | 0 | 8.835 | 0 | % 0,0 | |

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2014K090130 | Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2015 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 192 | % 19,2 | 2014 yılında ihalesi yapılan işin taşra teşkilatına yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Destek işleri hakkındaki ödemeleri 3 ayda bir 88500 TL olarak devam edecektir. Kullanıcıların Adet E-imza teminleri yapılmaktadır. |
| 2014K090160 | Fiziksel ve Dijital Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Uygulaması (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2015 | 2.500 | 0 | 2.500 | 15 | % 0,6 | Şartname çalışmaları devam etmektedir. 3.000.000 Adet Zaman Damgası temini yapılmıştır |
| 2014K090320 | Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2015 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 80 | % 8,0 | 2015 Yılı için ayrılan ödeneğin Bakanlık Coğrafi Verilerinin ve Metaverilerinin Güncellenmesi ve Entegrasyonu İşi kapsamında kullanılacaktır. |
| 2014K090300 | Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2015 | 4.500 | 1.500 | 3.000 | 94 | % 3,1 | İhale hazırlıkları yapılmıştır |
| 2014K090310 | Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2015 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 125 | % 6,3 | Dönüşüm Projeleri Özel Dönüşüm Hesabından karşılanan iş kapsamında Proje ile ilgili analiz ve tasarım işleri tamamlanmış, yazılım geliştirme işleri devam etmektedir. Veri uyumlaştırma işleri başlatılacaktır. |
| 2014K090170 | 1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2016 | 4.500 | 0 | 4.000 | 0 | % 0,0 | 2015 Yılı için ayrılan ödenek Ortofoto ve Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi İşi için ihale yapılmış, sözleşme imzalanmış ve proje başlatılmıştır |
| 2015K090410 | Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 1.500 | | 1.500 | 0 | % 0,0 | İhale hazırlıkları yapılmıştır |

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2015K090420 | Üç Boyutlu Topografya ve Kent Veri Modelinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 1.200 | | 1.200 | 153 | % 12,8 | Proje ile ilgili analiz, tasarım ve yazılım geliştirme işleri kısmi olarak tamamlanmıştır. |
| 2015K090430 | Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 1.000 | | 1.000 | 0 | % 0,0 | İhale hazırlıkları yapılmıştır |
| 2015K090480 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mobil Platform Altyapısı Oluşturma Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 1.000 | | 1.000 | 0 | % 0,0 | Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir |
| 2015K090440 | Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2016 | 1.500 | | 700 | 0 | % 0,0 | CBS Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uzaktan Eğitim Amacıyla Kullanılacak İçeriklerin Hazırlanması İş'i ve "CBS Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uzaktan Eğitim Sistemi Tasarlanması İş'i" Hizmet Alımı Teknik Şartnameleri hazırlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında Mesleki Yeterlilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Sistem Tasarımı ve Yazılım Çözümleri Projesine ilişkin Teknik Şartname hazırlanarak ihale işlemleri için Yönetim Hizmetlerine gönderilmiştir. |
| 2015K090450 | Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının Bulut Bilişim Tabanlı Geliştirilmesi Projesi (7*) (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2017 | 9.000 | | 7.599 | 0 | % 0,0 | Şartname çalışmaları devam etmektedir. |
| 2015K090460 | Siber Güvenlik Alt Yapısı Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2016 | 2.200 | | 1.100 | 0 | % 0,0 | Şartname çalışmaları devam etmektedir. |
| 2015K090470 | Kimlik Yönetim Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2016 | 1.300 | | 900 | 0 | % 0,0 | Şartname çalışmaları devam etmektedir. |

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2015K090490 | Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı Üretiminin Gerçekleştirilmesi Projesi (8*) (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2016 | 4.100 | | 4.000 | 0 | % 0,0 | 2015 Yılı için ayrılan ödenek Ortofoto Haritaları Kullanılarak Coğrafi Veri Altyapısı Üretiminin Gerçekleştirilmesi Projesi (Bina- Yol Kodlama) işi ve Raster Verilerinin Damgalanması, Arşivlenmesi ve Web Tabanlı Siparişlenmesi İşleri 'nde kullanılacaktır. Söz konusu işlerin ihaleleri yapılmış, sözleşmeleri imzalanmış ve projeler başlatılmıştır. |
| 2015K090600 | Bulut Bilişim Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (9*) (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2017 | 5.000 | | 1 | 0 | % 0,0 | İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip harcama yapılabilecektir |
| 2015K090500 | e-Plan Otomasyonu Projesi (8*) (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2017 | 2.900 | | 2.600 | 0 | % 0,0 | Şartname çalışmaları devam etmektedir. |
| 2015K090510 | Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2016 | 4.950 | | 4.900 | 406 | % 8,3 | 2 adet işin ihalesi yapılmıştır. Diğer işler için şartname çalışmaları devam etmektedir. Taşra teşkilatı ihtiyaç belirlemeleri devam etmektedir. İhtiyaç alımları için şartname çalışmalarına başlanılmıştır |
| 2014K090150 | Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı Güncelleştirme ve Optimizasyon Projesi (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2015 | 4.900 | 1.600 | 3.300 | 0 | % 0,0 | Şartname çalışmaları devam etmektedir. |
| 2015K090800 | Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü) | | | | | | | |
| | Bakanlık Yazıcı ve Baskı Süreçleri Yönetim Sistemi | 2015-2015 | 1.900 | | 1.900 | 0 | % 0,0 | Şartname çalışmaları devam etmektedir. Şartnamenin son kontrolleri yapılmaktadır. İhtiyaç belirlemesi ve uygun sayının tespiti yapılmakta. Kullanımda donanım ürünleri yerleri belirlenmektedir |

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2015K100040 | Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü) | | | | | | | |
| | Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu | 2015-2016 | 1.000 | | 2 | 0 | % 0,0 | Firma Bilgi Sistemi Otomasyonuna ilişkin şartname çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak projenin 2015 yılı için iz bedelli olarak çıkması sebebiyle ihale aşamasına geçilememiştir. |
| 2013K100060 | INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü) | 2013-2016 | 1.180 | 0 | 1 | 0 | % 0,0 | Proje değişikliği ve şartname değişikliği yapılarak Merkezi Finans ihale birimine gönderildi. Merkezi Finans İhale Biriminin (CFCU) ihaleyi yapması beklenmektedir. |
| AB KATKISI | | | 10.620 | 0 | 5.310 | 0 | % 0,0 | |
| 22 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 59.230 | 5.500 | 41.903 | 1.065 | % 2,5 | |
| | | DÖNER SERMAYE | 4.900 | 1.600 | 3.300 | 0 | % 0,0 | |
| | | GENEL TOPLAM | 64.130 | 7.100 | 45.203 | 1.065 | % 2,4 | |
| | | AB KATKISI | 10.620 | 0 | 5.310 | 0 | % 0,0 | |

(6*) Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.

(7*) Kuruluş tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben ihalesine çıkılabilecek ve harcama yapılabilecektir.

(8*) Pilot uygulama projesine ait fizibilite etüdü Kalkınma Bakanlığına iletildikten sonra proje tutarı revize edilecektir.

(9*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. İçişleri Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip uygulama yapılabilecektir. Proje tutarı fizibilite çalışması sonrasında netleştirilecektir.2015K080060 no'lu proje ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2014F000300 | Korunan Alanlarda Çevre-Cephe-Yol-İskele-Kıyı Düzenlemesi (Turizm Sektörü) | 2014-2017 | 2.163 | 500 | 500 | 71 | % 14,2 | Yenikent (Aksaray) Park Düzenlemesi Projesi tamamlanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir. |
| 2015F000150 | Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-Altyapı-Uygulama (Turizm Sektörü) | 2015-2015 | 23.000 | | 23.000 | 0 | % 0,0 | 19 adet projeye ilişkin protokoller toplam 18.655.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir. |
| 2015K050400 | Su Temini Hizmetleri Projesi (İçme Suyu Sektörü) | 2015-2015 | 4.848 | | 4.848 | 0 | % 0,0 | 4 adet projeye ilişkin protokoller toplam 4.350.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir. |
| 2015K060200 | Korunan Alanlar Atıksu Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon Sektörü) | 2015-2015 | 3.000 | | 3.000 | 0 | % 0,0 | Çamlıhemşin Atıksu Yönetimi Hizmetleri projesi planlanmıştır. Fakat planlama çalışmaları henüz sonuçlanmamış olduğundan proje çalışmalarına ve uygulama aşamasına geçilememiştir. |
| 2015K090030 | Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 355 | | 355 | 0 | % 0,0 | 3 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış ve sözleşmeler toplam 249.452,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir. |
| 2015K090040 | Hali hazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 800 | | 800 | 0 | % 0,0 | 3 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış ve sözleşmeler toplam 431.703,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir. |

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2015K090070 | İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 285 | | 285 | 0 | % 0,0 | 2 adet projeye ilişkin protokoller toplam 135.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir. |
| 2015K090080 | İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 500 | | 500 | 0 | % 0,0 | 6 adet projeye ilişkin protokoller toplam 500.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. |
| 2013K100020 | Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü) | 2013-2016 | 4.831 | 1.970 | 1.700 | 590 | % 34,7 | Türkiye'nin tamamında ihale çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi çalışmaları devam etmektedir. 21 adet sözleşme imzalanmıştır. 1 adet sözleşme imza aşamasındadır. |
| 2011K100190 | Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü) | 2011-2016 | 2.478 | 1.600 | 458 | 34 | % 7,4 | 7 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış ve sözleşmeler imzalanmıştır. |
| 2014K100140 | Mogan Gölü Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Döner Sermaye) (Çevre Sektörü) | 2014-2015 | 860 | 128 | 732 | 585 | % 79,9 | Projeye ilişkin ihale yapılmış ve sözleşme 731.600,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. |
| 11 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 42.260 | 4.070 | 35.446 | 695 | % 2,0 | |
| | | DÖNER SERMAYE | 860 | 128 | 732 | 585 | % 79,9 | |
| | | GENEL TOPLAM | 43.120 | 4.198 | 36.178 | 1.280 | % 3,5 | |

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|----------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2009K050400 | IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü) | 2009-2015 | 3.517 | 3.165 | 352 | 0 | % 0,0 | Proje kapsamında 3 ayrı hizmet alımı sözleşmesi yapılmış olup, sözleşme süreleri 2016 yılı ortasına kadar uzatılmıştır. |
| AB KATKISI | | | 19.930 | 17.937 | 1.993 | 0 | % 0,0 | |
| 2009K080310 | IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (Belediye Hizmetleri Sektörü) | 2009-2016 | 3.491 | 2.275 | 1.100 | 333 | % 30,3 | Proje kapsamında 2 ayrı hizmet alımı sözleşmesi yapılmış olup, sözleşme süreleri 2016 yılı ortasına kadar uzatılmıştır. |
| AB KATKISI | | | 19.773 | 13.253 | 5.868 | 887 | % 15,1 | |
| 2009K100090 | Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü) | 2009-2017 | 8.544 | 2.194 | 1.437 | 421 | % 29,3 | 1 adet Daire Başkanlığının Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Teknik Destek hizmet alımı sözleşmesi sona ermiş olup final ödemesi yapılmamıştır. 1 adet yeni dönem Daire Başkanlığının Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Teknik Destek hizmet alımı şartname çalışması devam etmektedir. Proje kapsamında 19 adet uzman ve 1 adet asistan hizmet alımı bulunmakta olup, hizmet devam etmektedir. 1 adet İletişim Eylem Planı Teknik Destek hizmeti alımı projesi, ihale sürecindedir. Ayrıca 4 adet Çerçeve Sözleşme ihalesi çalışmaları devam etmektedir. |
| AB KATKISI | | | 48.397 | 11.110 | 8.133 | 1.378 | % 16,9 | |
| 3 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 15.552 | 7.634 | 2.889 | 754 | % 26,1 | |
| | | AB KATKISI | 88.100 | 42.300 | 15.994 | 2.265 | % 14,2 | |

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|----------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2015K090820 | İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2015 | 700 | | 700 | 0 | % 0,0 | 2015 yılı 4 İlde (İstanbul,Kırşehir,Erzurum,Zonguldak) Bölgesel eğitimler gerçekleştirilecek olup 13.04.2015 tarihinde yapılan ihale ayaklaşık maliyetin altında teklif verilmesi sebebiyle iptal edilmiş olup yeni ihale çalışmaları devam etmektedir. |
| 1 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 700 | 0 | 700 | 0 | % 0,0 | |

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 22.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 2015K090830 | Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2016 | 24.864 | 4.957 | 13.600 | 4.625 | % 34,0 | |
| | Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2012-2016 | 5.245 | 1.500 | 3.000 | 2.249 | % 75,0 | Hizmet binası yapım işi 16.12.2013 tarihinde KDV dahil 5.244.443,92 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %75' dir. |
| | Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2013-2015 | 3.557 | 1.957 | 1.600 | 915 | % 57,2 | Hizmet binası yapım işi 30.10.2013 tarihinde KDV dahil 3.556.520,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %60' dir. |
| | Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2013-2016 | 6.883 | 500 | 4.000 | 986 | % 24,7 | Hizmet binası yapım işi 27.05.2014 tarihinde KDV dahil 5.027.980 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %33' dür. |
| | Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2013-2016 | 3.516 | 500 | 2.000 | 475 | % 23,8 | Hizmet binası yapım işi 28.05.2014 tarihinde KDV dahil 2.466.200 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %30' dur. |
| | Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2013-2016 | 5.663 | 500 | 3.000 | 0 | % 0,0 | Hizmet binası yapım işi 04.06.2014 tarihinde KDV dahil 4.189.000 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %12' dir. |
| 2014K090100 | Hizmet Binaları İnşaatı-2 (Döner Sermaye Katkısı Var) (Şehirleşme Sektörü) | 2014-2016 | 24.581 | 2.000 | 9.023 | 2.262 | % 25,1 | |
| | Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2014-2015 | 2.923 | 2.000 | 1.923 | 1.325 | % 68,9 | Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde KDV dahil 2.922.860,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %88' dir. |
| | Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2014-2016 | 7.749 | 0 | 250 | 0 | % 0,0 | İhale hazırlıkları tamamlandı, proje maliyetinin arttırılmasına ilişkin talep Kalkınma Bakanlığı'na iletili. |
| | Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2014-2016 | 4.764 | 0 | 850 | 0 | % 0,0 | İhalesi İl Müdürlüğünce 2 defa yapılmış ve iptal edilmiştir. İhale Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Proje maliyetinin arttırılması talebi Kalkınma Bakanlığı'na iletili. |
| | Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Döner Sermaye Katkısı Var) | 2014-2016 | 9.145 | 0 | 6.000 | 937 | % 15,6 | Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde KDV dahil 9.140.280 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %20' dir. |

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 22.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|-------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2015K090810 | Hizmet Binaları İnşaatı-3 (Şehirleşme Sektörü) | 2015-2017 | 25.707 | 0 | 7.100 | 7 | % 0,1 | |
| | Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2015-2017 | 5.293 | | 1.700 | 0 | % 0,0 | İhale hazırlıkları devam ediyor. |
| | Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2015-2017 | 6.298 | | 1.700 | 0 | % 0,0 | Tahsis edilen arsanın zemin etüd sonuçlarına göre zeminde iyileştirme yapılması gerektiği için projenin uygulanmasının ekonomik olmadığı kanaatine varılmıştır. Yeni arsa tahsisi için çalışma yapılmaktadır. |
| | Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2015-2017 | 8.824 | | 2.000 | 0 | % 0,0 | Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde KDV dahil 8.555.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. |
| | Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası | 2015-2017 | 5.292 | | 1.700 | 7 | % 0,4 | İhale hazırlıklarında son aşamaya gelinmiştir. En geç Temmuz ayı içerisinde ihale edilecek. |
| 2015K090800 | Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü) | | | | | | | |
| | Taşıt Alımı | 2015-2015 | 651 | | 651 | 0 | % 0,0 | Taşıt alımına yönelik Bakanlar Kurulu Kararının ihdas edilmesi için Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne; 04.02.2015 tarihli ve 16517702-602.07-685 sayılı yazımız gönderilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı beklenmektedir. |
| | Hizmet Binası Onarımı | 2015-2015 | 6.050 | | 6.050 | 755 | % 12,5 | Hizmet binası onarımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 53 adet ihale talimatı gönderilmiştir. |
| | Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı | 2015-2015 | 3.546 | | 3.546 | 1.718 | % 48,4 | Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 86 adet ihale talimatı gönderilmiştir. |

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 22.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|----------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 2015G000150 | Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü) | 2015-2015 | 5.800 | | 5.800 | 436 | % 7,5 | Lojman binası onarımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 35 adet ihale talimatı gönderilmiştir. |
| 5 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 85.199 | 6.957 | 39.770 | 9.803 | % 24,6 | |
| | | DÖNER SERMAYE | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | % 0,0 | |
| | | GENEL TOPLAM | 91.199 | 6.957 | 45.770 | 9.803 | % 21,4 | |

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

| PROJE NO | PROJE ADI | BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ | REVİZE PROJE TUTARI | 2014 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA | REVİZE 2015 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ | 01.01.2015 30.06.2015 ARASI HARCAMA | Gerçekleşme ORANI | PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA |
|----------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 2015G000150 | Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü) | 2015-2015 | 200 | | 200 | 9 | % 4,5 | Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 62/1 Sincan adresinde bulunan Kamu Konutunun onarımı. |
| 2015K090800 | Muhtelif İşler (SGB-Destek-CSB Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü) | | | | | | | |
| | Hizmet Binası Onarımı | 2015-2015 | 250 | | 250 | 0 | % 0,0 | |
| | Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı | 2015-2015 | 180 | | 180 | 0 | % 0,0 | |
| 2010K091030 | Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü) | | | | | | | |
| | Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (Döner Sermaye) | 2015-2015 | 2.795 | | 2.795 | 0 | % 0,0 | |
| 3 Proje | | 06 ve 07 TOPLAM | 630 | 0 | 630 | 9 | % 1,4 | |
| | | DÖNER SERMAYE | 2.795 | 0 | 2.795 | 0 | % 0,0 | |
| | | GENEL TOPLAM | 3.425 | 0 | 3.425 | 9 | % 0,3 | |

Arz Ederim.

Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkanı
