

# 2017 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 4. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 Dönemi)

Strateji Geliştirme Başkanlığı


10.12.2018

## BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ

### 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2017 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	731.633.000,00	731.630.000,00	722.199.043,49	% 98,7
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	128.503.000,00	128.506.000,00	122.416.860,85	% 95,3
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.958.000,00	104.717.401,45	95.859.112,21	% 91,5
05	CARİ TRANSFERLER	401.010.000,00	596.781.415,60	592.721.525,48	% 99,3
06	SERMAYE GİDERLERİ	292.780.000,00	1.107.993.439,62	765.920.662,34	% 69,1
	Bakanlık Yatırım Programı	273.752.000,00	232.084.486,86	170.970.493,50	% 73,7
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.028.000,00	10.028.000,00	6.599.909,06	% 65,8
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	865.880.952,76	588.350.259,78	% 67,9
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	154.071.000,00	2.753.127.000,00	2.746.645.225,01	% 99,8
	Bakanlık Yatırım Programı	33.105.000,00	36.551.000,00	30.069.283,85	% 82,3
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	120.966.000,00	215.966.000,00	215.965.941,16	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	2.500.610.000,00	2.500.610.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	35.959.000,00	51.474.000,00	34.988.106,00	% 68,0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.823.914.000,00</b>	<b>5.474.229.256,67</b>	<b>5.080.750.535,38</b>	<b>% 92,8</b>


## BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

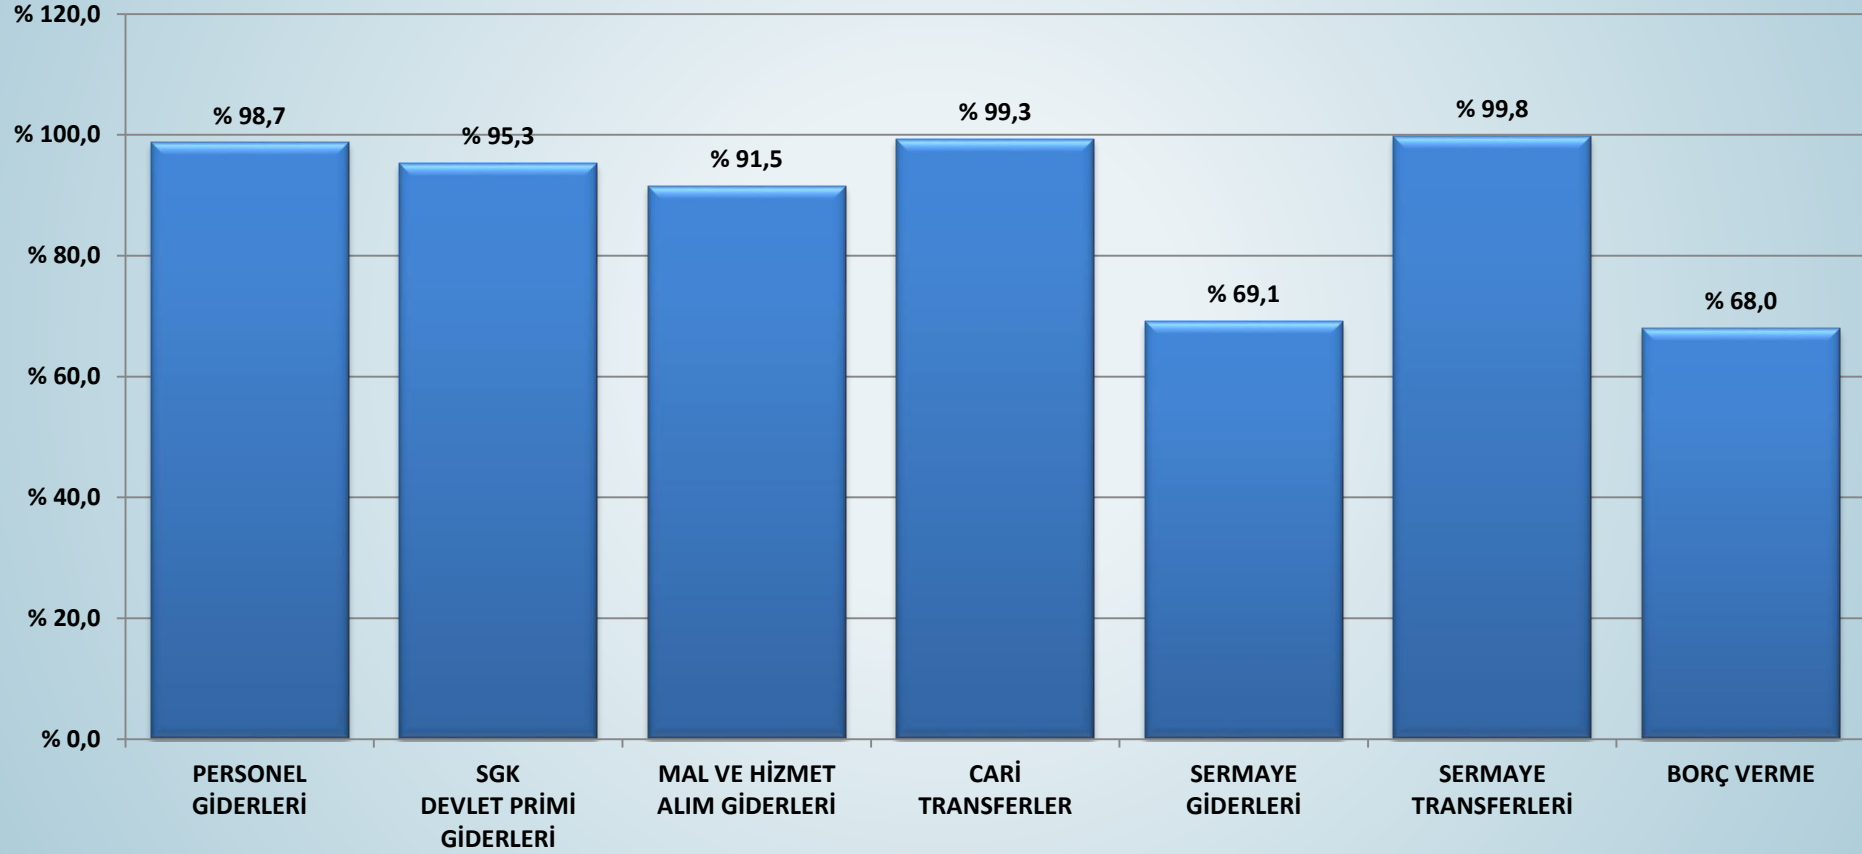

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	31 Aralık 2017		Gerçekleşme ORANI (%)
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	17.795.000,00	7.206.000,00	4.252.964,98	% 59,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	129.967.000,00	11.134.000,00	10.123.751,71	% 90,9
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	7	137.076.000,00	45.381.000,00	41.262.573,16	% 90,9
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	19	890.336.000,00	176.839.000,00	97.665.074,15	% 55,2
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn.Md. (DETAY)	5	15.650.000,00	6.250.000,00	6.179.335,84	% 98,9
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	42.470.000,00	7.604.000,00	3.229.627,37	% 42,5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	14	78.457.000,00	37.492.000,00	27.793.326,47	% 74,1
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	12	104.594.000,00	66.289.000,00	53.308.062,52	% 80,4
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	12.172.000,00	5.192.000,00	5.160.885,60	% 99,4
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	3	204.292.000,00	73.702.000,00	37.974.595,40	% 51,5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	4.118.000,00	4.118.000,00	3.098.689,97	% 75,2
Hukuk Müşavirliği (DETAY)	1	544.000,00	355.000,00	354.996,18	% 100,0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>99</b>	<b>1.637.471.000,00</b>	<b>441.562.000,00</b>	<b>290.403.883,35</b>	<b>% 65,8</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>93</b>	<b>1.472.478.000,00</b>	<b>342.816.000,00</b>	<b>223.454.883,35</b>	<b>% 65,2</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>6</b>	<b>164.993.000,00</b>	<b>98.746.000,00</b>	<b>66.949.000,00</b>	<b>% 67,8</b>

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

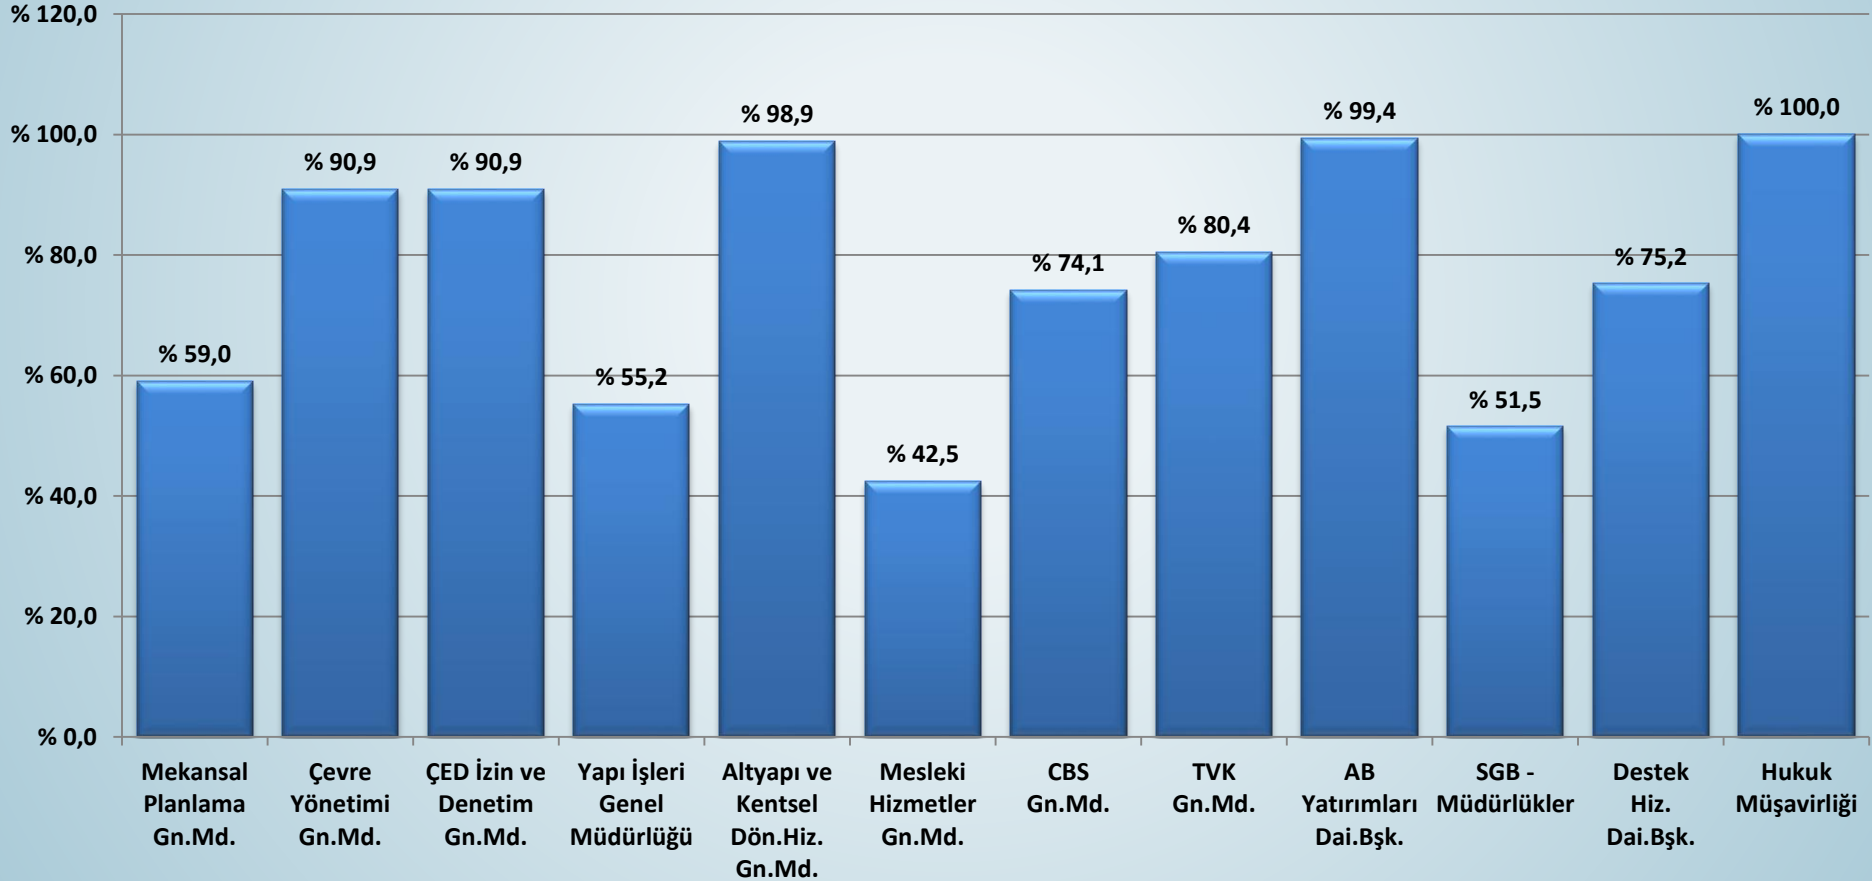


## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	31.12.2017 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	26.878.000,00	24.499.500,00	20.829.273,21	% 85,0
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	202.631.000,00	308.092.415,60	306.692.381,11	% 99,5
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	52.613.000,00	56.502.358,75	51.255.184,50	% 90,7
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	210.882.000,00	251.217.268,55	203.353.185,14	% 80,9
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	347.934.000,00	3.028.846.000,00	3.028.197.763,93	% 100,0
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	20.431.000,00	18.471.000,00	16.264.192,50	% 88,1
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	48.577.000,00	49.996.481,68	40.017.305,97	% 80,0
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	83.821.000,00	43.364.751,76	33.767.418,32	% 77,9
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	8.393.000,00	8.106.000,00	7.671.324,67	% 94,6
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	4.323.000,00	4.724.000,00	4.611.844,94	% 97,6
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.943.000,00	1.913.250,00	1.871.885,29	% 97,8
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4.023.000,00	4.253.000,00	4.113.225,79	% 96,7
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.749.000,00	22.996.250,00	19.529.801,92	% 84,9
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.575.000,00	8.239.000,00	7.895.164,74	% 95,8
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.409.000,00	2.350.650,00	1.328.677,96	% 56,5
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.082.000,00	4.292.000,00	4.250.976,85	% 99,0
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	37.555.000,00	40.380.000,00	39.068.131,16	% 96,8
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	751.000,00	837.800,00	801.068,22	% 95,6
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	25.214.000,00	24.969.350,00	24.532.341,87	% 98,2
İL MÜDÜRLÜKLERİ	721.130.000,00	1.570.178.180,33	1.264.699.387,29	% 80,5
<b>TOPLAM</b>	<b>1.823.914.000,00</b>	<b>5.474.229.256,67</b>	<b>5.080.750.535,38</b>	<b>% 92,8</b>



## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

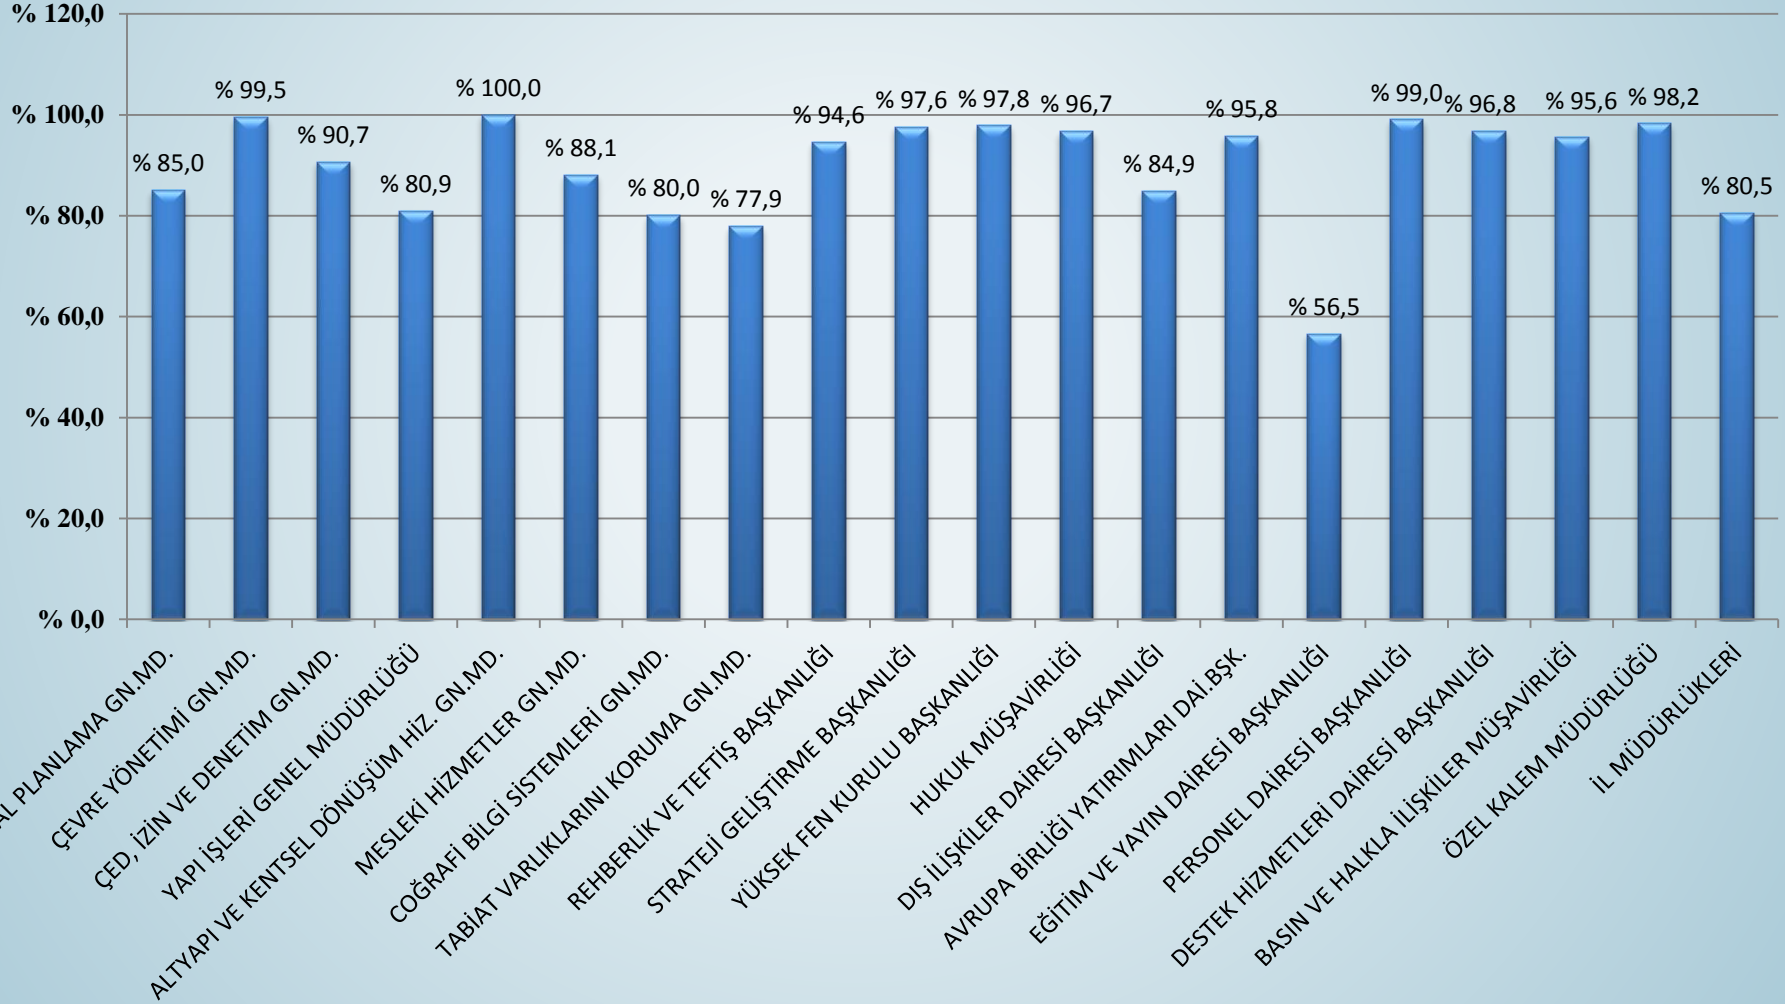

**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	2.000	200	1.200	539	% 44,9	İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında 1 nolu aşama bedeli olarak KDV Dahil 538.965 TL ödeme yapılmıştır. Diğer aşamalar 2018 yılı içerisinde ödenecektir.
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2018	3.860	2.860	170	169	% 99,4	Kilis İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı İşi için, 1 nolu hakediş bedeli olarak KDV Dahil 84.311,00 TL, 2 nolu hakediş bedeli olarak KDV dahil 42.155,50 TL, son hakediş bedeli olarak KDV Dahil 42.155,50 TL olmak üzere toplam 168.622,00 TL ödeme yapılmıştır.
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2017	1.695	1.315	380	0	% 0,0	
2015K090010	Özel Proje Alanları Atatürk Kültür Merkezi Alanı Kentsel Tasarım Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	600	600	0			2017 yılı için tahsis edilen 1.500.000 TL proje ödeneği başka projelere aktarılmış olup, projeye son verilmiştir.
2016K090020	GAP ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.640	64	1.576	1.575	% 99,9	Konya Meram İmar Uygulama Danışmanlık Hizmet alımı işi için 1 nolu hakediş bedeli olarak KDV dahil 100.300 TL, 2 nolu hakediş bedeli olarak KDV Dahil 300.900 TL, 3-4 nolu hakediş bedeli olarak KDV Dahil 601.800 TL (emanet) ödeme yapılmıştır. Karaman Ermenek İmar Uygulama Danışmanlık Hizmet alımı işi için 2 nolu hakediş bedeline karşılık KDV dahil 86.376 TL, 3 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 172.752 TL (emanet) ödeme yapılmıştır. Adıyaman-Gölbaşı İmar Uygulama Hizmet alımı işi için 2 nolu hakediş bedeli olarak KDV Dahil 104.430 TL ve 3 nolu hakediş bedeli olarak KDV Dahil 208.860 TL olmak üzere toplam 1.575.418 TL ödeme yapılmıştır.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		380	0	% 0,0	



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090030	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.000	970	% 97,0	Aydın - Muğla Bütünleşik Kıyı alanları işi için 1 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 206.559,00 TL, 2 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 114.755 TL, 3 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 137.706 TL (emanet) ödenmiştir. Balıkesir Çanakkale Bütünleşik Kıyı alanları işi için 1 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 229.923,00 TL, 2 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 127.735 TL, 3 nolu hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 153.282 TL (emanet) olmak üzere toplam 969.960 TL ödeme yapılmıştır.
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	4.000		2.500	1.000	% 40,0	
	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2017	1.000		1.000	1.000	% 100,0	22 Mayıs 2017 tarihinde KDV dahil 1.000,00 TL'lik Protokol imzalanmış olup, 22 Mayıs'ta projeye başlanılmış, 1 nolu aşama bedeline karşılık KDV Dahil 299.999,99 TL, 2 nolu aşama bedeline karşılık KDV Dahil 150.000 TL, 3 aşama hakediş bedeline karşılık KDV Dahil 300.000 TL ve 4 nolu aşama bedeline karşılık KDV Dahil 249.999,99 TL olmak üzere toplam 999.999,98 TL'lik ödeme gerçekleştirilmiştir.
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2018	1.500		500	0	% 0,0	
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2018	1.500		1.000	0	% 0,0	
<b>8 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>17.795</b>	<b>5.039</b>	<b>7.206</b>	<b>4.253</b>	<b>% 59,0</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K060210	Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2017	2.993	1.693	1.300	1.300	% 100,0	Nihai Raporu Genel Müdürlüğümüze sunulmuş ve incelenmiştir. Proje kapsamında verilmesi gereken eğitimler ile proje kapanış toplantısının henüz yapılamamış olması sebebiyle nihai rapora ilişkin ödeme yapılmamış olup, ödeneğin emanete alınması Yönetim Hizmetleri ve Finansman Dairesine yazı ile bildirilmiştir.
2016K060210	Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	3.500	300	1.770	1.770	% 100,0	Projeye ait II Ara Rapor sonrasında 1.770.000 TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır.Proje kapsamında III. Ara Rapor hazırlık ve arıtma çamuru numune alma çalışmaları devam etmekte olup, bölgesel çalıştayların ilk üçü (İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi) gerçekleştirilmiştir.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	2.500	445	826	826	% 100,0	2017 yılı 4. çeyreğinde 2. Ara Rapor Bakanlığımıza sunulmuş olup ödemeler yapılmıştır. Proje kapsamında havzaya özgü kirleticilerin belirlenmesi amacıyla Nilüfer Çayı Alt Havzası ve Yeşilirmak Havzasında belirlenen istasyonlarda mevsimsel izleme çalışmaları tamamlanmıştır. Havzalarda noktasal kaynakların tespiti ve karakteristiğinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları yapılmakta olup, ÇKS bazlı deşarj limitlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülmekte, alternatif yaklaşımlar denenmektedir.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2018	1.000		150	0	% 0,0	İhale süreci sonlandırılmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	99.000		40.000	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2017 yılı ödeneği Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza aktarılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir harcama yapılamamış olup, PROJENİN 2017 YILI ÖDENEĞİ TOPLAMA DAHİL EDİLMEMİŞTİR.
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	915	472	443	443	% 100,0	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile 30.09.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve ilk ödeme olan 468,400 TL Aralık 2015 te ödenmiştir. Final Raporu'nun onaylanmasını müteakip 468,400 TL Ocak 2017 de ödenmiştir. Proje süresi içerisinde 20 Ocak 2017 tarihinde tamamlanmıştır.
2015K100050	İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2017	3.839	2.494	1.345	1.342	% 99,8	Proje kapanış toplantısı 06 Aralık 2017 tarihinde yapılmıştır. 13.12.2017 tarihinde sonuç raporu yüklenici tarafından idareye teslim edilmiştir. İncelenen sonuç raporunda tespit edilen eksikliklerin için bütününe bozmadığı değerlendirildiğinden sonuç raporu çerçevesinde işin yapılan kısmının protokole uygun tamamlandığı ve kabule hazır olduğu tespit edilmiştir. Ancak bulunan eksikliklerin tamamlanmasına müteakip söz konusu ödeme idare tarafından yapılacaktır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K100040	Denizlerimizin Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2017	600	300	300	298	% 99,3	Proje sözleşmesi Haziran 2016 tarihi itibarıyla imzalanmış olup, başlangıç raporu Ekim 2016 tarihinde teslim edilmiş ve 101.000TL ödeme yapılmıştır. 09 Aralık 2016 tarihinde projenin birinci ara raporu teslim edilmiş olup, 151.000 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu projenin final raporu tarafımıza sunulmuş olup, teknik şartnamede yer alan faaliyetlerden biri olan kapanış toplantısının proje bitiş tarihi olan Aralık ayında tamamlanamaması sebebi ile muayene kabul işlemleri gerçekleştirilmiş ancak ödeme yapılmamıştır. 25 Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek kapanış toplantısının tamamlanmasına müteakip kalan miktarın (302.050 TL) ödemesi yapılacaktır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.500	0	745	548	% 73,6	2017 Kasım ayında başlayan proje kapsamında Medipol Üniversitesi ile protokol imzalanmış ve ilk hakedişi 2017 yılı Aralık ayında yapılmıştır. Proje başlangıç raporu ile ilgili onay işlemleri devam etmektedir.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	0	1.000	1.000	% 100,0	2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi ile 03.02.2017 tarihinde protokol imzalanmış ve proje başlamıştır. Proje Başlangıç Raporu yüklenici tarafından süresi içerisinde teslim edilmiş, İdare tarafından onaylanmıştır. Projeye ilişkin I. Ara Rapor gecikmeli teslim edilmiş olup bu kapsamda ceza kesintisi uygulanarak II. ödeme gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde Başlangıç raporu teslimi için 500.000 TL, I. Ara Rapor için 469.450 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında sektörel kontrol listeleri ve uygulama kılavuzları hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca demir çelik üretimi, demir dışı metal üretimi, tekstil, şeker üretimi, büyük yakma tesisleri, çimento üretimi ve cam üretim tesisleri yerinde ziyaret edilmiş ve üretim prosesleri hakkında bilgi alınmıştır. 2017 yılında 15 Demir-Çelik ve Demir dışı metal üretimi, 8 tekstil, 3 Şeker üretimi, 1 Çimento, 4 Cam üretim tesisi yerinde incelenmiştir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB)	2013-2017	1.008	410	598	498	% 83,3	Proje 2017 yılı Nisan ayında tamamlanmış ve tüm ödemeler gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		9.639	4.337	5.302	4.000	% 75,4	
2014K100080	Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB)	2014-2017	893	357	536	0	% 0,0	Projenin başlangıç tarihi 15 Şubat 2016 olup, 15 Şubat 2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Hazine Müsteşarlığından iletilen resmi yazıya istinaden yatırım programında belirlenmiş olan 100.000 avro karşılığı 344.690 TL 15.09.2015 tarihinde ulusal fon hesabına aktarılmıştır. Proje kapsamındaki tüm eğitim ve çalıştay faaliyetleri tamamlanmış olup, 8 Şubat 2018 tarihi itibarıyla kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Teknik şartnamede yer alan ve proje kapsamında üretilen raporların onaylanma süreci devam etmektedir. 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında ödemeye ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından talep gelmemiştir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		8.033	4.016	4.017	0	% 0,0	
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB)	2014-2017	893	357	536	520	% 97,0	Bahse konu proje 8 Mart 2017 tarihinde Point Otel (Ankara) düzenlenen kapanış etkinliği ile sonlandırılmıştır. Bununla birlikte, 8 Ağustos 2017 tarihli ve 10133 sayılı yazımızla projeye ait final raporu da dahil olmak üzere, projeye ait revize edilen raporların uygun bulunduğu Merkezi İhale ve Finans Birimine (MİFB) bildirilmiştir. Ayrıca, MİFB’ince talep edilen söz konusu projeye ait fatura örnekleri ile fatura onay kontrol listesi doldurularak imzalanmış ve MİFB’ne iletilmiştir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		8.033	4.016	4.017	3.900	% 97,1	
2015K100150	Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması (AB)	2015-2017	420	142	278	275	% 98,9	26 Ekim 2017 tarihinde Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, projenin tüm aktiviteleri tamamlanmıştır.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		3.213	1.428	1.785	1.755	% 98,3	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100060	Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB)	2015-2019	0	0	0			22.06.2017 tarihinde YATIRIM PROGRAMINDAN ÇIKARTILDI. Bakanlığımız Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığınca koordine edilen ve IPA-II Döneminde "Çevre ve İklim Sektörel Operasyonel Programı" kapsamında; projenin ön duyurusunun 09 Ocak 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Kısaca CITYAIR olarak tanımlanan projenin 2018 yılının 2. çeyreğinde ihalesinin başlaması planlanmakta olup projenin 2018 3. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		0	0	0			
2017K100040	Türkiye'de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)	2017-2019	4.106		1.307	1.304	% 99,8	
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		36.948		12.316	12.300	% 99,9	
15 Proje	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	714		238	237	% 99,6	Proje 2017 yılında başlatılmış olup, başlangıç raporu onaylanmış ve açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
			6.426		2.142	2.135	% 99,7	
	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	714		238	237	% 99,6	Proje 2017 yılında başlatılmış olup, başlangıç raporu onaylanmış ve açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
			6.426		2.142	2.135	% 99,7	
	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	714		181	180	% 99,4	Proje 14 Ağustos 2017'de başlamış olup projenin açılış toplantısı 27 Eylül 2017 tarihinde yapılmıştır. Proje kapsamında web sayfası, strateji dokümanı hazırlanmış ve çeşitli eğitimler gerçekleştirilmiştir.
			6.426		2.142	2.130	% 99,4	
	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	1.964		650	650	% 100,0	Hibe projeleri 15 Eylül 2017'de başlamış olup 38 hibe projesi için ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir
			17.670		5.890	5.890	% 100,0	
<b>06 ve 07 TOPLAM</b>			<b>129.967</b>	<b>6.970</b>	<b>11.134</b>	<b>10.124</b>	<b>% 90,9</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>65.866</b>	<b>13.797</b>	<b>27.437</b>	<b>21.955</b>	<b>% 80,0</b>	

Not: 2017K080040 numaralı "Katı Atık Programı" ptojesi Kalkınma Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınmış olmasına rağmen 40 Milyon TL tutarındaki 2017 yılı ödeneği Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza aktarılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir harcama yapılamamış olup, PROJENİN 2017 YILI ÖDENEĞİ TOPLAMA DAHİL EDİLMEMİŞTİR.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2017	9.394	7.673	1.721	0	% 0,0	Dişarbakır Ön Değerlendirme Projesi iptal edilmiştir. Söz konusu ödeneğin kullanılmayacağı bilgisi projeyi yürüten ilgili Daire Başkanlığı tarafından 04/07/2017 tarih ve E-10326 sayı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmiştir.
2017K100010	Atıkların Tehlikelilik Vasıflarının Belirlenmesi Projesi (Döner Sermaye-3.000.000 TL ödenek eklendi) (Çevre Sektörü)	2017-2017	10.421		10.421	9.367	% 89,9	Muayene Kabul işlemleri bitmiş olup, cihazların laboratuvara kurulumu yapılmıştır.
2017K10110	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binaları Yapımı Kesin Hesap Farkı	2017-2017	370	0	370	301	% 81,4	Proje Başarı ile tamamlanmıştır.
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu	2015-2017	3.000	1.000	2.000	2.000	% 100,0	Proje kapsamında işin %35'lik kısmı ve 3. hakediş miktarı olan 593.220 TL (KDV Hariç) muayene kabul işlemleri devam ettiği için emanete alınmıştır.



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	51.275	12.108	8.456	7.290	% 86,2	Gn.Md. Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili; Sarf-yedek malzame alımı gerçekleştirilmiş. Bakım-Onarım ve Kalibrasyon işi kapsamında yüklenicilere Mart-Aralık 2017 aylarına ait hakediş ile 2016 yılı son hakediş ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan,Marmara Temiz hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilgili; 06.1 Kaleminden Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarında Bulunan Cihaz ve Ekipmanlarında ve Laboratuvarıda kullanılmak üzere Mamul Mal alımını ve Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne İşletilen 54 Adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarında Bulunan Cihaz ve Ekipmanların, 2017-2019 Yılları arası(3 Yıl) Bakım-Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı işine ait 2017 Yılı 06.1 + 06.2 Toplam 2.844.800,44.- TL (KDV Dahil) ödeme yapılmıştır.
	Döner Sermaye	2015-2019	60.693	14.975	21.045	20.942	% 99,5	Gn.Md. Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili; Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı illerde 46 adet, Gaziantep'te 5 adet olmak üzere toplam 51 adet istasyon kurulumu başarıyla tamamlanmıştır. Diğer taraftan,Marmara Temiz hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilgili; Marmara Bölgesinde Bulunan İl/İlçelere 7 Adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulumu işine ait ihale sonuçlandırılmış 28.03.2017 tarihinde imzalanan sözleşme gereği firma işe başlatılarak Kasım 2017 sonu itibari ile 2.874.480,00.-TL (KDV Dahil) ödemesi yapılmıştır

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K100080	Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2016-2018	728	0	727	721	% 99,2	Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcısı olduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi kapsamında hizmet sözleşmesi 17.01.2017 tarihinde imzalanmış olup, 1.099.000 € bütçeli sözleşme 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Sözleşmenin kapanış bedeli 1.055.949,1 € olmuştur
AB KATKISI			3.338	0	3.337	3.250	% 97,4	
2017K100050	Türkiye'de E-PRTR Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.195		641	641	% 100,0	"Türkiye'de E-PRTR Konusunda Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi" 25.05.2017 tarihinde başlamıştır. Projenin 2 senede tamamlanması planlanmaktadır. Projenin Teknik Yardım bileşeninde 2017 yılı sonu itibarıyla proje çalışma takviminde planlanmış tüm aktiviteler gerçekleştirilmiş olup herhangi bir gecikme yaşanmamıştır. Projenin diğer bileşeni olan Destek Bileşeninde ise planlanmış olan tüm mal alımları gerçekleştirilmiştir. (01.01.2017-31.12.2019 arası devlet katkısı 140391Euro olarak ödenmiştir.)
AB KATKISI			9.822		5.924	5.924	% 100,0	
<b>7 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>73.383</b>	<b>20.781</b>	<b>21.336</b>	<b>18.078</b>	<b>% 84,7</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>63.693</b>	<b>14.975</b>	<b>24.045</b>	<b>23.184</b>	<b>% 96,4</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>137.076</b>	<b>35.756</b>	<b>45.381</b>	<b>41.262</b>	<b>% 90,9</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>13.160</b>	<b>0</b>	<b>9.261</b>	<b>9.174</b>	<b>% 99,1</b>	

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Şehirleşme Sektörü)-(Döner Sermaye)	2017-2017	11.000		11.000	8.123	% 73,8	Kesin Kabul işlemleri tamamlanmış olup,Kesin Hesap çalışmaları devam etmektedir.
2015K090010	Özel Proje Alanları Diyarbakır Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İnşaatı Projesi (Şehirleşme Sektörü)-(Döner Sermaye)	2017-2017	28.466		28.466	25.954	% 91,2	Geçici kabul çalışmaları devam ediyor.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	2.720	1.370	1.350	1.083	% 80,2	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları değerlendirme analizleri kitapçığı hazırlanmıştır. ADD-On yazılımı ve yazılım kurulum son haline getirilmiştir. Yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin gereksinim raporu ve yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin sistemin kontrol ve test raporu hazırlanmıştır. "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları" sözleşme gereği tamamlanmış, kabul işlemi yapılmıştır. Konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi (genelge vb...) ve yayımlanması için hazırlıklar ve devam etmektedir. CADD standartlarının yaygınlaştırılması ve standardın kullanıldığı örnek projelerin elde edilmesi amacıyla, 2018 yılında, bu standardın kullanıldığı projelerin elde edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	3.500	1.512	1.988	780	% 39,2	Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme ve Geliştirilmesi İşi ihalesi 03.04.2017 tarihinde , 175.000,00 TL+ KDV bedelli olarak yapılmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425.000,00 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanarak, pilot illerde uygulanması yapılmıştır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	1.100	600	500	314	% 62,8	2017-2018 yılı proje sürecinde vizyon projeler başlığı altında e-levha, e-hakediş ve ve yaklaşık maliyet otomasyon işlerine çıkacaktır.Planlanmış ve planlanmamış genel müdürlüğümüze ait otomasyon + yazılım, donanım ihtiyaçları proje kapsamında yürütülmektedir.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü)	2015-2017	3.000	2.000	1.000	960	% 96,0	İhale tamamlanmış ve Ekipmanlar teslim alınmıştır.
2017K140090	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Alımı (Afetler Sektörü)	2017-2017	1.760		1.760	0	% 0,0	Maliye Bakanlığından T22 Araçları için , özel izin alınmış olup,ihale aşamasındadır.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2019	6.700	3.000	1.500	238	% 15,9	İskan Konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır.Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalmden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca imar planı; parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2018	25.622	11.966	1.963	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2018	5.649	3.513	1.961	0	% 0,0	1. Kısım 30 konut inşaatları tamamlandı. Yaklaşık 80 konutun güçlendirme ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca sorunun çözümüne yönelik yöre milletvekilleri tarafından kanun çalışması yürütüldüğünden sonucu takip edilmektedir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2018	11.135	3.389	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor. Bu nedenle yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2018	8.838	5.064	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor. Bu nedenle yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2019	159.281	0	4	0	% 0,0	
	Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı	2009-2019	63.361	0	2	0	% 0,0	Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2019	95.920	0	2	0	% 0,0	Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2019	20.024	2.533	6.056	5.924	% 97,8	Kütahya-Kureysler Köyü, Erzincan-Üzümlü Ahıska Türkleri İskan Konutları Doğalgaz Dönüşümü ve Erzurum-Taşagül köylerinin altyapıları için kullanılmaktadır. Ödenek harcanmıştır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	5.400	1.800	1.500	446	% 29,7	2017 Yılı'nın ilk yarısında , Diyarbakır İli Sur İlçesindeki Yeni Yapıların Proje İş'i'ne öncelik tanındığından bu projede yılın ilk altı ayında hedeflenen ilerleme sağlanamamıştır. Gereken ödeneğin teminine müteakip, 2017 Yılı itibarıyla 13 adet İlde (Erzincan, Bayburt, Artvin, Ardahan, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Batman, Gaziantep, K.Maraş, Malatya, Adıyaman) gerçekleştirme sağlanmış, bunlardan başka Erzincan'da yüksek yoğunluklu yöresel konut projesi de tamamlanmıştır. 13 il için de (Adana, İçel, Hatay, Osmaniye, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkâri, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli) 2018 Yılında örnek kırsal konut projeleri elde etme çalışmalarını devam edecektir. 2017 yılı itibarıyla toplamda 42 ilde çalışmalar yapılmış olup, toplamda 234 adet yöresel koşullara uygun çözümleri içeren, yöresel doku ve malzemelerin günümüz yöntem ve teknolojisi ile kullanıldığı, yöresel doku ve mimari kimliklerin korunduğu, yöresel malzemenin kullanıldığı, güvenli kırsal yapı projeleri ile 23 adet köy konağı projesi elde edilmiştir. 2017 yılından itibaren yüksek yoğunluklu örnek yöresel konut projeleri elde edilmeye başlanmış, önümüzdeki yıllarda bu talebe uygun yeni örnek projeler elde edilecektir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	3.553	1.826	500	25	% 5,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	189.686	108.143	2.000	1.480	% 74,0	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2016	3.718	3.718	0	0		İş bitmiştir.
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2018	177.098	104.425	2	0	% 0,0	Üst yapı işi tamamlandı. Tarım arazisi ıslah işine başlandı. 1. etap ihale kapsamında 41.370.000.-TL ödenek harcanmış olup, bütçesi DSİ'den karşılandığı için gerçekleşmemizde görünmemektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2019	8.870		1.998	1.480	% 74,1	İş devam etmektedir.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	3.367	1.000	550	131	% 23,8	4 İlde 65 il müdürlüğümüz personeline yönelik planlanan bölgesel eğitimler tamamlanmıştır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2019	125.801	0	40.000	8.271	% 20,7	Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Orman vasfını kaybeden alanlardan seçilen yeni yerleşim yerine ait alt yapı ve üst yapı yapım ihalesi işinde 24/03/2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Ancak sahada bulunan bazı fidanların Orman Genel Müdürlüğüne başka bir alana nakledilmesi işlemi geciktirdiğinden inşaat işlerine eylül ayında hız verilmiştir. Bu nedenle ödenek harcanamamıştır. Harcanamayan ödenek dönüşüm hesabına aktarılmıştır.



## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	135.690	109.430	16.905	10.508	% 62,2	İş devam etmektedir.
	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (06.5-Ödeneği)		70.048	12.500	25.228	8.949	% 35,5	İş devam etmektedir. Bu kapsamda Samsun Vezirköprü Susuz Köyü nakli ve Kahramanmaraş Göksun Gücüksü Köyü nakli konut ve alt yapı işleri devam etmektedir. Karaman Merkez Güldere Köyü nakil işi ihalesinin yapılabilmesi, aralık ayında gerçekleştiğinden ödenek sadece ihale sürecinde kullanılmıştır.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	5.532	2.800	54	0	% 0,0	Vatandaşlardan kullanıma ilişkin talep gelmediğinden harcanamamıştır.
2011K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2020	88.086	2.000	34.515	24.480	% 70,9	İş devam etmektedir.
<b>19 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>621.562</b>	<b>148.250</b>	<b>85.899</b>	<b>28.601</b>	<b>% 33,3</b>	
		<b>08 TOPLAM</b>	<b>229.308</b>	<b>114.230</b>	<b>51.474</b>	<b>34.988</b>	<b>% 68,0</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>39.466</b>	<b>0</b>	<b>39.466</b>	<b>34.077</b>	<b>% 86,3</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>890.336</b>	<b>262.480</b>	<b>176.839</b>	<b>97.666</b>	<b>% 55,2</b>	

(\*\*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerinin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	6.500	650	3.050	3.050	% 100,0	Bu proje kapsamında, 07.03.2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ile bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde, 30.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, protokolün ilk üç aylık süreci başlamıştır. Bu süreçte, yüklenici firma, yeni bir yerleşim biriminin Bakanlığımızca daha evvelden hazırlanmış olan Süperkent Mahalle Standartlarına uygunluğunu sağlayacak teknolojilerin belirlenmesi işini yapacaktır. Yüklenici firma, 16.06.2017 tarihinde söz konusu iş kapsamında belirledikleri teknolojilere ilişkin olarak ilk raporlarını teslim etmiş olup, Bakanlığımızca uygulanması uygun bulunan teknolojiler belirlenmiş ve bu teknolojilerin pilot alanda uygulanmasına yönelik daha detaylı analizlerin ve uygulama projelerinin çizilmesi safhasına geçilmiştir. Bu kapsamda pilot uygulama alanına ilişkin yol kesitleri, içme suyu ve yağmur suyu hasadı sistemi projeleri ile tarım-otopark kulelerine, elektrik orta ve düşük gerilim projelerinin yapılması, ısı dağıtım şebekesinin ön projelerinin hazırlanması ve akıllı kent sistemlerinin geliştirilmesi iş kalemlerine ilişkin tutarın ödemesi yapılmıştır. Projenin, Protokol kapsamında 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmekte olup, 2018 yatırım yılı içerisinde 3.450.000,00 TL'lik ödeme yapılması planlanmaktadır.
2015K090050	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.500	2.450	1.050	1.050	% 100,0	Proje 09/01/2017 tarihinde tamamlanarak, 27/02/2017 tarihinde son hakediş ödemesi yapılarak proje tamamlanmıştır.
2017K090110	Plan Tadilatlarında ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kentsel Altyapı Etki Analizi Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	750		750	708	% 94,4	Proje kapsamında 05/05/2017 tarihinde Bakanlığımız ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 230 gün süreli 600.000 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden hizmet alım protokolü imzlanmıştır. Proje 06/12/2017 tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında 600.000TL (KDV hariç) ödeme yapılmıştır.

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090120	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.200	1.171	% 97,6	Projenin 1. Etapı kapsamında riskli alan ilan edilen Aydın/Ilıcabaşı, Ankara/Kahramankazan, İstanbul/Esenler, İstanbul/Gaziosmanpaşa, Mardin/Nusaybin, Şırnak/Cizre bölgelerinde anket ve derinlemesine görüşme yapılması işi için 22.03.2017 tarihinde, ihale gerçekleştirilmiştir. 106.600,00 TL+KDV bedel ile ihale uhdesinde kalan ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Limited Şirketi saha çalışmalarını tamamlayarak teslim etmiş, çalışmanın hakkeşi yapılmıştır. Sahaya inilerek 3757 kişi üzerinde anket çalışması yapılmış, Mardin/Nusaybin ve Şırnak/Cizre ilçeleri için ilçede bulunan kanaat önderleri ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş olup incelemelerin raporları teslim alınmıştır. 2. Etap olarak ise; Politika-plan-proje belirlemek için "Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli ve Rehberi"nin üretilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm literatür taraması, Bakanlık kentsel dönüşüm verilerinin incelenmesi, mevcut Bakanlık araştırmalarının değerlendirilmesi, ön bulgu raporlarının hazırlanması ve bu minvalde gelişim toplantılarının hazırlanması aşaması devam etmektedir.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2018	2.900	2.600	200	200	% 100,0	Bu proje kapsamında yazılım tasarımına ilişkin esasların raporlanması, yazılımın oluşturulmasında kullanılacak metodoloji ve adımlar, iş akış planı olarak sunulması, Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda belirtilen hesap kuralları ve risk değerlendirme yöntemi ile uyumlu bir yapısal analiz programının oluşturulması, yazılıma yönelik algoritma oluşturulması, gelişmelerin raporlanması, bina veri girişinin kolaylıkla yapılabileceği, her kat için röleve, yapısal elemanların kesitleri, donatıları ve malzeme dayanım bilgilerinin girileceği ve üç boyutlu perspektif görsellerin sunulduğu arayüz programının oluşturulması, yazılıma yönelik dokümantasyon hazırlanması, A.R.A.A.D. ile uyumlu veri tabanı oluşturulması işleri tamamlanmıştır. Üniversite tarafından İl Müdürlükleri personeline programın kullanımına yönelik eğitim düzenlenmiş olup, 5. gelişme raporu ile programın kullanımına ve eğitimine yönelik yazılı doküman ve eğitim videoları hazırlanarak tarafımıza sunulmuştur. İş paketi 5 kapsamındaki iş ve işlemlere devam edilmektedir.
<b>5 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>15.650</b>	<b>5.700</b>	<b>6.250</b>	<b>6.179</b>	<b>% 98,9</b>	

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015D000020	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü)	2015-2017	1.369	1.190	179	131	% 73,2	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi 2017 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanmıştır.
AB KATKISI			10.710	9.996	714	530	% 74,2	
2012D100020	Yeşil Bina ve Binalarda Enerji Performansı Yazılımları (Enerji Sektörü)	2012-2017	4.033	3.278	755	500	% 66,2	<p>* Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen dört etaplı "Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması İşi"nin II. etabı 2017 yılının Haziran ayı içinde tamamlanmıştır. II. etap için ödeme yapılmıştır. III. etap 2017 yılının Eylül ayı içinde, son etap olan IV etap ise Aralık ayında tamamlanmış olup 04.12.2017 tarihinde projenin kabulü yapılmıştır. Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımı (YeS-TR) Teknik Şartname çalışmalarına başlanılmıştır.</p> <p>* 6 ay süreli Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-Tr) Projesi 2017 Yılı Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşine ait sözleşme 02/03/2017 tarihinde iki taksitte ödenecek 50.000 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. Bu iş kapsamında 50.000 TL KDV hariç ödeme yapılmıştır</p>

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2017	2.620	2.400	220	60	% 27,3	<p>* 11-12/01/2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına katılım sağlandı.</p> <p>* 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde İzmir Yaşar Üniversitesi gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Günleri Etkinliğine katılım sağlandı.</p> <p>* 20- 21 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılan Yapı Denetimi Uygulamaları Eğitimine katılım sağlandı.</p> <p>* 22-25 Mart 2017 tarihinde düzenlenen 3. Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri CNR EXPO Fuarı ile 23-26 Mart 2017 tarihinde düzenlenen 15. Uluslararası Asansör TÜYAP İstanbul Fuarına katılım sağlandı.</p> <p>* 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 2. Etap Raporu Değerlendirme Toplantısına katılım sağlandı.</p> <p>* 19-21 Nisan 2017 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen 13. Ulusal Tesistat Mühendisliği Kongresi ve Teskon-Sodex Fuarına katılım sağlandı.</p> <p>* Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında 09-12 Mayıs 2017 tarihinde Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılım sağlandı.</p> <p>* 11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Yangın Güvenliği ve İtfaiye - Belediye Hizmet Araçları Fuarı ve panel, seminerine katılım sağlandı.</p> <p>* Bina Verimliliği Çalışmalarının İvmelendirilmesi Projesi (BEA) kapsamında 9 Haziran 2017 tarihinde Eskişehir İlinde gerçekleştirilen seminere katılım sağlandı.</p> <p>* 11-14/09/2017 tarihleri ve 25-28/09/2017 tarihleri arasında düzenlenen "Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Eğitimi"ne katılım sağlanmıştır.</p> <p>* 26-30/11/2017 tarihleri arasında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında Almanya'ya düzenlenen teknik geziye katılım sağlandı.</p>
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2017	844	574	270	100	% 37,0	<p>Proje kapsamında hizmet alım işinin sözleşmesi yapılmış olup sözleşme ve şartname hükümlerine göre 2017 yılı bakım onarım güncelleme, iyileştirme ve destek çalışmalarının kabulü yapılmıştır.</p>

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	12.594	12.094	500	182	% 36,4	Mart 2017 tarihinde düzenlenen, PGD Elemanları İleri seviye eğitimi kapsamında organizasyon ve yolluk ödemeleri gerçekleştirilmiş olup, buna ilişkin tahmini harcama miktarı belirlenmiştir. Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmıştır. Ayrıca YMDS yazılım 1 , 2 ve 3 nolu hakediş ödemesi yapılmıştır.
2015K010070	Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	1.250	750	500	130	% 26,0	Komisyon marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 03/07/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, 16-18/05/2017 tarihlerinde Ankara ili, Haymana ilçesinde taslak mevzuat çalışmasına ilişkin görüşlerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, TOBB, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve bazı dernekler ile İl müdürlüklerine yönelik Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
2016K010080	Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Bakım ve İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	600	250	350	295	% 84,3	23.12.2016 tarihinde Doğru Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşmeye bağlanan proje kapsamında 01.03.2017 tarihli ilk hak edişle 38.556,00-TL (KDV Hariç), 01.06.2017 tarihli 2. hak ediş ile 52.164,00 TL , 3. Hak ediş 52.164,00 toplamda , 4.hak ediş 60.102,00 TL, 202.986,00 TL toplamda ödenmiştir.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	4.270	2.200	1.000	774	% 77,4	13.12.2016 tarihli sözleşme ile (2 adet Optik Emisyon Spektrometre Cihazı ile Numune Hazırlama Ekipmanları Hatay ve Karabük İl Müdürlüğü laboratuvarlarımıza alınmış ve cihaz teslimleri yapılmıştır. -14.03.2017 tarihli sözleşme ile (KDV hariç 42.800 T Afyon ve Karaman İl müdürlüklerimize 2 adet 200 tonluk Beton ve Karot Presi alımı gerçekleştirilmiştir. - 20.11.2017 tarihinde (KDV hariç 57.350TL) Laboratuvarımıza İklimlendirme Odası için cihaz alımı yapılmıştır.
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.900	1.277	1.000	3	% 0,3	Bilecik ve Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Kurs Bitirme Belgesi alanlara Kişisel Koruyucu Malzeme Temin Edilmesi kapsamında 6.700,00-TL ödenek gönderilmiştir.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.800	2.100	1.500	137	% 9,1	2017 yılı içerisinde "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Uygulama Kılavuzu" kamu kurumlarına, ilgili sivil toplum kuruluşlarına, ilgili meslek odalarına ve üniversitelere dağıtılmıştır. 'Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik' tamamlanmış olup 18.10.2017 tarih ve 30214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. "Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu" hazırlanarak ilgili kamu kurumlarına (tüm belediyeler, il özel idareleri ve Bakanlığımız taşra teşkilatına) dağıtımı yapılmıştır.
2015K010100	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	1.750	550	5	0	% 0,0	Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi ile, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 58'inci maddesinin 8'inci fıkrasında hükme bağlandığı üzere, fenni mesullerin inşaat alanı sınırlamalarına ilişkin m <sup>2</sup> , yapı yeri ile fenni mesulün işyeri arasındaki mesafe ile fenni mesullerin denetime ilişkin iş ve işlemlerinin internet ortamında izlenmesi ve bu şekilde bürokrasinin azaltılması ve sayısal ortamda belge üretilmesi hedeflenmektedir.
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	450	150	200	108	% 54,0	Brüksel-Belçika'da 17.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen 12. Yapı Daimi Komitesine katılım masrafları bu projeden karşılanmıştır.03-06 Haziran 2017 tarihinde Fizik Mühendisleri Odası'nda 10 personelin katılımı ile Mühendislik Akustik Eğitimi gerçekleştirilmiştir. görevlendirilen onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme kuruluşu, Avrupa teknik değerlendirme kuruluşu ve ulusal teknik onay kuruluşlarının şikayet üzerine denetimler gerçekleştirilen personele yolluk ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2010K010110 nolu PGD Hizm. Art. Projesinde 2017 yılı için Donanım karakteristiği olmadığından 20 adet mobil tablet ve yazıcı alımı, bu projeden karşılanmıştır.



**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	990	330	125	6	% 4,8	Projede Muayene ve Önkabul işlemleri tamamlanmıştır.
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	1.000	0	500	306	% 61,2	Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile 18/01/2017 tarihinde protokol imzalanmıştır.Protokol üç aşamadan ibaret olup, literatür taraması ve analizi içerikli ilk aşama tamamlanmıştır. Üniversitenin ikinci aşama için (uygulama rehberi hazırlanması) sunduğu rapor Protokol kapsamında kurulan Teknik Kabul Komisyonunca yeterli bulunmamıştır. Projenin üçüncü aşaması olan pilot tasarım projeleri hazırlanması işinde proje alanına ilişkin karşılıklı mutabakat sağlanamamıştır. Açıklanan nedenlerle,Üniversite ile yapılan Protokol 20.11.2017 tarihinde feshedilmiştir.
2016K090050	Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000	500	500	498	% 99,6	Proje için, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile 24.01.2017 tarihinde protokol imza edilmiştir. Protokol kapsamındaki işler Teknik Kabul Komisyonunca uygun bulunmuş, 13/11/2017 tarihinde protokol tamamlanmıştır.
<b>15 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>42.470</b>	<b>27.643</b>	<b>7.604</b>	<b>3.230</b>	<b>% 42,5</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>10.710</b>	<b>9.996</b>	<b>714</b>	<b>530</b>	<b>% 74,2</b>	

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090440	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.200	2.700	500	485	% 97,0	Proje kapsamında planlanan 5 adet iş yapılmıştır.
2015K090500	e-Plan Otomasyonu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	4.245	3.300	945	944	% 99,9	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır.
2016K090420	Halihazır Harita Üretimine Yönelik 1/1000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	3.000	1.500	1.500	1.500	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 10 adet iş yapılmıştır.
2016K090430	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.155	700	455	120	% 26,4	Proje kapsamında planlanan 3 adet iş yapılmıştır.
2016K090440	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	2.600	2.000	600	134	% 22,3	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır.
2015K090410	Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	500	2.450	1.505	% 61,4	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	500	2.450	0	% 0,0	Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (4*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	5.000	0	3.000	0	% 0,0	Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.
2017K090360	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000		15.300	14.622	% 95,6	Proje kapsamında planlanan 31 adet iş yapılmıştır.
2017K090370	Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi ve Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000		2.500	2.500	% 100,0	Proje kapsamında planlanan 3 adet iş yapılmıştır.
2017K090380	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000		3.300	3.046	% 92,3	Proje kapsamında planlanan 2 adet iş yapılmıştır.
2017K090390	Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının İyileştirilmesi Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	6.000		4.000	2.531	% 63,3	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu	2015-2017	1.000	510	490	406	% 82,9	Proje kapsamında planlanan 1 adet iş yapılmıştır.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)		1.257	502	2	0	% 0,0	Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.
AB KATKISI			11.297	4518	2	0	% 0,0	
<b>14 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>78.457</b>	<b>12.212</b>	<b>37.492</b>	<b>27.793</b>	<b>% 74,1</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>11.297</b>	<b>4.518</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

(4\*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. Fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip pilot uygulama yapılabilecektir.

(6\*) Yeni proje formu hazırlanacaktır. Proje formu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017F000110	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi (Turizm Sektörü)	2017-2017	19.500		19.500	13.932	% 71,4	
	Köyceğiz Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	2.000		2.000	1.988	% 99,4	Köyceğiz Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Köyceğiz Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır. Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	Beyazırın İnönü Vadisi Peyzaj Projesi Yapımı	2017-2017	1.325		1.325	0	% 0,0	Beyazırın Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Ancak Beyazırın Belediye Başkanlığının 04/10/2017 tarih ve 4039 sayılı yazısında kamulaştırma sorununun çözülmemesi nedeniyle protokol konusu işin yapılamayacağı bildirilmiştir.
	Uzungöl Çevre Düzenleme Projesi (DOKAP)	2017-2017	2.000		2.000	2.000	% 100,0	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır. Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	Pamukkale Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	3.000		3.000	2.529	% 84,3	Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır. Pamukkale Çevre Düzenleme Projesi 597.243,50 TL tutarlı 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır. Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	Yerköprü Şelalesi Peyzaj Projesi Yapımı (KOP)	2017-2017	5.000		5.000	2.762	% 55,2	Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır. Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	İnsuyu Mağarası Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	1.000		1.000	978	% 97,8	Burdur İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birlik Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	Ürgüp Dağıstanlı Sokak Düzenleme Projesi (KOP)	2017-2017	1.675		1.675	1.675	% 100,0	Ürgüp (Nevşehir) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Ürgüp Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır. Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
	Darende Tarihi Zengibar Kalesi ve Tohma Kanyonu Yürüyüş Yolu Projesi (DAP)	2017-2017	1.500		1.500	0	% 0,0	Darende Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci, Darende Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
	Kaş Andifli Mahallesi Çukurbağ Yarımadası Anayolunun Asfalt Yapım İşİ	2017-2017	2.000		2.000	2.000	% 100,0	Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000300	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi Projesi (Turizm Sektörü)	2014-2017	1.663	1.208	455	0	% 0,0	Mersin Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi Kamera ile İzleme Projesi ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP) (Turizm Sektörü)	2017-2019	6.000		2.900	2.900	% 100,0	Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci,Sultanhanı Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır.Yılsonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2017K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçmesuyu Sektörü)	2017-2017	3.100		3.100	3.100	% 100,0	Genel Müdürlüğümüz ile Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Projesi için Eşmekaya Belediye Başkanlığı arasında, Selime (Aksaray) İçmesuyu Projesi için Selime Belediye Başkanlığı arasında, Çamlıhemşin (Rize) İlçesi Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Hattı Projesi için Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Her üç projede sözleşme imzalanmış olup işler devam etmektedir. Yılsonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2016K090060	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	2.000	825	675	150	% 22,2	Proje kapsamında 10 farklı iş yürütülmüştür. Bunlardan; Gölbaşı ÖÇKB 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Saros ÖÇKB Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Güneyli köyü imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdü işleri tamamlanmıştır.
2017K090260	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	800		600	517	% 86,2	Halihazır Harita alımı yapılacak yerleşim yerleri ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce ihaleler tamamlanarak işi alan yüklenici firmalar tarafından çalışmalara başlanmıştır. Yılsonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2017K090270	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	600		300	0	% 0,0	Proje kapsamında 7 farklı iş için protokol imzalanmış olup, sözleşmeleri bekleniyor.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090280	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	800		700	530	% 75,7	İmar Uygulaması yapılacak yerleşim alanları ile ilgili Genel Müdürlüğümüz ile ilgili Belediyeler arasında yapılan protokoller kapsamında ihaleleri Belediyelerce tamamlanarak işi alan yüklenici firmalar tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2018	63.368	12.368	36.234	31.534	% 87,0	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 15.07.2016 tarihinde yapılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlenmesi İşbirliği protokolü" kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Mogan Gölü tabanından 500.000 m3 çamur taranarak geotekstil tüplere basılmıştır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2018	3.713	2.603	625	488	% 78,1	Genel Müdürlüğümüze ulaştırılan final raporları doğrultusunda Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi Projesine ait ödemeler gerçekleştirilmiştir.
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.250		500	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.800		700	157	% 22,4	Yılısonu itibarıyla projeler tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilmiştir.
<b>12 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>104.594</b>	<b>17.004</b>	<b>66.289</b>	<b>53.308</b>	<b>% 80,4</b>	



**AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2017	6.247	3.697	2.550	2.550	% 100,0	Proje tamamlanmıştır.
AB KATKISI			34.897	29.162	5.735	5.735	% 100,0	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2018	5.925	3.068	2.642	2.611	% 98,8	Proje tamamlanmıştır.
AB KATKISI			56.306	33.910	20.046	19.800	% 98,8	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>12.172</b>	<b>6.765</b>	<b>5.192</b>	<b>5.161</b>	<b>% 99,4</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>91.203</b>	<b>63.072</b>	<b>25.781</b>	<b>25.535</b>	<b>% 99,0</b>	

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2019	131.512	33.704	27.521	20.164	% 73,3	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	3.023	2.923	100	94	% 94,0	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde <b>KDV dahil 2.922.860,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2015 yılında <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> . 2017 yılında kesin hesap farkı ödenmiştir.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	8.873	2.873	6.000	5.992	% 99,9	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.362.660,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	5.868	2.768	3.100	3.005	% 96,9	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.613.900,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	10.981	10.581	400	270	% 67,5	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde <b>KDV dahil 9.140.280 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2016 yılında <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> . 2017 yılında kesin hesap farkı ödenmiştir.
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	6.119	4.119	2.000	1.910	% 95,5	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.872.320,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	9.148	6.648	2.000	1.883	% 94,2	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.555.000,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.792	3.792	2.000	1.647	% 82,4	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde <b>KDV dahil 4.794.340,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR</b> .

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	9.771	0	2.000	1.371	% 68,6	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde <b>KDV dahil 9.770.400,00 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %35' dir.</b>
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	11.040	0	1.000	107	% 10,7	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor.</b>
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.383	0	2.525	2.004	% 79,4	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde <b>KDV dahil 6.652.840,00 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %45' dir.</b>
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	7.267	0	901	214	% 23,8	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Arsa sorunu çözüldü ve Projesi tamamlanmak üzere.</b>
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	20.000	0	1.800	13	% 0,7	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde <b>KDV dahil 17.039.200 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme henüz imzalanmadı. İhalenin değerlendirmesi devam ediyor.
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	11.400	0	1.000	121	% 12,1	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor. Proje maliyeti revize edildi.</b>
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	12.148	0	1.000	7	% 0,7	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor. Proje maliyeti revize edildi.</b>
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2017-2018	1.699	0	1.695	1.526	% 90,0	Hizmet binası yapım işi 27.03.2017 tarihinde <b>KDV dahil 1.335.760,00 TL'</b> ye ihale edilmiştir. <b>Sözleşme 14.04.2017 tarihinde imzalandı.</b> <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %95' dir.</b>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	<b>Döner Sermaye</b>		<b>49.367</b>	<b>0</b>	<b>22.768</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	35.320		19.768	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 23.08.2016 tarihinde <b>KDV dahil 28.219.700,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. <b>İtiraz ve mahkeme süreçleri tamamlandı ve sözleşme imzalanma aşamasında.</b>
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	5.100		1.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. <b>Arsa sorunu çözülmeye çalışılıyor.</b>
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.947		1.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Projesi hazırlandı ihale hazırlıkları devam ediyor.</b> <b>Proje maliyeti revize edildi.</b>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2017-2017	293		293	291	% 99,3	3 adet T5 (Minibüs) tipi araç DMO dan temin edilmiştir. Bu araçlar; Bursa, Edirne ve Kayseri İl Müdürlüklerine tahsis edilmiştir.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı (Döner Sermaye-6.500.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	8.090		8.090	6.854	% 84,7	2017 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan "Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı" harcamaları.
	Hizmet Binası Onarımı (Döner Sermaye-3.500.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	9.924		9.924	6.566	% 66,2	2017 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan "Hizmet Binası Onarımı" harcamaları.
2017G000130	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2017-2017	5.106		5.106	4.100	% 80,3	2017 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan "Lojman Onarımı" harcamaları.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>144.925</b>	<b>33.704</b>	<b>40.934</b>	<b>30.187</b>	<b>% 73,7</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>59.367</b>	<b>0</b>	<b>32.768</b>	<b>7.788</b>	<b>% 23,8</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>204.292</b>	<b>33.704</b>	<b>73.702</b>	<b>37.975</b>	<b>% 51,5</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017G000130	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Döner Sermaye-1.045.000 TL ödenek eklendi) (Konut Sektörü)	2017-2017	1.345		1.345	1.171	% 87,1	
2017K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2017-2017	141		141	0	% 0,0	Başbakanlık Tarafından Araç Tahsis Edildiğinden Harcama Yapılmamıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı (Döner Sermaye-1.422.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	1.862		1.862	1.176	% 63,2	
	Hizmet Binası Onarımı	2017-2017	770		770	752	% 97,7	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.651</b>	<b>0</b>	<b>1.651</b>	<b>1.199</b>	<b>% 72,6</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>2.467</b>	<b>0</b>	<b>2.467</b>	<b>1.900</b>	<b>% 77,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.118</b>	<b>0</b>	<b>4.118</b>	<b>3.099</b>	<b>% 75,3</b>	

**HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ**

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.12.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100160	Çevre Sorumluluk Direktifinin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	544	189	355	355	% 100,0	Projenin kapanış toplantısı 19.07.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup proje tamamlanmıştır.
AB KATKISI			4.723	3.170	1.553	1.553	% 100,0	
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>544</b>	<b>189</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>% 100,0</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>4.723</b>	<b>3.170</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>% 100,0</b>	
