

**STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI**

2025 Yılı Bütçe ve Yatırım Programı 2. Dönem Gerçekleşme Raporu (01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 Dönemi)





BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2025 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2025 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	15.571.414.000,00	16.346.220.679,86	7.906.274.720,74	% 48,4
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.071.366.000,00	2.201.354.356,72	986.236.511,04	% 44,8
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	966.471.000,00	1.600.163.477,24	630.330.197,88	% 39,4
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.743.000,00	1.453.468.545,15	609.817.511,39	% 42,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	148.728.000,00	146.694.932,09	20.512.686,49	% 14,0
05	CARİ TRANSFERLER	144.750.175.000,00	27.157.849.000,00	3.265.390.134,66	% 12,0
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	136.553.846.000,00	18.194.960.000,00	0,00	% 0,0
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	% 0,0
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	5.202.000.000,00	5.202.000.000,00	2.964.439.000,00	% 57,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	508.955.000,00	505.515.000,00	248.434.000,00	% 49,1
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	222.934.000,00	222.934.000,00	19.980.932,34	% 9,0
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	59.081.000,00	59.081.000,00	31.177.202,32	% 52,8
	İskan Uygulamaları Ödeneği	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 0,0
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	% 100,0
	Deprem Bölgesi İLBANK Projeleri KDV Ödemeleri	0,00	0,00	0,00	% 0,0
	Ahıska Türklerinin İskanı-TOKİ Ödemesi	0,00	770.000.000,00	0,00	% 0,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.794.713.000,00	103.664.518.907,24	77.856.102.691,40	% 75,1
	Bakanlık Yatırım Programı	29.404.713.000,00	29.582.841.602,75	4.671.983.578,22	% 15,8
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	390.000.000,00	390.000.000,00	368.399.654,51	% 94,5
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	67.822.543.918,97	67.339.147.377,60	% 99,3
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	80.000.000,00	36.469.166,27	% 0,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	5.789.133.385,52	5.440.102.914,80	% 94,0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	26.060.329.000,00	30.010.611.768,00	28.267.099.541,36	% 94,2
	Bakanlık Yatırım Programı	535.483.000,00	785.483.000,00	352.185.198,18	% 44,8
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	22.874.383.000,00	22.874.383.000,00	22.874.383.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.516.286.298,57	% 75,8
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	2.050.000.000,00	1.897.442.766,84	% 92,6
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	430.463.000,00	430.463.000,00	54.397.054,17	% 12,6
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	220.000.000,00	220.000.000,00	61.563.051,60	% 28,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	0,00	0,00	% 0,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	1.650.282.768,00	1.510.842.172,00	% 91,6
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	0,00	0,00	0,00	% 0,0
08	BORÇ VERME	80.000.000,00	80.000.000,00	21.430.500,00	% 26,8
GENEL TOPLAM		219.294.468.000,00	181.060.718.189,06	118.932.864.297,08	% 65,7



BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

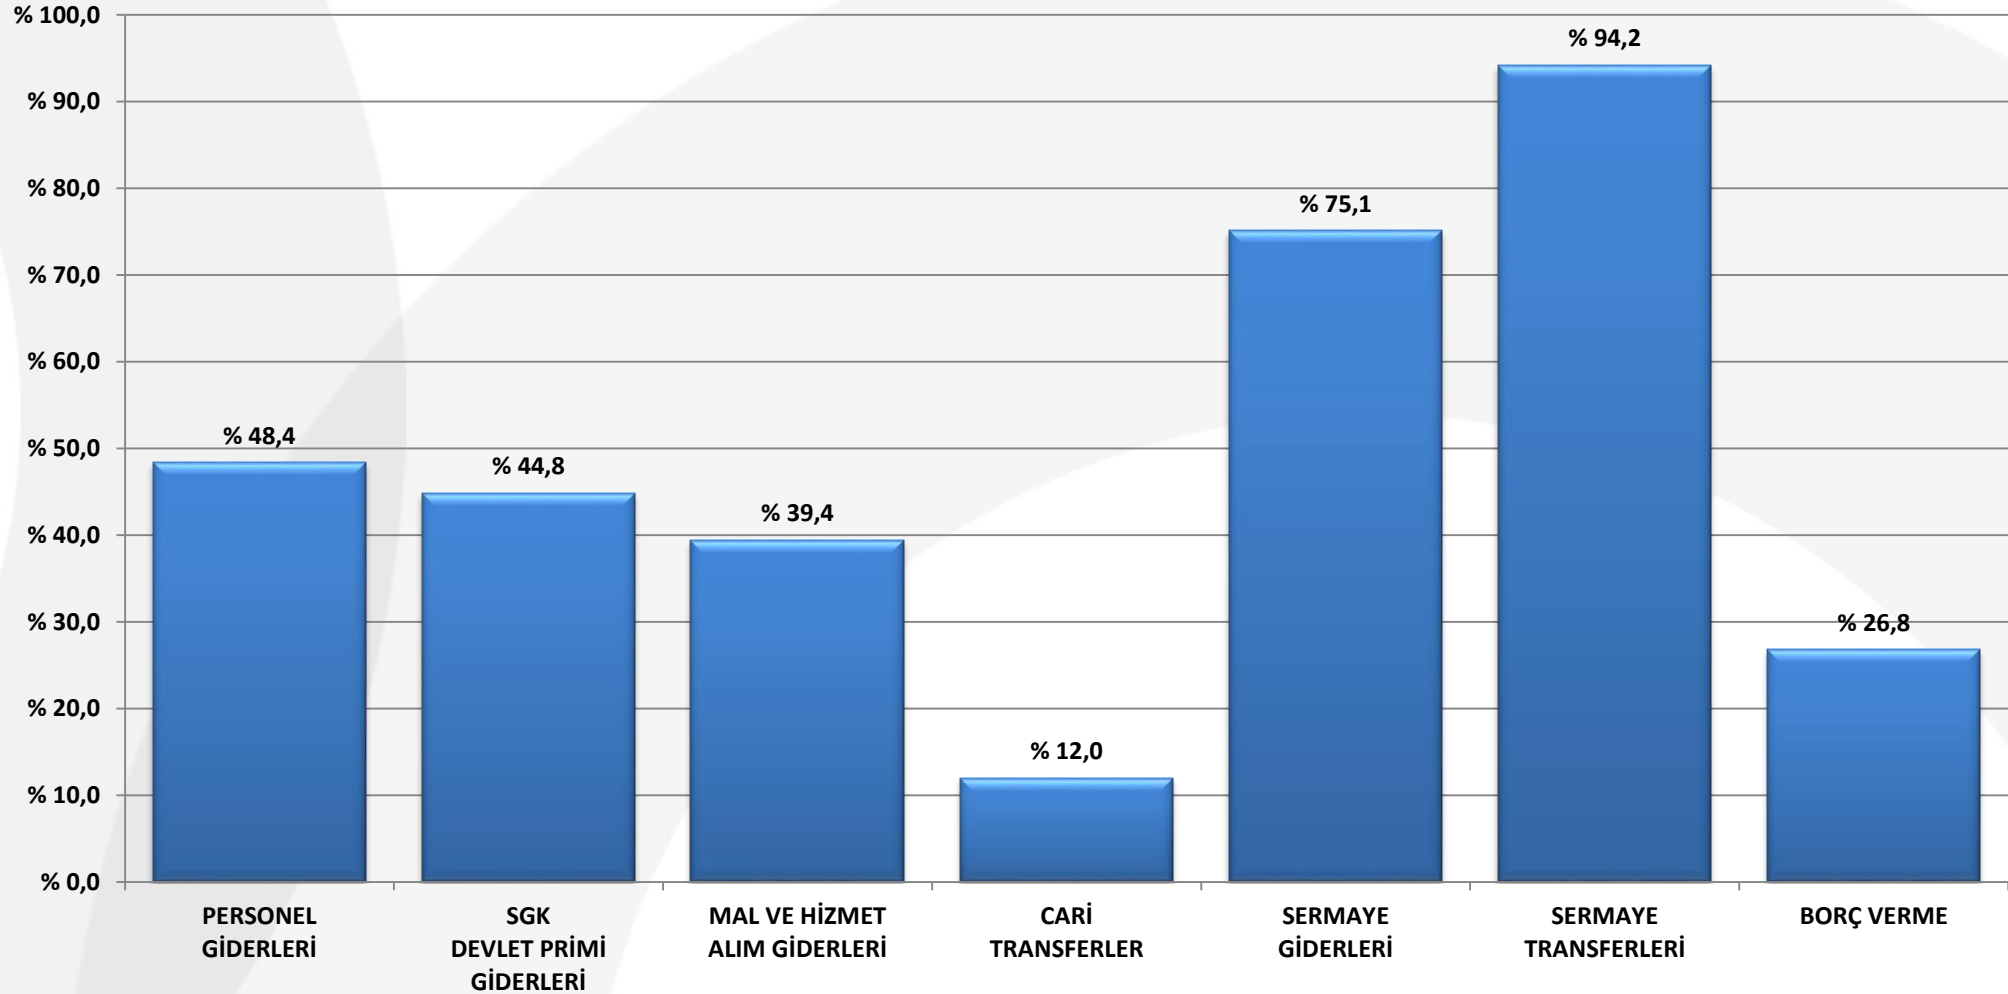




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2025 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2025 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	95.491.000,00	40.310.000,00	748.320,00	% 1,9
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	13	2.458.700.000,00	538.071.000,00	142.740.943,00	% 26,5
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	4	998.050.000,00	220.600.000,00	37.040.974,00	% 16,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	20	84.023.353.000,00	29.321.086.000,00	4.594.778.708,75	% 15,7
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	10.972.000,00	7.000.000,00	563.608,00	% 8,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	11	912.661.000,00	589.200.000,00	61.193.296,00	% 10,4
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	5.512.126.000,00	9.000.000,00	2.143.089,20	% 23,8
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	27	5.664.821.000,00	956.175.000,00	487.395.980,00	% 51,0
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	7.528.100.000,00	5.650.000,00	339.151,00	% 6,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	293.548.000,00	70.000.000,00	2.023.301,00	% 2,9
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	415.512.000,00	259.205.000,00	58.185.401,00	% 22,4
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	1	100.000,00	100.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	95	107.933.934.000,00	32.036.897.000,00	5.387.152.771,95	% 16,8
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	60	103.157.103.000,00	30.275.196.000,00	4.993.974.227,95	% 16,5
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	35	4.776.831.000,00	1.761.701.000,00	393.178.544,00	% 22,3
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	3 adet		390.000.000,00	368.399.654,51	% 94,5



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

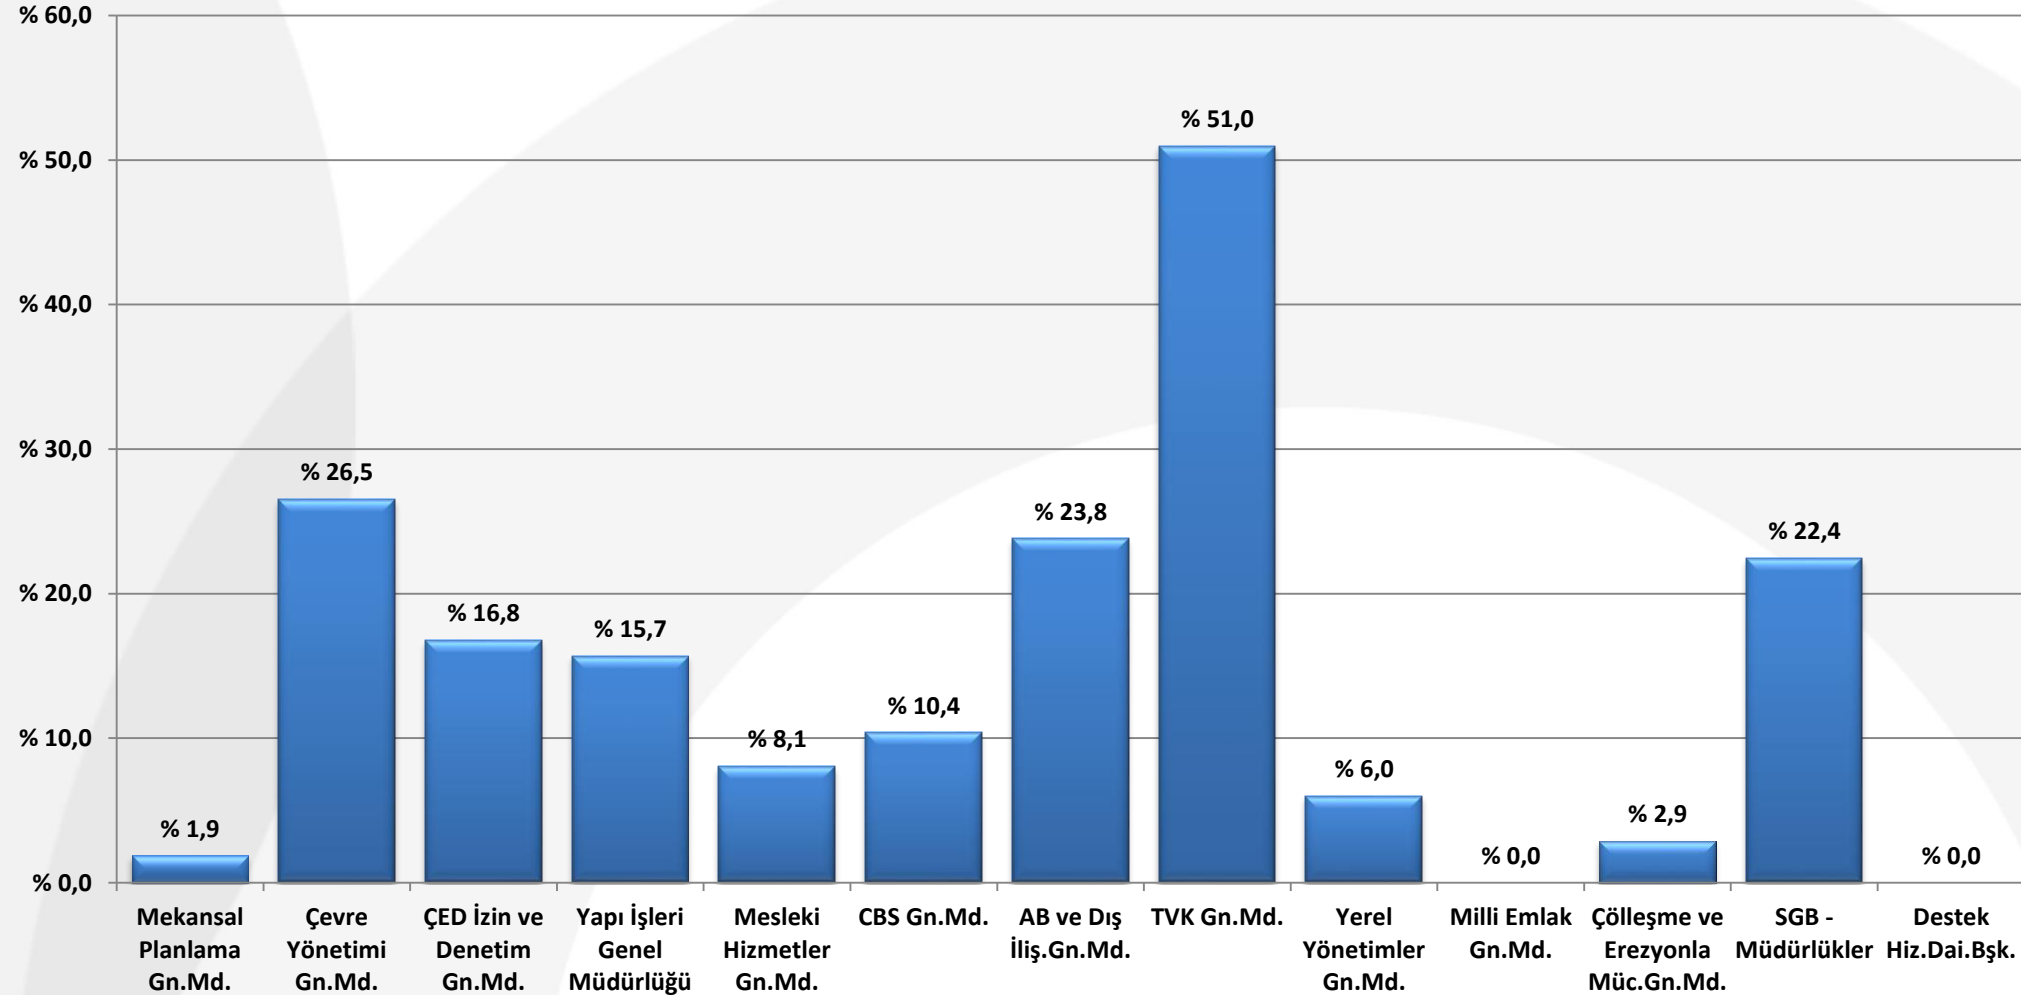




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2025 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2025 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	233.099.000,00	233.209.800,00	117.071.059,69	% 50,2
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	10.559.857.000,00	12.860.607.000,00	6.740.137.793,33	% 52,4
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	687.192.000,00	691.518.262,70	279.002.160,75	% 40,3
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	29.959.973.000,00	101.690.718.917,66	75.184.574.117,64	% 73,9
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	209.218.000,00	209.995.400,00	107.233.200,22	% 51,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	380.853.000,00	397.825.600,00	118.048.551,23	% 29,7
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	347.420.000,00	347.751.800,00	78.421.885,76	% 22,6
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	613.456.000,00	704.902.000,00	334.981.253,95	% 47,5
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	82.247.000,00	82.247.000,00	40.034.049,05	% 48,7
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	607.594.000,00	610.959.200,00	452.359.831,13	% 74,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	198.339.000,00	198.339.000,00	72.737.443,54	% 36,7
Personel Genel Müdürlüğü	86.259.000,00	87.259.000,00	48.326.879,04	% 55,4
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	108.512.000,00	408.512.000,00	126.729.969,86	% 31,0
Özel Kalem Müdürlüğü	122.288.000,00	125.288.000,00	53.118.356,80	% 42,4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.069.269.000,00	1.401.603.820,70	574.025.721,46	% 41,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	26.718.000,00	26.718.000,00	11.328.971,20	% 42,4
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	156.067.000,00	156.067.000,00	74.026.818,11	% 47,4
Strateji Geliştirme Başkanlığı	160.007.236.000,00	41.645.540.200,00	23.159.884.784,92	% 55,6
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	11.534.000,00	13.186.400,00	7.335.275,78	% 55,6
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	70.722.000,00	70.872.000,00	37.542.019,30	% 53,0
İl Müdürlükleri	13.712.735.000,00	19.053.717.788,00	11.294.788.967,32	% 59,3
Yurtdışı Teşkilatı	43.880.000,00	43.880.000,00	21.155.187,00	% 48,2
TOPLAM	219.294.468.000,00	181.060.718.189,06	118.932.864.297,08	% 65,7

 HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ
01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

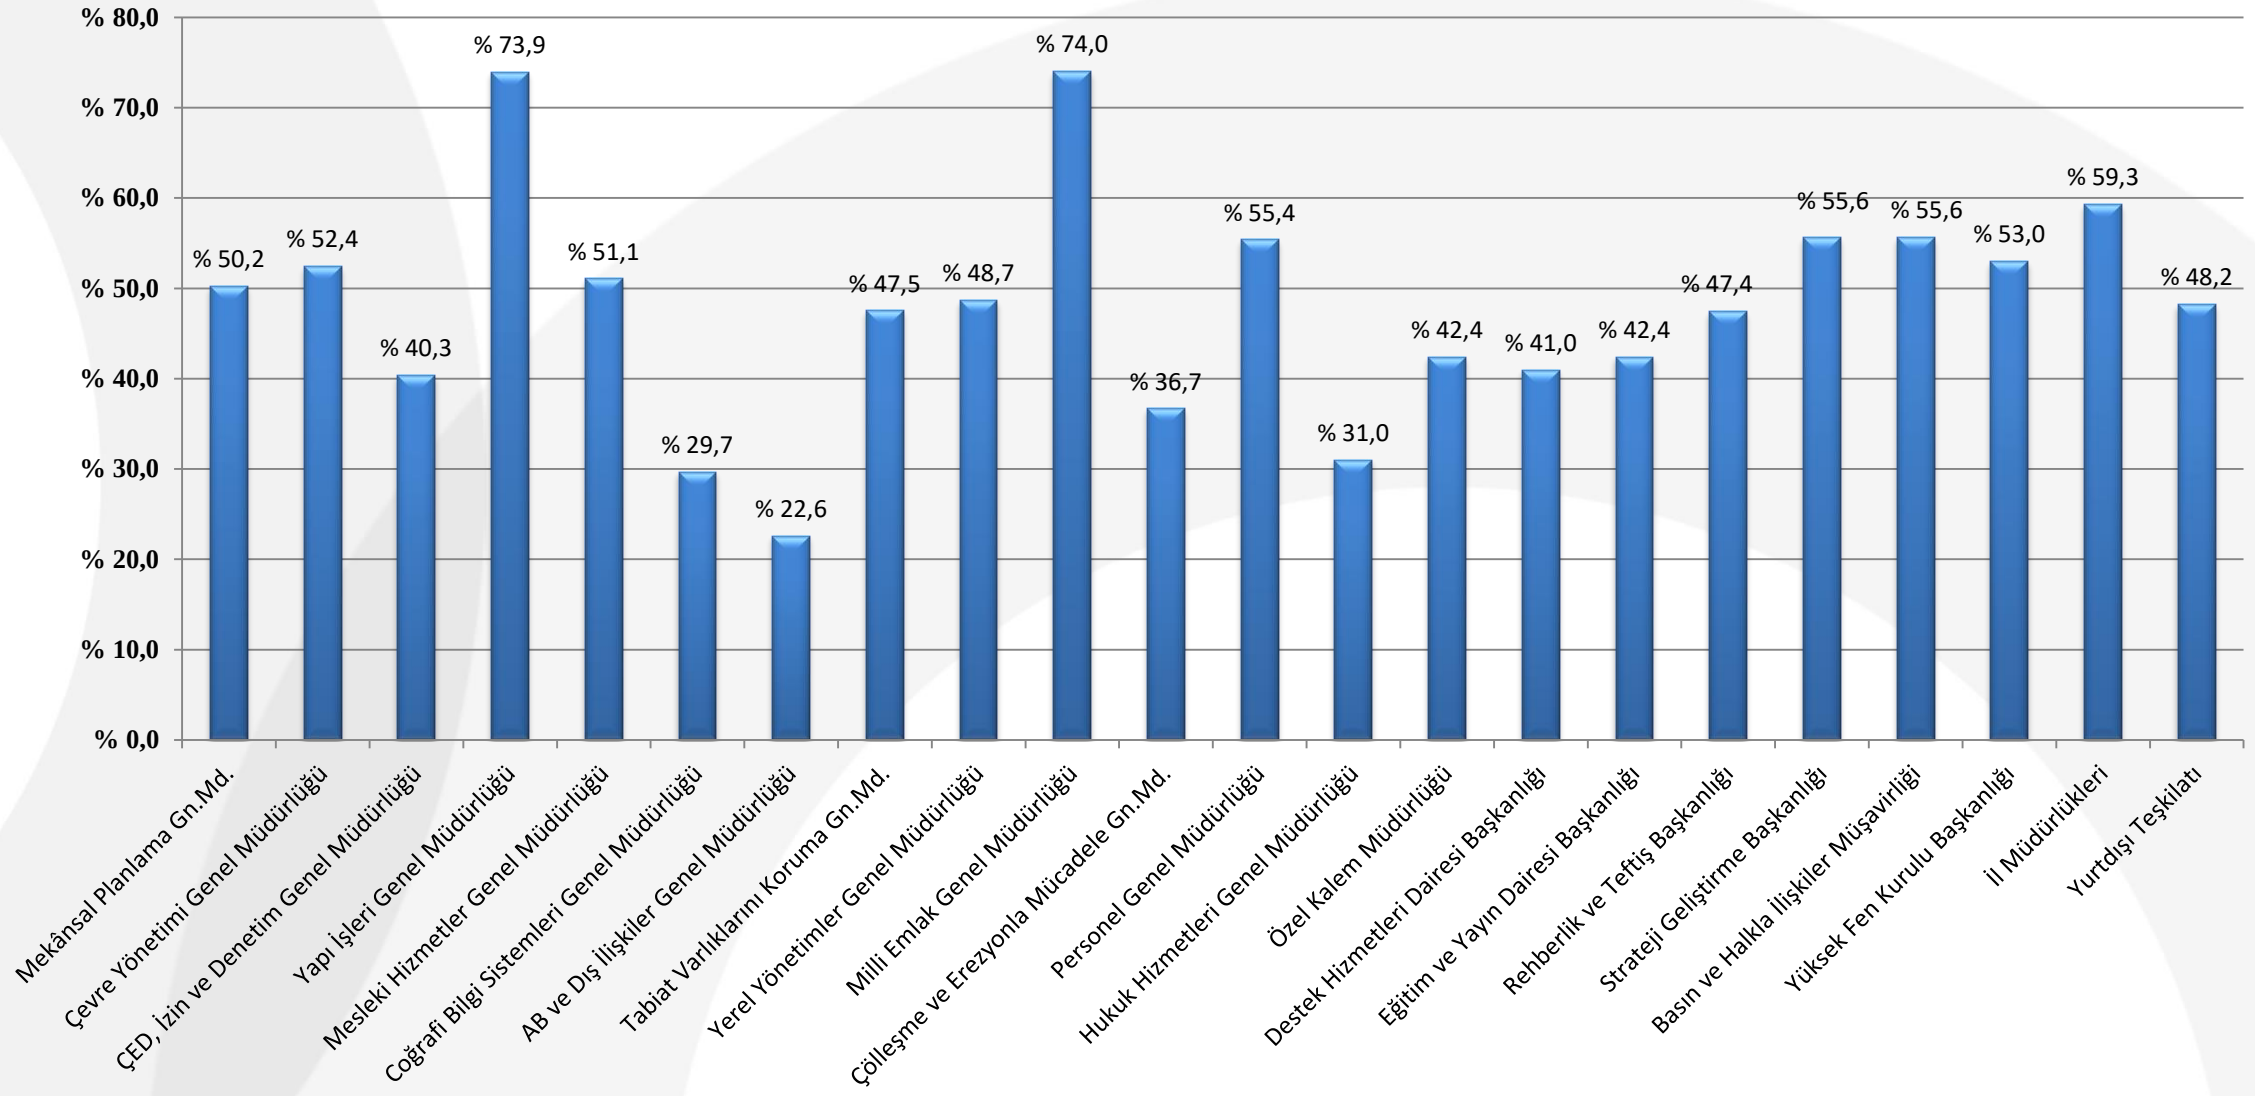



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

**Harcama Birimi Bazında
2025 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri
01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025**

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2025	31.306.000	20.946.000	10.360.000	0	% 0,0	
2020K09-150592-150594	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2025	19.146.000	15.146.000	4.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen 1. Aşama (İş Analizi ve Tasarım Dokümanı, Mevcut Sistem İdamesi), 2. Aşamaya (Açık Kaynak Kodlu Yazım, Geliştirme, Test ve Devreye Alma) ve 3. Aşama (İş Zekası- İstatistik ve Raporlama) çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin 2025 yılı proje iş takvimine göre 4. Aşama (Aktif Fay Zonlarının Sayısallaştırılması), 5. ve 6. Aşama (Sistem İdame , Bakım ve Geliştirme) çalışmaları da tamamlanarak proje sonuçlandırılmıştır. Projeye ilişkin son hakediş işlemleri Temmuz Ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
2020K09-150592-150602	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2025	12.160.000	5.800.000	6.360.000	0	% 0,0	Projeye ilişkin TÜRKİSAT ile sözleşme imzlanmış olup iş ve yer teslimi yapılacaktır.
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2025	4.500.000	2.000.000	2.500.000	748.320	% 29,9	
2023K09-209859-209860	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2025	4.500.000	2.000.000	2.500.000	748.320	% 29,9	
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2026	23.785.000	0	7.200.000	0	% 0,0	Projenin ihalesi gerçekleştirilmiş olup yüklenici ile 20.03.2025 tarihinde sözleşme imzalanmış ve çalışmalara başlatılmıştır. Bu kapsamda, teknik şartnamenin ilgili maddeleri gereğince; projenin 1. Etapında Çorum-Kamil (15 Ha), Bingöl-İlıcılar (37,4 Ha) ve Burdur-Hacılar (48,2 Ha) olarak belirlenen 3 yerleşim alanı için ayrı ayrı hazırlanacak İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporlarına ilişkin arazi çalışmaları devam etmektedir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	8.500.000	0	3.250.000	0	% 0,0	1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi kapsamında çalışmaları başlatılan "İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim ve Planlaması İşi" için TUBİTAK MAM ile 07.07.2025 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 08.07.2025 tarihinde işe başlanılmıştır. 480 takvim günü süreli işin 2026 yılının son çeyreğinde ise tamamlanması öngörülmektedir. Projenin bütçesi Yatırım Programında 2025 yılı için 3.250.000 TL (KDV Dahil), 2026 yılı için 5.250.000 TL olmak üzere toplam 8.500.000 TL(KDV DAHİL) olarak belirlenmiştir. Proje 4 etaptan oluşmakta olup, 2025 yılının ikinci yarısında I. Etap: "Hazırlık Aşaması" 2026 yılında ise II. Etap: "Araştırma Raporu'nun Hazırlanması" aşamalarının tamamlanması; III. Etap; "Alternatif Taslak Planların Hazırlanması" ve IV. Etap; "Nihai Planın Hazırlanması" aşamalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Sözleşme bedelinin %38'inin (KDV hariç 2,691,540.00 TL) 2025 yılının ikinci yarısında, kalan %62'sinin (KDV hariç 4.391.460.00 TL) 2026 yılında TUBİTAKA-MAM'a ödenmesi öngörülmektedir.
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	7.900.000	0	3.500.000	0	% 0,0	1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi kapsamında çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce yürütülen ve plan dönemi dolmuş olan havza bazındaki Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın revize edilmesi ihtiyacına binaen 24.06.2025 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale itiraz sürecinin tamamlanması sonrasında işin sözleşmesinin imzalanması ve bunu müteakip 1 yılda projenin tamamlanması öngörülmektedir. Projenin bütçesi Yatırım Programında 2025 yılı için 3.500.000 TL, 2026 yılı için 4.400.000 TL olmak üzere toplam 7.900.000 TL olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen ihale sonucunda işin sözleşme bedelinin 4.600.000 TL (KDV hariç) olması beklenmektedir. Proje 4 etaptan oluşmakta olup, 2025 yılının ikinci yarısında I. Etap: "Hazırlık Aşaması" ile II. Etap: "Araştırma Raporu'nun Hazırlanması" aşamalarının tamamlanması; 2026 yılında ise III. Etap; "Alternatif Taslak Planların Hazırlanması" ve IV. Etap; "Nihai Planın Hazırlanması" aşamalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Sözleşme bedelinin %40'ının (KDV hariç 1.840.000 TL) 2025 yılının ikinci yarısında, kalan %60'ının (KDV hariç 2.760.000 TL) 2026 yılında yüklenici firmaya ödenmesi öngörülmektedir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K09-249151	Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2025-2025	7.500.000		7.500.000	0	% 0,0	Projenin 2025 yılında gerçekleştirilebilmesi için 10.05.2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 07.04.2014 tarih ve 2014/6228 sayılı kararname ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi uyarınca, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar" doğrultusunda, proje maliyetinin Bakanlığımız Döner Sermaye kaynaklarından karşılanması suretiyle araştırma ve geliştirme hizmet alımı yapılarak, KDV Hariç 5.995.000TL (KDV Dahil 7.194.000) maliyet ile 09.05.2025 tarihinde Bakanlığımız ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştır. Projenin 3 aşamada gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Geline süreçte 1. aşama tamamlanmış olup bu kapsamda proje bedelinin %15'inin (KDV Hariç 899.250 TL) hakediş ödeme işlemleri sürdürülmektedir
2025K09-249153	Çevre Düzeni Planı-2 (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2025-2026	12.000.000		6.000.000	0	% 0,0	Söz konusu Proje kapsamında 2025-2026 yılı Yatırım Programına aktarılan bütçenin, 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi ile Genel Müdürlüğümüze verilen Çevre Düzeni Planı hazırlanması, hazırlatılması görevi doğrultusunda Bakanlığımızca yürütülen ve plan dönemi bitmiş, 2025 yılında ve daha sonraki yıllarda bitecek olan Antalya, Burdur, Isparta, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bilecik, Osmaniye, Bolu, Mersin ve Adana illerini içeren havza ve il bazındaki çevre düzeni planlarının sayısallaştırması ve teknik güncelleme işlerinin yapılması amacıyla "Veri Toplama, Güncelleme, Sayısallaştırma ve Uyumlaştırılması Hizmet Alımı İşi" kapsamında kullanılması hedeflenmiş ve bu çerçevede söz konusu Hizmet Alımı İşlerine ilişkin proje yer değişikliği gerekçesi, amacı ve hedefleri ile proje paketlerini belirtilen Revize Proje Teklif Formu (Yer ve Karakteristik Revizyonu Talebi) Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmiştir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	59.591.000	22.946.000	20.060.000	748.320	% 3,7	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	35.900.000	0	20.250.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	95.491.000	22.946.000	40.310.000	748.320	% 1,9	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	25.000.000	3.000.000	12.000.000	0	% 0,0	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 16.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 20.226.852 TL (KDV Hariç) ve projenin toplam süresi 764 (yedi yüz altmış dört) takvim günüdür. 1. Ara Rapor 25 Haziran 2025 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuştur. İnceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir. 2025 yılı için belirlenen 10 testisten atıksu deneysel karakterizasyon çalışmaları için alınan numunelerde analizleme çalışmaları tamamlanmıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren evsel/kentsel AAT'lerde tasarım hatalarından kaynaklanan proses sorunlarının belirlenmesine yönelik mevcut durum analizi yapılmıştır. Ayrıca, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Mayıs 2025 AAT tasarım eğitimi ve 07.07.2025 tarihinde kamu hizmet sucusu ve idare arasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 1.Ara Raporun uygun görülmesi sonrasında hakediş işlemleri gerçekleştirilecektir. Proje iş paketleri doğrultusunda yapılması gereken çalışmalara devam edilecektir.
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	50.000.000	15.000.000	24.000.000	11.821.770	% 49,3	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 15.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 39.405.901 TL + KDV olup; 15.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje başladığı tarihten itibaren, endüstriyel atıksu yönetimine ilişkin literatür araştırmaları, uluslararası mevzuatta atıksuda izlenen kirletici parametrelerin ve deşarj standartlarının incelenmesi, sektörel eğitimler, saha ziyaretleri, anket çalışmaları ve diğer sektörel faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Planlanan 60 saha ziyaretinin 16'sı tamamlanmış, 14 adet sektörel eğitim ile AB mevzuatına yönelik bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Atıksu numune alma ve analiz çalışmaları kapsamında pilot tesisler taslak olarak belirlenmiş ve İdare'nin değerlendirmesine sunulmuştur. Ayrıca, Almanya, Avusturya, İspanya, ABD ve Japonya gibi ülkelerdeki atıksu yönetim uygulamaları incelenmiştir. 27.05.2025 tarihinde sunulan Birinci Ara Rapor uygun görüldüğünden yükleniciye 11.821.770,30 TL (KDV Dahil) ödeme yapılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K06-247883	OSB Artılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2025-2026	10.000.000		4.000.000	0	% 0,0	Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için artırılmış atıksuların yeniden kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla sunulan proje 15.01.2024 tarihli ve 32783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2025 yılı yatırım programına (Proje No: 2025K06-247883) kabul edilmiş olup; proje tutarı 10.000.000 TL'dir. Projeye yönelik olarak; fiyat araştırması için bir üniversiteden fiyat teklifi alınmış ve alınan nihai teklif 24.801.000 (KDV Hariç) olarak verilmiştir.Üniversiteden alınan fiyat teklifi mevcut proje bütçesinin üzerinde olduğundan 28.04.2025 tarih ve 12276274 sayılı Strateji Geliştirme Başkanlığına yazılan yazı ile 20.000.000 (KDV Dahil) ek ödenek talebinde bulunulmuştur.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2027	1.100.000.000	404.750.000	196.000.000	123.061.469	% 62,8	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 2025 yılı yatırım programında 196 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 2025 yılı KAP proje detay listesi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 17/04/2025 tarihli yazı ile uygun görülmüştür. Proje detay listesinde revize çalışmaların yapılabilmesi amacıyla 01/07/2025 tarihinde komisyon toplantısı düzenlenmiş olup KAP revize proje detay listesi Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'na onaylanması amacıyla gönderilecek ve revize detay liste onayı sonrasında hakediş bazlı ödenek kullanımına başlanacaktır.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2026	5.000.000	0	2.500.000	0	% 0,0	Proje bütçesi revize edilmiş olup belirlenen bütçeye göre teknik şartname çalışmaları yürütülecektir.
2025K08-263549	Arsuz Katı Atık Yönetimi Tesisi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2025-2026	900.000.000		250.000.000	0	% 0,0	Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının belediye atık yönetimi yatırımlarını en uygun ve ekonomik şekilde yapması, atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla önerilen proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Proje ile Hatay İlinin belediye atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesi, entegre atık yönetim tesislerinin (ön işlem tesisleri ve düzenli depolama tesisleri) faaliyete geçirilmesi ve atık yönetim tesisleri finansman eksikliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yapım İşi, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülecektir. Yapım işine fizibilite raporu, ÇED süreci ve uygulama projesi tamamlanmasını müteakip başlanacaktır. Fizibilite raporu 30/6/2025 tarihli yazımız ile uygun görülmüş olup ÇED süreci devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2025	12.220.000	8.499.000	3.721.000	0	% 0,0	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü Çalıştayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, Otomotiv, Tüketici Ürünleri İmalatı, Plastik ve Tekstil Sektörüne Yönelik ilgili paydaşların katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi taslak Raporları sunulmuş olup nihai hale getirilmesi hazırlıkları devam etmektedir. 2024 yılında protokol kapsamında 6.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 27/12/2024 tarihinde imzalanan ek protokol ile proje süresi 200 gün uzatılmasına karar verilmiştir. 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde STÜ Ulusal Eylem Planı hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi. STÜ UEP Eylem Planı İzleme Yazılımı, Sektörel BAT ve BEP Kılavuzları, Rapor ve eylem planı hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür.
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)	2018-2026	9.500.000	3.150.000	3.850.000	0	% 0,0	EKÖK Sektör Uzmanı Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile 17.10.2024 tarihinde imzalanan protokol sonrası 18.10.2024 tarihinde başlamıştır. Proje ile Proje Yönetim Planı Raporu hazırlanmış ve ilk ödemesi gerçekleştirilmiştir. Projede aşağıda sıralanan işlerin tamamlanması hedeflenmiştir: - Proje Başlangıç Toplantısı - Proje Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları - Proje Yönetim Planı Raporu - Sektörel Tebliğlerin Hazırlanması - Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Raporların Usul ve Esaslarının Hazırlanması - Uzmanlığa Yönelik Usul ve Esaslar ile Eğitim ve Rehber Dokümanların Hazırlanması - Sektörel Toplantılar - Final Raporu Proje Kapsamında 22- 24 Ocak 2025 tarihleri arasında Proje Yönetimi ve Değerlendirme ve Sektörel Tebliğ Taslakları hazırlanmasına ilişkin Toplantı gerçekleştirilmiştir. 9-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında sektörel toplantı gerçekleştirildi, toplantıda sektörel tebliğ taslakları ve puanlama üzerinden geçildi.
2018K10-150237- 183734	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2026	9.500.000	3.150.000	3.850.000	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2027	38.000.000	0	13.000.000	0	% 0,0	
2018K10-43862- 247921	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-3	2025-2027	19.000.000		6.500.000	0	% 0,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren HEY Portalı veritabanının, veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. Bu Portal aracılığıyla NEFES yazılımına esas şehirlerde hava kalitesi seviyelerinin belirlenmesi, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatının kullanımına yönelik hava kalitesi haritalarının üretilmesi ile birlikte katı yakıt uygunluk, satış ve dağıtım hizmetinin elektronik süreç takibi gerçekleştirilmektedir. Katı Yakıt Modülü; Bakanlığımız 2020/25 sayılı Genelgesi ile uygulamaya alınmıştır. 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla ısınma amaçlı yerli ve ithal tüm katı yakıtların ülkeye girişten son kullanıcıya ulaşana kadar süreçte mevzuatın gereği olarak verilen tüm belgeler elektronik ortamda e-imza ile düzenlenmeye başlanmıştır. Modül, mobil arayüz geliştirilerek Bakanlık uygulama listesine eklenmiştir. Ülkemizdeki katı yakıt satıcılarının bu mobil versiyon ile satış yaptıkları müşterileri sisteme tanımlamaları ve adrese dayalı katı yakıt tüketim miktarı bilgisine ulaşmaları mümkün olmaktadır. HEYGEL projesi ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında hava kalitesi tahminleme sisteminin ilk adımları atılmış olup, yapay zeka kullanımı, büyük veri yönetimi, uzaktan algılama teknolojileri gibi farklı teknolojilerin sisteme entegrasyonu ile hesaplamalardaki belirsizlik oranının asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmekte, devam projesi için ileri düzey teknolojilerin entegrasyonu çalışmaları sürdürülmektedir. Hava kalitesi yönetiminde karar destek aracı olarak kullanılan Hava Emisyon Yönetim Portalının teknolojik açıdan iyileştirilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, web yazılım ile hayata geçirilen çevre yatırımının sürdürülmesi ve daha ileriye taşınması amaçlanmaktadır. Projenin şartname süreci devam etmektedir.
2018K10-43862- 247934	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Faz-2	2025-2027	19.000.000		6.500.000	0	% 0,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren NEFES yazılımına ait veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. NEFES yazılımı kapsamında şehirlerin hava kalitesine ilişkin değerlendirme ve sonuç odaklı eylemlerinin belirlenmesine esas şehirlerin hava kalitesi yönetiminde karar destek mekanizması için dijital ikizleri üzerinden 3 boyutlu haritalarının üretilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi yönetiminde şehirlere özgü yüksek çözünürlüklü veri üretiminin devamlılığı ile kirliliğin kaynağının tespiti sağlanmaktadır. Sağlık indeksi hesabı ile şehrin hava kalitesini etkileyen tüm etmenlere ilişkin karar destek süreçlerine değerlendirme aracı sağlanmıştır. Projenin şartname süreci devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müd. ile Ortak Proje-Ödeneği Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müd.ne aktarıldı) (Çevre Sektörü)	2021-2026	24.564.000	7.400.000	3.500.000	0	% 0,0	Proje, aynı proje adı ve proje numarası altında 2 fazlı olarak yürütülmekte olup birinci fazında hazırlanan planlar, kılavuzlar ve mevzuatlar için kurum görüşlerinin alınması süreci devam etmektedir. Projenin ikinci fazı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte ve yazılım çalışmaları devam etmektedir.
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2026	29.886.000	6.730.000	10.000.000	0	% 0,0	Proje 07/04/2023 tarihinde Türksat A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında başlamış olup, 30/06/2025 tarihi itibarıyla ilk etabı tamamlanmıştır. Sözleşme çerçevesinde yazılım destek ve yazılım modernizasyon çalışmalarını yürütmek için gereken planlamaları, kullanılacak yöntemleri, her bir faaliyet için takip edilecek yolları, proje takvimi yönetimi, organizasyon ve kaynakları içeren Proje Yönetim Planı hazırlanmış olup, planda belirtilen takvime göre çalışmalar yürütülmüştür. Proje için 2024 yılında harcanan bütçe 6.730.000 TL'dir. Projeye ait ödemeler aşağıdaki tabloda belirtilen yüzdelerle dilimlere göre yapılmış olup, bugüne kadar 5 adet hakediş ödenmiştir. 6. hakediş esas Sonuç Raporu 24.06.2025 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiştir. 6. hakediş esas çalışmalar devam etmektedir. Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen hususlara uygun olarak; yazılım geliştirme, test

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-247998	Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı (Çevre Sektörü)	2025-2026	25.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı işine yönelik teknik şartname hazırlanmış olup, ihale süreci devam etmektedir. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması hedeflenmektedir.
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	34.000.000	25.000.000	9.000.000	7.857.704	% 87,3	
AB katkısı			220.094.000	164.581.000	55.513.000	48.500.000	% 87,4	
9 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.123.720.000	441.399.000	488.071.000	130.919.173	% 26,8	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	114.886.000	24.730.000	50.000.000	11.821.770	% 23,6	
		GENEL TOPLAM	2.238.606.000	466.129.000	538.071.000	142.740.943	% 26,5	
		AB KATKISI	220.094.000	164.581.000	55.513.000	48.500.000	% 87,4	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K10-198443	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3 (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2024-2025	32.800.000	17.200.000	15.600.000	6.240.000	% 40,0	2023 yılında projenin 2023 yılı iş termin planına ilişkin ödemesi yapılmıştır. 2025 yılı Ocak – Haziran dönemi arasında 2025 yılı İTP'si sunulmuş olup, 5.200.000,00 TL (KDV hariç) hak ediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında Nisan ayında Marmara Deniz seferi tamamlanmıştır. 2025 yılı Ağustos ayı için de ek sefer planlanmıştır. 2024-2025 döneminde 2 yıllık yürütülen projenin 2025 yılı faaliyetleri kapsamında tamamlanmış faaliyetler listelenmiştir.
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)	2014-2027	915.000.000	327.000.000	188.500.000	30.800.974	% 16,3	
2014K10-169742- 2117	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2027	885.000.000	327.000.000	158.500.000	30.800.974	% 19,4	
	Genel Bütçe Ödeneği		463.000.000	182.000.000	78.500.000	30.800.974	% 39,2	İhale süresi biten Temiz Hava Merkezleri tarafından ihale süreçleri başlatıldı. Üç adet Mobil Hava Kalitesi İzleme Aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarı Mart 2025, Nisan 2025 Hakediş ödemeleri gerçekleştirildi. Sözleşme süresi 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		422.000.000	145.000.000	80.000.000	0	% 0,0	İhale süreci tamamlanmış olup, sözleşme imzalanması aşamasındadır.
2014K10-169742- 254653	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi (**.Döner Sermaye)	2025-2025	30.000.000		30.000.000	0	% 0,0	Yenilenecek Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ve cihazlarının tespit çalışmaları tamamlandı.Temmuz ayı sonunda ihalesi yapılacak
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2026	20.250.000	3.750.000	6.500.000	0	% 0,0	Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan “Türkiye Çevre Etiket Sistemi”nin (TÇES) Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında dört ürün grubunda çevre etiketi kriter belirleme çalışmalarına başlanmıştır. Ödeme gerçekleşmemiştir.
2025K10-246784	Sürekli İzleme Merkezi Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2025-2026	30.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Proje revizyonu önerisinde bulunulmuştur, revizyon önerisinin sonuçlanması beklenmektedir, proje henüz başlamamıştır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	513.250.000	185.750.000	95.000.000	30.800.974	% 32,4	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	484.800.000	162.200.000	125.600.000	6.240.000	% 5,0	
		GENEL TOPLAM	998.050.000	347.950.000	220.600.000	37.040.974	% 16,8	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2026	7.733.722.000	6.281.922.000	1.447.900.000	351.456.739	% 24,3	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi kapsamında Tüm ihaleler gerçekleştirilmiş olup, tahsis edilen kredi tutarının tamamı kullanılmıştır. Proje 2025 yılı sonunda tamamlanacaktır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2026	7.651.822.000	6.201.922.000	1.446.000.000	347.673.496	% 24,0	
	Hibe Ödeneği	2019-2026	81.900.000	80.000.000	1.900.000	3.783.243	% 199,1	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	10.767.000.000	117.000.000	2.023.400.000	3.356.329	% 0,2	Danışmanlık ve yapım ihale süreçleri devam etmektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	10.708.500.000	109.200.000	2.000.000.000	1.463.919	% 0,1	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	58.500.000	7.800.000	23.400.000	1.892.410	% 8,1	
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2026	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2026	0	0	0			
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2026	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2 (*.Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2024-2030	12.813.050.000	20.000	2.500.000.000	0	% 0,0	
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadag 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (Destek Hiz.Dai. Bşk. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2026	233.280.000	0	183.280.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet doğrultusunda proje maliyeti revizyonu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülmüştür. İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*.Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	31.226.000.000	6.098.355.000	13.640.800.000	2.214.475.692	% 16,2	Proje kapsamında 2024 yılında yapılan sözleşmelere binaen kırsal konut inşaatların geçici kabulü devam etmekte olup, 2025 yılında yapılan ihalelerin sözleşmeleri imzalanmaya başlanmıştır.
2024G00-224663	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar-JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA) (Konut Sektörü)	2024-2026	7.435.000.000	3.415.571.000	3.141.680.000	1.497.931.176	% 47,7	Proje kapsamında yapılan sözleşmelere binaen kırsal konut inşaatları devam etmekte olup 2025 yılı 4. Çeyrekte konutların geçici kabulü planlanmaktadır.
	JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2024-2026	6.264.000.000	2.846.571.000	2.617.680.000	1.429.522.045	% 54,6	
	Genel Bütçe Ödeneği	2024-2026	1.171.000.000	569.000.000	524.000.000	68.409.131	% 13,1	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021H03-255345	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Yükseköğretim Sektörü)	2021-2027	6.733.413.000	277.157.000	4.018.326.000	426.652.044	% 10,6	
2021H03-255345-255346	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı	2021-2027	1.587.843.000	0	500.000.000	0	% 0,0	
2021H03-255345-255347	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri	2023-2027	2.325.163.000	0	1.175.076.000	0	% 0,0	
2021H03-255345-255963	Boğaziçi Üniv.Üçaksavar Kampüsü Superdorm Binası	2024-2025	130.250.000	24.000.000	106.250.000	74.159.393	% 69,8	Boğaziçi Üniv. Üçaksavar Kampüsü Superdorm Binası için ihale edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. İlerleme yüzdesi %70 olup 2025 yılı Ağustos ayı itibari ile geçici kabulü planlanmaktadır.
2021H03-255345-255971	İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar	2024-2025	183.500.000	19.000.000	164.500.000	151.633.267	% 92,2	İTÜ- Ayazağa Kampüsü – Vadi Yemekhane, Vadi Erkek Yurdu (B-C-D-E Blokları) Binaları ihale edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. İlerleme yüzdesi %80 olup 2025 yılı Ağustos ayı itibari ile geçici kabulü planlanmaktadır.
2021H03-255345-255977	İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar	2024-2025	285.000.000	0	285.000.000	25.512.242	% 9,0	İstanbul Teknik Üniversitesi (Ayazağa Kampüsü) – Uzay Uçak Fakültesi, Gemi İnşaat Fakültesi, Maden Fakültesi, Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu Binaları ihale edilerek sözleşmeye bağlanmıştır. İlerleme yüzdesi %30 olup çalışmalar hız ile devam etmektedir.
2021H03-255345-255987	İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü	2024-2025	137.500.000	0	137.500.000	0	% 0,0	İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa – Avcılar Kampüsü Rektörlük İdari Binası ve Öğrenci Kültür Merkezi ile Büyükkçekmece Kampüsü C Blok Yurt Binası ve V Blok Yurt Binası ihale edilerek sözleşmeye bağlanmış ve İlerleme yüzdesi %10 olup çalışmalar hız ile devam etmektedir.
2021H03-255345-255992	Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü	2024-2025	140.000.000	6.000.000	134.000.000	31.119.768	% 23,2	Marmara Üniversitesi (Göztepe Kampüsü) – Yabancı Diller Yüksek Okulu, Teknik Eğitim Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Binaları ihale edilerek sözleşmeye bağlanmış ve İlerleme yüzdesi %70 olup çalışmalar hız ile devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021H03-255345-256013	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar	2024-2025	240.000.000	16.000.000	224.000.000	144.227.374	% 64,4	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi – Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi Binaları ihale edilerek sözleşmeye bağlanmış ve ilerleme yüzdesi %80 olup çalışmalar hız ile devam etmektedir. 2025 yılı Ağustos ayı itibarı ile geçici kabulü planlanmaktadır.
2021H03-255345-256029	Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci Yurtları	2024-2025	120.000.000	0	120.000.000	0	% 0,0	Kocaeli Gazanfer Bilge Kandıra öğrenci yurdu inşaatı ihale edilerek sözleşmeye 2025 yılı Temmuz ayı ilk haftası yapılmış olup, çalışmalara hız verilecektir.
2021H03-255345-256035	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar	2024-2025	350.000.000	0	350.000.000	0	% 0,0	Hatay ilindeki Kamu Binalarının Sismik Güçlendirilmesi ve Enerji Verimliliği Yenilemeleri Yapım İşleri (Mustafa Kemal Üniv.-Fen-Edebiyat, Ziraat, Eğitim Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binaları) ihale edilerek sözleşmeye bağlanmış ve 2026 yılı ilk çeyreğinde geçici kabulü yapılması planlanmaktadır.
2021H03-255345-256080	Boğaziçi Üniversitesi Kare Bina	2025-2026	1.000.000.000		800.000.000	0	% 0,0	Yararlanıcı kuruluş tarafından iptal edilmiştir.
2021H03-255345-254389	Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap Binalar	2024-2025	234.157.000	212.157.000	22.000.000	0	% 0,0	Boğaziçi Üniversitesi- Kilyos Kampüsü- 1.Öğrenci Yurdu Binası, Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) A ve B Blok Binaları ve Sosyal Tesis/Yurt Binası Geçici Kabulü yapılmıştır.
2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2024-2027	2.000.000.000	0	910.000.000	0	% 0,0	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı işi ihale edilerek, yer teslimi yapılmış ve çalışmalar büyük bir hız ile devam etmektedir.
2024I00-235103-235104	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı	2024-2027	1.980.000.000	0	900.000.000	0	% 0,0	
2024I00-235103-235105	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat	2024-2027	20.000.000	0	10.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
2017K09-3813- 171165	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2026	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813- 171166	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2025	46.476.000	43.476.000	3.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813- 171167	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2026	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2025	2.430.737.000	1.530.737.000	900.000.000	44.271.938	% 4,9	GFDRR Grant TF0B6770 Hibe Anlaşması kapsamında "İleri Mühendislik Uygulamaları ve Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım Danışmanlık Hizmeti (WB/CS-TA-02)" sözleşme kapsamında hizmet alımı yapılmış ve KADEV kapsamında danışmanlık ve müşavirlik ödemeleri yapılmaktadır.
2021K14-172248- 172249	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2025	513.362.000	263.362.000	250.000.000	26.189.679	% 10,5	
	Hibe Ödeneği	2021-2025	31.500.000	31.500.000	0	18.082.259	% 0,0	
2021K14-172248- 172250	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2025	1.885.875.000	1.235.875.000	650.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K14-246725	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2025-2025	35.000.000		35.000.000	0	% 0,0	
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (Destek Hiz.Dai. Bşk. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2024-2026	145.000.000	2.000.000	120.000.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet doğrultusunda proje maliyeti revizyonu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülmüştür. İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2027	495.000.000	10.000.000	223.000.000	56.720.293	% 25,4	24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Oluru ile tahmini ödenek teminine esas revize bedeli onaylanmış olup 04.07.2024 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. Yapılan sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 16.06.2028 olarak güncellenmiştir. İş devam etmektedir.
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2026	161.000.000	0	70.000.000	0	% 0,0	2024 yılında yatırım programına alınmış olup, iş devam etmektedir.
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	77.000.000	1.000.000	40.000.000	0	% 0,0	2024 yılında yatırım programına alınmış olup, 48.000.000,00 TL anahtar teslim götürü bedeli üzerinden ihalesi tamamlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K07-245711	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	3.000.000		3.000.000	168.000	% 5,6	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2025K07-245713	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	10.000.000		10.000.000	2.073.910	% 20,7	Bingöl-Solhan-Kale köyü yeni yerleşim yeri projesi hazırlama işi kesin hesap ödemesi 256.193,21 TL (KDV dahil) ve Bursa-Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Karyağmaz köyünün, Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş beldesi sınırları içerisinde nakledilmesi yapım işi ödemesi 1.817.716,39 TL (KDV dahil) kesin hesap ödeneğinden karşılanmıştır.
2025K07-255697	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (**08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2028	1.500.000.000		79.950.000	21.430.500	% 26,8	Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2025 yılı itibarıyla bu iş için ayrılan ödenek miktarı 79.950.000 TL olarak belirlenmiştir. 2025 Yılı Yatırım Programı çalışmaları kapsamında, Ocak-Haziran Döneminde, 08.1 kaleminden (Yurt İçi Borç Verme-K.E.Y.Y'li konutlar) Yatırım Programında yer alan Aksaray, Çankırı, Erzurum, İzmir, Isparta, K.Maraş, Sivas illerinde, toplam da 21.430.500 TL (30.06.2025 tarihi itibarıyla) tutarında ödenek harcanmıştır. İşler süratle devam etmektedir.
2025K07-245714	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (**08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2027			45.000.000	40.170.239	% 89,3	Kamulaştırma ve konut ile arazi satın alımları için kullanılmaktadır. "06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) kaleminden 2025 Yılı ilk 6 aylık dilimin de; Adıyaman, Çorum, Samsun Kocaeli, ve Ankara İllerinde 5 adet Tarım arazisi ve 29 adet konut olmak üzer toplam da 34 adet satın alımı için 40.170.239 TL ödenek gönderilmiştir. 2025 Yılı için kamulaştırma ödeneği olarak 45.000.000 TL'lik ödenek belirlenmiştir.
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	81.713.022.000	17.612.462.000	28.902.806.000	4.573.348.209	% 15,8	
2 Proje		08 TOPLAM	1.500.050.000	0	80.000.000	21.430.500	% 26,8	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	413.280.000	2.000.000	338.280.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	83.798.252.000	17.733.762.000	29.321.086.000	4.594.778.709	% 15,7	
3 Proje		HİBE	171.900.000	119.300.000	25.300.000	23.757.912	% 93,9	
1 Proje		AB KATKISI	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	116.127.000	43.476.000	60.000.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	45.000.000	40.170.239	% 89,3	

Not-1: "GES Kurulumu" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-2: "Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİ F HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2027	4.972.000	1.425.000	1.000.000	0	% 0,0	1.Güncellenen "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına Dair Tebliğ" yayımlanarak 01 Nisan 2025 tarihi itibarıyla zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir. 2.7.Nisan 2025 de, Bakanlığımız ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) arasında "Binalarda Yalıtım Uygulamaları ve İyi Uygulama Kurallarına İlişkin Farkındalığın Artırılması" konusunda protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında çeşitli konularında bölgesel eğitimler verilmesi kararlaştırılmıştır. İlk eğitim 29 Nisan 2025'de Gaziantep'de, ikinci eğitim 28 Mayıs 2025'de Erzurum'da, üçüncü eğitim 19 Haziran'da İzmir'de gerçekleştirilmiştir. 3.8.Nisan 2025 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi ile; "Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR)'nin Uluslararası Sürümünün (YeS-INT) Oluşturulması Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması" protokolü imzalanıp çalışmalara başlanmıştır. 4.Binalarda enerji verimliliği hesaplama ve uygulamalarının güncel standart ve metodolojilere göre gerçekleştirilmesi çalışmaları neticesinde hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 25 Nisan 2025'de 32881 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 5."Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 24 Haziran 2025'de 27075 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Güncellenen mevzuat ve standartlara göre BEP-TR yazılımı güncellenmiştir. 6.AB Binalarda Enerji Performansı Direktifi (AB/2024/1275) ile yeni binalar için zorunlu hale getirilen Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Raporunun hazırlanması hususunda ulusal YDD metodolojisinin geliştirilmesi ve BEP-TR yazılımına entegre edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 7.Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile binaların enerji performansı ve mekanik tesisat hesaplarında kullanılan iklim verilerinin güncellenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında BEP-TR uygulamasının kullandığı meteorolojik veriler güncellenerek Tipik Meteorolojik Yıl (TMY) oluşturulmuştur. BEP-TR uygulamasında bina enerji performansı hesaplamalarının daha hassas sonuç vermesi sağlanmıştır. 8.Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'nde yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin alınması amacıyla; 60 farklı kurum, kuruluş, üniversiteler ve sivil toplum örgütünden yaklaşık 400 katılımcı ile gerçekleşen toplantılar düzenlenerek, yönetmeliğe nihai hali verilmiş kurum görüşleri aşamasına gelinmiştir.
2025K01-246705	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2025-2025	6.000.000		6.000.000	563.608	% 9,4	TSE'ye test ve deney ücreti ödemesi, Geçici görev yolluk ödemeleri, .Laboratuvar Cihaz Kalibrasyon ödemeleri ve Türkak Akreditasyon ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği		1.000.000		1.000.000	378.180	% 37,8	
	Döner Sermaye Ödeneği		5.000.000		5.000.000	185.428	% 3,7	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	5.972.000	1.425.000	2.000.000	378.180	% 18,9	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	5.000.000	0	5.000.000	185.428	% 3,7	
		GENEL TOPLAM	10.972.000	1.425.000	7.000.000	563.608	% 8,1	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2025	9.768.000	5.400.000	4.368.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanmıştır.İşin süresi 31.12.2025 tarihinde sona erecektir. Proje Kapsamında Harcama Planlanmış Sözleşmeye bağlanmış olup ödenegin tümü kullanılacaktır.
2023K60-217018	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2025	195.932.000	96.000.000	99.932.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanmıştır.Ödemeler yapılacaktır.
2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000	9.000.000	20.800.000	3.699.514	% 17,8	Sözleşme imzalanmıştır.2025 yılı için ihale yapılmıştır.Sözleşme aşamasına gelinmiştir.
2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	38.500.000	13.500.000	25.000.000	0	% 0,0	Sözleşmeye bağlanan işler için hakediş ödemeleri yapılacaktır.
2023K60-230220	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2026	46.027.000	8.027.000	18.000.000	0	% 0,0	Sözleşme imza aşamasına getirilmiştir.Gelecek 6 aydan itibaren hakediş ödemeleri gerçekleştirilecektir.
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4 (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2026	230.000.000	45.000.000	90.000.000	45.747.605	% 50,8	İhalesi 2023 yılında yapılan projenin ihale süresi 2026 yılında sona erecektir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K60-246748	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2025-2025	306.800.000		306.800.000	8.061.450	% 2,6	
2025K60-246748- 246749	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2025-2025	184.400.000		184.400.000	185.696	% 0,1	İhtiyaç duyulan donanımlar temin edilmekte olup ödemeler kabullerinden sonra ödemeler gerçekleştirilecektir.
2025K60-246748- 246750	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2025-2025	95.600.000		95.600.000	3.641.354	% 3,8	Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu lisanslar temin edilmektedir.
2025K60-246748- 246751	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2025-2025	11.500.000		11.500.000	1.292.000	% 11,2	İKBS ve Belgent ödemeleri yapılmaktadır.
2025K60-246748- 247713	Bakanlık Web Sitesi Altyapı Platformu Modernizasyonu	2025-2025	11.100.000		11.100.000	446.400	% 4,0	Proje kapsamında ihaleler yapılmıştır. Kabuller yapılacaktır.
2025K60-246748- 247716	CA Api Gateway Lisans Hizmet ve Bakım	2025-2025	2.500.000		2.500.000	2.496.000	% 99,8	Proje kapsamında lisans temini yapılmıştır.
2025K60-246748- 247719	Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama	2025-2025	1.700.000		1.700.000	0	% 0,0	Sözleşme yapılmış olup 31.12.2025 tarihinde hakediş ödemesi yapılacaktır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K60-259557	Merkezi Yapay Zeka Çözümleri (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2025-2026	10.000.000		5.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında donanım malzemesi temini yapılmış ödemesi temmuzda yapılmıştır.
2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	4.670.000	1.870.000	2.800.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 2024 yılında ihale yapılmış olup 2025 yılında devam etmektedir.
2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi (Çevre Sektörü)	2024-2025	16.600.000	3.600.000	13.000.000	3.684.727	% 28,3	Proje devam etmekte olup İkişer aylık hakediş ödeleri yapılmaktadır.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Yönetimi Genel Müd. ile Ortak Proje- Ödeneği Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müd.ne aktarıldı) (Çevre Sektörü)	2021-2026	24.564.000	7.400.000	3.500.000	0	% 0,0	Söz Konusu proje kapsamında hizmet ve yazılım geliştirilmesi işi için sözleşme imzalanmıştır hakediş dönelerinde ödemeleri yapılacaktır.
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	315.164.000	134.900.000	166.600.000	7.384.241	% 4,4	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	597.497.000	54.897.000	422.600.000	53.809.055	% 12,7	
		GENEL TOPLAM	912.661.000	189.797.000	589.200.000	61.193.296	% 10,4	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	72.840.000	53.840.000	9.000.000	2.143.089	% 23,8	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibariyle sona ermiştir. 2.Bileşen olan teknik yardım sözleşmesinin nihai raporu 11/12/2024 tarihinde onaylanmıştır. Nihai ödemesi 21/01/2025 tarihinde yapılmıştır. Geri kalan 2 bileşenin uygulaması devam etmektedir. Dört bileşenden biri olan 2. teknik yardım projesinin uygulama aşaması 2024 Yılı Eylül ayında başlamış olup, devam etmektedir.
AB katkısı			453.318.000	340.836.000	55.545.000	12.144.171	% 21,9	
2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2026	4.985.968.000	4.465.918.000	490.257.000	159.352.115	% 32,5	Açıklamalar aşağıda verilmiştir.
	AB Hibesi		4.238.635.000	3.796.635.000	416.697.000	137.362.060	% 33,0	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		308.518.000	275.118.000	31.480.000	10.138.141	% 32,2	
	Mahalli İdare Katkısı		438.815.000	394.165.000	42.080.000	11.851.913	% 28,2	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	72.840.000	53.840.000	9.000.000	2.143.089	% 23,8	
AB KATKISI			453.318.000	340.836.000	55.545.000	12.144.171	% 21,9	
İçmesuyu Sektörü Projesi			4.985.968.000	4.465.918.000	490.257.000	159.352.115	% 32,5	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K05-93010- 103430	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2026	822.962.000	749.978.000	70.056.000	15.904.092	% 22,7	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		699.515.000	637.489.000	59.541.000	13.518.478		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		49.385.000	44.995.000	4.210.000	954.246		
	Mahalli İdare Katkısı		74.062.000	67.494.000	6.305.000	1.431.368		
2019K05-93010- 103433	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2026	1.062.788.000	1.017.932.000	65.000.000	57.894.879	% 89,1	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		903.363.000	865.244.000	55.000.000	50.566.819		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		63.775.000	61.075.000	5.000.000	3.569.423		
	Mahalli İdare Katkısı		95.650.000	91.613.000	5.000.000	3.758.637		
2019K05-93010- 103441	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2026	1.023.198.000	964.517.000	50.802.000	27.275.221	% 53,7	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		869.713.000	819.842.000	43.180.000	23.183.938		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		61.400.000	57.870.000	3.050.000	1.636.513		
	Mahalli İdare Katkısı		92.085.000	86.805.000	4.572.000	2.454.770		
2019K05-93010- 103447	Trabzon Su Tesisi	2019-2026	747.880.000	691.651.000	31.986.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		635.693.000	587.905.000	27.428.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		44.878.000	41.498.000	830.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		67.309.000	62.248.000	3.728.000	0		
2019K05-93010- 149593	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2026	701.184.000	427.729.000	268.578.000	58.277.923	% 21,7	Proje kapsamında ; Müşavirlik işi sözleşmesi 30.08.2023 tarihinde başlamıştır. 2. yapım işi olan yağmursuyu hatları yapımı işinin geçici kabulü 30.11.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapım işi ise 22.01.2024 tarihinde başlamıştır.Uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		596.589.000	364.155.000	228.290.000	50.092.825		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		46.690.000	28.230.000	18.130.000	3.977.960		
	Mahalli İdare Katkısı		57.905.000	35.344.000	22.158.000	4.207.138		
2019K05-93010- 149594	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2026	627.956.000	614.111.000	3.835.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu toplama hattı yapım işinin geçici kabulü 03.03.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi inşaatının uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		533.762.000	522.000.000	3.258.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		42.390.000	41.450.000	260.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		51.804.000	50.661.000	317.000	0		

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025F00-261992	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2025-2025	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	
2025F00-261992-261993	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2025-2025	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	“Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Projesi”nin ihalesi yapılmış ve yüklenici firma ile 2.640.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli sözleşme imzalanmıştır. Projenin hazırlanma süreci devam etmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2027	155.600.000	35.600.000	30.000.000	0	% 0,0	“Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme Projesi Kapsamında ÇED ve EDR Dosyalarının Hazırlanması İşleri” için mali katkı protokolü imzalanmış olup iş devam etmektedir. 2025 yılı içerisinde henüz ödeme gerçekleştirilmemiştir.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2027	29.000.000	0	1.000	0	% 0,0	“Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı” projesinin yapılacağı alana ilişkin İmar Planı çalışmaları henüz ilgili Belediyesince tamamlanmadığından projenin uygulama sürecine başlanılamamıştır.
2025F00-254757	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Yapımı (Turizm Sektörü)	2025-2027	40.750.000		14.999.000	0	% 0,0	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Yapımına ait uygulama projelerinin hazırlanması kapsamındaki proje hizmet alımı iş ve işlemlerine devam edilmektedir. Uygulama projelerinin hazırlanmasını müteakip mali katkı protokolü hazırlanacak olup daha sonra ilgili idaresince yapım ihalesine çıkılacak ve yapım işine başlanılacaktır.
2025F00-254761	Seydikemer Çevre Düzenleme Yapımı (Turizm Sektörü)	2025-2027	40.816.000		20.000.000	0	% 0,0	“Seydikemer (Muğla) Çevre Düzenleme Yapım İşleri” kapsamında 2025 yılı ödeneği olan 20.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle mali katkı protokolü imzalanmış olup işin ihalesi Seydikemer (Muğla) Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.
2025F00-262857	Uzundere Tortum Şelalesi Çevre Düzenlemesi (**.Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2025-2025	22.000.000		22.000.000	0	% 0,0	“Uzundere (Erzurum) Tortum Şelalesi Çevre Düzenleme Yapım İşleri” kapsamında 22.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle mali katkı protokolü imzalanmış olup işin ihale süreci devam etmektedir.
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (**.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2027	398.171.000	120.000.000	78.420.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2018K05-18615-63117	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2027	160.000.000	45.000.000	30.000.000	0	% 0,0	Korunan alan statüsündeki yerleşim yerlerine yönelik içmesuyu temin talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirme aşamasında olup, uygun bulunan projelere ilişkin mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615-141350	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2027	238.171.000	75.000.000	48.420.000	0	% 0,0	Korunan alan statüsündeki yerleşim yerlerinin içmesuyu teminine yönelik talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmekte olup, uygun bulunan projeler için mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (**. Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2027	369.224.000	87.000.000	58.451.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2021K06-161764-199492	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2027	225.000.000	55.000.000	30.000.000	0	% 0,0	"İhlara (Aksaray) Belediyesi İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı 1. Etap Yapım İşİ" kapsamında İhlara (Aksaray) Belediye Başkanlığıyla 5.000.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.
2021K06-161764-199500	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2027	144.224.000	32.000.000	28.451.000	0	% 0,0	Korunan alan statüsündeki yerleşim yerlerinin atıksu bertarafına yönelik talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmekte olup, uygun bulunan projeler için mali katkı protokolü hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2026	52.524.000	33.500.000	16.024.000	0	% 0,0	
2017K09-3807-92807	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2026	13.705.000	8.000.000	4.705.000	0	% 0,0	1)Muğla İli Seydikemer ilçesi Özel Çevre Koruma Bölgesi 3000 Ha lık Alanın Fotogrametrik Halihazır Alım işi ihale edildi. 2)İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Alım işi ihale edildi.
2017K09-3807-92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2026	18.996.000	13.500.000	4.836.000	0	% 0,0	1-Datça-Bozburun Öçkb, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları Ve Kentsel Tasarım Rehberi İşİ (Tarım Bakanlığı Ve Kültür Bakanlığı Görüşü Bekleniyor 247.800,00 TL) 2-Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu Yapımı İşİ - Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu Tİ İş Devam Ediyor. (Tarım Bakanlığı Görüşü Bekleniyor 159.300,00 TL) 3-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kırı Kesimi 1.Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Ve Plan Açıklama Raporu Yapımı İşİ Kurum Görüşü Beklendiğinden İş'in Süresi Durduruldu 61.000.00 TL +KDV

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807- 92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2026	6.823.000	4.000.000	2.483.000	0	% 0,0	01.000,00 TL + Kdv) 4-Gümüşhane İli Merkez İlçesi Süleymaniye Kayak Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Ve Plan Açıklama Raporu Yapımı İşi (Sözleşme İmzalandı 1.290.000,00 TL + Kdv) 5-Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve Plan Açıklama Raporu Yapımı İşi (İhale Öncesi İşlemler Devam Ediyor) 6-Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt Hazırlanması İşi (İhale Öncesi İşlemler Devam Ediyor) 7-İmar Planı Paftalarının Taranması Ve Koordinatlandırılması İşi (İhale Öncesi İşlemler Devam Ediyor)
2017K09-3807- 92809	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2026	13.000.000	8.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Trabzon ili Çaykara İlçesinde 74 ha lık alanda yapılacak "Uzungöl Mahallesi İmar uygulaması İşi" için Çaykara Belediyesi ile Protokol imzalanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	2021-2026	37.680.000	19.680.000	13.500.000	3.729.000	% 27,6	
2021K10-169752-183737	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2025	21.680.000	17.680.000	4.000.000	3.729.000	% 93,2	2.Ara Rapor sunulmuş olup; 2.Hakediş ödemesi yapılmıştır.Proje çalışmaları devam etmektedir.
2021K10-169752-228254	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2024-2026	12.000.000	2.000.000	8.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında arazi çalışmaları devam etmektedir.
2021K10-169752-246728	Pamukkale Travertenlerindeki Mikroorganizmaların İzlenmesi ve Araştırılması	2025-2026	4.000.000		1.500.000	0	% 0,0	Projenin ihalesi 18.07.2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2025	11.500.000	3.420.000	8.080.000	0	% 0,0	
2021K10-161752-225373	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama	2024-2025	6.200.000	990.000	5.210.000	0	% 0,0	Karaburun-İldır ÖÇK Bölgesin doğal, tarihi, kültürel değerleri ve sosyoekonomik yapısını bütünlük alan yönetimi yaklaşımı ile sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde planlayarak korumayı ve yönetmeyi amaçlayan projenin ihalesi, 2025 yılı içerisinde bütçe revizyonu sonrasında yapılacak olup, 2025-2026 yıllarını kapsayacak şekilde yürütülmesi planlanmaktadır.
2021K10-161752-228257	Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.800.000	1.260.000	1.540.000	0	% 0,0	2025 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-161752-236211	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.500.000	1.170.000	1.330.000	0	% 0,0	22-23-24-25 Ekim 2024 tarihlerinde yönetim planı toplantısı gerçekleştirildi. Bölgede yetki ve sorumluluk sahibi olan taraflardan bölgeye yönelik sorunlar ve çözüm önerileri alınarak ve elde edilen bilgiler ışığında detaylı sorun analizleri yapılarak ideal hedefler, uygulama hedefleri ve zaman çerçevesi, kurumsal ihtiyaçları ve diğer kaynak ihtiyaçlarını içeren faaliyet planları belirlenerek Yönetim Planı çalışmasının %45'i tamamlanmış olup, proje devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	14.794.000	7.794.000	7.000.000	6.466.074	% 92,4	PROJE TAMAMLANMIŞ OLUP TÜM HAKEDİŞLER ÖDENMİŞTİR.
2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	2.900.000	1.200.000	1.700.000	860.000	% 50,6	2. YIL ÖN RAPOR TESLİM EDİLMİŞ OLUP 3.HAKEDİŞ ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2026	15.500.000	6.500.000	4.000.000	698.400	% 17,5	2025 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
2017K10-3827- 20858	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı	2017-2026	15.500.000	6.500.000	4.000.000	698.400	% 17,5	
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2027	3.012.837.000	890.190.000	592.000.000	475.642.506	% 80,3	2025-4 numaralı hakediş ödenmiş olup iş devam etmektedir. Haziran 2025 itibariyle mali gerçekleşme oranı % 80,35'tir.
	Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)		1.193.737.000	271.090.000	250.000.000	218.599.000	% 87,4	
	Döner Sermaye Ödeneği		1.819.100.000	619.100.000	342.000.000	257.043.506	% 75,2	
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı		1.285.000.000	485.000.000	250.000.000	200.850.889	% 80,3	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	8.500.000	2.670.000	3.700.000	0	% 0,0	Projenin 1. Ara Raporu 2024 yılı içerisinde sunulmuş olup ödemesi yapılmıştır. 2. Ara Rapor 2025 yılı Haziran ayı içerisinde sunulmuştur. 2. Hakediş ödemesi için çalışmalar devam etmektedir.
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	6.275.000	1.600.000	2.600.000	0	% 0,0	Projenin 1. Ara Raporu 2024 yılı içerisinde sunulmuş olup ödemesi yapılmıştır. 2. Ara Rapor 2025 yılı Mayıs ayı içerisinde sunulmuş olup 2. Hakediş ödemesi için evraklar 04.07.2025 tarihinde Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmiştir.
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme (Çevre Sektörü)	2024-2027	33.300.000	0	9.000.000	0	% 0,0	Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yetkilendirme yapılması suretiyle devam etmiştir. 2025 yılı için de aynı yöntemle koruma izleme faaliyetlerine devam edilecektir. Bu kapsamda Samsun İl Müdürlüğüne ihaleyi başlatması için talimat verilmiştir. Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4734 sayılı Kanun Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılmış olup ihaleye ait ödeme bilgileri tarafımıza iletildikten sonra bütçede gerekli kısımlar serbest bırakılacaktır.
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2026	10.500.000	1.500.000	4.000.000	0	% 0,0	Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa illeri Anıt Ağaç Rehabilitasyonu hizmet alım işi ihalesi 30.06.2025 tarihinde yapılmış olup sözleşme imzalanma aşamasındadır. 2025-2026 yıllarında yapılacak projede toplam 9.000.000 (KDV dahil) bütçe kullanılacaktır.Proje bedelinin %45'i 2025 yılının ikinci yarısında, %55'i 2026 yılının ilk yarısında ödenecektir.
2025K10-246738	Derin Su Sert Mercanları Biyoçeşitlik Tespiti (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2025	2.700.000		2.700.000	0	% 0,0	PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. 1. HAKEDİŞ İMZALANMIŞ OLUP ÖDEME AŞAMASINDADIR.
2025K10-246740	Metruk Tuzlası Sulakalan Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2025	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	"Metruk Tuzlası Sulakalan Rehabilitasyonu" projesi için mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246685	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	23.000.000		16.000.000	0	% 0,0	
2025K10-246685-246686	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında arazi çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246685-246687	Fethiye-Göcek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Projenin Ön Raporu 2025 yılı içerisinde sunulmuş olup ödemesi yapılmıştır.
2025K10-246685-246688	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Projenin Ön Raporu 2025 yılı içerisinde sunulmuş olup ödemesi yapılmıştır.
2025K10-246685-246689	Belek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında arazi çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246685-246690	Göksu Deltası ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.500.000		1.500.000	0	% 0,0	18.07.2025 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecektir.
2025K10-246685-246744	Kum Zambağı Koruma ve İzleme	2025-2025	3.500.000		3.500.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup; proje sözleşme aşamasındadır.
2025K10-246685-246745	Göcek Semenderi Koruma ve İzleme	2025-2025	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup; proje sözleşme aşamasındadır.
2025K10-246685-246746	Datça Hurması Koruma ve İzleme	2025-2026	4.000.000		1.500.000	0	% 0,0	19.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup; arazi çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246685-246747	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2025-2026	3.500.000		1.500.000	0	% 0,0	02.05.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup; arazi çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246685-246752	Karakulak Popülasyonlarının İzlenmesi ve Araştırılması	2025-2026	4.500.000		2.000.000	0	% 0,0	19.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup; arazi çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246753	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Araştırma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2027	16.000.000		4.500.000	0	% 0,0	
2025K10-246753- 246754	Göksu Deltası ÖÇKB Karasal Alanlarda Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	4.500.000		750.000	0	% 0,0	İhale ödeneği, işi yapılması için yetersiz olduğundan, ödenek aktarımı talep edilmiştir.
2025K10-246753- 246757	Uzungöl ÖÇKB Denizel ve Karasal Alanlarında Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	5.000.000		1.000.000	0	% 0,0	İhale işlemleri devam etmekte olup, ihale ilanı yayımlanmıştır. 209.07.2025 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
2025K10-246753- 246759	Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Alanlarında Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	6.500.000		2.750.000	0	% 0,0	İhale işlemleri devam etmektedir. Henüz ihale ilanı yayımlanma aşamasındadır.
2025K10-246766	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyon (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	5.250.000		3.000.000	0	% 0,0	PROJENİN PROTOKOL İMZA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR.
2025K10-246767	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2027	24.000.000		6.000.000	0	% 0,0	TEKNİK ŞARTNAME ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.
2025K10-246771	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Deniz Çayırı Koruma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	8.000.000		4.000.000	0	% 0,0	PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. 1. HAKEDİŞ İMZALANMIŞ OLUP ÖDEME AŞAMASINDADIR.
2025K10-246776	Erdek Körfezi Pina Katılımı ve Büyüme Tespiti (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	9.000.000		4.500.000	0	% 0,0	PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. 1. HAKEDİŞ İMZALANMIŞ OLUP ÖDEME AŞAMASINDADIR.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödenegi							
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.640.182.000	374.060.000	386.904.000	223.026.400	% 57,6	
15 Proje		DÖNER SERMAYE	2.739.639.000	836.594.000	569.271.000	264.369.580	% 46,4	
		GENEL TOPLAM	4.379.821.000	1.210.654.000	956.175.000	487.395.980	% 51,0	
1 Proje		Belediye Katkısı	1.285.000.000	485.000.000	250.000.000	200.850.889	% 80,3	
		Kamu laştırma	0	0	0	0		

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2027	8.100.000	5.100.000	650.000	339.151	% 52,2	
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2026	20.000.000	6.500.000	5.000.000		% 0,0	
2025K07-245708	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	7.500.000.000		7.500.000.000	0	% 0,0	** Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından KÖYDES Projesi ödeneği 6,5 Milyar TL olarak revize edilmiştir. KÖYDES Projesi Cumhurbaşkanlığı kararı 15 Mayıs 2025 Tarihinde yayımlanmıştır. Karar ekinde belirtilen ödeneklere göre illerimizden programları istenilmiştir. Gelen programların kontrolleri yapılarak Bakan Oluruna sunulmuştur. 30.06.2025 tarihinde KÖYDES Projesi programlarının Bakan Oluru imzadan çıkmıştır. İllerimize onaylanan programlar gönderilerek iş ve işlemlerine başlamaları istenilmiştir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	7.528.100.000	11.600.000	5.650.000	339.151	% 6,0	

Dipnot: 231

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLÎ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K01-246700	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2025-2025	20.500.000		20.500.000	0	% 0,0	
2025K01-246700- 246701	Harita Alımları	2025-2025	250.000		250.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
2025K01-246700- 246702	Plan, Proje Alımları	2025-2025	250.000		250.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
2025K01-246700- 246703	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2025-2025	20.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2025-2027			335.000.000	325.983.518	% 97,3	335.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış 325.983.518,00.-'e harcama yapılmış olup, 9.016.482,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2025-2027			10.000.000	2.952.597	% 29,5	10.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 2.952.597,00.-'e harcama yapılmış olup, 7.047.403,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.500.000	0	20.500.000	0	% 0,0	
Kamu laştırma			0	0	345.000.000	328.936.115	% 95,3	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormancılık Sektörü)	2023-2027	52.425.000	8.900.000	19.500.000	0	% 0,0	
2023A05-196779-196780	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2026	33.520.000	6.500.000	17.400.000	0	% 0,0	UASİS yazılımı kapsamında yapılacak olan 2. Bakım Sözleşmesi hazırlık süreci devam etmektedir. Bakıma ait ilk ödeme 2025 Aralık ayında ödenmesi planlanmaktadır.
2023A05-196779-196781	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2027	3.255.000	1.250.000	600.000	0	% 0,0	Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) yazılımı için yapılacak güncelleme için gerekli olan veri temini Haziran ayı sonunda gerçekleştirilmiş olup teknik şartnamenin oluşturulması ve ihale süreci çalışmaları başlatılmıştır.
2023A05-196779-225368	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	2024-2026	15.650.000	1.150.000	1.500.000	0	% 0,0	Yıl sonuna kadar atmosferik analizlerin yapılmasına ve KTF kaynak alanlarının tespitine yönelik danışmanlık hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2024-2027	177.200.000	27.200.000	50.500.000	2.023.301	% 4,0	
2024A05-229765- 229766	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2024-2027	137.200.000	27.200.000	30.500.000	2.023.301	% 6,6	Evsel Atık Arıtma Çamurunun Toprak ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi için ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bilecik ili Bozüyük ilçesi Aşağıarmutlu Köyü Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi ile Sivas ili Gemerek ilçesi Yeniçubuk Mahallesi Yukarı Havza Sel Kontrol Uygulaması için ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Çankırı Orta Kırsakal Eymür Karbon Yutak Alanı ve Aksaray Gülağaç Demirci 100. Yıl Karbon Yutak Alanında ilk bahar dönemi için bakım ve tamamlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2 adet entegre mikrohavza rehabilitasyonu projesinin alan belirleme çalışmaları devam etmektedir. Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Oluşturma Çalışmaları: Proje toplamda iki aşama halinde yürütülmüş olup, ilk aşamada 22 ilimizi kapsayan İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine ait bitki türlerinin belirlenmesi çalışmaları 2024 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Projenin 2.aşaması olarak 59 ilimizi kapsayan “Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri İllerine ait Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Oluşturulması” projesi kapsamında ihale işlemlerine başlanılmıştır. İş bitimine müteakip son ödemesi gerçekleştirilerek 2025 yılı sonu itibarıyla proje tamamlanacaktır. Ay Yıldız Müşterek Karargâhı Yeni Karbon Yutak Alanı Oluşturulma Projesi Faz-1 (Bakım): Proje kapsamında 2024 yılı içerisinde ağaçlandırma çalışmaları tamamlanan alanda tamamlama dikimleri, sulama, ot alma vb. faaliyetlerle bakım yapılması planlanmaktadır. Ay Yıldız Müşterek Karargâhı Yeni Karbon Yutak Alanı Oluşturulma Projesi Faz-2, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Karbon Yutak Alan Projesi, Konya İli Selçuklu İlçesi Karbon Yutak Alan Projesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karbon Yutak Alan Projesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Karbon Yutak Alan Projesi için uygulama ihalesi hazırlıkları başlatılmış olup yaklaşık maliyetin belirlenmesine yönelik piyasa araştırmaları devam etmektedir.
2024A05-229765- 248146	Çığ Alanlarının Sağlıklı Ekosisteme Dönüştürülmesi Modeli	2025-2026	40.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi Çığ Tehlike Değerlendirme Projesi tamamlanmıştır. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi Çığ Kontrol Projesi tamamlanmış olup, kontrol etme süreci devam etmektedir. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi Çığ Kontrol Uygulaması için ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. İklim Değişikliğine Uyumlu, Potansiyel Çığ Alanlarında Dayanıklı Bitki Türlerinin Tespiti Araştırma Projesi'nin Makam Olur'u alınması ve ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi (Ormancılık Sektörü)	2024-2027	63.923.000	2.203.000	21.934.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	229.625.000	36.100.000	70.000.000	2.023.301	% 2,9	
1 Proje		UNDP HİBESİ	63.923.000	2.203.000	21.934.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
2017K09-3813- 152319	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2025	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	Geçmiş yıllarda inşaa edilen İl Müdürlükleri binalarında kesin hesap ödemesi gerektiğinde kullanılmaktadır. 2025 yılında ödeme talebi gelmemiştir.
2017K09-3813- 226070	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (**.Döner Sermaye)	2024-2025	57.629.000	19.629.000	38.000.000	30.069.657	% 79,1	İhalesi Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 12.06.2024 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 43.850.000 TL (KDV dahil 52.620.000 TL) üzerinden sözleşmesi 24.07.2024 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı) (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	331.700.000	0	196.700.000	26.868.482	% 13,7	İhalesi Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 14.01.2025 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 214.621.000 TL (KDV dahil 257.545.200 TL) üzerinden sözleşmesi 17.03.2025 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K09-246691	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2025-2025	19.605.000		19.605.000	313.200	% 1,6	
2025K09-246691- 246692	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2025-2025	9.605.000		9.605.000	313.200	% 3,3	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2025K09-246691- 246693	Hizmet Binası Onarımı	2025-2025	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2025K09-246691- 248158	Taşıt Alımı (HİBE)	2025-2025	1.178.000		1.178.000	1.178.000	% 100,0	Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yurtiçi hibe olarak 2 adet binek otomobil (T02) tipi taşıt edinilmiştir.
2025G00-251235	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2025-2025	3.900.000		3.900.000	934.062	% 24,0	
2025G00-251235- 251239	Taşra Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	2025-2025	3.900.000		3.900.000	934.062	% 24,0	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	23.505.000	0	23.505.000	1.247.262	% 5,3	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	390.829.000	20.129.000	235.700.000	56.938.139	% 24,2	
		GENEL TOPLAM	414.334.000	20.129.000	259.205.000	58.185.401	% 22,4	
1 Proje		HİBE	1.178.000	0	1.178.000	1.178.000	% 100,0	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 30.06.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadag 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) <i>(Yapı İşleri Genel Müd. ile Ortak Proje)</i> <i>(**.Döner Sermaye)</i> (Enerji Sektörü)	2024-2026	233.280.000	0	183.280.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet doğrultusunda proje maliyeti revizyonu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülmüştür. İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı <i>(Yapı İşleri Genel Müd. ile Ortak Proje)</i> <i>(**.Döner Sermaye)</i> (Afetler Sektörü)	2024-2026	145.000.000	2.000.000	120.000.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet doğrultusunda proje maliyeti revizyonu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülmüştür. İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2025G00-251235	Lojman Onarımı <i>(SGB-Destek Ortak Proje)</i> (Konut Sektörü)	2025-2025	100.000		100.000	0	% 0,0	
<i>2025G00-251235- 251237</i>	Merkez Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	2025-2025	100.000		100.000	0	% 0,0	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	100.000	0	100.000	0	% 0,0	
Proje		DÖNER SERMAYE						
		GENEL TOPLAM	100.000	0	100.000	0	% 0,0	

Not-1: "GES Kurulumu" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-2: "Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.
