

# 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI

İLİ : AFYONKARAHİSAR  
YILI: 2017 (ARALIK SONU)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  
(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. % (Yıl içi)	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
1	EĞİTİM	Afyon BolvadinYurt İnşaatı (500 Öğrencilik)	2011	2018	30.000.000,00	0	8.000.000,00	6.151.650,16	76	70	İnşaat çalışmaları devam ediyor.
2	GENEL	Afyonkarahisar İş-Kurumu İl Müdürlüğü Hiz. Binası (E+P+İ) YAPIM İşi	2015	2018	5.000.000,00	725.289,82	1.966.000,00	2.123.006,77	100	90	İnşaat çalışmaları devam ediyor.
3	GENEL	Afyon Mrk. Huzurevi İnş. (90 Kişilik) ( E+P+İ )	2011	2019	11.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	Proje İhalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.
4	GENEL	Afyon Mrk. Çocuk Destek Merkezi ( Erkek 30 Kişilik )	2016	2019	7.870.000,00	0	2.400.000,00	2.156.938,81	90	80	İnşaat çalışmaları devam ediyor.
5	GENEL	Sosyal Hizmetler Merkezi + İl Müdürlüğü Hiz Binası YAPIM İşi.	2015	2019	9.900.000,00	0	1.365.800,00	999.507,00	73	65	İnşaat çalışmaları devam ediyor.

İLİ : AFYONKARAHİSAR

YILI: 2017 (ARALIK SONU)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  
(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. %	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
6	EĞİTİM	Afyon Merkez 500 Öğrencilik Yurdu (E-P-İ)	2013	2018	30.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	Proje çalışmaları devam ediyor.
7	GENEL	Afyon Merkez Çocuk Evleri Sitesi( 50 Kişilik) E-P	2017	2017	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	Proje çalışmaları devam ediyor.
8	GENEL	Afyon Emirdağ Davulga J.Krk.Klğ.Hiz.Bin.ve Tesisleri yapım işi.	2017	2019	3.900.000,00	0	390.000,00	0	0	0	Yapım ihalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında
9	GENEL	Afyon Dinar Sosyal Hizmet Merkezi ( E-P )	2017	2017	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	Proje Yaklaşık Maliyet çalışmaları devam ediyor.
10	GENEL	Afyon Sandıklı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ( E-P )	2017	2017	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	Proje Yaklaşık Maliyet çalışmaları devam ediyor.

TOPLAM :

97.890.000,00 725.289,82 24,341.800,00 11.431.201,74

## BOLVADİN 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ




SÖZLEŞME BEDELİ	13.299.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	21.03.2017
BİTİŞ TARİHİ	03.08.2018
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 55
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 50
AÇIKLAMA	Biri idari ( A Blok = Bodrum+2 kat) diğerleri yurt binası (B ve C Blok = Bodrum + 5 kat) olmak üzere 3 Bloktan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 11.600 m2 dir.

## İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



SÖZLEŞME BEDELİ	2.809.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	26.07.2016
BİTİŞ TARİHİ	01.02.2018
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 85
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 90
AÇIKLAMA	Bodrum + Zemin + 2 Kat + Çatı Katından oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 3.033 m2 dir.

## ÇOCUK DESTEK MERKEZİ (ERKEK 30 KIŞILIK) YAPIM İŞİ

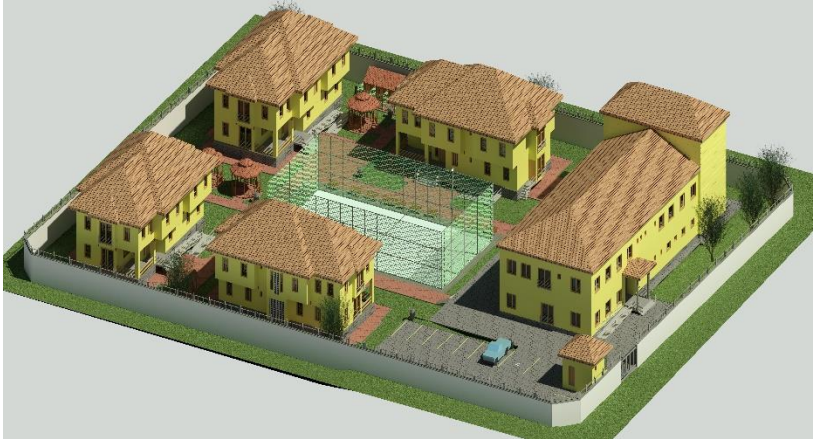

SÖZLEŞME BEDELİ	4.213.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	28.06.2017
BİTİŞ TARİHİ	18.02.2019
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 45
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 50
AÇIKLAMA	Her biri 2 katlı, biri idari diğerleri çocuk yaşam merkezi olmak üzere 5 Bloktan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 2.830 m2 dir.

## SOSYAL HİZMET MERKEZİ + İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ



SÖZLEŞME BEDELİ	5.866.000,00 TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ	17.07.2017
BİTİŞ TARİHİ	29.04.2019
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 20
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 25
AÇIKLAMA	A ve B Bloktan oluşmaktadır. A blok çok amaçlı salon B blok idari bina olmak üzere toplam 4720 m2 inşaat alanı vardır.
