

01 Ocak - 22 Ekim 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu


Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkan V.

24 Ekim 2013

BAKANLIK 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

KODU	AÇIKLAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	554.355.000	554.355.000	402.213.473	% 72,6
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	90.032.000	90.032.000	64.717.756	% 71,9
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	67.600.000	127.292.909	95.706.369	% 75,2
05	CARİ TRANSFERLER	790.787.650	833.387.650	230.424.241	% 27,6
06	SERMAYE GİDERLERİ	219.100.000	863.877.562	516.449.479	% 59,8
	Bakanlık Yatırım Programı	203.100.000	209.667.000	60.792.310	% 29,0
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.000.000	6.000.000	1.457.548	% 24,3
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0	648.210.562	454.199.621	% 70,1
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	136.025.000	136.730.000	87.202.420	% 63,8
	Bakanlık Yatırım Programı	41.331.000	42.036.000	11.581.958	% 27,6
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	94.694.000	94.694.000	75.620.462	% 79,9
08	BORÇ VERME	23.010.000	55.738.000	12.957.127	% 23,2
GENEL TOPLAM		1.880.909.650	2.661.413.121	1.409.670.866	% 53,0

BAKANLIK 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI




BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	73.810.739	19.588.377	% 26,5	
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	165.252.546	110.355.435	% 66,8	
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	20.690.454	9.470.384	% 45,8	
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	222.834.200	99.661.778	% 44,7	
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GN. MD.	792.655.000	208.937.514	% 26,4	
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	31.159.000	10.780.519	% 34,6	
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	22.188.600	5.239.864	% 23,6	
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	39.445.900	15.561.828	% 39,5	
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	9.890.900	5.093.085	% 51,5	
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	3.146.350	2.554.969	% 81,2	
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	2.224.400	725.340	% 32,6	
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	43.256.500	40.766.374	% 94,2	
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.635.600	6.899.840	% 64,9	
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.134.100	2.910.425	% 56,7	
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.078.100	1.762.693	% 34,7	
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.940.900	2.351.056	% 79,9	
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	31.041.300	22.173.723	% 71,4	
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	1.883.600	454.949	% 24,2	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	13.137.500	16.401.733	% 124,8	
İL MÜDÜRLÜKLERİ	BÜTÇE KANUNU İLE VERİLEN ÖDENEKLER	526.383.209	388.360.268	% 73,8
	DİĞER KURUMLARIN YATIRIM ÖDENEKLERİ	638.624.223	439.620.711	% 68,8
TOPLAM	2.661.413.121	1.409.670.866	% 53,0	

(*) Veriler 22 Ekim 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

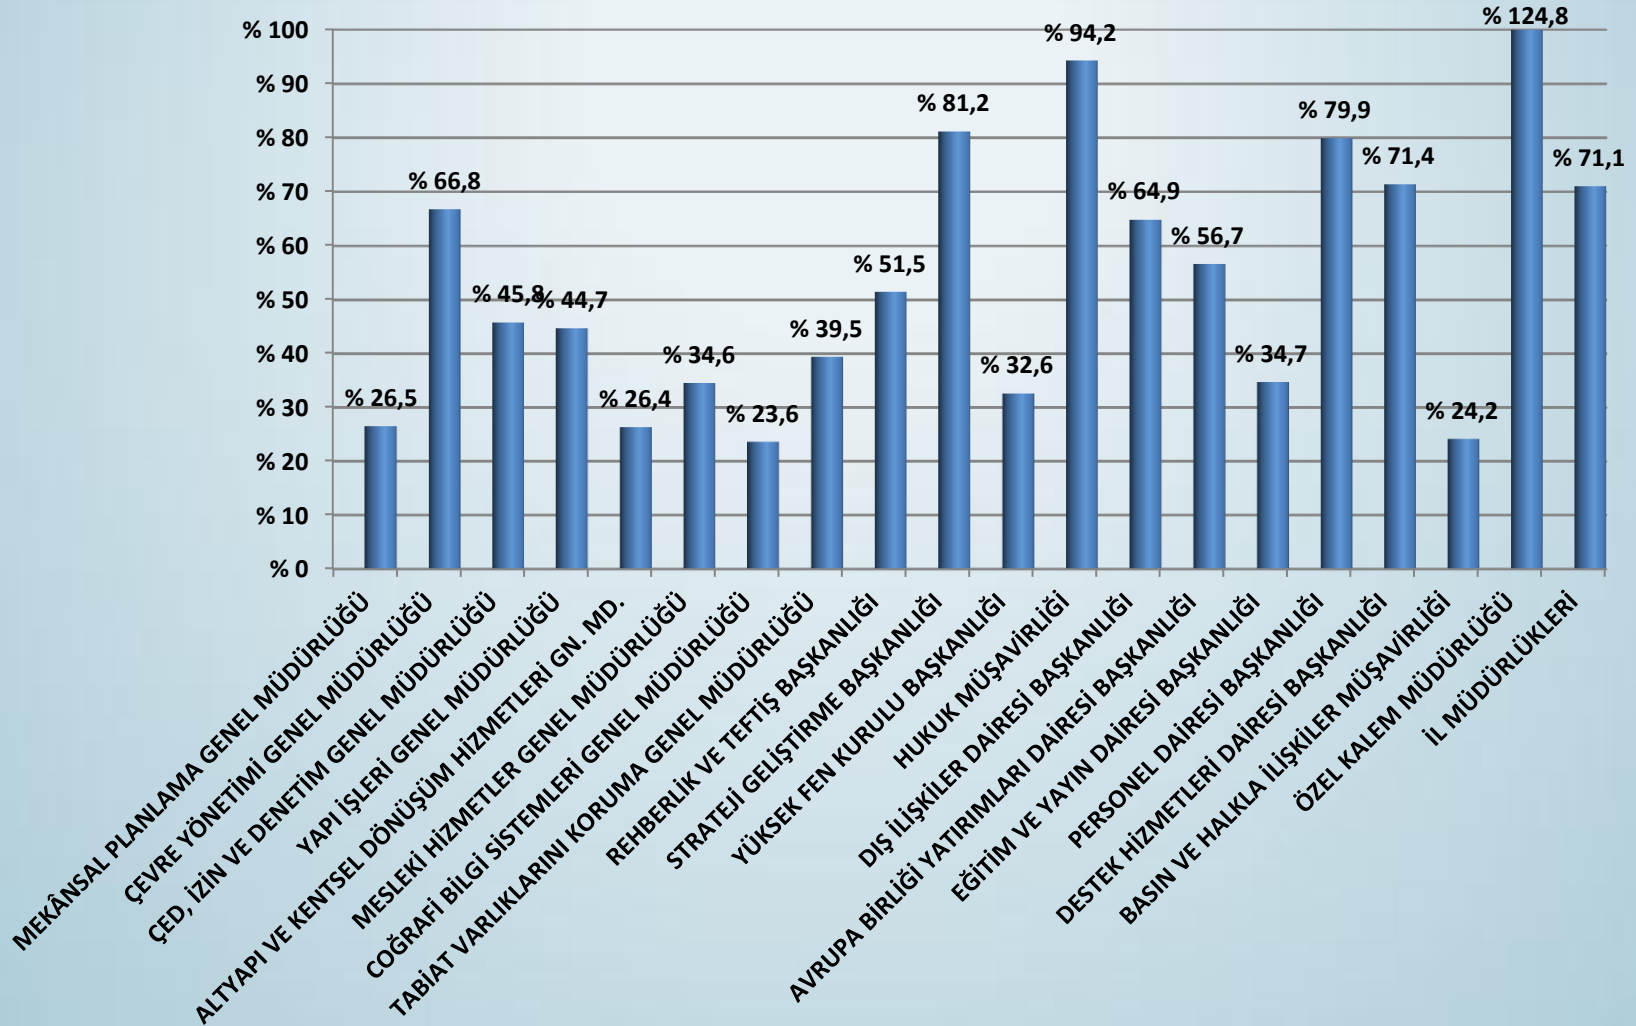


DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELERİ

KURUM	ÖDENEK	HARCAMA	GERÇEKLEŞME
KREDİ VE YURLAR KURUMU GN. MD.	312.620.615	270.101.233	% 79,8
ADALET BAKANLIĞI	67.546.691	21.635.985	% 32,0
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ	62.996.000	59.603.870	% 94,6
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI	49.860.000	26.831.611	% 53,8
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI	39.230.000	20.835.359	% 53,1
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	26.029.895	5.970.011	% 22,9
TÜRKİYE İŞ KURUMU	22.552.064	866.915	% 3,8
DEVLET SU İŞLERİ	14.420.200	11.877.014	% 82,4
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI	8.307.783	2.044.709	% 24,6
MALİYE BAKANLIĞI	8.046.299	3.058.442	% 38,0
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI	7.292.000	2.064.722	% 28,3
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	4.341.246	1.819.955	% 41,9
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI	4.174.380	354.126	% 8,5
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	2.950.000	891.027	% 30,2
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.668.400	1.326.684	% 79,5
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI	1.568.700	0	% 0,0
ANAYASA MAHKEMESİ	1.202.962	201.509	% 16,8
BAŞBAKANLIK	914.904	23.365	% 2,6
EKONOMİ BAKANLIĞI	883.010	40.651	% 4,6
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU	828.159	40.498	% 4,9
DİĞER	10.777.254	24.611.936	% 21,3
TOPLAM	639.823.560	408.652.968	% 57,2

(*) Veriler 22 Ekim 2013 tarihi itibarıyla e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE HARCAMALAR*

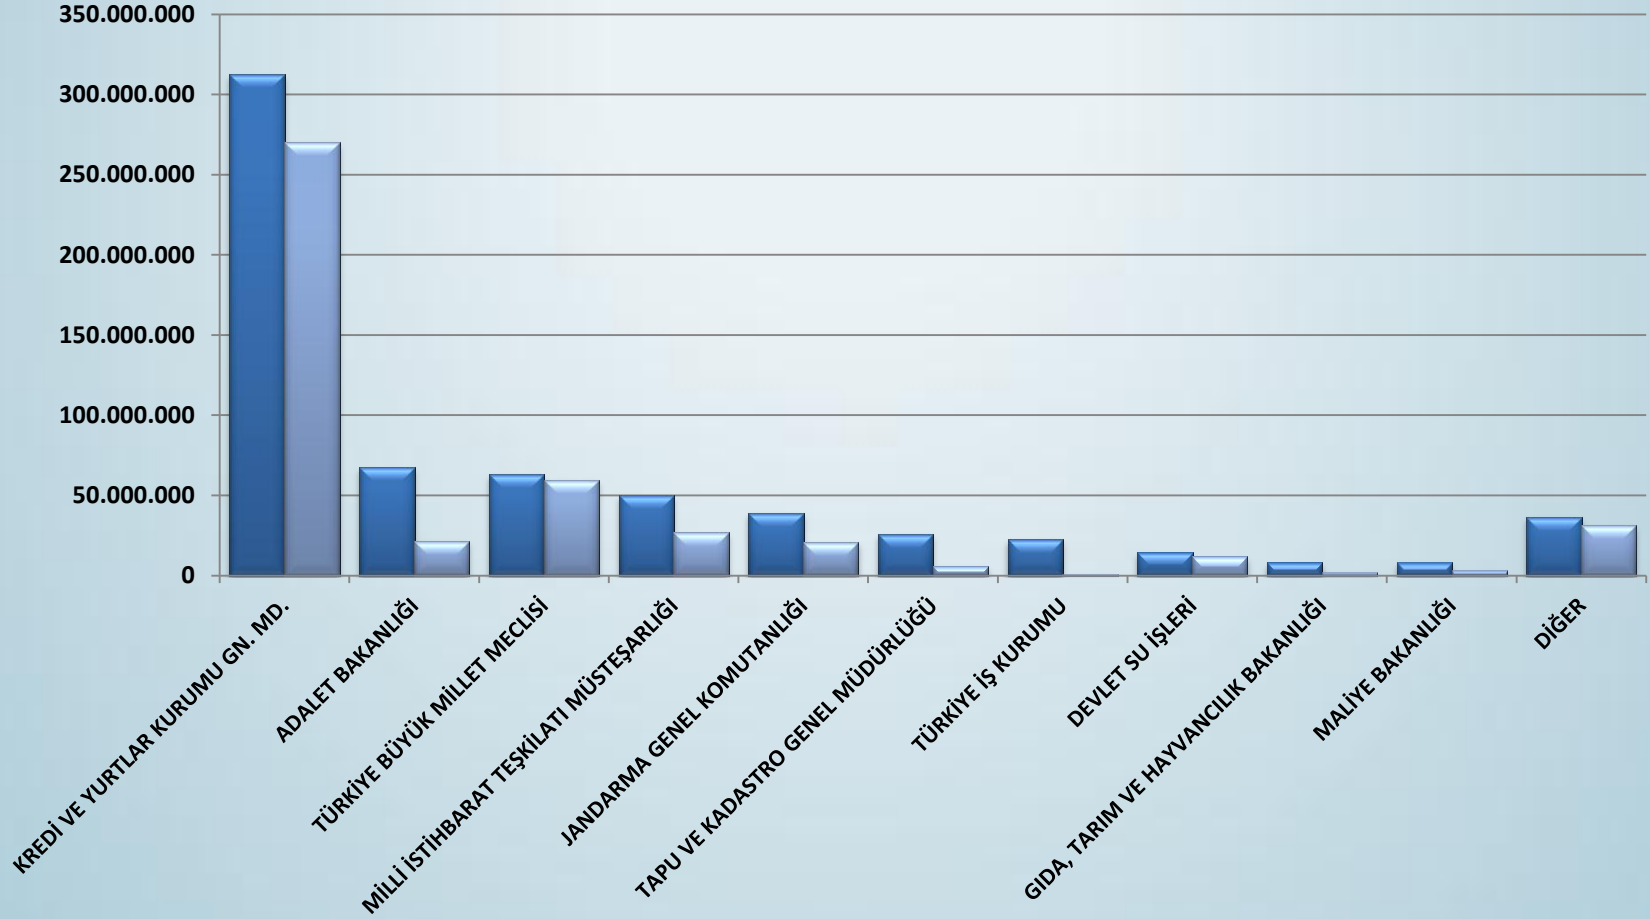


(*) Veriler 22 Ekim 2013 tarihi itibarıyla e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2013		Gerçekleşme (%)
			REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000TL)	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	9	107.264	54.700	7.519	% 13,7
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	22	50.091	16.326	1.540	% 9,4
ÇED, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	5	8.328	4.779	277	% 5,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	18	792.420	136.235	44.208	% 32,4
Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	7	38.274	4.755	642	% 13,5
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	12	46.109	10.990	4.192	% 38,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	5	23.434	16.899	699	% 4,1
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	41.166	30.913	9.570	% 31,0
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	7	8.398	2.944	1.742	% 59,2
Eğitim Ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	1.600	1.600	171	% 10,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri (DETAY)	4	63.938	31.150	14.209	% 45,6
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	1	1.150	1.150	561	% 48,8
GENEL TOPLAM	105	1.182.172	312.441	85.330	% 27,3

BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

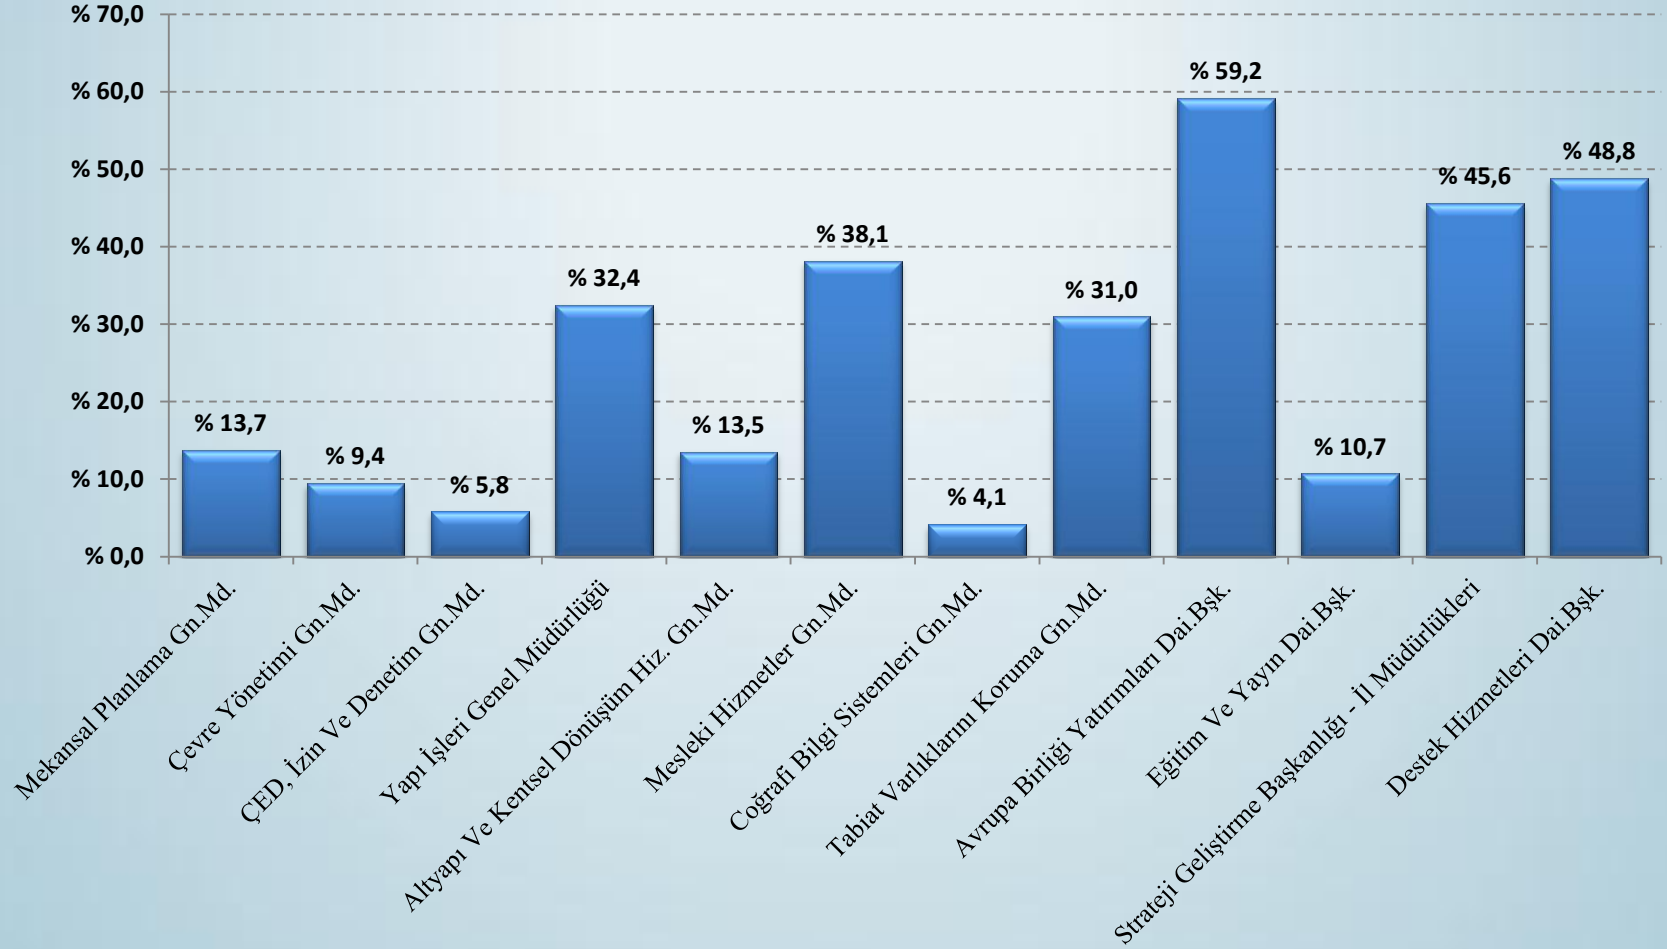

Harcama Birimi Bazında Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları Belirleme (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2014	1.000		500	0	% 0,0	840.950 TL bedelle ihalesine çıkılmış teklifler açılmış değerlendirme aşamasındadır.
2007F000100	İmar Uygulamaları (*) (Turizm Sektörü)	2007-2015	53.095	16.437	11.500	2.180	% 19,0	1970 'li yıllardan beri süregelen bu proje kapsamında 2013 yılında da Turizmde Öncelikli Yöre Belediyelerine(TÖYB) projeye esas mali yardım yapılmaya devam edilmekte, bu kapsamda TÖYB belediyelerinden gelen yapım ve düzenleme işlerine ait projeler değerlendirilmiş ve 2013 yılı bütçemizde yer alan 11.500.000 TL lik Turizm Düzenleme Ödeneği 116 Belediyeye projelerinin tamamlanmasına mütakiben gönderilmektedir.
2007K090150	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2007-2013	4.389	4.089	300	100	% 33,3	İlbank Yönetim Kurul Kararı imzalanmış olup, protokol ve sözleşme imzalanma aşamasındadır. 200.000 TL'si ödenek İbanka Aralık ayı itibariyle aktarılacaktır.
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.450		1.350	0	% 0,0	Afyon- Uşak- Kütahya Çevre Düzeni Planı İhalesine 1.310.000TL bedelle çıkılmış olup teklifler açılmış süreç devam etmektedir. İhale sonucu kalan bakiye İbanka Aralık ayı itibariyle aktarılacaktır.
2010K090120	Kıyı Master Planı (Şehirleşme Sektörü)	2010-2013	5.550	2.500	3.050	0	% 0,0	İlbank Yönetim Kurul Kararı imzalanmış olup, protokol ve sözleşme imzalanma aşamasındadır. 3.050.000 TL'si ödenek İbanka Aralık ayı itibariyle aktarılacaktır.
2010K090110	Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2010-2013	1.000	500	500	0	% 0,0	577.020 TL bedelli ihalesinin 1.hakedisi 173.106 TL'si (%30'u) 2012 yılında ödenmiş olup geriye kalan 403.914 TL'si (%70'i) ödenecektir. Toplamda 403.914 TL harcama öngörülmektedir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2013	34.780	2.280	32.500	5.092	% 15,7	<p>İstanbul İli Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mh. Kentsel Dön.Projesi, İstanbul ili Avrupa Yakası 3.Havalimanı projesini kapsayan yaklaşık 8.000ha alana ilişkin Etütlerin Hazırlanması ile Mania Planlarının Aktarıldığı İmar Planlarının Teknik Çizimi işi,</p> <p>Kahramanmaraş İli Merkezinde Riskli Alan ilan edilen 29.9 Hektar Büyüklüğündeki bölge ve çevresinin 6306 sayılı Kanun Kap. Değ. amacıyla Mikrobölgeleme Etütleri Yap.ve Rap.Haz. İşi,</p> <p>İstanbul 1. Etap Mikrobölgeleme etütleri İşi,</p> <p>İstanbul 2.Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,</p> <p>İstanbul 3. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,</p> <p>İstanbul 4. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,</p> <p>İstanbul 3. Havalimanı sahasına ait zemin etütleri İşi,</p> <p>Tokat ili Reşadiye ve Niksar İlçesi 544,70ha Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap. Hazırlanması işi,</p> <p>Tokat ili Erbaa İlçesi 1115,34 ha Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap. Hazırlanması işi,</p> <p>Ağrı Merkez İlçesi 100.yıl Mah 250ha alan Sayısal Halihazır Harita Yapım işi, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi İşleri için <u>KDV Dahil 8.427,060 TL</u> ödeme yapılması öngörülmektedir.</p> <p>Eskişehir ili Odunpazarı Etüt İşi için 86.657 TL,</p> <p>Ankara İli Çankaya İlçesi Karakusumlar Mah. İmar Planı <u>81.184 TL KDV Dahil</u> bedelle ihalesi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>1/5000 ölçekli Kentsel Tasarım Proje Alanı ile Çevresel Değerlendirme Raporu ve Ön Animasyon İşleri için 1.835.540TL aktarıma yapılmıştır.</p> <p>Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kentsel Tasarım Projesi işinin ihalesine çıkmış olup <u>2.000.100 TL KDV Dahil</u> bedelle gerçekleştirilecektir.</p> <p>Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kentsel Tasarım Uygulama Projesi işi için 11.800.000 TL bedelle ihale çalışmaları yapılmakta olup, bu işe ait karakteristik değişikliğinin Kalkınma Bakanlığından uygun görüşü alınması halinde bu projeden ihalesi yapılacak ancak kabul edilmemesi halinde söz konusu adı geçen ödenğin Kentsel Dönüşüm hesabına aktarılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.</p> <p>2013 yılı içerisinde kullanılmayacağı düşünülen 2.000.000 TL'si ödenek yıl sonunda iade edileceği bildirilmiştir. Kalan 6.179.459 TL ödenek Yenişehir İmar Planları için Kentsel Dönüşüm hesabına aktarılacaktır.</p> <p>Toplamda 32.500.000 TL harcama öngörülmektedir.</p>

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090020	Marka Kentler Oluşmasına Yön. Özel Projeler Prj. (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	3.500		3.500	147	% 4,2	Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı Kentsel Tasarım Projesi işi 147.264 TL (KDV DAHİL) Bedel üzerinden 04.04.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup ödeme aşamasındadır. Trabzon İli, Beşirli Bölgesinde,Dolgu Alanı İmar Planı ve Rekreasyon Amaçlı Kıyı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi Yapımı Hizmet Alım İşi 1.852.000 TL'si bedelle ihale çalışmaları yapılmaktadır. *2013 yılı içerisinde kullanılmayacağı düşünülen 3.000.000TL ödenek iade edilmiş bunun 1.500.000TL'si CBS'ye geriye kalan 1.500.000 TL'si Bina Onarım işine aktarılacaktır. Toplamda 3.500.000TL harcama öngörülmektedir.
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşİ	2013-2014	2.500		1.500	0	% 0,0	İlbank Yönetim Kurul Kararı imzalanmış olup, protokol ve sözleşme imzalanma aşamasındadır. 1.500.000 TL'si ödenek İlbanka Aralık ayı itibariyle aktarılacaktır.
		TOPLAM	107.264	25.806	54.700	7.519	% 13,7	54.700.000 TL harcama öngörülmektedir.

(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012F000090	Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (Turizm Sektörü)	2012-2014	2.000	500	1	0	% 0,0	Proje ile ilgili çalışmalara devam etmekte olup şimdiye kadar Bakanlığımıza başlangıç ve 1. ara raporları sunulmuştur.
2012K100070	Çevresel Açından Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2012-2015	1.900	0	718	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup sözleşme aşamasındadır. 2013 bütçesi 718.000 TL iken projenin 2015 yılına sarkmasıyla 2013 yılında 200.000 TL ödenecek olup 518.000 TL'lik ödeme ise 2015 yılına ötelenmiştir.
2011K100080	Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (Çevre Sektörü)	2011-2013	1.965	750	1.215	373	% 30,7	<p>Proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, şimdiye kadar 3 adet ara rapor Bakanlığımıza teslim edilerek onaylanmıştır. Projeye ilişkin final raporu Aralık 2013 tarihinde teslim edilecektir.</p> <p>-Proje kapsamında denizlerimiz için seçilen parametreler için kirlilik haritaları hazırlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>- Deşarj kriterlerinin belirlenmesine ilişkin yöntem önerileri sunulmuştur.</p> <p>-Kıyı sularının tipolojilerinin belirlenmesi için uygun yöntem seçilmiş olup, kıyı ve geçiş sularının sınıflandırılması işi devam etmektedir.</p> <p>- Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi kapsamında denizlerinin durumunu tanımlamak için belirlenmiş olan 11 göstergelere göre ülkemizdeki çeşitli Deniz Bilimleri enstitüleri ile işbirliği içerisinde tüm veriler biraraya getirilmektedir.</p> <p>-Bu göstergelerin her biri için mevcut durum ve direktife uygun izleme, değerlendirme yöntemleri belirlenmeye devam etmektedir.</p> <p>-11 göstergeden özellikle deniz çöpleri için bir taslak değerlendirme ve önlem programı oluşturulmuştur.</p> <p>- Ulusal İzleme Enstitüsü'nün kurulması için gerekli fizibilite çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>- Proje kapsamında tüm paydaşların, ilgili kurumların ve enstitülerin katılımı ile 2 adet çalıştay yapılmıştır.</p> <p>-Yabancı bir uzmanın katılımı ile bilgi paylaşımı toplantısı yapılmıştır.</p>

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100080	Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2013-2015	1.800		900	0	% 0,0	
	Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu	2013-2014	600		200	0	% 0,0	Proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz bir ödeme yapılmamıştır.
	Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması	2013-2013	200		200	0	% 0,0	Proje 19.08.2013 tarihinde başlatılmış olup, 01/10/2013 tarihinde açılış çalışmaları icra edilmiştir. Teknik Şartname uyarınca herhangi bir ödeme yapılmamıştır. (*7. Proje kapsamında sunulacak ara raporun İdarece uygun bulunarak kabul edilmesinin ardından sözleşme bedelinin % 60'ı final raporunun İdarece uygun bulunarak kabul edilmesinin ardından sözleşme bedelinin geri kalan % 40'ı yükleniciye ödenir.)
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (1. Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi)	2013-2014	800		420	0	% 0,0	02.09.2013 tarihi itibarı ile ihale iptal olmuştur. Tekrar ihaleye çıkmak üzere ihale süreci başlatılarak, 21 Ekim 2013 günü yeni ihale yapılacaktır.
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi)	2013-2015	200		80	0	% 0,0	12.08.2013 tarihinde, ihale sonucu firma ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca 12.09.2013 tarihi itibarı ile aylık rapor tarafımıza sunulmuş ve incelemesi yapılmaktadır.
2011K100120	İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2011-2013	950	300	650	300	% 46,2	2013 yılı sonunda tamamlanması planlanan Proje için 2013 Yılı Yatırım Programında belirlenen bütçe tahsisine uygun olarak harcama yapılacaktır

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100130	İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilerin Belirlenmesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2011-2014	4.000		1	0	% 0,0	
2009K100070	Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2013	430	287	143	128	% 89,5	2013 yılı içerisinde proje kapsamında Almanya'nın REACH Yetkili Mercine Bakanlığımız temsilcileri ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan bir heyetle çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Buna ilaveten, kimyasalların kayıt sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmiş ve hazırlanan sistemin testlerine başlanmıştır. REACH Tüzüğüne uyumlaştıran taslak yönetmelik ve ekleri hazırlanmış olup, mevzuat yayımlandıktan sonra sanayicilere ve ilgilienlere mevzuat ve uygulamalar hakkında daha kolay ve çabuk bilgiye erişebilecekleri bir yardım masası kurulma hazırlıkları tamamlanmış, internet sitesi test yayınına başlamıştır. Proje için 2013 yılı yatırım programına konulan 143 .-TL ödeneğinden 128 TL iç katkı payı ödenmiştir. Proje için 2014 iç katkı payı olarak 79 bin avro ödenek konulması talep edilmiştir.
AB KATKISI			3.205	1.755	1.450	0		
2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirlenmeler Tüzüğüne Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2012-2014	238	117	72	71	% 98,6	Proje 26 Haziran 2013 tarihinde resmen başlamış olup söz konusu projeye ilişkin açılış semineri de 25 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Teknik Yardım kapsamındaki bu projede, kapasite artırmaya yönelik eğitimler verilecek olup haklı bilgilendirilmesi için de seminer, toplantılar gerçekleştirilecek ve taslak mevzuat hazırlanacaktır. Projenin toplam bütçesi 925.000 avro olup, ülke katkısı olarak bugüne kadar yaklaşık 100.000 avrodur. Ülke katkısı olarak bugüne kadar 30.000 avroluk ulusal katkı payı Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. Kalan 70.000 avroluk miktarın ise 2014-2015 yıllarında peyderpey Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılması planlanmaktadır.
AB KATKISI			2.148	843	716	0		
2011K100110	Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2011-2013	545	295	250	115	% 46,0	Projenin Eşleştirme Bileşeni,25 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen Kapanış Toplantısı ile sona ermiştir. 06.10.203 tarihinde resmi olarak tamamlanacaktır. Projenin Teknik Destek Bileşeni 21 Ocak 2013 tarihinde başlamış ve 21 Şubat 2014 tarihinde sona erecek olup, envanter toplanması, yazılım hazırlanması, maliyet değerlendirmesi yapılması ve eğitim programları düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.
AB KATKISI			3.943	1.643	2.300	0		

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2014	690		345	0	% 0,0	İhale süreci başlamış olup PROJENİN 2014 yılında başlaması öngörülmektedir. 2013 yılı için konulan 345.-TL iç katkısı payı; 2014 yılında IPA'nın talebi neticesinde gerçekleşecektir.
AB KATKISI			6.211		2.795	0		
2013K100030	İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2013-2015	2.300		862	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi hazırlanmış olup, Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK ile görüşmelere devam edilmektedir. Proje için 2013 Yılı Yatırım Programında belirlenen bütçe tahsisine uygun olarak harcama yapılması planlanmaktadır.
2010K100110	Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	792	533	198	130	% 65,7	Projenin Twinning (Eşleştirme) ve Tedarik Bileşenleri tamamlanmıştır. Teknik Yardım Bileşeni ise halen devam etmekte olup, 2013 yılı Bakanlık katkısı olan 48.039,35 Euro 2013 yılı içinde ödenecektir. Teknik Yardım Bileşeni 27 Nisan 2014 tarihi itibarıyla sona erecektir.
AB KATKISI			5.590	3.800	1.790	0		
2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2015	296	19	98	92	% 93,9	Proje, 28 Haziran 2013 tarihinde başlamış olup, projenin yatırım bileşeni tamamlanmış, teknik yardım bileşeni çalışmaları ise devam etmektedir.
AB KATKISI			13.297		4.903	0		
2010K100080	Emisyonların Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2013	207	105	102	0	% 0,0	Proje, 11 Haziran 2013 tarihinde tamamlanmıştır.
AB KATKISI			2.720	1.280	1.440	0		
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2011-2014	9.000	0	2.650	0	% 0,0	
	Marmara Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2014	3.650		725	0	% 0,0	İstanbul THM binası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası ile birlikte yapılacaktır.
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2014	3.000		1.050	0	% 0,0	Samsun THM arsa tahsisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı onayı aşamasındadır. Mimarı proje ve etüt çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2014	2.350		875	0	% 0,0	Erzurum THM binası için Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 5 katlı bir binanın onarımı sonrasında kullanımı yönünde çalışmalar devam etmektedir. Zemin sağlamlaştırma vb. süreçler tamamlanma aşamasındadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2012-2014	12.000	0	2.851	0	% 0,0	
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2014	2.900		1.000	0	% 0,0	Konya THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2014	3.300		850	0	% 0,0	İzmir THM arsa tahsisi için milli emlaktan görüş beklenmektedir. Binanın zemin, statik vb. proje çalışmaları sürdürülmektedir.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2014	3.000		1	0	% 0,0	Diyarbakır THM için milli emlaktan arsa tahsisi yapılmadığı için il müdürlüğü binasının bulunduğu arsa üzerinde bina yapımı yönünde çalışmalar devam etmektedir.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2014	2.800		1.000	0	% 0,0	Adana THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı.
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2014	6.300	333	2.230	331	% 14,8	
	Samsun, Erzurum, İzmir, Konya, Ankara, Diyarbakır ve Adana Temiz Hava Merkezlerine Bağlı İllerde Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi	2010-2014	6.300	333	2.230	331	% 14,8	Erzurum-İzmir THM hava kalitesi ön değerlendirme projesi için 2 dönem ara raporun hakedişi yapılmıştır. Adana ve Konya THM ihalesi gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi ölçüm araçlarının yenilenmesi projesinin 28.09.2013 tarihi itibarı ile ihalesi gerçekleştirilmiştir.
2010K100090	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB)	2010-2014	250	156	2	0	% 0,0	Projenin Eşleştirme Bileşeni,04 Temmuz 2013 tarihinde tamamlanmıştır.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		5.813	3.080	1.703	0		Projenin Teknik Destek Bileşeni Nisan 2014 tarihinde tamamlanacaktır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100050	Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (Çevre Sektörü) - <i>Dipnotlu Prj.</i>	2013-2013	1.700		1.700	0	% 0,0	
	Referans Emisyon Laboratuvarı Kurulması	2013-2013	585		585	0	% 0,0	Proje ihale edilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Muayene Kabul işlemlerinden sonra yüklenici firmaya ödeme yapılacaktır.
	EMEP (Avrupa'da Hava Kirlenmelerinin Uzun Menzilli Taşınımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı) Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Yenilenmesi Projesi	2013-2013	1.115		1.115	0	% 0,0	Proje ihale edilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Muayene Kabul işlemlerinden sonra yüklenici firmaya ödeme yapılacaktır.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü*) - <i>Dipnotlu Prj.</i>	2013-2014	498		200	0	% 0,0	
	Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi Projesi	2013-2014	498		200	0	% 0,0	Proje, BİT Projeleri hazırlama klavuzuna uygun format ve içerikte revize edilerek Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı'ndan cevap beklenmektedir. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. Kalkınma Bakanlığının 02.10.2013 tarihli yazısı ile projeden harcama yapılması uygun görülmüştür.
2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (1)	2013-2015	230		138	0	% 0,0	Projenin (Teknik Destek) Şartnamesi MFİB ve Avrupa Delegasyonu tarafından onaylanmış olup ihalesinin 2013 yılı 2 nci çeyreğ sonunda gerçekleştirilmesi, proje başlangıcının ise 2014 yılı ikinci çeyreği olması öngörülmektedir.
AB KATKISI			2.070		1.242	0		
2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi	2013-2014	2.000		1.000	0	% 0,0	İşi kapsamında Teknik Şartname işlemleri bitmiş olup ihale işlemlerine başlanılmıştır
TOPLAM			50.091	3.395	16.326	1.540	% 9,4	
AB KATKISI			44.997	12.401	18.339	0	% 0,0	

(*) Proje Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müd. ile ortak.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K100090	Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü)	2012-2013	2.686	1.066	1.620	130	% 8,0	Veri Aktarımı Projesi ve Karar Destek Sistemi Yazılım Projesi adı altında iki parça olarak 04.06.2013 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen projenin her iki kısmı için 20-21.06.2013 tarihlerinde yüklenici firmalarla sözleşme imzalanmıştır. Projeye ait yazılım çalışmaları yıl sonunda tamamlanıp, projenin teslimi yapılacak şekilde çalışmalarımız devam etmektedir.
2013K100100	Çevresel Etiket Altyapısı Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2014	800		230	0	% 0,0	Proje 4 Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır. Proje yönetim planı yüklenici firma tarafından teslim edilmiş, kabulü yönünde değerlendirilmektedir. Kabulün ardından çalışmalarımız yönetim planına uygun devam edecektir.
2013K100040	Çevre Denetim Aracı Alımı (Çevre Sektörü)	2013-2013	2.750		2.750	0	% 0,0	2013 yılında alınması planlanan 40 adet Çevre Denetimi Aracı için 2.550.000-TL ödenek Devlet Malzeme Ofisi'ne aktarılmıştır. Teknik şartname kapsamında araçların ve ekipmanlarının teminine ilişkin DMO nezdinde gerekli işlemler yürütülmektedir.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü*) - <i>Dipnotlu Prj.</i>	2013-2014	1.402		0	0	% 0,0	
	E-Çevre Denetim Süreçleri Otomasyonu Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları Geliştirilmesi	2013-2014	1.402		0	0	% 0,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	690	345	179	147	% 82,1	Proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup, proje kapsamında direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sanayici ve STK'lara 24 adet eğitim verilecektir. Bu tarihe kadar eğitimlerden 3'ü gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin yanında proje kapsamında bir pilot bölge çalışması, Seveso Bildirim Sisteminin yeniden yapılandırılması, AB ülkelerine çalışma ziyaretleri ve halkın konu ile ilgili bilgilendirilmesi kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecektir. 146.679,72-TL tutarındaki ulusal katkı payı 19 Haziran 2013 tarihinde Ulusal Fon Hesabına aktarılmıştır. FAKAT; HARCAMA ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. TOPLAMA DAHİL EDİLMEMİŞTİR.
AB KATKISI			6.400	3.317	1.611	0		
TOPLAM			8.328	1.411	4.779	277	% 5,8	

(*) Proje Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortak.

AB KATKISI	6.400	3.317	1.611	0	% 0,0
------------	-------	-------	-------	---	-------

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Şehirleşme Sektörü)	2010-2014	137.900	4.623	49.315	19.102	% 38,7	Yapımı devam etmektedir.
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2014	1.260	420	500	104	% 20,8	Bilgisayar ve fotokopi makinesi alınmıştır.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	1.130	380	500	300	% 60,0	Proje kapsamında proje arşivi tarama hizmet alımı ve arşiv yazılım temini gerçekleştirilmiştir.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2014	3.500	1.140	1.710	91	% 5,3	Proje kapsamında yeni yazılım ihalesi, mevcut yazılımın bakım-destek ve iyileştirme işi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yeni Yapı Denetim Sistemi yazılımına ilişkin yazılım çalışmalarına başlanılmış, yeni yazılımın analiz-tasarım çalışmaları tamamlanarak yazılımın kodlanmasına başlanılmıştır.
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	2.850	650	700	207	% 29,6	2013 Yılı Kasım ayı içerisinde Bakanlığımızca "Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklik Kapsamında İl Müdürlüklerinin Eğitimi" adı altında eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	4.935	2.000	2.000	152	% 7,6	Yöresel Mimariye uygun Trabzon Kırsalında Tip Konut Projesi temini ihalesi 25.09.2013 tarihinde yapıldı. (12 Tip mimari proje proje müellifince hazırlanıyor.) Bursa, Edirne ve Balıkesir kırsalında tip konut projesi temini ihale çalışmaları devam ediyor. (12x3=36 tip)
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2014	5.420	1.000	1.000	265	% 26,5	Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak bilinmemekle beraber şu ana kadar ödenek problem yaşanmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2014	17.325	8.453	1.000	0	% 0,0	
	Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2014	9.450	3.389	500	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Bu kapsamda Musa Gögebakan, Saçıkara ve Horzum Göç.İsk. Ve Hüseyin Vural Göçebeleri İskanı işleri 2013 yılı yatırım programından çıkarılmıştır. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2014 yılında yapılması planlanmaktadır.
	Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2014	7.875	5.064	500	0	% 0,0	
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2015	179.210	8.269	4.001	0	% 0,0	
	Tahtalı Barajı İskanı	2009-2014	13.210	8.269	1.500	0	% 0,0	İş tasviye edildi. İşin tamamlanmasını müteakip haksahiplerine dağıtımı yapılacaktır. Kalan İşlerin tamamlanması için ödenek revizesi yapılarak 2013 yılında ikmal ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 2014 yılında ise tamamlanması için 2.650.000.- TL ödenek talep edilmektedir. (İhale talimatı Yapım Dairesi Başkanlığınca verilmiştir.)
	İhsu Barajı İskanı	2009-2015	85.471		1.000	0	% 0,0	Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır.
	Yusufeli Barajı İskanı	2009-2015	85.470		1.501	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskan isteyen çıkmamıştır. Fiziksel yerleşim düzenlemesi için çalışmalar devam etmektedir.
2011K070020	Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2014	33.030	0	16.520	10.364	% 62,7	Yapımı devam etmektedir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2014	3.000	1.200	1.200	666	% 55,5	İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama yapılmaktadır.
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2014	5.200	2.700	1.000	0	% 0,0	Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı işi için talep gelecektir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2014	147.700		501	0	% 0,0	
	Gördes Barajı İskanı	2013-2014	3.498		500	0	% 0,0	Manisa-Gördes'te Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin iskanı için yapımı planlanmaktadır. İşin İmar planı yapılmıştır. Yarin tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden istenmiş olup tahsisi beklenmektedir. İşin Projesi Yöresel şartlara göre revize edilmektedir. 2013 yılında tahsisinin alınması halinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
	Alaköprü Barajı İskanı	2013-2014	144.202		1	0	% 0,0	İşin İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup ödeneği DSİ Genel Müdürlüğünden aktarılmaktadır. İş devam etmekte olup 2014 Mart ayında bitirilecektir.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	3.000		550	0	% 0,0	02-05 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir.
1995K070030 (*)	Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1995-2015	136.580	77.560	16.239	7.353	% 45,3	İşler devam etmektedir.
2006K070020 (*)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2015	5.990	2.700	1	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
2011K070040 (*)	Köysel Alanda İç İsk. Düzenlenmesi II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	102.500	16.930	39.497	5.604	% 14,2	İşler devam etmektedir.
2011K070050 (*)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	1.890	105	1	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
TOPLAM			545.460	30.835	80.497	31.251	% 38,8	
TOPLAM-08			246.960	97.295	55.738	12.957	% 23,2	

(*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

Genel TOPLAM	792.420	128.130	136.235	44.208	% 32,4
--------------	---------	---------	---------	--------	--------

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K060110	Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2013-2015	3.644		243	0	% 0,0	Ödeneğin 242.000 TL sinin Afet Risk Haritası Hazırlanması projesine aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanlığı'ndan talepte bulunulmuştur.
2013K080060	Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd Hazırlama Projesi (Belediye Sektörü)	2013-2015	17.905		1	0	% 0,0	
2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Sektörü)	2012-2015	2.530	800	500	308	% 61,6	Kasım ayı içerisinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görevli personel için eğitim planlanmaktadır.
2013K080030	Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi (Belediye Sektörü)	2013-2014	1.645		341	88	% 25,8	Proje ile ilgili olarak "Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritası Raporu Oluşturulması Ve Karşılaşılabilecek Sorunların Tespiti Maksatlı Pilot Uygulama Yapılması Hizmeti Alımı" ihalesi yapılmış olup, 17.06.2013 tarihinde Yüklenici Firma ile Sözleşme imzalanmıştır. İhale Bedeli 163.430,00-TL'dir (KDV Dahil)
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Sektörü)	2013-2014	3.200		1.420	0	% 0,0	Proje kapsamında, Yıkım ve hafriyat yüklenicileri, geri dönüşüm yatırımcıları, deponi alan işletmecileri, inşaat malzeme tedarikçileri gibi sürecin tüm aktörleri ile İdareden (Büyükşehir Belediyesi, İlçe veya Belde Belediyesi, İl Özel İdaresi) sağlanacak bilgilerin uygun yazılım programlarına işlenerek hafriyat, inşaat ve yıkıntı atığı atık yönetiminde yer alan kurum ve kişilerin karar süreçlerine destek verecek ulusal veri tabanı oluşturulması amacıyla "Hafriyat ve Yıkıntı Atığı Kontrol ve Takip Sistemi" Bilgisayar Yazılım alımı işi için doğrudan temin yapılmış ve yüklenici firma ile 17.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve Ekim ayı içerisinde 48.380,00 TL'lik ödeme gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Protokol yapılmasına yönelik olarak Bakanlığımız adına yetkilendirme oluru alınmış olup, bahse konu kurumla protokol imzalanmıştır. İmzalananan Protokol kapsamında 1.aşama 30.10.2013 tarihinde hazırlanacak ara raporu Bakanlık tarafından teslim alınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde (Kasım Ay'ı) 950.000,00 TL. + % 18 KDV ödemesi gerçekleştirilecektir.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K080050	Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Sektörü)	2013-2015	4.500		250	0	% 0,0	Proje kapsamındaki konular sektörlere ayrılarak, içmesuyu, kanalizasyon, atıksu toplama, depolama ve bertarafı, yağmursuyu, elektrik, iletişim, doğalgaz vb. altyapı tesisleri için ihaleye çıkılmak üzere hazırlıklar yapılmaktadır.
2013K140090	Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması (Afetler Sektörü)	2013-2014	4.850		2.000	246	% 12,3	Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında 3 Bileşenli çalışmadan, Bileşen-1 Türkiye Geneli çalışması tamamlanmıştır. Bileşen-2 Üç farklı İl belediyesi için örnek kentsel deprem riski belirlemelerinin ve riskli alanların mahalle ve/veya geo-grid bazında önceliklendirme yapılması, Bileşen-3'te ise bileşen 2 kapsamında yapılan örnek riskli alan belirleme çalışmalarında kullanılan metodolojiler ve kullanılan yazılımlar ile ilgili döküman, kılavuz ve standartların hazırlanması çalışmalarına devam edilerek, tüm bu çalışmalar ile ilgili panel düzenlenerek gerekli tanıtım çalışması yapılacaktır. 15 Aralık 2013 tarihi itibarıyla aşamaların tamamlanması planlanmaktadır. Ortak Hizmet Uygulaması Protokolünün Bedeli 1.900.000,00 TL+KDV'dir, eksik kalan 242.000,00 TL ödeneğin Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesinden aktarılması için Kalkınma Bakanlığında talepte bulunulmuştur.
		TOPLAM	38.274	800	4.755	642	% 13,5	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100010	Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi (Enerji Sektörü)	2012-2013	3.132	2.132	1.000	0	% 0,0	"Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesinin" gerçekleştirilmesinde kamu menfaati olmadığı düşünüldüğünden, projenin 2013 yatırım programı dahilinde gerçekleştirilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2015	1.715	426	500	36	% 7,2	* Mart 2013 tarihinde 176 personele Enerji Denetçisi eğitimi verilmiş, İl Müdürlüklerine 26.440-TL ödenek görev yolluğu olarak gönderilmiştir. * Eğitim programı çerçevesinde flash bellek ve döküman yaptırılması (5.015-TL) * Görev yolluğu (425-TL + 2.169-TL + 857-TL + 150- TL) * THOR (teknik şartname hazırlanması) projesi ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. (17.370-TL) * 2013 yılı 4. Çeyreğinde bir Enerji Denetçisi eğitimi daha yapılması planlanmaktadır.
2013D100010	Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması (Enerji Sektörü)	2013-2014	200		100	0	% 0,0	*Yeşil Binaların Sertifikalandırılmasına yönelik olarak 2013 yılı 4. çeyreğinde Çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.
2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı (Enerji Sektörü)	2012-2014	2.752	800	1.300	69	% 5,3	* Bep-TR-II "Yazılım Metodolojisinin Geliştirilmesi" Projesi Tubitak tarafından proje takvimine uygun olarak sürdürülmekte olup, 2013 ödeneği 354.000 TL dir. * BEP-TR yazılımının bakım ve onarım sözleşmesi 138.060 TL'ye imzalanmış ve 1. hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.(27.612 TL) * BEP-TR-II Yazılım ihalesi için şartname oluşturulmuş olup, Haziran sonu itibarıyla TÜBİTAK MAM raporu ile ihale aşamasına gelinecektir. * 2. hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.(41.418 TL)

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010080	İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	7.925	2.457	1.271	7	% 0,6	* İl Müdürlüğü Laboratuvarları ihtiyacı olan 59 adet (hafif, taşınabilir, fonksiyonel) Karot cihazı alımı için Yaklaşık Maliyet Komisyonu 27.05.2013 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. * Elazığ İl Müdürlüğüne acil ihtiyaca binaen 1 adet hafif, taşınabilir karot cihazı alınmıştır. (4.720-TL) * 45 İl Müdürlüğümüze muhtelif laboratuvar cihazı temini için İl Müdürlüklerinden talepler alınarak hazırlık yapılmış olup, 25.06.2013 tarihinde ihalesi yapılmış, sözleşmesi imzalanmıştır. (402.549-TL) *Cihaz alımı gerçekleşmiştir.(5.000)
2010K010050	Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	6.475	2.967	712	13	% 1,8	Kimya Laboratuvarına deney aletleri alınmıştır. (12.829-TL)
2010K010060	Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	4.000	198	3.590	3.505	% 97,6	* Proje 3.268.600 TL teklif bedelle yüklenici Şimşekler İnş. Tur. Taah. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiştir. Bina inşaatı tamamlanmıştır.
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	16.396	7.173	1.358	429	% 31,6	* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için ödeme yapılmıştır.(66.954 TL) * 02-04 Mart 2013 tarihinde 182 kişinin katılımıyla" Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi " yapılmıştır. * Personel, eğitmen ve dış katılımcılar için yolluk ödemesi yapılmıştır. (93.536 TL) * 07-10 Nisan 2013 de yapılan PGD ileri seviye eğitimi için ödeme yapılmıştır. (92.327 TL) * YMDS bakım ve onarım işleri ihale sözleşmesi 207.680 TL'ye imzalanmıştır. * YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 1. hakedişinin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. (41.536 TL) * TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için ödeme yapılmıştır. (16.755 TL) * Eğitim için kitap basımı yaptırılmıştır. (18.800 TL) * TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için ödeme yapılmıştır. (3.722 TL) * YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 2. hakedişinin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. (62.304 TL) * Yolluk giderleri.(6.415)

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	586	32	255	11	% 4,3	* Yurtdışı görev için yolluk ödemesi yapılmıştır. (10.793,10TL) * Uyumlaştırılmış standart sayısı 421'e yükselmiştir * 2 Yönetmelik ve 1 tebliğ çalışması devam etmektedir.
2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	963	387	204	42	% 20,6	* İki adet 50 sayfa/dk Baskı Kapasiteli Renkli Fotokopi cihazı temin edilmiştir. (49,560-TL) * Onaylanmış Kuruluşların görevlendirildiği standart sayısı 206 olmuştur. * 01.07.2013 tarihinde (CPR 'a göre yeniden) görevlendirme süreci başlayacaktır. * İki adet 50 sayfa/dk Baskı Kapasiteli Renkli Fotokopi cihazı alındı.(41.514,76TL)
2013K010080	Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2015	1.260		400	80	% 20,0	* Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) İşletme, Bakım, Onarım ve Güncelleme İşi için 159.248 TL'ye sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanmış, 1. hakedişinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. (31.848,20 TL). *2. hakedişinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. (47.772,00 TL)
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2015	705		300	0	% 0,0	* 2013 yılı e-kooperatif Bakım, İyileştirme, Destek Hizmetleri işinin ihalesi gerçekleştirilmiştir. (56.876-TL) * Taşra teşkilatlarımızda gerçekleştirilen yeni yapılanma Kooperatifleri ile ilgili uygulamaların şube değiştirdiğinden, ilgili personele yönelik yıl sonunda eğitim yapılması planlanmaktadır.
TOPLAM			46.109	16.572	10.990	4.192	% 38,1	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K091070	ÇŞB Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2011-2013	6.000	2.500	3.500	0	% 0,0	1- Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi ve Jeoloji Temasının Hazırlanması Yapımı İşi İhalesi 01.07.2013 tarihinde yapıldı, İhale bedli 330.00TL.dir. Süresi 5 ay.2- Veri İçiliği Projesi Yapım İşi ihalesi 25.04.2013 tarihinde yapılmış olup 17.05.2013 işe başlandı. İşin süresi 8 ay sözleşme bedeli 814.000,00TL'dir. 3- Mekansal Veri Altyapısının Oluşturulması İçin Donanım Ürünleri Alımı İşi İhalesi 09.07.2013 tarihinde yapıldı, İhale bedeli 1.237.000.00 TL.dir. 4- C.B.S. Orta Seviye Eğitimi İşi İhalesi 21.08.2013 tarihinde yapıldı. teklif bedeli 129.000.00TL olup yasal süre bekleniyor. 5- C.B.S. Uzaktan Eğitim Pilot Uygulaması İşi ihalesi 22.08.2013 tarihinde yapıldı. teklif bedeli 165.200.00TL olup yasal süre bekleniyor. 6- MEKANSAL VERİ ARŞIV SİSTEMİ YAZILIMININ BAKIMI, GÜNCELLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ İŞİ ihalesi 26.08.2013 yapıldı. sözleşme bedeli 168.690.00TL dir. 7- NETCAD Lisans alımı İşi 680.000.00TL'ye yapılmıştır. 8- ARCGİS Lisans alımı İşi 396.000.00TL'ye yapılmıştır. 9- FME Lisans alımı İşi işlemleri devam etmektedir.
2011K091050	Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısı Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2011-2013	4.300	2.500	1.800	41	% 2,3	1- ULUSAL COĞRAFI VERİ PORTALININ (UCBS GEOPORTAL) OLUŞTURULMASI PROJESİ YAPIMI İŞİ İhalesi 21.06.2013 tarihinde yapıldı,tebliğ edildi.Yasal süre bekleniyor.İhale bedeli 460.00 TL.süre 150 gündür 2- INSPIRE WEB (UCBS) YAPIMI İŞİ Doğrudan Temin Usulü İle Yapılmıştır. 1 adet ödeme emri ile 41.500.00TL ödenmiştir. 3- CBS Teknolojileri Eğitimi ve Bina Pilot Çalışması İşi için teknik şartname çalışması devam etmektedir. 4- Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yol Haritasının Belirlenmesine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi'nin adı değiştirilmiştir.İşi ihalesi 13.08.2013 tarihinde yapılmıştır. sözleşme bedeli 151.000.00TL'dir. 5- COĞRAFI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE PROJE YÖNETİMİ(PMP) EĞİT.İŞL. işi ihalesi yapılmıştır. sözleşme bedeli 155.780.00TL'dir.6- Yardım Masası İşi doğrudan temin yoluyla yapılmıştır. bedeli 50.000.00TL'dir. 7- Entegrasyon doğrudan temin yoluyla yapılmıştır. bedeli 50.000.00TL'dir

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090010	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri idame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	10.488		10.488	658	% 6,3	(5.000.000 TL ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından eklenerek karşılanacaktır.) 1- ÇŞB Merkez Teşkilatı Bilgisayar Teknolojileri Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi ihalesi 07.01.2013 tarihinde yapılmış ve 631.000,00TL'ye 23.01.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 8 adet ödeme emri ile toplam 399.918.33TL ödeme yapılmıştır. 2- Mobil Çevre ve Şehircilik Uygulaması Yapımı İşi İhalesi 26.04.2013 tarihinde yapılmış olup iş tamamlanmıştır. 1 adet ödeme emri ile toplam 59.950.00TL ödeme yapılmıştır.3- 1000 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR (TİP-1), 500 ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR (TİP-2), 1000 ADET LCD MONİTÖR (TİP-1) VE 500 ADET LCD MONİTÖR (TİP-2) ALIM İŞİ ihalesi 29.04.2013 tarihinde yapılmış ve 25.06.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedeli 2.830.000.00TL. 4- PORTAL VE İŞ SÜREÇLERİ PLATFORMU YAPIMI İŞİ İhalesi 03.05.2013 tarihinde yapılmış,Sözleşmesi 05.06.2013 tarihinde 1.723.000,00TL'ye imzalanmıştır. İşin Süresi 120 gündür. 5- E-İMZA ENTEGRASYON İŞİ Doğrudan Temin Usulü ile Yapılmıştır. 1 adet ödeme emri ile toplam 50.740.00TL ödeme yapılmıştır. 6- REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BŞK. LİSANS TARAYICI,YAZICI ALIM İŞİ Doğrudan Temin ile alınmıştır. 2 adet ödeme emri ile 33.408.16TL ödenmiştir.7- Genel Müdürlüğümüz asma katta bulunan toplantı salonu ve diğer personel odaları için Enerji - Data Hattı ve Muhtelif İnşaat İşleri Doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır 1 adet ödeme emri ile toplam 24.992.40TL ödeme yapılmıştır. 8- 1176 kalem Bilgisayar Donanım Alımı İşi Doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır 1 adet ödeme emri ile toplam 38.772.44TL ödeme yapılmıştır.9- Genel Müdürlüğümüz giriş kat ve asma katlarının Havalandırma ve Muhtelif İnşaat İşleri Doğrudan temin yoluyla yaptırılmıştır 1 adet ödeme emri ile toplam 24.525.54TL ödeme yapılmıştır. 10- STACAD LİSANS ALIM İŞİ DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE YAPILMIŞTIR. BEDELİ 20.000.00TL, MALZEME TESLİMİ BEKLENMEKTEDİR. 11- İDECAD LİSANS ALIM İŞİ DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE YAPILMIŞTIR. BEDELİ 82.246.00TL, MALZEME TESLİMİ BEKLENMEKTEDİR. 12- PROBİNA LİSANS ALIM İŞİ DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İLE YAPILMIŞTIR. BEDELİ 37.583.00TL, MALZEME TESLİMİ BEKLENMEKTEDİR.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090100	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.735		200	0	% 0,0	Proje kapsamında kurulması hedeflenen BGYS alt yapısı ile ilgili teknik şartname çalışması devam etmektedir.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB)	2013-2013	911		911	0	% 0,0	“INSPIRE Kapasite Geliştirme Projesi” ile ilgili olarak Teknik Şartname Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir. İhale süreçleri tamamlanamadığı için bütçe kullanılamamıştır.
AB KATKISI	8.280			8.280	0			
TOPLAM			23.434	5.000	16.899	699	% 4,1	
AB KATKISI			8.280	0	8.280	0	% 0,0	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013F000010	Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme- Altyapı, Uygulama ve Ekipmanları (*) (Turizm Sektörü)	2013-2013	10.999		10.999	2.226	% 20,2	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda Acil Hizmetler	2013-2013	3.499		3.499	233	% 6,7	15 adet projeye ilişkin protokoller toplam 2.641.413,50 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
	Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzenlemesi- Cephe Kaplaması-Yol Düzenlemesi	2013-2013	4.000		4.000	957	% 23,9	3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 4.296.495 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
	Korunan Alanlarda Çevre-Cephe- Yol Düzenlemeleri	2013-2013	3.500		3.500	1.036	% 29,6	11 adet projeye ilişkin protokoller toplam 3.500.000 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
2013K050250	Su Temini Hizmetleri Projesi (*) (İçme Suyu Sektörü)	2013-2013	2.975		2.975	1.594	% 53,6	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçerisinde Su Temini Hizmetleri	2013-2013	1.650		1.650	1.175	% 71,2	4 adet projeye ilişkin protokoller toplam 1.870.000 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
	Tuz Gölü Özel çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçerisinde Su Temini Hizmetleri	2013-2013	500		500	0	% 0,0	3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 500.000 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
	Korunan Alanlarda Acil Hizmetler	2013-2013	825		825	419	% 50,8	2 adet projeye ilişkin protokoller toplam 825.000 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
2012K060110	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon Sektörü)	2012-2013	1.050		1.050	1.049	% 99,9	
	Ulukışla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	2012-2013	1.050	0	1.050	1.049	% 99,9	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K060100	Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (*) (Kanalizasyon Sektörü)	2013-2013	6.116		6.116	1.792	% 29,3	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Eskil Atıksu Arıtma Tesisi	2013-2013	1.000		1.000	320	% 32,0	Projeye ilişkin protokol toplam 1.000.000 TL bedelle imzalanmıştır. Proje 2013 yılı içinde tamamlanarak bedeli ödenecektir.
	Aksaray İli Özel Çevre koruma Bölgesi Sınırları İçinde Doğal Arıtma Sistemleri Yapımı	2013-2013	1.810		1.810	621	% 34,3	2 adet projeye ilişkin protokoller toplam 2.107.713 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
	Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınırları İçinde Kanalizasyon Sistemi	2013-2013	1.500		1.500	403	% 26,9	3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 1.500.000 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
	Yeşiltepe Kanalizasyon Sistemi Yapımı	2013-2013	750		750	0	% 0,0	Projeye ilişkin protokol toplam 750.000 TL bedelle imzalanmıştır. Proje 2013 yılı içinde tamamlanarak bedeli ödenecektir.
	Zincirlikuyu Kanalizasyon Sistemi Yapı	2013-2013	306		306	306	% 100,0	Projeye ilişkin protokol toplam 306.000 TL bedelle imzalanmıştır. Proje 2013 yılı içinde tamamlanarak bedeli ödenecektir.
	Bolayır Kanalizasyon Sistemi Yapımı	2013-2013	750		750	142	% 18,9	Projeye ilişkin protokol toplam 750.000 TL bedelle imzalanmıştır. Proje 2013 yılı içinde tamamlanarak bedeli ödenecektir.
2009K080100	Düzenli Depolama Tesisleri 2. Etap Yapımı (Belediye Sektörü)	2009-2013	5.122	2.604	2.010	1.173	% 58,4	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Ortaca KADDT 2. Etap Yapımı	2010-2013	2.010	0	2.010	1.173	% 58,4	2 adet projeye ilişkin protokoller toplam 1.870.341 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K080110	Eski Çöplük Kapatma (Belediye Sektörü)	2009-2013	1.764	1.762	2	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Kulu katı atık vahşi depolama alanı rehabilitasyonu	2012-2013	1.562	1.560	2	0	% 0,0	2012 yılında proje imalatı gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır.
2013K080020	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri (*) (Belediye Sektörü)	2013-2013	3.864		3.864	1.204	% 31,2	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda Toplama ve Taşıma Ekipmanı	2013-2013	1.664		1.664	1.204	% 72,4	12 İlçede Toplama ve Taşıma Ekipmanı Temini için 1.364.632,00 TL protokol imzalanmıştır. Araç Temini DMO tarafından yapılacaktır.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde KADD Tesisi Transfer ve İşletme Ekipmanı	2013-2013	2.200		2.200	0	% 0,0	İşletme Ekipmanı alımı için 2.200.000,00 TL protokol imzalanmıştır. Araç Temini DMO tarafından yapılacaktır.
1992K090010	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	1992-2013	162	152	10	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Çamlı-Marmaris-MUĞLA İmar Planı Yapı. Harita Alımı	2001-2013	24	14	10	0	% 0,0	Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde planlama süreci devam etmektedir.
2013K090050	İmar Planı Yapımı (*) (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	600		600	160	% 26,7	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2013-2013	600		600	160	% 26,7	7 adet projeye ilişkin protokoller toplam 556.000 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
2013K090060	İmar Uygulaması (*) (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	600		600	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması	2013-2013	600		600	0	% 0,0	7 adet projeye ilişkin protokoller toplam 600.000 TL bedelle imzalanmıştır. Projeler 2013 yılı içinde tamamlanarak bedelleri ödenecektir.
2013K090090	Hali hazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.250		500	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Korunan Alanlarda Hali hazır Harita Alımı	2013-2014	1.250		500	0	% 0,0	5 adet proje için 498.550,00 TL (KDV DAHİL) bedelle sözleşme imzalanmıştır. Diğer projeler için ihale süreci devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100130	Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II (Çevre Sektörü)	2010-2014	1.002	673	187	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Foça (Karasal Alan)	2011-2013	115	70	45	0	% 0,0	Sözleşmesi 08.08.2011 tarihinde 110.625 TL bedelle imzalanan proje 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olup çalışmalar devam etmektedir.
	Saros Körfezi (Karasal ve Denizel Alan)	2011-2014	473	189	142	0	% 0,0	Sözleşmesi 05.10.2012 tarihinde 470.820 TL bedelle imzalanan proje 2014 yılında tamamlanacak olup çalışmalar devam etmektedir.
2009K100120	Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (GEF) (Çevre Sektörü)	2009-2014	662	412	150	79	% 52,7	Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminini güçlendirilmesi projesi kapsamında Mayıs ayı içerisinde kapasite geliştirme eğitimi ile çalışmalar yapılmıştır. Eğitimin ilki doğrudan teminle 49.501,00 TL ye yapılmıştır.
GEF Katkısı	3.413		1.883	1.230	370			
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.	2013-2014	3.500		1.250	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Doğal Sit Sınırlarının Değerlendirilmesi, Veri Analizi ve CBS Geliştirilmesi	2013-2014	1.550		750	0	% 0,0	Sözleşmesi 735.730,00 TL (KDV Dahil) bedelle imzalanan proje 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olup çalışmalar devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda Biyo-Ekolojik Araştırma Projesi	2013-2014	1.950		500	0	% 0,0	Projenin ihalesi yapılmış olup sözleşmeleri imza aşamasındadır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2014	1.500	504	600	293	% 48,8	Bu kapsamda taraf olunan uluslararası sözleşme ve ulusal mevzuatımız kapsamında tür ve habitatların koruma ve izleme çalışmaları yapılmaktadır. Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	560	210	280	103	% 36,8	2011 yılından itibaren proje sürmektedir. 2013 yılında proje tamamlanarak 273.760 TL ödenecektir.
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	165	40	55	33	% 60,0	Proje için 47.200 TL ye doğrudan temin yapılmıştır.
	Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	214	89	55	34	% 61,8	Proje için 48.380 TL ye doğrudan temin yapılmıştır.
	Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	205	80	55	35	% 63,6	Proje için 49.560 TL ye doğrudan temin yapılmıştır.
	Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2014	210	85	55	34	% 61,8	Proje için 48.380 TL ye doğrudan temin yapılmıştır.
	İhlara ÖÇK Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi	2013-2014	146			100	54	% 54,0
TOPLAM			41.166	6.107	30.913	9.570	% 31,0	
GEF Katkısı			3.413	1.883	1.230	370	% 30,1	

(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K050400	Artım İçin Uygun Yöntem Belirlenmesi (AB)	2010-2014	1.410	0	1	0	% 0,0	
AB KATKISI	(İçmesuyu Sektörü)		7.987	0	4.091	0		
2009K050400	İPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB)	2009-2014	3.045	657	1.152	581	% 50,4	
AB KATKISI	(İçmesuyu Sektörü)		17.252	3.724	6.114	1.154		
2009K080310	İPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB)	2009-2014	1.671	566	1.102	596	% 54,1	
AB KATKISI	(Belediye Sektörü)		9.114	3.209	3.943	1.330		
2009K100080	Çevre Operasyonel Programı İletişim Eylem Planının Uygulanması için Teknik Yardım Projesi (AB)	2009-2015	108	0	1	0	% 0,0	
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		611	0	239	0		
2009K100090	Çevre Operasyonel Programı Yönetimi ve Uygulanmasının Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	2009-2015	151	66	81	60	% 74,1	
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		743	264	217	39		
2009K100100	Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	2009-2015	1.939	839	606	505	% 83,3	
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		10.989	4.554	3.145	1.738		
2011K100040	İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin Teknik Yardım Projesi (AB)	2011-2014	74		1	0	% 0,0	
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		417		255	0		
TOPLAM			8.398	2.128	2.944	1.742	% 59,2	
AB KATKISI			47.113	11.751	18.004	4.261	% 23,7	

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100010	Eğitim, Tanıtım ve Yayın Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2013	600		600	171	% 28,5	
2013K090070	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2013	1.000		1.000	0	% 0,0	
	TOPLAM		1.600	0	1.600	171	% 10,7	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2008K091080	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2008-2015	45.560	13.575	12.772	9.058	% 70,9	Projenin ödenek dağılımı; Bakanlık Makamının 19.02.2013 tarihli ve 16517702-602.07-580 sayılı Oluru ile yapılmıştır.
	Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2008-2012	1.489	1.489	0	0		09.06.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
	Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2010-2012	2.012	2.012	0	0		30.08.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2011-2012	626	626	0	0		08.08.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
	Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2008-2013	2.895	703	2.192	2.184	% 99,6	Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam 2.887.000 TL harcama yapılmıştır. İnşaat tamamlandı. Geçici kabul aşamasında. Tefrişat ihalesine çıldı.
	Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2010-2013	2.539	2.198	341	340	% 99,7	Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam 2.538.000 TL harcama yapılmıştır. İnşaat tamamlanmış olup 03.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
	Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2011-2013	2.899	1.276	1.623	1.443	% 88,9	Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam 2.719.000 TL harcama yapılmıştır. İnşaat tamamlanmış olup 30.09.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
	Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2011-2013	2.711	1.141	1.520	1.434	% 94,3	Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam 2.575.000 TL harcama yapılmıştır. İnşaat tamamlandı. Geçici kabul aşamasında. Tefrişat ihalesi tamamlandı.
	Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2011-2013	3.846	2.526	1.320	1.319	% 99,9	Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam 3.845.000 TL harcama yapılmıştır. İnşaat tamamlanmış olup 12.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
	İğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2014	3.456	26	3.430	2.208	% 64,4	Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam 2.234.000 TL harcama yapılmıştır. 01 Kasım 2013 tarihinde inşaat tamamlanacak. Tefrişat alımına ilişkin DMO başvuruları yapıldı.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2014	7.091	0	710	58	% 8,2	İhale aşamasında.
	Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2013-2014	454		400	72	% 18,0	15.07.2013 tarihinde KDV dahil 328.000 TL ye ihale edildi. 2014 yılı Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.
	Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	4.992		549	0	% 0,0	Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.970		400	0	% 0,0	Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.169		320	0	% 0,0	Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.176		320	0	% 0,0	Hizmet binası yapımı işi 22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2014						İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı Temiz Hava Merkezi ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü de içinde yer alacak şekilde 49.000.000 TL proje maliyeti ile 09.04.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığına teklif edilmiştir. 12.07.2013 tarihinde teklifimiz yenilenmiştir. 2014 yılı yatırım programı teklifinde de yer verilmiştir.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2014						Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı Temiz Hava Merkezide içinde yer alacak şekilde 7.145.000 TL proje maliyeti ile 31.05.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığına teklif edilmiştir. Proje maliyetinin 4.000.000 TL lik kısmı Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanacaktır. 2014 yılı yatırım programı teklifinde de yer verilmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü*)	2013-2013	12.578		12.578	3.790	% 30,1	
	Taşıt Alımı	2013-2013	2.500		2.500	0	% 0,0	15 adet T8 (Pick-up) tipi Nissan Navara marka aracın alımı yapılarak İl Müdürlüklerine teslim edilmiştir. Taşıt alımına yönelik 28.01.2013 tarihli ve 2013/4280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 30 adet T2 (Binek Oto) alımı için gerekli izin verilmemiştir.
	Hizmet Binası Onarımı	2013-2013	5.850		5.850	2.430	% 41,5	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binalarında 5378 sayılı Kanun doğrultusunda erişilebilirliğe ilişkin gerekli tedbirleri almak amacıyla, Bakanlık Makamının 13.03.2013 tarihli Oluru ile ödenek tahsisleri yapılmış olup bu güne kadar 5.412.000 TL ihale talimatı gönderilmiştir.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2013-2013	4.228		4.228	1.360	% 32,2	İl Müdürlüklerine bu güne kadar toplam 4.200.490 TL ödenek gönderilmiştir.
2013G000130	Lojman Yapımı Etüt-Proje Hazırlığı (Konut Sektörü)	2013-2013	200		200	11	% 5,5	Etüd ve Proje Hazırlığı olarak 2013 yılı yatırım programında yer alan Van ve Şırnak İlleri Lojman Yapımı projesinin inşaat olarak programa alınması için 29.05.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı'na talep yazımız gönderilmiştir.
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Binası İnşaatı	2013-2013	100		100	0	% 0,0	
	Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Binası İnşaatı	2013-2013	100		100	11	% 11,0	Lojmanın inşaa edileceği alanda jeoteknik etüd yapılmıştır.
2013G000140	Lojman Onarımı (Konut Sektörü*)	2013-2013	5.600		5.600	1.350	% 24,1	İhtiyaçlar doğrultusunda bu güne kadar illere 4.889.000 TL ihale talimatı gönderilmiştir.
	TOPLAM		63.938	13.575	31.150	14.209	% 45,6	

(*) 1 proje Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2013 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2013 22.10.2013 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü*)	2013-2013	1.150		1.150	561	% 48,8	
	Hizmet Binası Onarımı	2013-2013	650		650	478	% 73,5	
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2013-2013	500		500	83	% 16,6	
	TOPLAM		1.150	0	1.150	561	% 48,8	

(*) 1 proje SGB-İl Müdürlükleri ile ortak

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI



Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
