

2017 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

1. Dönem Gerçekleşme Raporu

Strateji Geliştirme Başkanlığı


14.04.2017

BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2017 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	731.633.000,00	731.632.000,00	191.503.955,01	% 26,2
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	128.503.000,00	128.504.000,00	31.877.393,17	% 24,8
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.958.000,00	88.512.954,60	14.608.077,91	% 16,5
05	CARİ TRANSFERLER	401.010.000,00	401.182.915,60	95.290.878,58	% 23,8
06	SERMAYE GİDERLERİ	292.780.000,00	622.684.046,66	65.161.121,42	% 10,5
	Bakanlık Yatırım Programı	273.752.000,00	244.368.000,00	11.129.637,03	% 4,6
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.028.000,00	19.028.000,00	676.000,00	% 3,6
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	359.288.046,66	53.355.484,39	% 14,9
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	154.071.000,00	154.071.000,00	17.468.184,61	% 11,3
	Bakanlık Yatırım Programı	33.105.000,00	33.105.000,00	478.184,61	% 1,4
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	120.966.000,00	120.966.000,00	16.990.000,00	% 14,0
08	BORÇ VERME	35.959.000,00	35.959.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM		1.823.914.000,00	2.162.545.916,86	415.909.610,70	% 19,2


BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

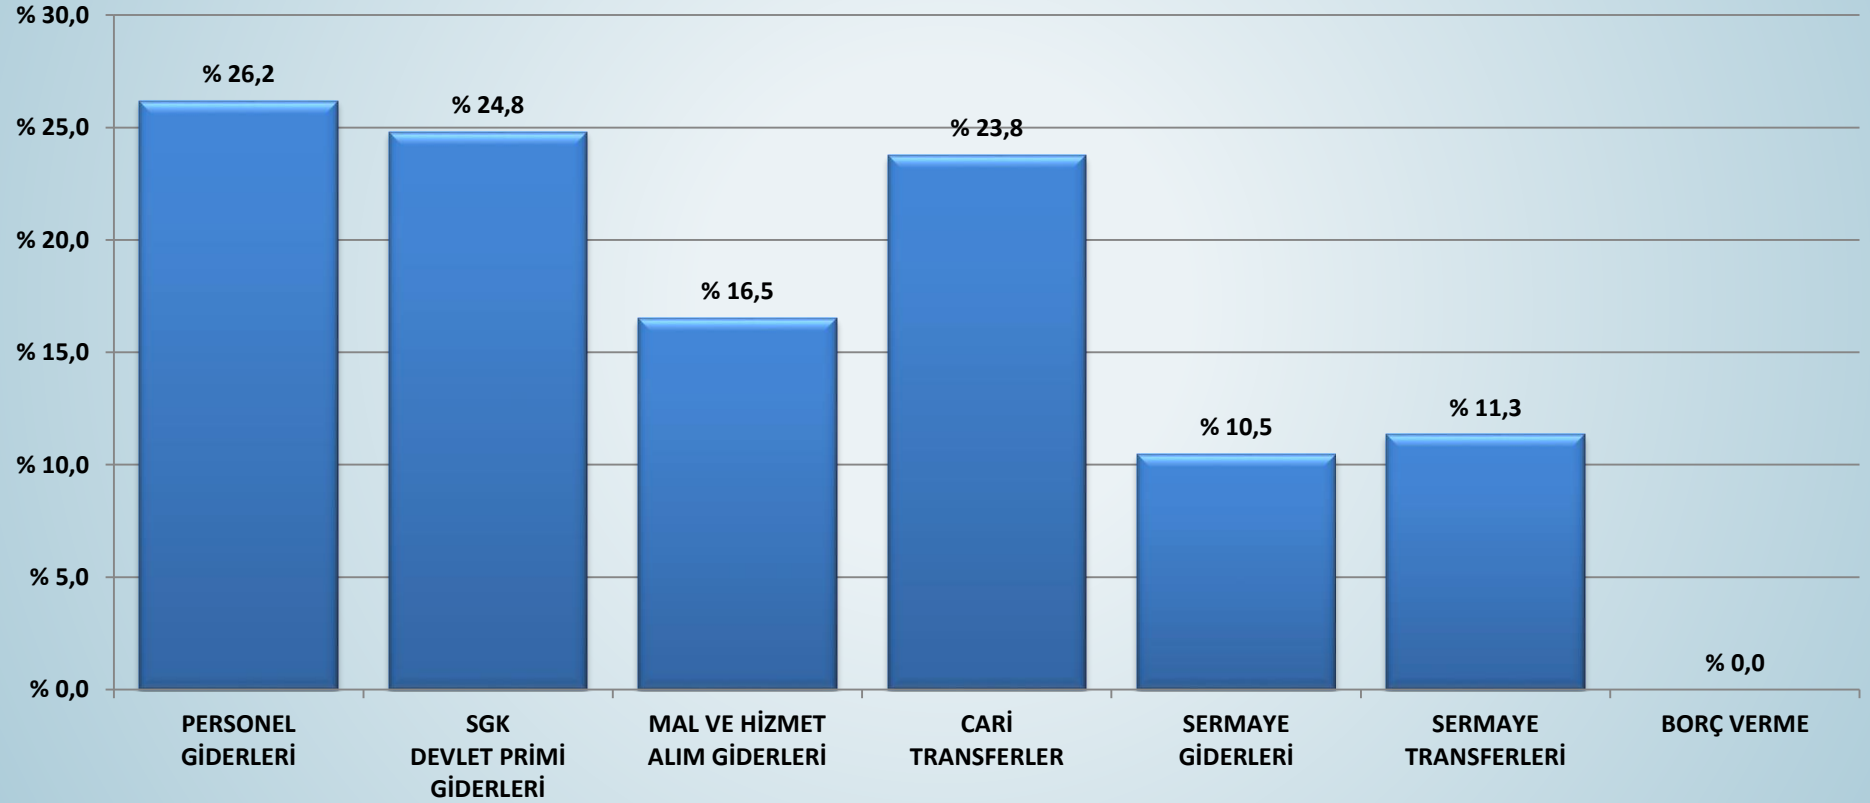

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	31.03.2017 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	26.878.000,00	27.954.000,00	4.831.322,58	% 17,3
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	202.631.000,00	203.802.915,60	22.208.159,84	% 10,9
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	52.613.000,00	54.836.158,75	7.053.000,52	% 12,9
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	210.882.000,00	238.079.657,50	28.602.213,65	% 12,0
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	347.934.000,00	347.936.000,00	98.766.905,63	% 28,4
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	20.431.000,00	20.431.000,00	3.776.064,11	% 18,5
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	48.577.000,00	49.261.481,68	2.223.741,19	% 4,5
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	83.821.000,00	44.936.635,91	3.142.830,74	% 7,0
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	8.393.000,00	8.393.000,00	2.148.661,16	% 25,6
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	4.323.000,00	4.324.000,00	1.562.217,18	% 36,1
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.943.000,00	1.943.000,00	519.587,13	% 26,7
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4.023.000,00	4.023.000,00	1.000.472,55	% 24,9
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.749.000,00	14.751.250,00	636.826,54	% 4,3
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5.575.000,00	5.575.000,00	1.125.813,81	% 20,2
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.409.000,00	2.415.000,00	299.081,94	% 12,4
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.082.000,00	4.082.000,00	1.117.638,09	% 27,4
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	37.555.000,00	39.555.000,00	8.451.655,20	% 21,4
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	751.000,00	751.000,00	172.941,99	% 23,0
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	25.214.000,00	25.216.350,00	6.869.944,85	% 27,2
İL MÜDÜRLÜKLERİ	721.130.000,00	1.064.279.467,42	221.400.532,00	% 20,8
TOPLAM	1.823.914.000,00	2.162.545.916,86	415.909.610,70	% 19,2


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2017 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

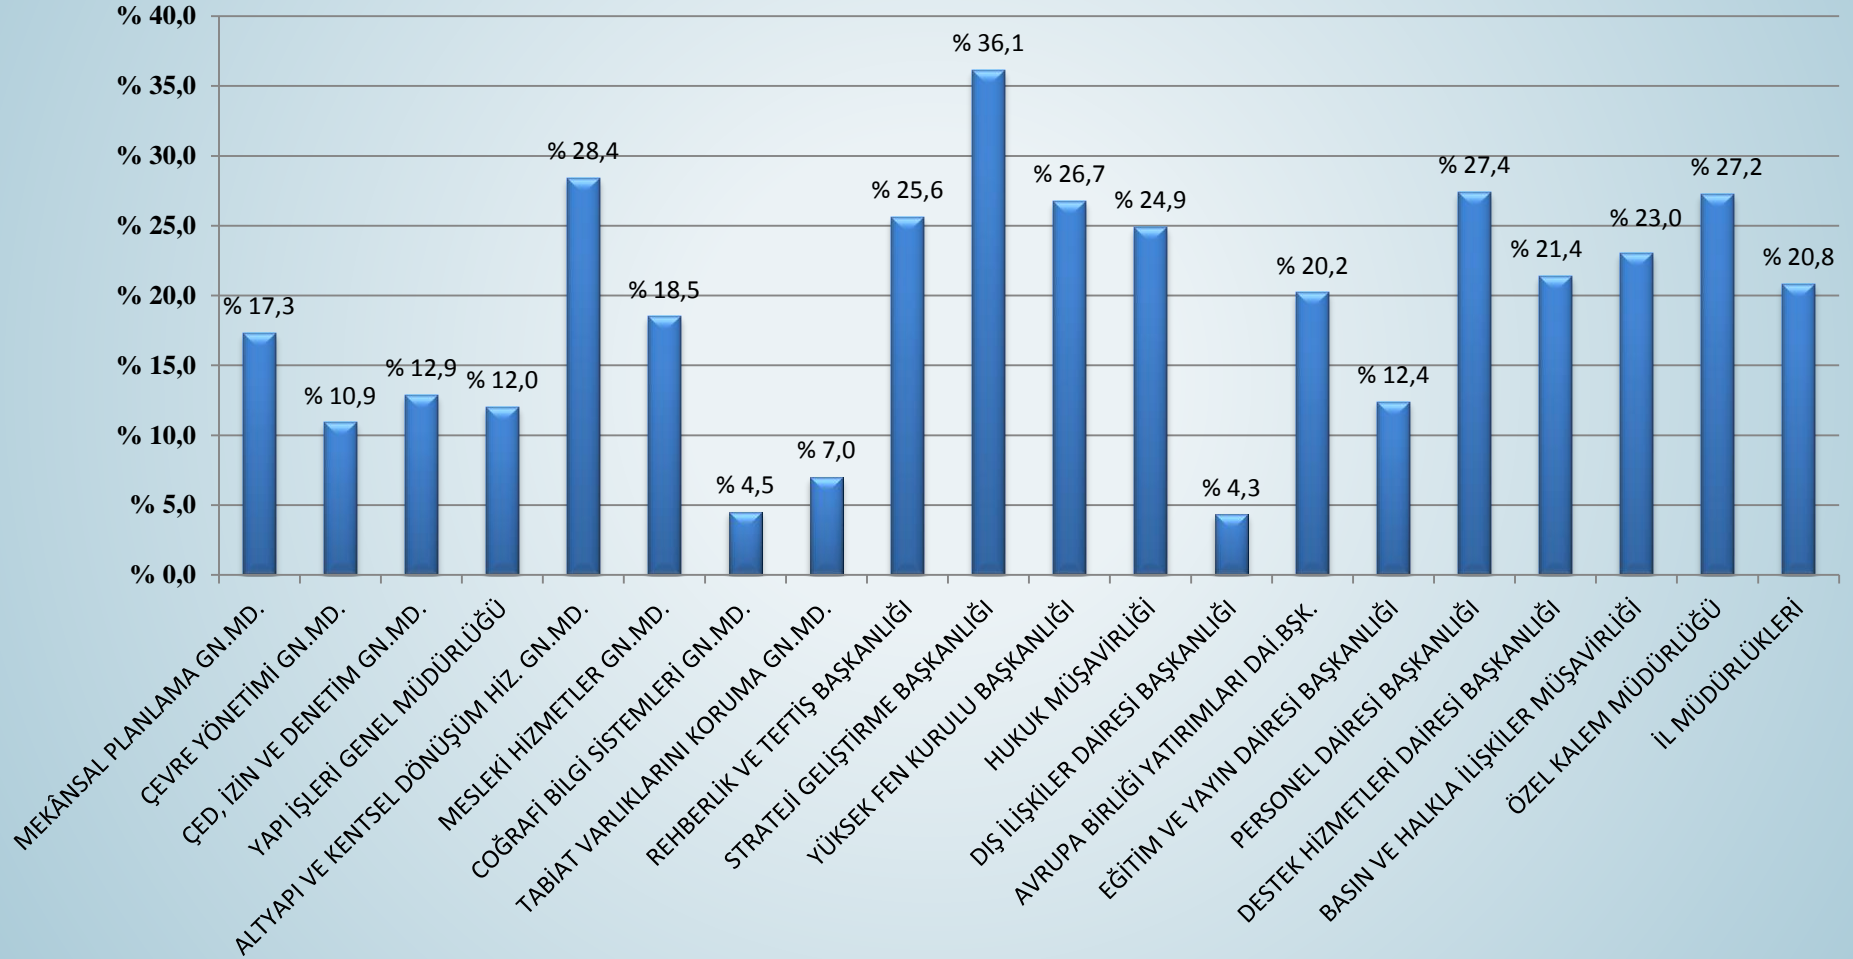

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	31 Mart 2017		Gerçekleşme ORANI (%)
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	20.515.000,00	10.876.000,00	84.311,00	% 0,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	29.361.000,00	10.795.000,00	442.500,00	% 4,1
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	5	135.576.000,00	45.029.000,00	197.744,40	% 0,4
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	18	794.960.000,00	148.323.000,00	2.930.125,93	% 2,0
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn.Md. (DETAY)	5	15.650.000,00	5.600.000,00	1.053.150,00	% 18,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	42.470.000,00	8.304.000,00	253.152,76	% 3,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	14	77.457.000,00	37.492.000,00	173.188,60	% 0,5
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	12	105.491.000,00	68.936.000,00	0,00	% 0,0
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	12.172.000,00	2.542.000,00	347.010,15	% 13,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	3	174.732.000,00	70.836.000,00	6.052.652,80	% 8,5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	1.241.000,00	1.241.000,00	73.986,00	% 6,0
Hukuk Müşavirliği (DETAY)	1	525.000,00	155.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	97	1.410.150.000,00	410.129.000,00	11.607.821,64	% 2,8
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	92	1.280.287.000,00	342.316.000,00	11.607.821,64	% 3,4
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	5	129.863.000,00	67.813.000,00	0,00	% 0,0

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

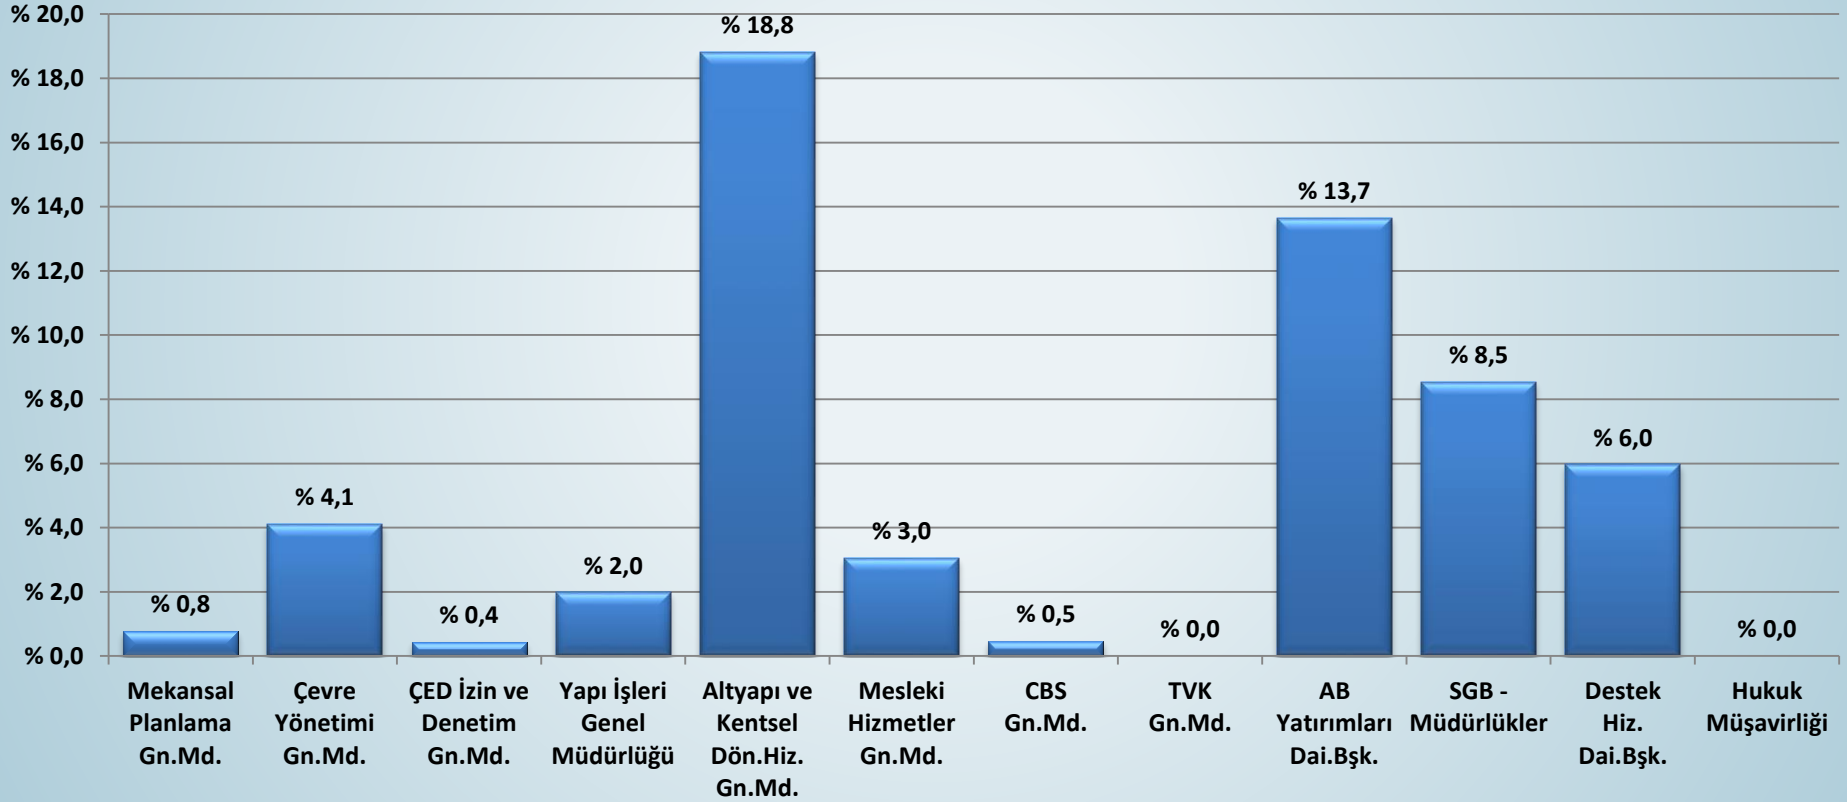

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	2.000	200	1.200	0	% 0,0	
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2018	3.860	2.860	500	84	% 16,8	Kilis İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı İşi için, 1 nolu hakediş bedeli olarak KDV Dahil 84.311,00 TL, ödeme yapılmıştır.
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2017	2.915	1.315	1.600	0	% 0,0	
2015K090010	Özel Proje Alanları (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	2.100	600	1.500	0	% 0,0	
2016K090020	GAP ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.640	64	1.576	0	% 0,0	
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.000	0	% 0,0	
2017K090030	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.000	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	4.000	0	2.500	0	% 0,0	
	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2017	1.000		1.000	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2018	1.500		500	0	% 0,0	
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2018	1.500		1.000	0	% 0,0	
8 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.515	5.039	10.876	84	% 0,8	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K060210	Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2017	2.993	1.693	1.300	0	% 0,0	TÜBİTAK ile 09.10.2015 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan projeye ait 2. Ara Rapor 01.11.2016 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup, 595.900 TL'lik ödeme işlemi tamamlanmıştır. Proje kapsamında atıksu ve alıcı ortam örneklemelerinin analiz sonuçları üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca pilot sağlık kuruluşlarında kullanılan tüm analizörler ve bu analizörlerde kullanılan sıvı kimyasallar değerlendirilmektedir. Bu aşamada ekolojik risk değerlendirme çalışmaları ile birlikte mayıs ayında yapılması planlanan çalıştay için de hazırlıklar devam etmektedir. Projeye ait nihai raporun 2017 yılı temmuz ayı sonunda Bakanlığımıza sunulması beklenmektedir.
2016K060210	Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	3.500	300	876	0	% 0,0	28.07.2016 tarihinde imzalanan protokolle proje başlamış olup, II. Ara Rapor Dönemi tamamlanmıştır. Ancak 14 Ocak 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete ile proje bütçesi, 2017 yılı ödeneği ve süresinde değişiklik olmuştur. 13.02.2017 tarihli ve 1853 sayılı yazı ile 2017 yılı içinde yapılması gereken iş ve işlemler için ek bütçe talebi yapılmış olup, konuyla ilgili geri dönüş beklenmektedir.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	2.500	445	826	0	% 0,0	Proje kapsamında havzaya özgü kirleticilerin belirlenmesi amacıyla Nilüfer Çayı Alt Havzası ve Yeşilirmak Havzasında belirlenen istasyonlarda kış-ilkbahar aylarına ait numune alma ve analiz çalışmaları yapılmış olup mevsimsel izleme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bahse konu havzalarda noktasal kaynakların tespiti ve karakteristiğinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 1.eğitim programı kapsamında hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2018	1.000		150	0	% 0,0	Projenin ihalesine çıkılmamıştır.
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	915	472	443	443	% 100,0	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile 30.09.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve ilk ödeme olan 468,400 TL Aralık 2015 te ödenmiştir. Final Raporu'nun onaylanmasını müteakip 468,400 TL Ocak 2017 de ödenmiştir. Proje süresi içerisinde 20 Ocak 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100050	İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2017	3.839	2.494	1.345	0	% 0,0	2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 12.10.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yüklenici tarafından projeye ilişkin başlangıç raporu, 11.11.2015 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup bunun üzerine Yükleniciye 2015 yılında proje bütçesinin % 10'u oranında (383.500 TL) ödeme yapılmıştır. 2016 yılında ise proje ilişkin birinci ara rapor 7 Nisan 2016 tarihinde sunulmuştur. Yükleniciye proje bütçesinin % 25'i oranında (gecikme cezalı olarak 902.687,50 TL) ödeme yapılmıştır. İkinci ara rapor 30.11.2016 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş ve yükleniciye proje bedelinin %30'u oranında 1.150.500 TL ödeme yapılmıştır. Kalan ödemeler 3. Ara rapor %25 ve Nihai Rapor %10 olacak şekilde bu yıl içerisinde tamamlanacaktır.
2016K100040	Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2017	600	300	300	0	% 0,0	Söz konusu proje kapsamında 2017 yılında Nisan ayına kadar herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Projenin 2017 yılında sonlandırılması planlandığından bu yıl içinde 302.050 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (4*) (Çevre Sektörü)	2016-2019	3.000	0	1.000	0	% 0,0	Proje yatırım programında yer almış olup, ilgili Bakanlıklarla protokoller imzalanmış olup, teknik şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	0	1.000	0	% 0,0	Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2016/9368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi ile 03.02.2017 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç Raporu teslim edilmiştir, inceleme aşamasındadır.
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2017	1.071	410	661	0	% 0,0	2013K100090 Nolu 'Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesinin' toplam proje tutarı 7.236.000 TL olup bütçesi 3.000.000 Avro'dur. Söz konusu projenin ulusal katkısı 804.000 TL olup proje süresi iki yıldır (2014-2016). Proje 25 Aralık 2014 tarihinde başlamış olup proje için 120.000 Avro yatırıldığı kur üzerinden 344.832,00 TL tutarındaki ulusal katkı payı yatırılmıştır.13/02/2015 tarihinde ulusal katkı olarak 97.431,2 €, AB katkısı olarak 876.880,8 € yüklenici firmaya ödenmiştir. Projenin genel amacı, sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve raporlanması ile ilgili tespit edilen boşlukların giderilmesi, Ulusal Sera Gazı Envanterinin, sera gazı projeksiyonlarının ve iklim değişikliği ulusal bildirimlerinin hazırlanması konusunda teknik düzeyde kapasitenin artırılması olup, 2017 yılının ilk çeyreğinde de kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarını devam ettirmiştir. Proje kapanış toplantısı Nisan 2017'de gerçekleştirilecektir.
AB KATKISI			9.639	4.337	5.302	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100080	Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2017	893	357	536	0	% 0,0	Proje devam etmekte olup, 2017 yılı içerisinde herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu proje 2018 yılının Şubat ayında biteceğinden 2017 yılında herhangi bir ödeme ön görülmektedir.
AB KATKISI			8.033	4.016	4.017	0	% 0,0	
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2017	893	357	536	0	% 0,0	Bahse konu proje 8 Mart 2017 tarihinde Point otel (Ankara) düzenlenen kapanış etkinliği ile sonlandırılmıştır. Projeye ilişkin raporlar Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup değerlendirilmemiz Merkezi İhale ve Finans birimi ile paylaşılmıştır.
AB KATKISI			8.033	4.016	4.017	0	% 0,0	
2015K100150	Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	357	142	215	0	% 0,0	Proje 16 Aralık 2015 tarihinde başlamış olup açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hazine Müsteşarlığı’ndan harcama talebi olmadığından, 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasında herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. Nisan 2017 tarihine kadar 4 eğitim, 2 çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş olup, projeye ilişkin yasal boşluk analizi tamamlanmış ve websitesi, düzenleyici etki analizi, taslak yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.
AB KATKISI			3.213	1.428	1.785	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100060	Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2019	894	0	300	0	% 0,0	Projenin yatırım programından çıkartılmasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, proje Kalkınma Bakanlığı tarafından programdan çıkartılacaktır.
AB KATKISI			8.032	0	2.678	0	% 0,0	
2017K100040	Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	4.106		1.307	0	% 0,0	
AB KATKISI			36.948		12.316	0	% 0,0	
15 Proje	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	714		238	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	714		238	0	% 0,0	Proje ihale aşamasında olup söz konusu sürecin 2017 Haziran ayında tamamlanması öngörülmektedir.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	714		181	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
			6.426		2.142	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	1.964		650	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
			17.670		5.890	0	% 0,0	
06 ve 07 TOPLAM			29.361	6.970	10.795	443	% 4,1	
AB KATKISI			73.898	13.797	30.115	0	% 0,0	

(4*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2017	9.594	7.673	1.921	0	% 0,0	Bölgedeki güvenlik koşulları nedeniyle Diyarbakır Temiz Hava Merkezi Ön Değerlendirme Projesi için iki defa uzatma verildiğinden projeye başlanamamıştır.
2017K100010	Atıkların Tehlikelilik Vasıflarının Belirlenmesi Projesi (Döner Sermaye-3.000.000 TL ödenek eklendi) (Çevre Sektörü)	2017-2017	10.421		10.421	0	% 0,0	Teknik şartnamesi hazırlanmış, ihale aşamasına gelinmiştir. Projenin ihalesi 12.05.2017 tarihinde yapılacaktır.
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu	2015-2017	3.000	1.000	2.000	0	% 0,0	2017 yılında herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir. 2017 yılı Mayıs ayında ara rapor teslim edilecek olup 1.300 TL lik ödeme yapılacaktır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	51.278	12.108	9.170	198	% 2,2	Gn.Md. Labaratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili; 2016 yılı son hakediş ödeme işlemleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, 2017 yılı bakım onarım ihalesi gerçekleştirilerek ilk ay (Mart ayı) için hakediş işlemleri devam etmektedir. Diğer taraftan, Marmara Temiz Hava Merkezi tarafından yürütülen proje ile ilgili; 06.2 kaleminden yapılan Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce İşletilen 54 Adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarında Bulunan Cihaz ve Ekipmanların, 2017-2019 Yılları arası(3 Yıl) Bakım-Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı işine ait Ocak ve Şubat Ayı Ödeme Toplamı(197.744,40 TL.) ödemesi Marmara Temiz Hava Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 05.04.2017 tarihi itibarı ile Mart ayı ödemesi olan 121.068,00 TL. ödemesi yapılmak üzere Mal Müdürlüğüne gönderilmiştir.
	Döner Sermaye	2015-2019	60.693	14.975	21.045	0	% 0,0	Gn.Md. Labaratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili; Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi'ne bağlı illerde istasyon kurulumu projesine başlanmış ve teknik şartname hazırlanmış olup yaklaşık maliyeti belirlemek amacıyla firmalardan fiyat teklifi beklenmektedir. Diğer taraftan, Marmara Temiz Hava Merkezi tarafından yürütülen proje ile ilgili; Marmara Bölgesinde Bulunan İl/İlçelere 7 Adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Kurulumu işine ait ihale sonuçlandırılmış 28.03.2017 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 29.03.2017 tarihinde firma işe başlamıştır. Tahminen 2017 Ağustos sonu 2.436.000,00 TRY (Türk Lirası)(KDV Hariç) ödemesi yapılacaktır.
2016K100080	Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (AB)	2016-2018	590	0	472	0	% 0,0	Peroje kapsamında teknik yardım hizmet sözleşmesi 14.01.2017 tarihinde imzalanmış olup, 07.02.2017 tarihinde sözleşmenin uygulama süreci başlamıştır. Müşavir firma tarafından avans ödeme talebimde bulunmuş olup, talep AB Yatırımları Dairesi Başkanlığımız tarafından incelenmektedir.
AB KATKISI	3.338		0	2.671	0	% 0,0		
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	71.883	20.781	20.984	198	% 0,9	
		DÖNER SERMAYE	63.693	14.975	24.045	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	135.576	35.756	45.029	198	% 0,4	
		AB KATKISI	3.338	0	2.671	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	11.000		11.000	0	% 0,0	Kesin kabul işlemleri tamamlanma aşamasında olup kesin hesap çalışmalarına başlanacaktır.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	2.670	1.370	1.300	0	% 0,0	İL MÜDÜRLÜKLERİNİ KAPSAYACAK ŞEKLİDE BAKANLIK PROJE ARŞİVİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PROJE ÇİZİM DOSYALARININ ÇEVİRİM İÇİ YÖNETİMİNİ (Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Standardı ne uygun olarak) SAĞLAYACAK BİLGİSAYARLI OTOMASYON SİSTEMİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI SONRASI İHALE İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	3.500	1.512	1.988	32	% 1,6	Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme ve Geliştirilmesi İşi ihalesi 03.04.2017 tarihinde , 175.000,00 TL+ KDV bedelli olarak yapılmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425.000,00 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve pilot illerde uygulanması devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	1.100	600	500	12	% 2,4	Bilgisayar alımı yapıldı.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü)	2015-2017	3.000	2.000	1.000	0	% 0,0	27 Nisan 2017 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
2017K140090	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Alımı (Afetler Sektörü)	2017-2017	1.760		1.760	0	% 0,0	Teknik konulara ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2019	6.700	3.000	1.500	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı alanlarla ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir.Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt gibi işlerde kullanılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2018	25.622	11.966	2.138	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2018	5.649	3.513	2.136	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlandı. Yaklaşık 80 konutun güçlendirme ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2018	11.135	3.389	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2018	8.838	5.064	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2019	159.281	0	13.519	0	% 0,0	
	Hasankeyf-İhsu Barajı İskanı	2009-2019	63.361	0	3.519	0	% 0,0	İhsu Barajı İskanı için iskan duyurusuna çıkılmış olup başvurular alınmıştır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2019	95.920	0	10.000	0	% 0,0	Yusufeli Barajında hak sahipliği başvuruları alınmış olup inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir.Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2019	13.935	2.533	5.881	2.864	% 48,7	Kütahya-Kureysler köyü, Erzincan-Üzümlü Ahıska Türkleri İskan konutları Doğalgaz Dönüşümü ve Erzurum-Taşagül köylerinin altyapıları için kullanılmaktadır. 3.000.000 TL ödenek Kalkınma Bakanlığı ile koordineli olarak altyapı işlerinin ihalesinin 2017 yılına kalmaması için temin edilmiştir.Kütahya konutlarının altyapı ihalesi tamamlanmıştır. Erzurum ve Erzincanda İhale ilanlarına aralık ayında çıkılmış olup Erzincan'daki konutların ihalesi 13 Ocak'ta yapılmıştır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	5.400	1.800	1.500	22	% 1,5	Şanlıurfa, Denizli, Muğla, Uşak, Erzurum, Kars, Iğdır, Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerine ait projeleri kapsayan 2. kitap çalışmaları devam etmektedir.. (51 tip konut projesi, 10 tip köy konağı projesi) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Konya, Karaman, Aksaray illerine ait projelerin elde edilme süreci devam etmektedir. (39 tip konut, 9 tip köy konağı) Adana, İçel, Hatay, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Bingöl, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt illerine ait projeler için ihale çalışmaları devam etmektedir. (35 tip konut, 5 tip köy konağı)
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	3.553	1.826	500	0	% 0,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukdca harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	189.686	108.143	2.000	0	% 0,0	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2016	3.718	3.718	0			27 konut ve alt yapı inşaatı işleri tamamlanmış olup dağıtım yapılmıştır.
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2018	177.098	104.425	2	0	% 0,0	Üst yapı işi tamamlandı. Altyapı işine başlandı. Yaklaşık 4.730.000.-TL ödenek harcanmış olup bütçesi DSİ den karşılandığı için gerçekleşmemizde görünmemektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2019	8.870		1.998	0	% 0,0	2017 Yılında Yatırım Programında yer almaktadır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	3.367	1.000	550	0	% 0,0	Yıl içerisinde; 1 adet genel eğitim ve 4 adet de bölgesel eğitim yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda planlama yapılmıştır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2019	125.801	0	40.000	0	% 0,0	İhalesi 26.01.2017 tarihinde yapılmıştır. Kalkınma Bakanlığı ile koordineli olarak işin ihalesinin 2017 yılının 1. ayında yapılabilmesi amacıyla temin edilmiştir. Aksi takdirde işin yapımına başlanması 2017 yılının 3. yarısına sarkabilecektir. Ödenek harcanmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	126.223	109.430	15.905	0	% 0,0	Nisan ayı içerisinde 2.783.600 TL harcama yapılmıştır.
	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (06.5-Ödeneği)		43.000	12.500	27.228	0	% 0,0	Kırsal dönüşüm projelerinden ihaleli olarak yapılacak olan projelerdir. 3 köyde çalışmalar devam etmekte olup bunlar; Kırsal Dönüşüm kapsamında; 1-Kütahya-Arslanapa İlçesi-Kureyşler köyü (30 hak sahibi) 2-Kahramanmaraş-Göksu İlçesi-Güçüksü köyü (76 hak sahibi) 3- Karaman-Merkez-Güldere Köyü (73 hak sahibi) Kütahya-Arslanapa-Kureyşler köyünde üstyapı inşaatları tamamlanmıştır. Altyapı işin ihalesi yapılmış olup yer teslimi yapılarak inşaatlara başlanmıştır. Kahramanmaraşta inşaatlar devam etmektedir. Karamanda proje çalışmaları devam etmektedir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	5.532	2.800	54	0	% 0,0	Vatandaşlardan talep gelmesi halinde harcanmaktadır.
2011K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2020	63.830	2.000	20.000	0	% 0,0	KEYY kapsamında Erzurum, Aksaray ve Kastamonu illerine ödenek gönderildi. Nisan ayı içerisinde 2.616.600 TL harcama yapılmıştır.
18 Proje		06 ve 07 TOPLAM	588.375	148.250	101.364	2.930	% 2,9	
		08 TOPLAM	195.585	114.230	35.959	0	% 0,0	
		DÖNER SERMAYE	11.000	0	11.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	794.960	262.480	148.323	2.930	% 2,0	

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerinin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	6.500	650	2.400	0	% 0,0	Proje kapsamında Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HTTTM) ile Protokol imzalanmış olup, yer teslimi HTTTM'ye yapılmıştır. Proje kapsamında herhangi bir nakdi ödeme yapılmamıştır.
2015K090050	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.500	2.450	1.050	1.050	% 100,0	Proje Ocak 2017 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
2017K090110	Plan Tadilatlarında ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kentsel Altyapı Etki Analizi Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2017-2017	750		750	4	% 0,5	Proje kapsamında Protokol taslağı hazırlanmış, Hukuk Mütavirliği ve Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiş olup süreç devam etmektedir. Proje kapsamında herhangi bir nakdi ödeme yapılmamıştır.
2017K090120	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	2.000		1.200	0	% 0,0	Sahada anket çalışması yapılması için ihalesi yapılmış olup, ANAR sosyal araştırmalar merkezi ile sözleşme imzalanacaktır. Proje kapsamında herhangi bir nakdi ödeme yapılmamıştır.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2018	2.900	2.600	200	0	% 0,0	Projede ödeme planına göre (2016 yılı içerisinde 3.000,00 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.) %91 gerçekleşme sağlanmıştır. Söz konusu yazılımın deneme ve kontrol süreci 2017 yılı itibarıyla devam etmektedir.Proje kapsamında herhangi bir nakdi ödeme yapılmamıştır.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	15.650	5.700	5.600	1.054	% 18,8	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015D000020	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü)	2015-2017	1.369	1.190	179	131	% 73,2	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi 2017 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanacak olup; 131.174,46 TL Hazine Müsteşarlığı Ulusal Fona aktarılmıştır.
AB KATKISI			10.710	9.996	714	525	% 73,5	
2012D100020	Yeşil Bina ve Binalarda Enerji Performansı Yazılımları (Enerji Sektörü)	2012-2017	4.033	3.278	755	1	% 0,1	* Sürdürülebilir Yeşil Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen dört etaplı "Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Kapsamında Data Yönetim Planı Hazırlanması İşinin I. etabı 2016 yılı içinde tamamlanmıştır. Kalan etap çalışmalarına 2017 yılında devam edilmektedir. Tüm etapların tamamlanmasının ardından Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımı geliştirilecektir. * 6 ay süreli Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-Tr) Projesi 2017 Yılı Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşine ait sözleşme 02/03/2017 tarihinde iki taksitte ödenecek 50.000 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. Bu iş kapsamında henüz ödeme yapılmamıştır.
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2017	2.620	2.400	220	2	% 0,9	* 11-12/01/2017 tarihleri arasında düzenlenen İstanbul'da 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına katılım sağlanmış olup, katılım sağlayan personellerin harcırah ödemeleri yapılmıştır. * 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde İzmir Yaşar Üniversitesi gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Günleri Etkinliğine katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır. * 20- 21 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılan Yapı Denetimi Uygulamaları Eğitimi'ne katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır. * 22-25 Mart 2017 3. Uluslararası Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri CNR EXPO Fuarı ile 23-26 Mart 2017 15. Uluslararası Asansör TÜYAP İstanbul Fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2017	844	574	270	0	% 0,0	Yapı Kooperatifleri Yazılım Sistemi (E-Kooperatif) 2017 Yılı Bakım, Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşinin 06.04.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Henüz hak ediş ödemesi yapılmamıştır.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	12.594	12.094	500	25	% 5,0	Mart 2017 tarihinde düzenlenen, PGD Elemanları İleri seviye eğitimi kapsamında organizasyon ve yolluk ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmıştır.
2015K010070	Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	1.250	750	500	64	% 12,8	* Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği revizyonuna ilişkin Komisyon marifetiyle yürütülen çalışmalar Mart ayı başında tamamlanmış olup, bazı belediye ve mimarlarla toplantılar gerçekleştirilmiş, taslak metin nihai hale getirilmiştir. Taslak Yönetmelik Mart ayı içerisinde kurum görüşlerine açılmıştır. Nisan ayı sonuna kadar intikal edecek kurum görüşleri, Komisyonca değerlendirmeye alınacaktır. * Otopark Yönetmeliği hazırlığı kapsamında Japonya'ya inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
2016K010080	Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Bakım ve İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	600	250	350	17	% 4,9	Yasaklanan mütahhithlere ilişkin ilan bedelleri ödenmiştir.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	4.270	2.200	1.000	14	% 1,4	13.12.2016 tarihli sözleşme ile (KDV hariç birim fiyatı 319.000TL) 2 adet Optik Emisyon Spektrometre Cihazı ile Numune Hazırlama Ekipmanları Hatay ve Karabük İl Müdürlüğü laboratuvarlarımıza alınmış ve cihaz teslimleri yapılmıştır. -14.03.2017 tarihli sözleşme ile (KDV hariç 42.800 TL) Afyon ve Karaman İl müdürlüklerimize 2 adet 200 tonluk Beton ve Karot Presi alımı gerçekleştirilmiştir.
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.900	1.277	1.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 1.Dönem (01.01.2017--31.03.2017) 8900 usta eğitim almak için İl Müdürlüklerimize başvuru yapmıştır. Ustaların bilgilendirilmesi ve eğitimlere çağırılması amacıyla İl Müdürlüklerimizce ustalara SMS hizmeti sağlanmıştır. Diğer taraftan; hali hazırda toplam 853 adet usta Kurs Bitirme Belgesi almıştır.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.800	2.100	1.500	0	% 0,0	1) Ömer Halisdemir Üniversitesi ile yürütülen "Doğal Kayaların Oyulması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirme Tasarım ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında hazırlanan Yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine 05.12.2016 tarihinde gönderilmiş olup toplanan görüşler değerlendirilmiştir. Yönetmelik hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 2) İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 27.05.2016 tarihinde imzalanan "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Kapsamında Uygulama Kılavuzu Hazırlanması Projesi" hizmet uygulaması protokolü kapsamında Uygulama Kılavuzunun Bakanlığımızca basılı ve dijital olarak çoğaltılması işi tamalanmıştır. Bakanlığımız ve diğer kamu kurumlarında çalışan teknik personeller ve çelik yapıların tasarım, yapım ve denetim alanlarını da kapsayan tüm sektör çalışanlarına kaynak Kılavuz olarak dağıtımı sağlanacaktır. 3) "Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği" nin 2017 yılının 2. yarısında yayımlanması planlanmaktadır. 4) 2017 yılının ilk yarısında Bakanlığımızın planlı eğitimleri kapsamında 26-28 Nisan 2017 tarihlerinde II müdürlüklerinde görevli teknik personele "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları"na dair eğitim verilmesi planlanmaktadır. 5) 2017 yılının 2. yarısında "Ahşap Yapıların Tasarım Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" imzalanması planlanmaktadır. 6) 2017 yılının 2. yarısında "Hafif Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" imzalanması planlanmaktadır. 7) 23-24 Mart 2017 Tarihinde İstanbul'da düzenlenen İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 2017 "Hedef Sıfır , Pratik Çözümler" konulu Eğitime Eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
2015K010100	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	1.750	550	550	0	% 0,0	Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi ile, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 58'inci maddesinin 8'inci fıkrasında hükme bağlandığı üzere, fenni mesullerin inşaat alanı sınırlamalarına ilişkin m ² , yapı yeri ile fenni mesulün işyeri arasındaki mesafe ile fenni mesullerin denetime ilişkin iş ve işlemlerinin internet ortamında izlenmesi ve bu şekilde bürokrasinin azaltılması ve sayısız ortamda belge üretilmesi hedeflenmektedir.
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	450	150	150	0	% 0,0	İlk üç aylık periyotta herhangi bir görevlendirme yapılmadığından harcama gerçekleşmemiştir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	990	330	330	0	% 0,0	Projede Muayene ve Önkabul işlemleri tamamlanmıştır.
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000	500	500	0	% 0,0	"Kadim Şehirler Projesi" kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile 18/01/2017 tarihinde protokol imzalanmış olup, protokolün bedeli kdv hariç 600,000-TL olup, süresi 330 (üçyüzotuz) gündür.Proje kapsamında Protokolün "madde 5.1" Literatür Taraması Raporu Yıldız Teknik Üniversitesinin 3/4/2017 tarihli yazısı ekinde basılı ve ayrıca dijital olarak Bakanlığımıza iletilmiştir.
2016K090050	Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000	500	500	0	% 0,0	"Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi Projesi" protokolü 24.01.2017 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile imza edilmiştir. Protokolün bedeli kdv hariç 390,000-TL olup, süresi 180 (yüzseksen) gündür. Protokolün 9. maddesi doğrultusunda 1. Aşamaya ait 2 adet Ara Rapor Bakanlığımıza iletilmiştir.
15 Proje		06 ve 07 TOPLAM	42.470	28.143	8.304	254	% 3,1	
		AB KATKISI	10.710	9.996	714	525	% 73,5	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090440	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.200	2.700	500	0	% 0,0	Proje kapsamında devam eden iki adet hizmet alımı işi vardır. 2016 yılında ihalesi yapılan "Coğrafi Bilgi Sistemleri Meslek Gruplarına Yönelik Belgelendirme Sınav Merkezi ve Yetkilendirme Süreçleri Hizmet Alımı İşi"nin III.hakedişi yapılacaktır. (147.634TL) "Uzaktan Eğitim Portal Yazılımı ilave modüllerin geliştirilmesi ve mevcut modüllerin güncellenmesi İşi" nin sözleşmesi 30.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. (İhale Bedeli 155.000TL+KDV)
2015K090500	e-Plan Otomasyonu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	4.000	3.300	700	0	% 0,0	
2016K090420	Hali hazır Harita Üretimine Yönelik 1/1000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	3.000	1.500	1.500	62	% 4,1	"İnsansız Hava Araçları İle True (Gerçek) Ortofoto Üretimi" 1-) 2017-1, 2-) 2017-3 ve 3-)2017-4 nolu işlerin ihaleleri tamamlanmış ve yüklenici firmalarla sözleşme yapılması beklenmektedir. 4-) 2017-2 Nolu iş için ihale tarihi beklenmektedir (02.05.2017) 5-) 2017-5 ve 2017-6 nolu işler için teknik şartname ve yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları yürütülmekte olup, alınacak ihale olurları sonrası 2017 Nisan ayı içerisinde ihalelerinin yapılması planlanmaktadır.
2016K090430	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.400	700	700	0	% 0,0	
2016K090440	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	2.600	2.000	600	0	% 0,0	2017 yılına 600.000 TL bütçe ayrılmıştır. Projenin sağlıklı işlemesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi kapsamında yapılacak çalışmaların yapılması amacı ile 2017 bütçesine ek olarak Bakanlık Döner Sermaye Bütçesinden 2.500.000 TL kullanılması talep edilmiştir. Projedeki ödenek ve Bakanlık Döner Sermaye Bütçesinden talep edilen ek ödenek Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi işi için kullanılacak olup teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2015K090410	Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	500	2.450	0	% 0,0	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	500	2.450	0	% 0,0	
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (4*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	5.000	0	3.000	0	% 0,0	
2017K090360	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000		11.300	112	% 1,0	PROJE KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETMETEDİR
2017K090370	Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi ve Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000		4.000	0	% 0,0	PROJE KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETMETEDİR.
2017K090380	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000		4.800	0	% 0,0	TEKNİKŞARTNAME HAZIRLIK AŞAMASINDA.
2017K090390	Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının İyileştirilmesi Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	6.000		5.000	0	% 0,0	PROJE KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM ETMETEDİR.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu	2015-2017	1.000	510	490	0	% 0,0	
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)		1.257	502	2	0	% 0,0	
AB KATKISI			11.297	4518	2	0	% 0,0	
14 Proje		06 ve 07 TOPLAM	77.457	12.212	37.492	174	% 0,5	
		AB KATKISI	11.297	4.518	2	0	% 0,0	

(4*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. Fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip pilot uygulama yapılabilecektir.

(6*) Yeni proje formu hazırlanacaktır. Proje formu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000300	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi Projesi (Turizm Sektörü)	2014-2017	1.663	1.208	455	0	% 0,0	Projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2017F000110	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi (Turizm Sektörü)	2017-2017	21.000		21.000	0	% 0,0	Mali katkı protokolleri çalışmaları devam etmektedir.
	Köyceğiz Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	2.000		2.000	0	% 0,0	Projeler için çalışmalar devam etmektedir.
	Beypazarı İnözü Vadisi Peyzaj Projesi Yapımı	2017-2017	4.000		4.000	0	% 0,0	Projeler için çalışmalar devam etmektedir.
	Uzungöl Çevre Düzenleme Projesi (DOKAP)	2017-2017	2.000		2000	0	% 0,0	Protokol aşamasında.
	Pamukkale Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	3.000		3.000	0	% 0,0	Projeler için çalışmalar devam etmektedir.
	Yerköprü Şelalesi Peyzaj Projesi Yapımı (KOP)	2017-2017	5.000		5.000	0	% 0,0	Projeler için çalışmalar devam etmektedir.
	İnsuyu Mağarası Çevre Düzenleme Projesi	2017-2017	1.000		1.000	0	% 0,0	Projeler için çalışmalar devam etmektedir.
	Beyşehir Gölü Çevre Düzenleme Projesi (KOP)	2017-2017	3.000		3.000	0	% 0,0	Projeler için çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Ürgüp Dağıstanlı Sokak Düzenleme Projesi (KOP)	2017-2017	1.000		1.000	0	% 0,0	Protokol aşamasında.
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP) (Turizm Sektörü)	2017-2019	6.000		2.000	0	% 0,0	Projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2017K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçmesuyu Sektörü)	2017-2017	2.500		2500	0	% 0,0	3 adet proje bulunmakta olup, ihale aşamasındadır. (Selime, Eşmekaya, Çamlıhemşin İçmesuyu projeleri)
2016K090060	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	2.000	825	675	0	% 0,0	Proje ihale öncesi çalışmaları devam etmektedir.
2017K090260	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	800		600	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
2017K090270	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	600		300	0	% 0,0	Protokol çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090280	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	800		700	0	% 0,0	Protokol yapıldı. Belediyesince çalışmaları yapılıyor.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2018	63.368	12.368	38.884	0	% 0,0	Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında proje yapılmaktadır. Proje için 2017 yılına tahsis edilen 38.884.000 TL ödenegin tamamı 28.03.2017 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na aktarılmıştır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2018	3.710	2.603	622	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.250		500	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.800		700	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	105.491	17.004	68.936	0	% 0,0	

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2017	6.247	5.147	1.100	132	% 12,0	Proje devam etmektedir.
AB KATKISI			34.897	29.162	5.735	2.991	% 52,1	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2018	5.925	4.268	1.442	215	% 14,9	Proje devam etmektedir.
AB KATKISI			56.306	33.910	20.046	4.900	% 24,4	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	12.172	9.415	2.542	347	% 13,7	
		AB KATKISI	91.203	63.072	25.781	7.890	% 30,6	

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 31.12.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090820	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	1.000		1.000	890	% 89,0	İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Bölgesel Seminerlerine 2016 yılında 5 bölge ve 52 ilden toplam 1429 kişi katılmıştır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.000	0	1.000	890	% 89,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2019	110.139	33.704	28.645	5.884	% 20,5	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.923	2.923	100	94	% 94,0	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde KDV dahil 2.922.860,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2015 yılında HİZMETE AÇILMIŞTIR . 2017 yılında kesin hesap farkı ödenmiştir.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	7.796	4.796	3.000	1.963	% 65,4	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde KDV dahil 8.362.660,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %85' dir. 2017 Temmuz ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	4.717	2.217	2.500	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde KDV dahil 6.613.900,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %90' dir. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR .
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	11.259	10.859	400	270	% 67,5	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde KDV dahil 9.140.280 TL 'ye ihale edilmiştir. 2016 yılında HİZMETE AÇILMIŞTIR . 2017 yılında kesin hesap farkı ödenmiştir.
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.293	2.793	2.500	1.910	% 76,4	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde KDV dahil 6.872.320,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %90' dir. 2017 Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	8.824	6.324	2.500	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde KDV dahil 8.555.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %95' dir. 2017 Mayıs ayında hizmete açılması planlanıyor.
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.292	3.792	1.500	1.647	% 109,8	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde KDV dahil 4.794.340,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Fiziki gerçekleşme %100' dür. Geçici kabul yapılmıştır. 2017 Haziran ayında hizmete açılması planlanıyor.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.407	0	2.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.345	0	2.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.383	0	3.420	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde KDV dahil 6.652.840,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı, yapım işi henüz başlamadı.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	7.267	0	1.901	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	17.003	0	3.900	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	5.888	0	1.500	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2019	7.043	0	1.500	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2017-2018	1.699	0	1.000	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Döner Sermaye		45.170	0	22.768	0	% 0,0	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	35.320		19.768	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 23.08.2016 tarihinde KDV dahil 28.219.700,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 16.12.2016 tarihinde imzalandı, yapım işi henüz başlamadı.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	5.100		1.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	4.750		1.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2017-2017	243		243	0	% 0,0	3 adet T5 (Minibüs) tipi aracın DMO dan temini için 243.000 TL tutarında kredi açılmıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı (Döner Sermaye-6.500.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	7.880		7.880	48	% 0,6	2017 yılında Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, İl Müdürlüklerine 6.222.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
	Hizmet Binası Onarımı (Döner Sermaye-3.500.000 TL ödenek eklendi)	2017-2017	5.300		5.300	50	% 0,9	2017 yılında Hizmet binası onarımı için, İl Müdürlüklerine 5.250.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
2017G000130	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2017-2017	6.000		6.000	70	% 1,2	2017 yılında Lojman binası onarımı için, İl Müdürlüklerine 4.800.000 TL tutarında talimat verilmiştir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	119.562	33.704	38.068	6.052	% 15,9	
		DÖNER SERMAYE	55.170	0	32.768	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	174.732	33.704	70.836	6.052	% 8,5	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017G000130	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2017-2017	300		300	3	% 0,8	Sincan/Fatih de bulunan 58/5 ve 64/2 Kamu Konutlarının Pis ve Temiz Su Borularının değiştirilmesi işi yaptırılmıştır.
2017K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2017-2017	141		141	0	% 0,0	
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2017-2017	300		300	43	% 14,3	Bakanlığımız Spor Salonunda Kullanılmak Üzere Koşu Bandı ve Bakanlığımız Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Geri Dönüşüm Atık Ünitesi Alınmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2017-2017	500		500	28	% 5,6	Bakanlığımız Matbaasına Havalandırma Sistemi ile Merkez Hizmet Binası 18. Kat Tadilatı Yaptırılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.241	0	1.241	74	% 5,9	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2017 31.03.2017 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100160	Çevre Sorumluluk Direktifinin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	525	370	155	0	% 0,0	Proje kapsamında 2017 yılı için ödeme çağrısı henüz gelmemiştir. Bu nedenle herhangi bir harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında; 26 -31 Mart 2017 tarihleri arasında İspanya'da (5) günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			4.723	3.170	1.553	0	% 0,0	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	525	370	155	0	% 0,0	
		AB KATKISI	4.723	3.170	1.553	0	% 0,0	
