

# **01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu**


**Sadi KIZIK**  
**Strateji Geliştirme Başkan V.**

**17 Mart 2015**

## BAKANLIK 01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL SONU REVİZE ÖDENEĞİ	YIL SONU HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	571.825.000	571.635.000	559.760.546	% 97,9
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.871.000	95.061.000	92.883.129	% 97,7
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.628.000	86.640.380	80.232.610	% 92,6
05	CARİ TRANSFERLER	196.795.000	391.434.360	384.661.817	% 98,3
06	SERMAYE GİDERLERİ	232.250.000	1.072.379.731	674.802.651	% 62,9
	Bakanlık Yatırım Programı	216.250.000	169.418.000	122.736.036	% 72,4
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.000.000	15.408.000	2.408.000	% 15,6
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0	887.553.731	549.658.615	% 61,9
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	139.772.000	179.267.000	175.546.890	% 97,9
	Bakanlık Yatırım Programı	39.397.000	39.892.000	36.387.338	% 91,2
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	100.375.000	139.375.000	139.159.552	% 99,8
08	BORÇ VERME	24.275.000	51.204.000	40.797.600	% 79,7
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.329.416.000</b>	<b>2.447.621.471</b>	<b>2.008.685.243</b>	<b>% 82,1</b>

## BAKANLIK 01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

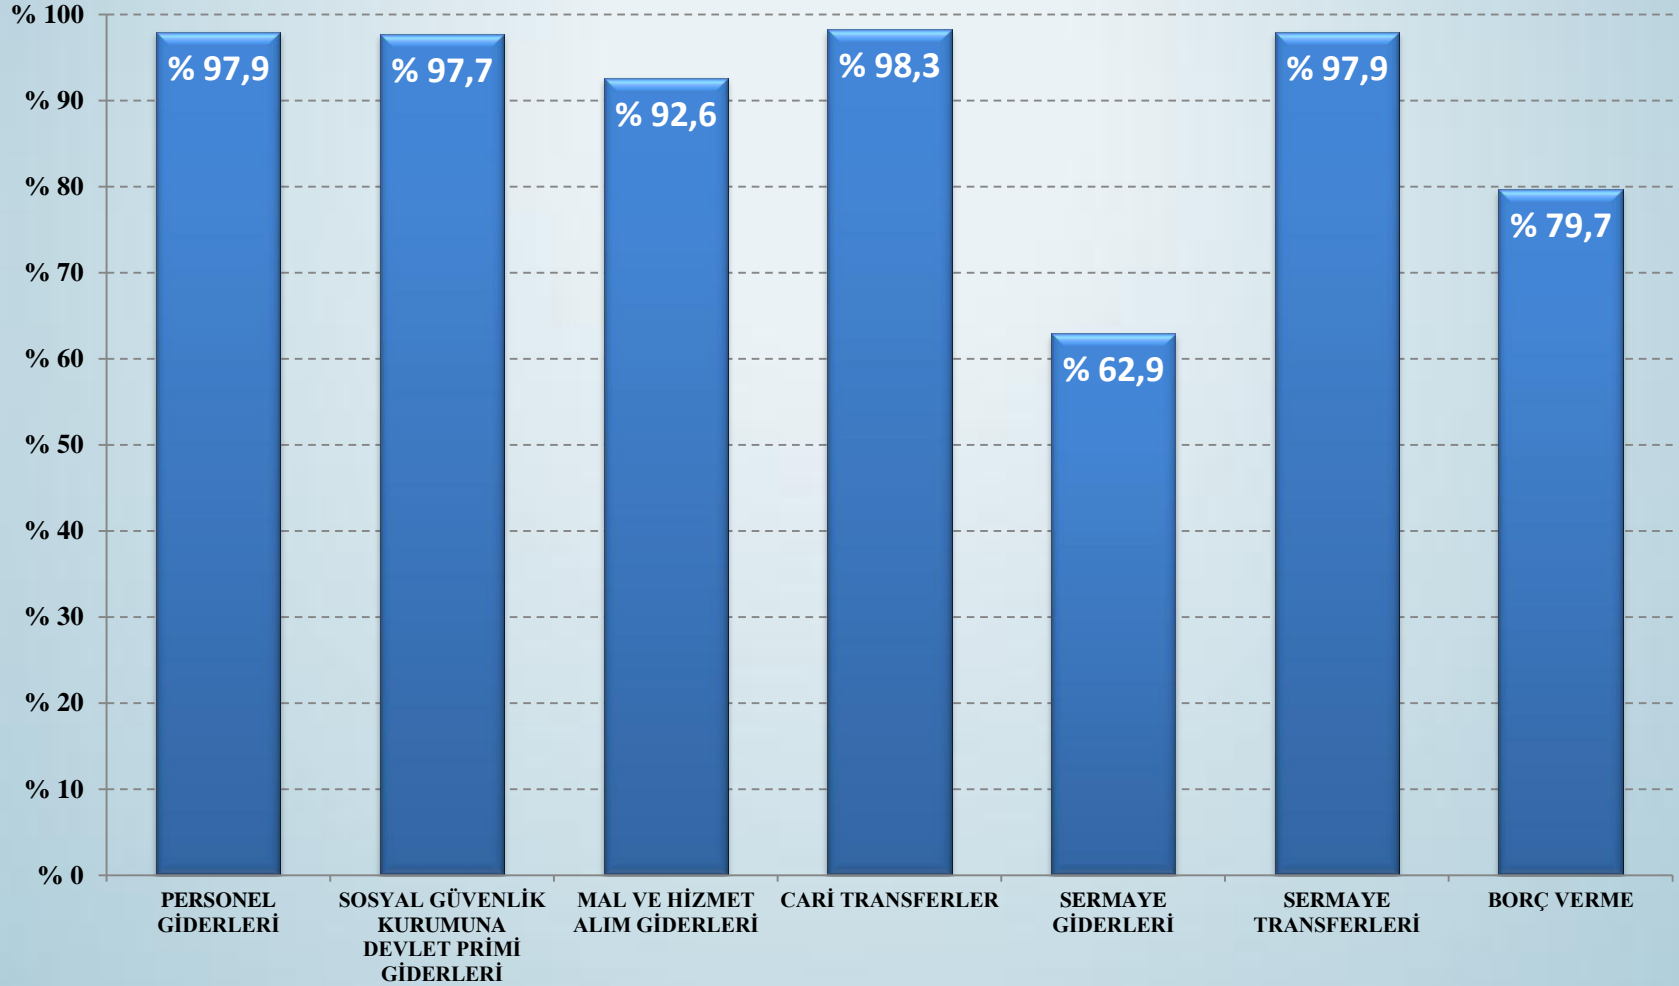


## BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL SONU REVİZE ÖDENEĞİ	YIL SONU HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	60.405.100	58.702.867	41.614.260	% 70,9
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	182.179.400	203.658.518	198.100.307	% 97,3
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	29.510.600	38.093.521	34.406.294	% 90,3
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	151.028.700	321.590.904	213.976.046	% 66,5
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	157.293.900	366.293.900	361.102.648	% 98,6
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	17.801.100	16.942.187	16.392.988	% 96,8
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	21.870.900	23.179.966	22.347.764	% 96,4
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	36.069.500	36.530.900	33.412.366	% 91,5
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	7.838.700	6.943.700	6.757.878	% 97,3
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	3.808.500	3.464.500	3.338.851	% 96,4
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.064.100	1.126.100	1.096.429	% 97,4
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.150.800	3.005.800	2.946.983	% 98,0
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.295.500	9.839.910	9.001.040	% 91,5
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.019.900	4.815.900	4.649.574	% 96,5
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.957.400	3.501.000	3.066.713	% 87,6
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.398.800	2.858.800	2.788.363	% 97,5
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	47.934.400	31.015.560	30.923.570	% 99,7
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	619.200	619.790	593.531	% 95,8
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	24.184.100	21.883.800	21.277.133	% 97,2
İL MÜDÜRLÜKLERİ	562.985.400	1.293.553.848	1.000.892.507	% 77,4
<b>TOPLAM</b>	<b>1.329.416.000</b>	<b>2.447.621.471</b>	<b>2.008.685.243</b>	<b>% 82,1</b>

(\*) Veriler e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.


## BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

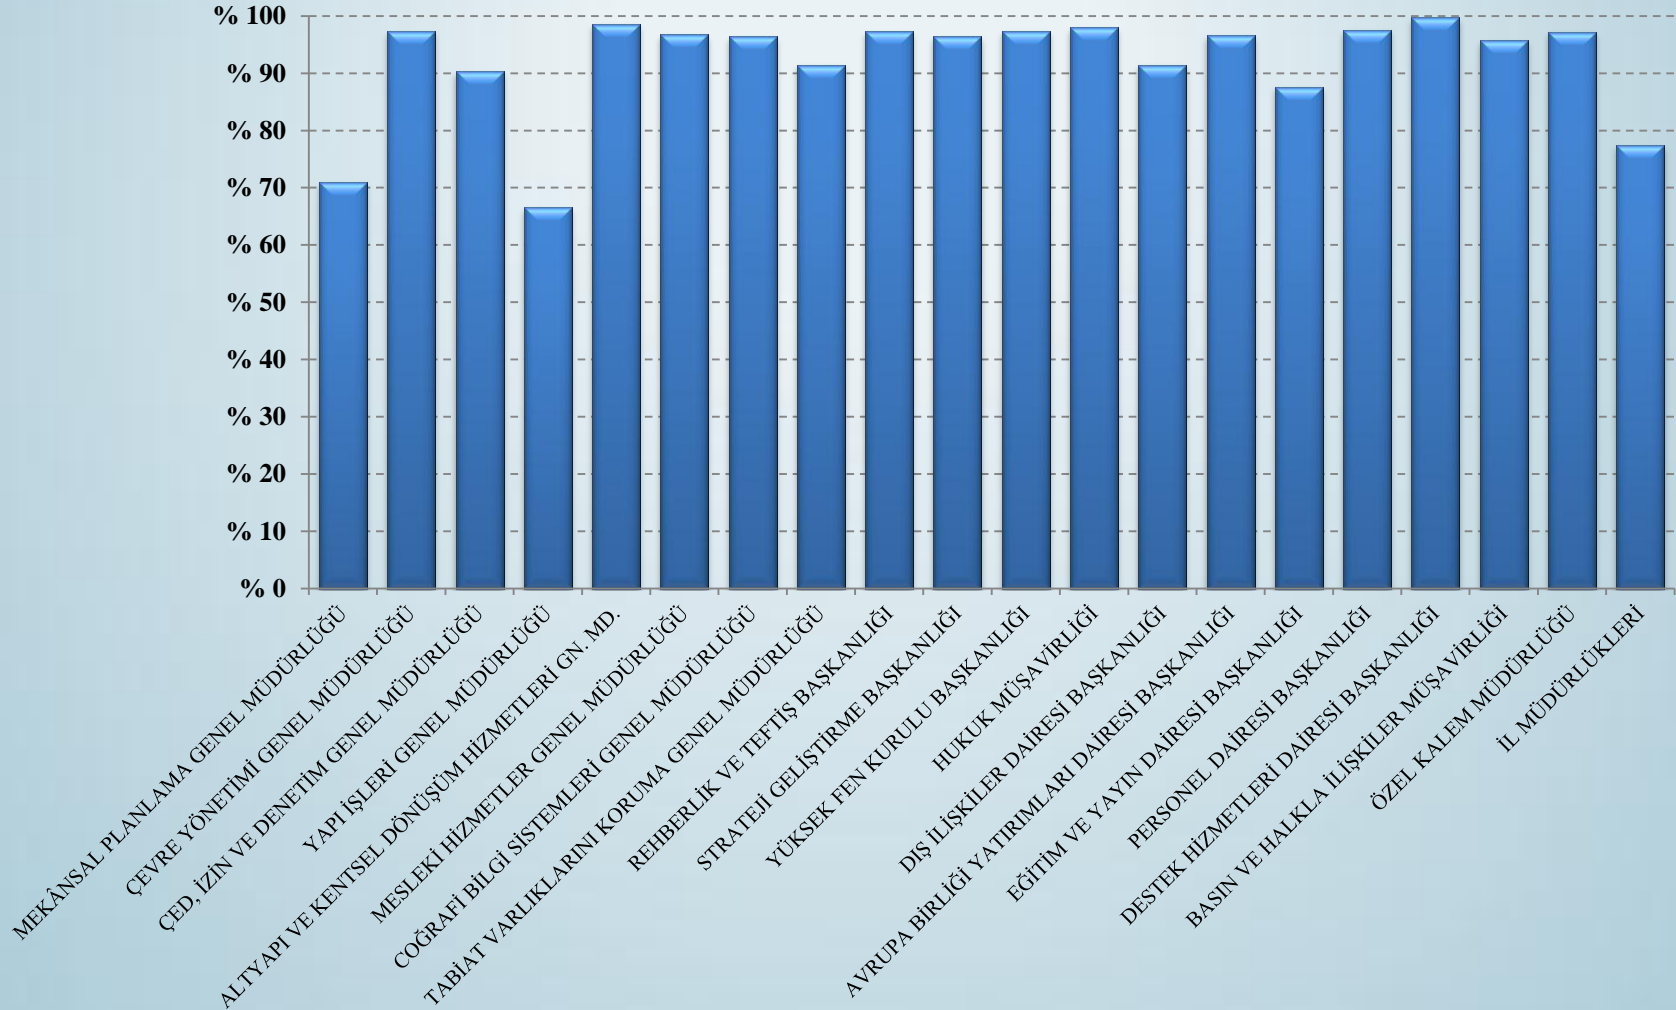

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	31 ARALIK 2014		Gerç. Oranı (%)
			REVİZE ÖDENEĞİ	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	7	109.386.000	42.714.461	26.839.820	% 62,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	18	17.589.000	8.757.500	8.208.091	% 93,7
ÇED, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	10	45.666.000	14.650.779	13.242.177	% 90,4
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	19	859.045.000	106.063.902	73.828.662	% 69,6
Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	7	22.287.000	9.400.000	5.380.104	% 57,2
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	12	40.736.000	7.419.087	7.004.658	% 94,4
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	10	36.522.000	15.679.686	14.963.596	% 95,4
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	14	37.456.000	26.021.400	23.607.802	% 90,7
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı <a href="#">(DETAY)</a>	3	8.394.000	2.320.000	2.263.235	% 97,6
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı <a href="#">(DETAY)</a>	2	1.600.000	1.408.000	1.219.902	% 86,6
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri <a href="#">(DETAY)</a>	5	88.233.000	25.694.025	22.978.818	% 89,4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı <a href="#">(DETAY)</a>	2	650.000	385.160	384.110	% 99,7
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>106</b>	<b>1.267.564.000</b>	<b>260.514.000</b>	<b>199.920.974</b>	<b>% 76,7</b>

## BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

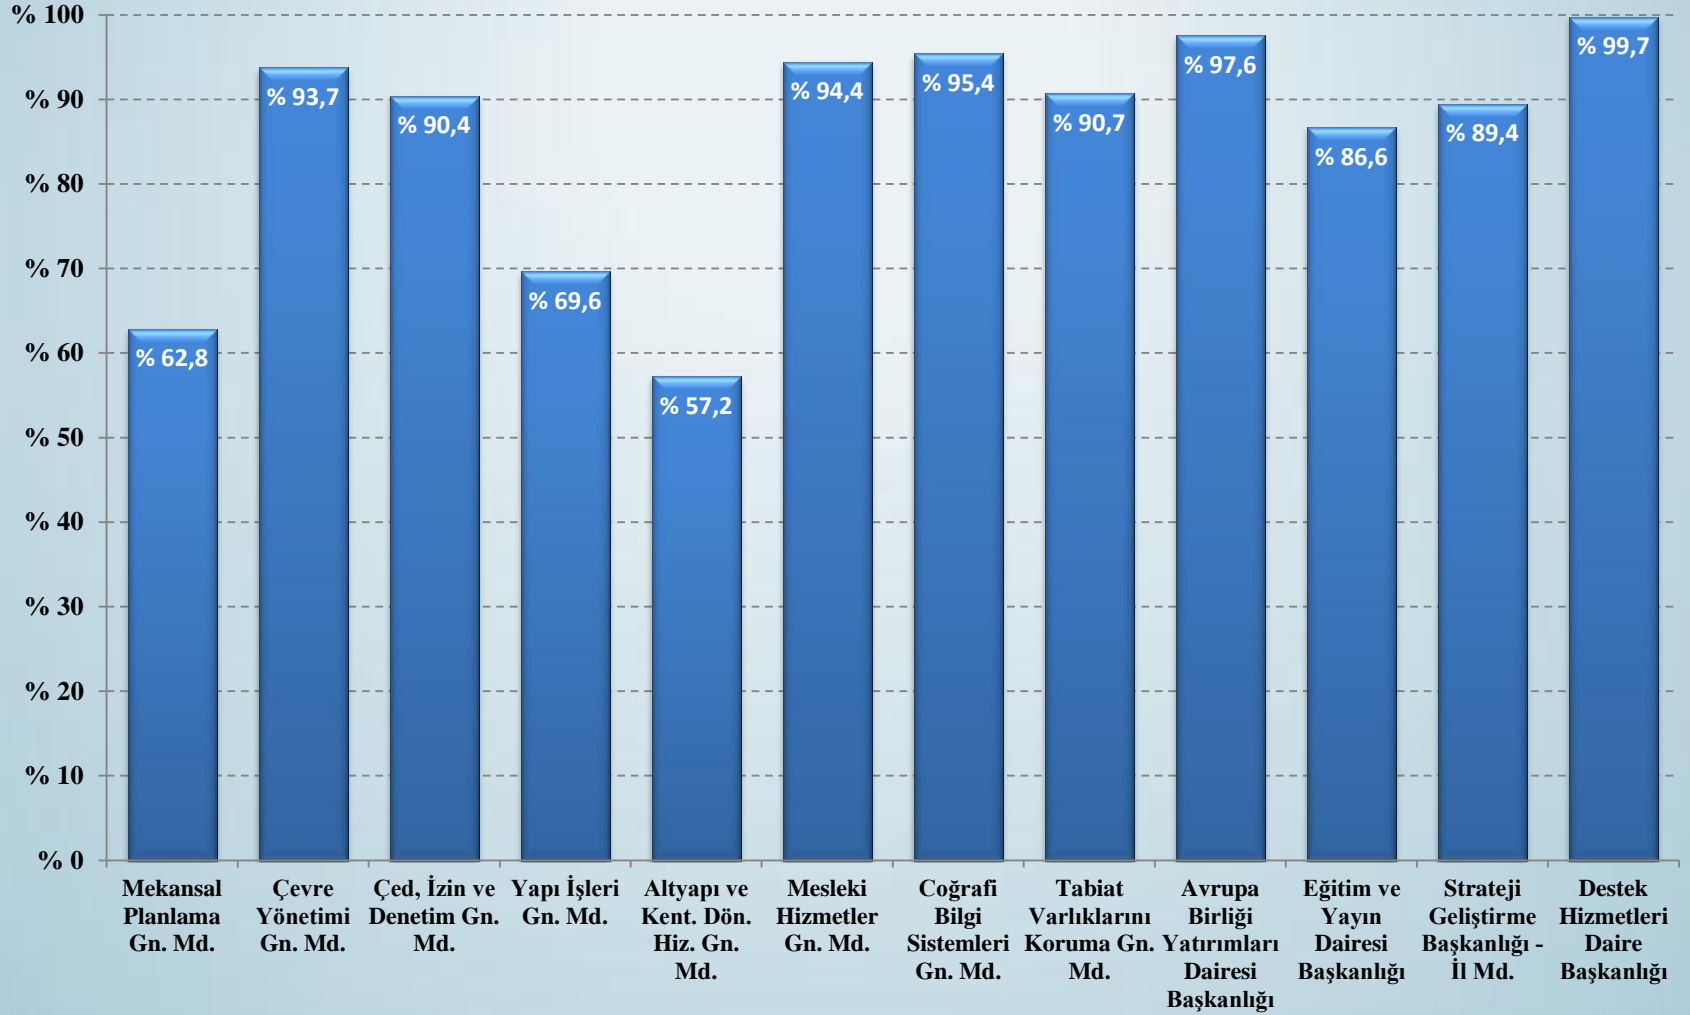

# Harcama Birimi Bazında Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri



**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2007F000100	İmar Uygulamaları (Turizm Sektörü)	2007-2014	37.000	25.500	11.500	11.093	% 96,5	"İmar uygulamaları projesi" kapsamında Tahsis edilen 11.500.000 TL ödeneğinden 142 Belediyeye ödenek gönderilerek 11.093.000 TL'nin harcaması gerçekleştirilmiştir.
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları Belirleme (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2014	1.000	200	800	0	% 0,0	Harcama yapılamamıştır.
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2014	58.536	35.780	22.756	15.614	% 68,6	1-Samsun İli Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Riskli Alan İlan Edilen 29,4 Hektar Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yapıtılması ve Raporunun Hazırlanması işi için 44.840,00 TL, 2-Samsun İli İlkadım İlçesi Ulugazi, Sait ve Kökçüoğlu Mahallelerinde Riskli Alan İlan Edilen 79,53 Hektar Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yapıtılması ve Raporunun Hazırlanması işi için 68.204,00 TL, 3-Diyarbakır İli, Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İmar Planı, Kentsel Tasarım ve Uygulama Projesi işi için 125.606,28 TL (1. Hakediş)- 30.001,50 TL (2.Hakediş), 1.217.661 TL (3. Hakediş), 315.415,77TL (4.Hakediş), 111.405,57 TL (5.Hakediş), 200.010,00TL (6.Hakediş-emanet) 4-İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mah. 62/41, Şenlikköy Mah. 276/3, Arnavutköy İlçesi Ömerli Mah. 373-375-376-407-431(996) Numaralı Parsellerin Değerleme İşleri için 4.720,00 TL, 5-İstanbul Küçükçekmece İnönü Mah. 3470, Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mah. 3406, Bakırköy İlçesi Şenlikköy Mah. 297/13-34-41, Arnavutköy İlçesi Ömerli Mah. 374-431(188/1) Numaralı Parsellerin Değerleme İşleri için 4.720,00 TL, 6-Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demetevler, Demetale ve Demetgöl Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 162,11 hektarlık alanda Dönüşüm Master Planı Hazırlanması İşleri için 243.375,00 TL (1.Hakediş)- 146.025,00 TL (2.hakediş), 292.050 TL (3. Hakediş), 292.050 TL (4. Hakediş). 7-İzmir İli Buca İlçesi Seyhan Mahallesi Riskli Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yapıtılması ve Raporlarının Hazırlanması işi için 79.532,00 TL, 8-Çorum İli Osmancık İlçesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yapıtılması ve Raporlarının Hazırlanması işi için 116.820,00 TL, 9- Erzurum Etüt İşleri 51.743 TL (emanet) 10-Diyarbakır Etüt İşleri 52.923 TL (1.Hakediş) 11- Bakanlığımız ve İller Bankası A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında 12.217.190,00 TL ödenek aktarımı yapılmıştır.

**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2015	3.350	1.350	800	0	% 0,0	Harcama yapılamamıştır.
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	2.500	1.500	1.000	0	% 0,0	Harcama yapılamamıştır.
2014K090010	Özel Proje Alanları Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	5.000		5.000	133	% 2,7	1-16.166 TL fotokopi makinası alımı işi. 2- 19.960 TL Akademik Toplantı yapılmıştır.. 3- 96.760 TL AKM Envanter Raporu Hazırlanması İşi.
2014K090060	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (*)	2014-2015	2.000		1.000	0	% 0,0	Harcama yapılamamıştır.
<b>TOPLAM</b>			<b>109.386</b>	<b>64.330</b>	<b>42.856</b>	<b>26.840</b>	<b>% 62,6</b>	

<b>Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı</b>	<b>142</b>
---	------------

(\*) Proje den harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı'nın Onayına tabidir.

e-bütçe ödenek miktarı

42.714

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012F000090	Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (Turizm Sektörü)	2012-2014	2.000	500	1.500	1.472	% 98,1	Projenin ihale bedeli KDV dahil 1.970.000 TL. dir. Proje başlangıç, 3 ara rapor ve nihai rapor dan oluşmakta olup 3. ara raporun tarafımızca kabul edilmesine müteakip olarak 2014 yılının Nisan ayında 736.000 TL. ödeme yapılmıştır. Proje nihai raporu Kasım 2014 tarihinde kabul edilerek proje tamamlanmıştır. Projenin kabul edilmesi aşamasına geri kalan 764.000 TL. ödenmesi yapılmıştır. 2014 yılı bütçesinden artan para yoktur.
2014K100050	Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	200		100	100	% 100,0	Proje süresinin 1 yıl olması ve sürenin 2015 yılına sarkacak olması nedeniyle Kalkınma Bakanlığının onayı ile projenin toplam ödeneği aynı kalmak üzere 2015 yılına uzatılmıştır. Projenin 2014 yılı ödeneği 100.000 TL ve 2015 yılı ödeneği 100.000 TL olarak düzenlenmiştir. TÜBİTAK-MAM ile Ağustos 2014'te sözleşme imzalanmıştır. 2014 yılı ödeneği olan 100.000 TL (%50) yıl sonu itibarı ile gerçekleştirilecektir.
2013K100030	İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	2.300	0	1.035	1.035	% 100,0	Projenin ikinci dönem ödemesi Aralık ayında gerçekleştirilmiş olup; üçüncü dönem ödemesi teknik şartnameye istinaden 2015 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecektir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	2.000	166	944	399	% 42,3	Proje ödeneği güncellenmiş olup 2014 yılı için 400.000,00-TL (KDV Dahil) ve 2015 yılı için 1.434.000,00-TL (KDV Dahil) olmak üzere toplam 1.834.000,00-TL (KDV Dahil) ayrılmıştır. Söz konusu ödenekten Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliklerinin Belirlenmesi Projesine 400.000 TL, İPA Projeleri iç katkı paylarının ödenmesi için 375.000 TL 2014 yılı için ayrılan payın 398.840,00-TL (KDV Dahil) harcanmıştır.
2012K100070	Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü)	2012-2015	1.900	209	1.182	930	% 78,7	Proje kapsamında ik çeyrekte herhangi bir rapor sunulması ve ödeme yapılması planlanmamıştır. İkinci çeyrekte projenin 1. ara raporu Bakanlığımıza sunulmuştur. Söz konusu raporun incelenmesi devam etmekte olup, bu rapora istinaden ödeme yapılması planlanmamıştır. Bu bağlamda 2014 yılı ilk ve ikinci çeyreğinde herhangi bir ödeme yapılması planlanmamış olup, yıl içerisinde sadece son çeyrekte (yıl sonu) ilgili iş bölümünün ödemesi yapılmıştır. (Proje ihale bedeli 1.475.000 TL dir. 146.000 TL 2013 yılında ödenmiştir. 2014 yılı proje bütçesinden 930.000 TL ödeme yapılmış olup, 252,000 TL ödenek artacaktır.
2014K100100	Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	800		300	300	% 100,0	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu' nun 3 üncü maddesi (f) bendi hükümleri çerçevesinde projenin yürütülmesi için Bitlis Eren Üniversitesi ile Genel Müdürlüğümüz arasında 10.12.2014 tarihinde protokol yapılmıştır. Analiz ve Tasarım Raporu' nun sunulması ve onaylanması neticesinde 19.12.2014 tarihinde Bitlis Eren Üniversitesi' ne 299,999,66 TL ödeme yapılmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100080	Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.813	923	860	739	% 85,9	Birleşik Projedir.
	Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması	2013-2013	241	241	0			2013 yılında proje tamamlanmıştır.
	Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu	2013-2014	600	200	400	383	% 95,8	Proje ihale bedeli 589.000 TL. dir. Proje, iki ara rapor ve bir final raporundan oluşmaktadır. 1. ara rapor 23 Kasım 2013 tarihinde sunulmuş ve ödeme yapılmıştır. 2. ara rapor ödemesi olarak 177.000 TL. Eylül 2014'de ödenmiştir. Final raporu ise Kasım 2014 de sunulmuş ve olup teknik şartname gereği 213.580 TL. ödeme yapılması öngörülmüştür.ancak eksik iş bedeli olarak Bakanlığımız tarafından 7.138.44 TL kesinti yapılarak 206.441.56 TL ödeme yapılmış ve proje tamamlanmıştır. gerçekleşme % 100'dür. Yaklaşık 16.638,44 TL artmıştır.
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (1.Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi)	2013-2014	800	420	380	276	% 72,6	Proje, bir açılış toplantısı sonuç raporu, iki ara rapor ve bir final raporundan oluşmaktadır. Açılış Toplantısı Sonuç Raporu 18 Aralık 2013 tarihinde sunulmuş ve ödeme yapılmıştır. 1. ara rapor Mayıs 2014 tarihinde sunulmuştur ancak 1. ara rapora ilişkin ödeme bulunmamaktadır. 2. ara rapora ilişkin olarak 109.000 TL Ağustos 2014 ödenmiştir. Final raporu ise Kasım 2014 de sunulmuş olup, aralık 2014 de 163.000 TL. ödeme yapılmıştır.(Proje ihale bedeli 542.840 TL dir. 271.400 TL 2013 yılında ödenmiştir. 2014 yılı proje bütçesinden 108.000 TL ödenek artacaktır. Bu yüzden proje %100 gerçekleşmesine rağmen %71 olarak görünmektedir.)
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi)	2013-2015	172	62	80	80	% 100,0	Proje ihale bedeli 136.000 TL dir. Proje kapsamında 2013 yılında 61.000 TL. ödeme yapılmıştır. 2014 yılında ikinci ara ödemesi Mayıs 2014 de 47.495 TL (KDV Dahil) olarak yapılmıştır. Geri kalan kısım 2015 yılında 28.000 TL olarak yapılacaktır. Projeden arta kalan 33.000 TL. teçhizat ve donanım alımı yapılmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi	2014-2015	880		400	0	% 0,0	Projenin 2014 yılı Yatırım Programına alındığı Kalkınma Bakanlığı'nın 14.10.2014 tarih ve 88799753-746.01.03.01-4440 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Projenin "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" gereğince uygun görülen "Kamu Hizmet Sunucularından Protokol ile Alım" usulü ile gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, protokol ile alım yapılabilecek kamu hizmet sunucularına ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu itibarla, projenin başlamasının 2015 yılına öteleneceği düşünüldüğünden, 2014 yılı için ayrılan bütçenin 2016 yılına aktarılması talebi 05.12.2014 tarih ve 15473 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı'na bildirilmiştir.
2009K100070	Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme. İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2014	678	441	237	237	% 100,0	Proje 11 Aralık 2013 tarihi ile tamamlanmıştır.
AB KATKISI			5.689	2.105	3.584	3.584	% 100,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	233	131	102	32	% 31,4	Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni söz konusudur. Projenin, tedarik bileşeni tamamlanmış olup, teknik yardım bileşeni 28 Haziran 2013 tarihinde başlamıştır. 2014 yılı ilk çeyrek dönemi için Hazine Müsteşarlığından gelen bir harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. 2014 yılı ikinci çeyrek döneminde 4.921,70 Avro (dörtbindokuzyüzyirmibir Avro yetmiş sent) karşılığı 14.466,84 TL tutarındaki ulusal katkı payı (TR21 0001 5001 58048014 3490 82) no'lu Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. 2014 yılı üçüncü çeyrek döneminde ise 4.921,70 Avro (dörtbindokuzyüzyirmibir Avro yetmiş sent) karşılığı 14.245,86 TL tutarındaki ulusal katkı payı (TR21 0001 5001 58048014 3490 82) no'lu Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. 2014 yılı itibari ile toplam yaklaşık 29,000 TL ödeme yapılmıştır. Kalan miktar (27.533,35 Avro) 2015 yılı yatırım programına konulmuştur.
AB KATKISI			14.020	5.328	8.692	2.900	% 33,4	
2010K100090	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB)	2010-2014	288	182	106	105	% 99,1	Projede yer alan aktiviteler tamamlanmış ve kapanış toplantısı 12 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, final raporu Bakanlığımızca onaylanmış ve MFİB ve AB Delegasyonuna iletilmiştir. 2014 yılı Mayıs ayında 35.000 Avro karşılığı 100.352 TL ödeme yapılarak projenin ödemeleri tamamlanmıştır.
AB KATKISI			3.551	2.446	1.105	1.100	% 99,5	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100110	Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	1.617	1.375	242	242	% 100,0	2014 yılı için konulan 242 ödeneğin tamamı iç katkı payı olarak gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			10.948	10.344	604	604	% 100,0	
2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirlenmeler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2012-2015	268	84	80	0	% 0,0	Söz konusu proje kapsamındaki eğitimler tamamlanmış olup uygulama mevzuatı, düzenleyici ve sektörel etki analizi çalışmaları ile Ulusal Uygulama Planına ilişkin taslak çalışmalar devam etmektedir.
AB KATKISI			2.412	804	965	0	% 0,0	
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2015	804	0	375	341	% 90,9	Hazine Müsteşarlığından Bakanlığımıza gelen 10 Ekim 2014 tarihli resmi yazıya istinaden söz konusu projenin iç katkı payı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır: 1) 25.09.2014 tarihinde sözleşme imzalandı 2) 25.12.2014 tarihinde proje başladı 3)Şu anda Projenin inception (başlangıç) fazındayız. 4) Şubat ayında kick-off meeting yapılması planlanmaktadır.
AB KATKISI			7.236	0	3.257	3.000	% 92,1	
2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (1) (Çevre Sektörü)	2013-2015	268	161	80	0	% 0,0	Projenin açılış toplantısı 22.07.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin uygulanma süresi projenin başlamasından itibaren 24 ay ( 2 sene) dir. (22.07.2014-22.07.2016) 2014 yılı için konulan 80 TL ödeneğin iç katkı payı Hazine Müsteşarlığı tarafından talep edilmediği için ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			2.412	1.447	724	0	% 0,0	



**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100080	Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2015	670		268	0	% 0,0	Projenin ihale süreçleri Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından yürütülmekte olup, ihale çalışmaları halen devam etmektedir. 2014 herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Projenin 2015 yılında başlaması öngörülmektedir. 2015 yılı için muhtemel harcamalar ile ilgili olarak 100.000 Euro yaklaşık 268.000 TL. Hazine Müsteşarlığına aktarılacaktır.
AB KATKISI	6.030			3.015	0	% 0,0		
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2015	670		295	287	% 97,3	Projenin ihale süreçleri Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından yürütülmekte olup, ihale çalışmaları halen devam etmektedir. Muhtemel harcamalar ile ilgili olarak 100.000 Euro yatırıldığı gün kur üzerinden 287.360 TL. Hazine Müsteşarlığına aktarılmıştır.
AB KATKISI	6.030			3.015	3.000	% 99,5		
2014K100120	Kesin Hesap Farkı (AB) (1) (Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi) (Çevre Sektörü)	2014-2014	200		200	200	% 100,0	Tüm ödemeler yapılmış ve proje tamamlanmıştır.
AB KATKISI	0			0	0			
<b>TOPLAM</b>			<b>17.589</b>	<b>4.172</b>	<b>8.306</b>	<b>6.419</b>	<b>% 77,3</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>58.328</b>	<b>22.474</b>	<b>24.961</b>	<b>14.188</b>	<b>% 56,8</b>	

**Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı** **1.339**

e-bütçe ödenek miktarı 6.967

çed proje 8.757 8.209

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100060	Çevre İznine Tabi Faaliyetlerin Yer Aldığı Listelerin Uyumlaştırılması Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	0		0	0	% 0,0	13.06.2014 tarihinde yatırım programından çıkartılmıştır.
2013K100100	Çevresel Etiket Altyapısı Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2014	721	124	597	597	% 100,0	2013-2014 yıllarını kapsayan Çevresel Etiket Altyapısı Projesi 06 Ekim 2014 tarihinde tamamlanmış olup, proje çıktıları da dikkate alınarak ulusal çevre etiketi ile ilgili mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir.
2014K100030	Çevre Denetim Aracı Alımı (Çevre Sektörü)	2014-2014	3.782		3.782	3.781	% 100,0	41 adet Fiat Doblo marka aracın alımı yapılmış olup, Şubat ayı içinde dağıtımı gerçekleştirilecektir.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100110	Çevre Kirliliği ile Mücadele Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin Denetim, İzleme ve Numune Alma Kapasitelerinin Artırılması Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	4.000		2.000	351	% 17,6	Proje kapsamında İl Müdürlükleri için alınacak denetim malzemeleri ile ilgili piyasa araştırması yapılmış olup firmaların verdiği teklifler proje bütçesinin üzerinde çıktığı için ihale gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle alımı yapılacak malzeme sayısı azaltılarak tekrar piyasa araştırması yapılmış, bu sefer de firmalar alımı yapılacak ekipmanların tümüne teklif vermeyipsadece 4 kalem malzemeye fiyat teklifi verdiği için bu malzemelerin alımı gerçekleştirilmiştir. Alınan malzemelerin Ocak ayı içerisinde İl Müdürlüklerine dağıtımı gerçekleştirilecektir.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	559	0	350	172	% 49,2	Proenin ihalesi gerçekleştirilmiş olup, donanım alımı gerçekleşmiş yazılım geliştirilmesi devam etmektedir. Proje 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2016	9.015	2.620	4.200	3.164	% 75,3	Samsun, İzmir ve Erzurum Ön değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ankara, Konya ve Adana Ön değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, Ankara 2015 Konya ve Adana ise 2016 yılında tamamlanacaktır. Diyarbakır Ön Değerlendirme çalışmalarına ise 2015 yılında başlanacaktır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü)	2011-2015	5.350	288	3.500	100	% 2,9	
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	3.000	140	2.250	100	% 4,4	Uygulama projesi hazırlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışması devam etmekte olup, Kasım-2014'te ihalesi yapılacaktır. Gerçekleşme oranı: % 0'dır.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	2.350	148	1.250	0	% 0,0	Tadilat projeleri hazırlanmaktadır. Gerçekleşme oranı: % 0'dır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü)	2012-2015	12.000	628	5.300	1.641	% 31,0	
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.371	437	1.967	1.000	% 50,8	İnşaat çalışması halen devam etmekte olup, 2015 yılı Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır. Gerçekleşme oranı: % 60'dır.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	2.344	0	1.100	7	% 0,6	Uygulama projesi hazırlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışması devam etmekte olup, Kasım-2014'te ihalesi yapılacaktır. Gerçekleşme oranı: % 0'dır.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	528	191	200	0	% 0,0	Uygulama projesi hazırlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışması devam etmekte olup, Kasım-2014'te ihalesi yapılacaktır. Gerçekleşme oranı: % 0'dır.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.757	0	2.033	634	% 31,2	İhalesi tamamlanmış olup, 03/07/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Gerçekleşme oranı: % 10'dur.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	9.030	0	6.030	4.846	% 80,4	
	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Bakım-Onarımı	2014-2015	2.530		2.350	1.548	% 65,9	Şubat 2014 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle gerçekleştirilen bakım-onarım süreci 31 Ocak 2015 tarihinde tamamlanacaktır.
	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması	2014-2015	5.000		2.680	2.412	% 90,0	Samsun Temiz Hava Merkezi kapsamında 11 adet istasyonun kurulması ile hava kalitesi istasyonlarının sayısı 2014 yıl sonu itibariyle 186 adet olmuştur.
	İstasyonlara Yedek Cihaz ve Ekipman ile Sarf-Yedek Malzeme Alımı	2014-2015	1.500		1.000	886	% 88,6	İstasyonlara yedek cihaz ve ekipman ile sarf-yedek malzeme alımı 2014 yılında ihtiyaçlar doğrultusunda alınmıştır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	901	652	249	245	% 98,4	Projenin 13/11/2013 tarihinde kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş, 17/11/2014 tarihinde de proje resmen tamamlanmıştır.
AB KATKISI			7.236	5.608	1.628	1.600	% 98,3	Proje kapsamında eğitim çalışmaları, pilot bölge çalışması, AB üye ülkeleri çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Halkın bilgilendirilmesi çalışmaları kapsamında halka ve sanayiye dağıtılmak üzere ayı ayrı broşürler hazırlanmıştır. Film çekimi çalışmaları tamamlanmış, televizyon kanallarında gösterilmek üzere kamu spotları hazırlanmıştır. Seveso Bildirim Sistemi yeni adıyla BEKRA Bildirim Sistemi Bakanlığımız sunucularına yüklenmiş, son düzeltmelerin tamamlanmasını müteakip hem Bakanlığımızın, hem sanayicinin, hem de diğer yetkili otoritelerin kullanımına açılacaktır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100070	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	308		139	135	% 97,1	Proje 12/05/2014 tarihinde başlamış olup, başladığı tarihten bugüne kadar geçen süre zarfında yapılması beklenen tüm aktiviteler zamanında gerçekleştirilmiştir. Ulusal eş finansman kapsamında 2014 yılında ödenecek miktarın tamamı (46.000 Avro=135.253,80 TL olarak 1 Avro=2,9403 TL) Mayıs 2014 itibari ile ödenmiştir. Projenin Amacı: Bakanlığımız ve Stratejik Çevresel Değerlendirmenin uygulanmasından sorumlu yetkili kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi; pilot çalışmalarla dört farklı sektörde (su yönetimi, enerji, tarım, bölgesel kalkınma) SÇD uygulama deneyiminin kazanılması ve Taslak SÇD Yönetmeliği'ne son şeklinin verilerek etkin uygulanmasını sağlamak üzere tüm ilgili paydaşların SÇD konusunda farkındalıklarının artırılmasıdır. Proje kapsamında 14-21/Eylül/2014 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde Eğitimcilerin Eğitimi Programı düzenlenmiştir. Üst düzey yöneticilere yönelik Çalışma Ziyareti, 1-5/Aralık/2014 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid ve Valensiya kentlerinde gerçekleştirilmiştir. Pilot projeler kapsamındaki açılış ve bilgilendirme toplantıları ile eğitim toplantıları her sektör için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıcını müteakip, ilgili Kurumlarla yapılan görüşmeler ve resmi yazışmalar ile söz konusu sektörler; tarım, su yönetimi, enerji ve bölge planlama sektörleri olarak belirlenmiştir. Bu anlamda, anılan 4 sektörde hazırlanmakta olan planlama süreçlerine SÇD pilot uygulama çalışmaları hali hazırda devam etmektedir.
AB KATKISI			2.774		1.041	1.000	% 96,1	
		<b>TOPLAM</b>	<b>45.666</b>	<b>4.312</b>	<b>26.147</b>	<b>15.033</b>	<b>% 57,5</b>	

<b>AB KATKISI</b>	<b>10.010</b>	<b>5.608</b>	<b>2.669</b>	<b>2.600</b>	<b>% 97,4</b>
-------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı</b>	<b>9.707</b>
---	--------------

e-bütçe ödenek miktarı 16.440

çevre yön. proje 14.650 13.243



## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Şehirleşme Sektörü)	2010-2015	163.000	64.000	5.884	5.884	% 100,0	331 adet iksa ve 448 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Dış cephe, döşeme duvar tavan kaplama, makine ve elektrik tesisatı imalatları devam ediyor. Hakediş ödemelerine göre gerçekleştirme oranı yaklaşık %77,33'dür. Fiziki gerçekleştirme oranı yaklaşık %80,0'dır.
2014K090110	Bakanlık Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	38.405		38.405	0	% 0,0	Proje 29.08.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Ödeneği döner sermayeden karşılanıyor. Yer Teslimi yapılmıştır. İş devam ediyor.
2014K090080	Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (*)	2014-2014	17.500		17.500	10.838	% 61,9	Mobilya alımları DMO üzerinden gerçekleştirilmiştir.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	1.130	0	1.130	86	% 7,6	Bakanlık arşivimizde bulunan tüm projeler taranarak jpeg programıyla elektronik ortama aktarıldı. Bakanlığımız web sitesine yüklendi. İstenildiğinde projelerin CD kaydı verilebiliyor. Proje hedeflerinden olan sistemin taşra teşkilatına açılması ise henüz tamamlanmadı.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2014	3.500	110	3.390	135	% 4,0	Yapı Denetim Sistemi Uygulama, Bakım, Destek, İyileştirme, Bakanlık Merkezine Taşınması ve Merkez Bilgi İşlem Altyapısına Entegrasyonu İşi ihalesi 14.02.2014 tarihinde yapılmış, 124500 TL+KDV bedelli sözleşme 17.02.2014 tarihinde imzalanmış olup, kabul aşamasındadır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425000 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	2.990	360	1.630	434	% 26,6	4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata yönelik uygulamalar hakkında İl Müdürlükleri eğitimi 17-20.11.2014 tarihlerinde ve Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarların denetiminde görev alan İl Müdürlüklerimiz bünyesindeki değerlendirme heyetlerine TS EN ISO/ICE 17025 ve İç Tetkik Eğitimi 20-22.10.2014 tarihlerinde yapılmış olup, YDS-2 Sistemi'nin kabulünün yapılması halinde, kabule müteakip söz konusu sistemin kullanımına ilişkin İl Müdürlüklerimize eğitim verilmesi düşünülmektedir.
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2015	1.300	353	350	225	% 64,3	Yatırım Takip Sistemi (YTS) yazılımının geliştirilmesi için ihale işlemi gerçekleştirilerek sözleşmesi imzalandı. YTS yazılımının arayüzü güncelleştirildi. Yazılıma yeni modüller eklenerek geliştirilmektedir.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2016	5.745	1.805	1.500	414	% 27,6	Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskân amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak bilinmemekle beraber şu ana kadar ödenek problemi yaşanmamıştır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2015	23.334	8.453	5.058	545	% 10,8	
	Bismil-Beritanlı Göçebeleri-Dicle- Batman Barajı İskanı	2013-2014	5.056	0	5.056	545	% 10,8	İhalesi yapılmıştır. İş devam etmektedir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2015	9.970	3.389	1	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde hak sahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskân edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2015	8.308	5.064	1	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde hak sahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskân edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070020	Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2014	33.030	16.520	12.510	10.849	% 86,7	İş devam etmektedir.
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2015	106.691	0	1.001	0	% 0,0	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2015	6.303		1.000	0	% 0,0	Manisa-Gördes'te Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin iskânı için yapımı planlanmaktadır. 18.12.2014 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
	Anamur-Alaköprü Barajı İskanı	2013-2014	100.388		1	0	% 0,0	İşin İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup, ödeneği DSİ Genel Müdürlüğünden aktarılmaktadır. Konutların dağıtımı için Kura çekimleri yapıldı. Geçici kabul aşamasındadır.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2017	189.900	10.559	2.652	2.047	% 77,2	
	Tahtalı Barajı İskanı	2009-2014	13.209	10.559	2.650	2.047	% 77,2	İş bitme aşamasındadır.
	Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı	2009-2017	88.346	0	1	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2017	88.345	0	1	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskân isteyen aile çıkmamıştır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2016	10.000	2.700	1.000	517	% 51,7	Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı işi için ödenek gönderilmiş olup ihalesi yapılmıştır. İş tamamlanmıştır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	5.230	2.120	2.000	704	% 35,2	Kütahya İli yöresel mimari özelliklere uygun 2 tip iskân konutu ile sosyal donatıları (cami, çeşme, köy konağı, tandırevi, şadırvan, pazar yeri, halı saha) avan projeleri hazırlanmış olup uygulama projeleri de devam etmektedir. Erzurum İli yöresel mimari özelliklere uygun 10 tip avan proje hazırlanmış olup uygulama projelerinin temin edilmesi için ihale çalışmaları devam etmektedir. Yöresel mimari özelliklere uygun Urfa için 12 tip (konut+köy konağı), Rize için 15 tip (konut+köykonağı), Edirne için 12 tip (konut+köykonağı), Balıkesir için 12 tip (konut+köykonağı), Amasya için 15 tip (konut+köykonağı) projesi ihale yolu ile temin edilmiştir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	3.180	1.820	250	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama yapılmaktadır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	3.180	500	550	353	% 64,2	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır. Sene başında iki eğitim planlanmıştır. Ancak yıl boyunca bir eğitim yapılabilmektedir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1995K070030 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1995-2014	137.080	133.580	3.500	2.780	% 79,4	İşler devam etmektedir.
2011K070040 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	108.650	32.982	47.604	38.018	% 79,9	İşler devam etmektedir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	5.200	2.700	100	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
<b>TOPLAM</b>			<b>608.115</b>	<b>109.300</b>	<b>94.810</b>	<b>33.031</b>	<b>% 34,8</b>	

<b>TOPLAM-08</b>	<b>250.930</b>	<b>169.262</b>	<b>51.204</b>	<b>40.798</b>	<b>% 79,7</b>
------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

(\*\*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

<b>Genel TOPLAM</b>	<b>859.045</b>	<b>278.562</b>	<b>146.014</b>	<b>73.829</b>	<b>% 50,6</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

<b>Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı</b>	<b>1.546</b>
---	--------------

(\*) Bu ödenek, 2010K091030 numaralı "Bakanlık Hizmet Binası" projesinin tamamlanmasından sonra kullanılabilir.

ödenek toplamı	144.468
döner sermaye	38.405
e-bütçe ödenek miktarı	106.063

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014E060030	Çamlıca Özel Proje Alanında Altyapı Tesisleri Etüd ve Proje İşlerinin Yapılması Projesi (2*) (Kentçi Ulaşım Sektörü)	2014-2015	2.250		10	0	% 0,0	
2013K060110	Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2013-2016	5.054		1.500	0	% 0,0	
2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2012-2015	2.530	1.220	580	199	% 34,3	2014 yılı içerisinde proje kapsamında Bakanlığımız "6306 Sayılı Kanunun Uygulamaları: Riskli Alan İlan Edilmesi, Riskli Alan Uygulamaları, Rezerv Yapı Alanı Belirlenmesi, Riskli Yapı Tespiti, Riskli Yapı Uygulama Süreci, Finansal Destekler" eğitimi, 21-23.04.2014 tarihlerinde Zonguldak'ta, 05-07.05.2014 ve 21-23.05.2014 tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenmiştir. 6306 Sayılı Kanunun Uygulamalarına yönelik çözüm önerileri ve kentsel altyapının geliştirilmesine yönelik eğitim 17.-19.09.2014 Erzurumda ve 03-05.11.2014 tarihinde Denizli İlinde düzenlenmiştir. Proje kapsamında Kütahya İlinde Bakanlığımız ve Kütahya Belediyesi ile "Şehir Kimliği Çalıştayı" toplantısı yapılmıştır.
2013K080030	Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2014	1.211	341	870	0	% 0,0	

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2014	3.000	900	2.100	1.859	% 88,5	TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 31.07.2013 tarihli 2.542.000,00 TL (KDV Hariç) tutarlı, "İnşaat ve yıkıntı atıklarının her bir grubu için geri kazanımı ve kullanıma yönelik kriterlerin ve yol gösterici usul ve esasların belirlenmesi, etkin ve verimli bir geri kazanım sistemi için atık yönetim planlama seçici yıkım ve yıkım planlaması konuları ile birlikte gerekli mevzuatın geliştirilmesi" konusunda protokol kapsamında, 5 aşamalı çalıma tamamlanmıştır.
2013K080050	Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2015	3.150	150	1.500	473	% 31,5	Yıldız Teknik Üniversitesi ile 25.09.2014 tarihinde, 2013K080050 Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi kapsamında "Mahalli idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı konusunda protokol imzalanmıştır. Tamamlanan %20 lik kısım olan Mevcut Durum Raporu için ödeme yapılmıştır.
2013K140090	Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması (Afetler Sektörü)	2013-2014	5.092	2.242	2.850	2.850	% 100,0	Bitlis Eren Üniversitesi ile 07.11.2014 tarihinde 2013K140090 Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması Projesi kapsamında "Kentsel Dönüşüm alanlarının belirlenmesi ve senaryo afetlerin oluşturulması için yerel yönetimlerin verilerinin kullanıldığı coğrafi bilgi sistemi tabanlı otomasyon sisteminin oluşturulmasının araştırılması ve geliştirilmesi" konusunda protokol imzalanmış ve 1. aşama tamamlanmıştır.
		<b>TOPLAM</b>	<b>22.287</b>	<b>4.853</b>	<b>9.410</b>	<b>5.381</b>	<b>% 57,2</b>	

(2\*) Proje ödeneği döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.



**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım- Onarımı (Enerji Sektörü)	2012-2016	4.033	346	432	420	% 97,2	***Tubitak tarafından yürütülerek tamamlanan "BEP-TR Yazılım Metodolojisinin Geliştirilmesi Projesi " işinin kabulü yapılmış ve KDV dahil 354.000 TL tutarındaki ödemesi gerçekleştirilmiştir. ***Hâlihazırda kullanılmakta olan BEP-TR Yazılım Sisteminin Bakım ve Onarımı İşinin hizmet alımı için Mimar Bilgi İletişim San.Tic.Ltd.Şti. ile KDV hariç 65.250 TL bedel üzerinden 25.04.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işe bitirilmiş olup, hak edişleri ödenmiştir. ***Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yeni sürümü olacak olan BEP-TR II sistemini gerçekleştirilmek üzere hizmet alımı işinin ihale sözleşmesi Mozaik Yazılım Ltd. Şti. ile KDV hariç 597.000 TL üzerinden yapılmıştır.
2013D100010	Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması (Enerji Sektörü)	2013-2014	110	100	10	10	% 100,0	***19.06.2014 tarihinde İbank tesislerinde Yeşil Bina konulu çalıştay düzenlenmiştir. ***26.08.2014 tarihinde İbank tesislerinde Otopark konulu çalıştay düzenlenmiştir.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2015	2.781	693	2.058	2.000	% 97,2	<p>***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsü yerleşkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması işi Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihale edilerek, KDV hariç 1.856.180 TL bedel üzerinden 23.07.2014 tarihinde FD Pro.Müh.İnş.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmış ve işe bitirilmiş olup, bu projeden 340.293 TL tutarında ödenek aktarılmıştır.</p> <p>***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsü yerleşkesinde çevre düzenlemesi işi Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihale edilerek, KDV hariç 1.856.180 TL bedel üzerinden 23.07.2014 tarihinde FD Pro.Müh.İnş.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmış olup, bu projeden 300,000-TL tutarındaki ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>***Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması işi İl Müdürlüğünce KDV hariç 638.000 TL ile Teknolus Enerji Ltd. Şti. firmasına ihale edilmiş olup, 752.840 TL tutarındaki ödeneğin aktarımı yapılmıştır.</p> <p>***15-17 Eylül 2014 tarihleri arasında Enerji Denetçisi Eğitimi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>***Bina Isıtma ve Soğutma Enerji Gereksinimlerini Sınırlandıran U Değerlerinin Tespiti AR-GE Projesi olarak Karabük Üniversitesi ile KDV hariç 300.000 TL lik protokol imzalanmış olup; 2014 yılı içerisinde ilk etap ödemesi olarak 35.400 TL ödenecek iken, raporun geç intikalinden dolayı ödeme gerçekleştirilememiştir.</p>
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2015	705	200	225	131	% 58,2	<p>Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) yazılımının 2014 yılı bakım ve onarım işinin hizmet alımı için Mimar Bilgi İletişim. Ltd. ile KDV hariç 53.750 TL bedel üzerinden 03.06.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve iş bitirilmiş ve hakedişleri ödenmiştir.</p> <p>***e-kooperatif yazılımının 2013 yılı bakım ve onarım işinin kabulü neticelendirilerek, kdv dahil 56.876 TL tutarında kesin hak ediş ödemesi yapılmıştır.</p> <p>***2014 yılı için planlanan eğitim faaliyetleri yapı kooperatifçiliği ile ilgili yeniden yapılandırma ve devir mevzuat çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilememiştir.</p>
2010K010060	Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	3.800	3.795	5	0	% 0,0	

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K010700	Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün Enerji Verimli Hale Getirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2014	2.750	900	1.850	1.848	% 99,9	***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsündeki bulunan laboratuvar binalarının enerji verimli hale getirilmesi işi Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale edilerek, kdv hariç 1.856.180 TL bedel üzerinden 23.07.2014 tarihinde FD Pro.Müh.İnş. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmış olup, bu projeden 1.850.000 TL tutarındaki ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.
2010K010080	İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	6.725	3.257	800	800	% 100,0	***Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermekte olan yapı malzemesi laboratuvarlarının deney kapasitesini ve etkinliğini arttırmak üzere ihtiyaç duyulan alet-edevat-cihaz-ekipman-donanım vb. malzemelerin alımını yapmak üzere İl Müdürlüklerimizin ihtiyaçları tespit edilmiş olup, ihalesi 29.08.2014 cuma günü yapılmış ancak uygun teklif çıkmadığından ihale iptal edilmiştir. Yıl sonuna az bir zaman dilimi kalması nedeniyle tekrar ihaleye çıkılmak yerine bahse konu alımın DMO yoluyla teminine karar verilmiş ve buna göre işlemlere başlanılmıştır. 02.10.2014 tarihinde DMO tarafından ihalesi yapılmış olup, sözleşme gereği ödeme gerçekleştirilmiştir.
2010K010050	Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	6.225	3.667	558	334	% 59,9	***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsünde hizmet vermekte olan Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarının deney kapasitesini ve etkinliğini arttırmak üzere ihtiyaç duyulan alet-edevat-cihaz-ekipman-donanım vb. malzemelerin alımını yapmak üzere ihtiyaçlar tespit edilmiş olup, ihalesi 15.08.2014 cuma günü yapılmıştır. İhale kararı onaylanmış ve isteklilere bildirilmiş olup, KİK na itirazın şikayet başvurusu yapılmış, 2014/UM-II-3357 nolu karar ile şikayet başvurusu KİK tarafından 09.10.2014 tarihinde reddedilmiş olup; Utest Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmıştır. Cihaz teslimi 2015 yılı içerisinde yapılacağından ödenek harcanamamıştır.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	10.908	8.064	1.200	1.184	% 98,7	<p>***Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS) yazılımının bakım ve onarımı işinin hizmet alımı için İnter-san Bilg.Yaz.Ltd. ile kdv hariç 77.600-TL bedel üzerinden 03.06.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmıştır. İş bitirilemediğinden ödemesi yapılmamıştır.</p> <p>***Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet arazi vitesli çift kabin pick-up alınmış ve ihtiyaç duyulan İl Müdürlüklerine dağıtılacaktır. DMO kanalıyla yapılan bu alım için 901.080 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.</p> <p>***15-18 Nisan 2014 tarihleri arasında PGD temel seviye eğitimi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>***24-26 Kasım 2014 tarihleri arasında PGD ileri seviye eğitimi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>***Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmıştır.</p> <p>***06-10 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Yapı Fuarına katılım sağlanmıştır.</p> <p>***MOBİLPGD uygulamasına yönelik yazılımın gerçekleştirilmesi için 43.000-TL+KDV bedel üzerinden İnter-san Bilg.Yaz.Ltd. ile 17.07.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmıştır. İş bitirilemediğinden ödemesi yapılmamıştır.</p> <p>***Mobil PGD pilot uygulamasında kullanılmak üzere tablet bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir.</p>
2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	863	450	15	14	% 93,3	<p>***Yolluk ödemeleri gerçekleştirilmiştir.</p>
2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	486	86	185	41	% 22,2	<p>***İstanbul Teknik Üniversitesi ile Gürültü konusunda KDV dahil 98.000 TL lik protokol imzalanmış olup; 1. etap ödemesi olarak 2014 yılı içerisinde 24.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.</p>

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K010080	Yapı Müteahhitiği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2015	1.260	200	800	222	% 27,8	***Yapı Müteahhitiği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Yazılımının Bakım ve Onarım İşinin hizmet alımı ihalesi 09.06.2014 günü yapılmış ve iş 38,150-TL bedel ile İntersan Bilg.Yaz.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmış ve hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir. ***03-05 Kasım 2014 tarihleri arasında YAMBİS uygulamalarına yönelik eğitim yapılmıştır. ***31.05.2014 tarihinde İbank tesislerinde imar yönetmeliği konulu çalıştay düzenlenmiştir. ***Yapı Ustalarına Eğitim amacıyla yapılacak bilgilendirme broşürü, billboard tanıtımları vb. işlemleri gerçekleştirilmiştir. ***Ankara ilinde yapı ustalarına yönelik olarak yaptırılacak eğitimlerle ilgili olarak ihale sonucu sözleşme yapılmış, İntes A.Ş. tarafından eğitimlere başlanılmış, eğitimler tamamlanmadığı için ödeme gerçekleştirilmemiştir.
		<b>TOPLAM</b>	<b>40.646</b>	<b>21.758</b>	<b>8.138</b>	<b>7.004</b>	<b>% 86,1</b>	

<b>Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı</b>	<b>719</b>
---	------------

e-bütçe ödenek miktarı

7.419

**COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090100	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.700	200	1.500	1.500	% 100,0	Yıl içerisinde yapılması planlanan işler tamamlanmıştır.
2014K090120	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.950		4.900	4.900	% 100,0	Yıl içerisinde yapılması planlanan işler tamamlanmıştır.
2014K090130	Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.000		1.700	1.700	% 100,0	Yıl içerisinde yapılması planlanan işler tamamlanmıştır.
2014K090150	Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı Güncelleştirme ve Optimizasyon Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.900		2.600	2.600	% 100,0	Yıl içerisinde yapılması planlanan işler tamamlanmıştır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090170	1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	10.000		500	500	% 100,0	Yıl içerisinde yapılması planlanan işler tamamlanmıştır.
2014K090300	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi	2014-2015	3.400		1.500	1.500	% 100,0	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Yıl içerisinde yapılması planlanan işler tamamlanmıştır.
2014K090310	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi	2014-2015	3.000		1.000	264	% 26,4	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Yıl içerisinde Planlanan 1 işin ihalesi iptal edilmiştir.
2014K090320	Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Projesi	2014-2015	3.000		2.000	2.000	% 100,0	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Yıl içerisinde yapılması planlanan işler tamamlanmıştır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090160	Fiziksel ve Dijital Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Uygulaması (*) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	2.500		2.500	0	% 0,0	Yatırım Bütçesinin söz konusu proje için yeterli olmadığından 2015 Yılı Yatırım Programına alınması için Kalkınma Bakanlığı ile görüşüldü.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.072	0	410	0	% 0,0	Proje değişikliği ve şartname değişikliği yapılarak Merkezi Finans İhale birimine gönderildi. Ancak AB Bakanlığı ve Merkezi Finans İhale birimi ihalesini yapmadığı için gerçekleştirme olmamıştır.
AB KATKISI			9.648	0	4.824	0	% 0,0	
<b>TOPLAM</b>			<b>36.522</b>	<b>200</b>	<b>18.610</b>	<b>14.964</b>	<b>% 80,4</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>9.648</b>	<b>0</b>	<b>4.824</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

<b>Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı</b>	<b>431</b>
---	------------

(\*) Proje ödeneği döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

ödenek toplamı	18.179
döner sermaye	2.500
e-bütçe ödenek miktarı	15.679



**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000150	Çevre Koruma-Planlama- Düzenleme-Altyapı-Uygulama (Turizm Sektörü)	2014-2014	10.500		10.500	10.429	% 99,3	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2014F000300	Korunan Alanlarda Çevre-Cephe- Yol-Iskele-Kıyı Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2014-2016	4.000		500	499	% 99,8	Proje 2014 yılında başlatılmış olup, 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
2014K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçme Suyu Sektörü)	2014-2014	3.769		3.769	3.762	% 99,8	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2014K060400	Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2014-2014	6.620		6.620	5.227	% 79,0	6360 sayılı Kanun ile birlikte Büyükşehirlerin sorumluluğuna giren yerleşimlerdeki küçük projeler birleştirilerek tek proje haline getirildi.
2014K080010	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2014-2014	1.000		1.000	979	% 97,9	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
1992K090010	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	1992-2014	162	152	10	0	% 0,0	İmar Planı onaylandıktan sonra mevzuat gereği askıya çıkarılmış olup, askı itirazlarının Değerlendirilmesine ilişkin olur Bakanlık Makamı tarafından 2014 yılı içinde onaylanmadığı için 2014 yılı içinde kabul işlemleri yapılamamıştır. Söz konusu işin süresi dolduğu için ödeme yapılmayacaktır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090090	Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.245	500	745	744	% 99,9	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2014K090020	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	360		360	360	% 100,0	Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2014K090030	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	800		800	544	% 68,0	Sermaye Transferi kaleminde yapılan işlerin ilgili Belediyesi ve İl Müdürlükleri tarafından takibi ve kontrolünün yeterli düzeyde olmayışı nedeniyle yıl içinde bitirilememiştir.
2014K090040	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	600		600	265	% 44,2	Düzenleme sınırı içerisinde mera parsellerinin çıkması ve iki belediyenin ihaleyi zamanında yapmayıp protokolü iptal etmesi ve bir belediyeninde işi zamanında yetiştirmemesi nedeniyle iş yapılmamıştır.
2010K100130	Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II (Çevre Sektörü)	2010-2014	1.042	900	142	141	% 99,3	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	4.858	1.308	1.178	213	% 18,1	Antalya,Burdur,Isparta,İstanbul,Muğla,Balıkesir, Bursa, Yalova,İzmir,Manisa,Çanakkale,Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu,Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın,Kocaeli, Sakarya, Düzce Edirne, Tekirdağ,Kırklareli İlleri ve Tuz Gölü ÖÇKB Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırması Projeleri 2014 yılında başlatılmış olup projeler 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatlarda Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2015	1.862	1.112	435	395	% 90,8	
	Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	590	495	55	53	% 96,4	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
	Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	190	95	55	53	% 96,4	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	240	145	55	53	% 96,4	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
	Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	233	143	55	53	% 96,4	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
	Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	233	143	55	53	% 96,4	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
	Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2014-2014	55		55	53	% 96,4	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
	Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi	2013-2014	136	91	45	43	% 95,6	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
	Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi	2014-2015	185		60	34	% 56,7	Proje 2014 yılında başlatılmış olup, 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100140	Mogan Gölü Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (2*-Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2014-2015	800		80	0	% 0,0	İşin ihalesi yapılmış olup, itirazlar olduğundan kamu ihale kurumuna gidilmiştir.
2009K100120	Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (GEF) (Çevre Sektörü)	2009-2014	638	588	50	49	% 98,0	Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
GEF Katkısı			3.103	2.837	266	266	% 100,0	
TOPLAM			<b>38.256</b>	<b>4.560</b>	<b>26.789</b>	<b>23.607</b>	<b>% 88,1</b>	
GEF KATKISI			<b>3.103</b>	<b>2.837</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>% 100,0</b>	

<b>Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı</b>	<b>688</b>
---	------------

ödenek toplamı	26.101
döner sermaye	80
e-bütçe ödenek miktarı	26.021

**AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2015	3.217	1.590	1.127	1.100	% 97,6	Proje kapsamında 3 ayrı hizmet alımı sözleşmesi yapılmış olup, sözleşme süreleri 2016 yılı ortasına kadar uzatılmıştır.
AB KATKISI			18.231	9.017	6.381	5.123	% 80,3	
2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2009-2014	2.131	1.830	301	301	% 100,0	Proje kapsamında 2 ayrı hizmet alımı sözleşmesi yapılmış olup, sözleşme süreleri 2016 yılı ortasına kadar uzatılmıştır.
AB KATKISI			14.753	13.061	1.692	1.754	% 103,6	
2009K100090	Çevre ve Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) Çevre Sektörü)	2009-2016	3.046	1.580	892	862	% 96,6	1 adet Daire Başkanlığının Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Teknik Destek hizmet alımı sözleşmesi devam etmekte olup, 2015 yılında sona ermiştir. 1 adet yeni dönem Daire Başkanlığının Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Teknik Destek hizmet alımı şartname çalışması devam etmektedir. Proje kapsamında 20 adet uzman ve 1 adet asistan hizmet alımı bulunmakta olup, hizmet devam etmektedir. 1 adet İletişim Eylem Planı Teknik Destek hizmeti alımı projesi, ihale sürecindedir. Ayrıca 4 adet Çerçeve Sözleşme ihalesi çalışmaları devam etmektedir.
AB KATKISI			17.258	8.558	5.054	1.677	% 33,2	
<b>TOPLAM</b>			<b>8.394</b>	<b>5.000</b>	<b>2.320</b>	<b>2.263</b>	<b>% 97,5</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>50.242</b>	<b>30.636</b>	<b>13.127</b>	<b>8.553</b>	<b>% 65,2</b>	

**EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100020	Çevre Konusunda Bilinçlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2014	600		600	319	% 53,2	
2014K090070	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	1.000		1.000	900	% 90,0	
<b>TOPLAM</b>			<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.219</b>	<b>% 76,2</b>	

<b>Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı</b>	<b>192</b>
---	------------

e-bütçe ödenek miktarı

1.408

## STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2008K091080	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2008-2015	47.975	23.089	7.000	2.900	% 41,4	
	Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2013-2014	361	264	61	61	% 100,0	2013 yılında yapımına başlanan ek hizmet binası inşaatı 2014 yılı içerisinde tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2015	5.245	58	1.939	1.595	% 82,3	Hizmet binası yapım işi 16.12.2013 tarihinde <b>KDV dahil 5.244.443,92 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi yeni başlamıştır.
	Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.557	0	2.000	1.045	% 52,3	Hizmet binası yapım işi 30.10.2013 tarihinde <b>KDV dahil 3.556.520,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir.
	Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	6.883	6	1.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 27.05.2014 tarihinde <b>KDV dahil 5.027.980 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi başlamıştır.
	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.516	0	1.000	199	% 19,9	Hizmet binası yapım işi 28.05.2014 tarihinde <b>KDV dahil 2.466.200 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi başlamıştır.
	Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	5.693	0	1.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 04.06.2014 tarihinde <b>KDV dahil 4.189.000 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi başlamıştır.

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090100	Hizmet Binaları İnşaatı-2 (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	24.581	0	8.200	905	% 11,0	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.923		2.000	862	% 43,1	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde <b>KDV dahil 2.922.860,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	7.749		100	19	% 19,0	İhale hazırlıkları tamamlandı, proje maliyetinin artırılmasına ilişkin talep Kalkınma Bakanlığı'na iletildi.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	4.764		100	24	% 24,0	İhalesi Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iki defa yapılmış ve iptal edilmiştir. İhale Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	9.145		6.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde <b>KDV dahil 9.140.280 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi başlamıştır.
2014K090090	Hizmet Binası Etüd-Proje İşleri (Giresun-Kocaeli-Tokat- Kahramanmaraş-Ankara)	2014-2014	250	0	250	0	% 0,0	Proje 18.07.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Giresun, Kocaeli, Tokat, Kahramanmaraş ve Ankara İl Müdürlükleri tarafından proje hazırlıkları yürütülmüştür.



**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	15.002	0	15.002	13.549	% 90,3	
	Taşıt Alımı	2014-2014	602		602	602	% 100,0	Taşıt alımına yönelik 24.02.2014 tarihli ve 2014/6031 sayılı <b>Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 7 adet T8 (Pick-up) tipi araç DMO dan temin edilmiştir. Araçlar; Diyarbakır, Kayseri, Bolu, Artvin, Trabzon, Hatay ve Isparta illerine tahsis edilmiştir.</b>
	Hizmet Binası Onarımı	2014-2014	9.500		9.500	8.352	% 87,9	Hizmet binası onarımı için, <b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 141 adet ihale talimatı gönderilmiştir.</b>
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2014-2014	4.900		4.900	4.595	% 93,8	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, <b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 152 adet ihale talimatı gönderilmiştir.</b>
2014G000370	Lojman Onarımı (Konut Sektörü)	2014-2014	5.625		5.625	5.625	% 100,0	Lojman binası onarımı için, <b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 84 adet ihale talimatı gönderilmiştir.</b>
<b>TOPLAM</b>			<b>93.433</b>	<b>23.089</b>	<b>36.077</b>	<b>22.979</b>	<b>% 63,7</b>	

**Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı 4.383**

"Muhtelif İşler" ve "Lojman Onarımı" projeleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı projeleri ile ortak projedir.

(3\*) Proje maliyetinin 6.000.000 TL si döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır. Bu ödenek Diyarbakır Hizmet Binası için 2014 yılında kullanılacaktır. Toplama dahil edilmiştir.

ödenek toplamı	31.694
döner sermaye	6.000
e-bütçe ödenek miktarı	25.694

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 31.12.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	350	0	350	276	% 78,9	
	Hizmet Binası Onarımı	2014-2014	250		250	245	% 98,0	Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Balgat ek hizmet binası giriş katı onarımı yaptırılmıştır. Mekansal Planlama Gn.Md. Tadilat İşi. Merkez Hizmet Binası boya ve badana işleri, yaptırılmıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2014-2014	100		100	31	% 31,0	Sağlık Ünitesinde kullanılmak üzere spirometre cihazı alınmıştır. Bakanlığımız Yemekhanesinde kullanılmak üzere Mutfak malzemesi ve Galoşmatik alınmıştır.
2014G000370	Lojman Onarımı (Konut Sektörü)	2014-2014	300		300	109	% 36,3	Eryaman Aktürk Bloklarındaki Lojman onarımı, Çukurca 2. Devlet Mah. 10 Nolu daire tadilatları yaptırılmıştır. Eryaman 4. Devlet Mah.'de bulunan 47/2-9-17 nolu kamu konutları tadilatları yaptırılmıştır. Çankaya Devlet Mah. 5 ve 10 nolu Lojmanların İnşaat ve tesisat işleri yaptırıldı.
<b>TOPLAM</b>			<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>385</b>	<b>% 59,2</b>	

<b>Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde düşülen ödenek tutarı</b>	<b>265</b>
---	------------

"Muhtelif İşler" ve "Lojman Onarımı" projeleri İl Müdürlükleri projeleri ile ortak projedir.

e-bütçe ödenek miktarı

385

# **01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Sunumunu Arz Ederim.**

**Sadi KIZIK**  
**Strateji Geliştirme Başkan V.**
