

# **2014 Yılı Bütçesi Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu**


**Strateji Geliştirme Başkanlığı**

**04 Temmuz 2014**

## BAKANLIK 01 OCAK 2014 – 25 HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	25 Haziran 2014 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	571.825.000	571.825.000	294.666.888	% 51,5
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.871.000	94.871.000	48.347.687	% 51,0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.628.000	73.080.400	26.672.973	% 36,5
05	CARİ TRANSFERLER	196.795.000	196.795.000	86.243.311	% 43,8
06	SERMAYE GİDERLERİ	232.250.000	757.102.809	238.735.592	% 31,5
	Bakanlık Yatırım Programı	216.250.000	216.198.000	16.834.815	% 7,8
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.000.000	16.000.000	1.223.000	% 7,6
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0	524.904.809	220.677.777	% 42,0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	139.772.000	139.824.000	34.087.825	% 24,4
	Bakanlık Yatırım Programı	39.397.000	39.449.000	2.424.186	% 6,1
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	100.375.000	100.375.000	31.663.639	% 31,5
08	BORÇ VERME	24.275.000	24.275.000	3.336.140	% 13,7
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.329.416.000</b>	<b>1.857.773.209</b>	<b>732.090.416</b>	<b>% 39,4</b>

## BAKANLIK 01 OCAK 2014 – 25 HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

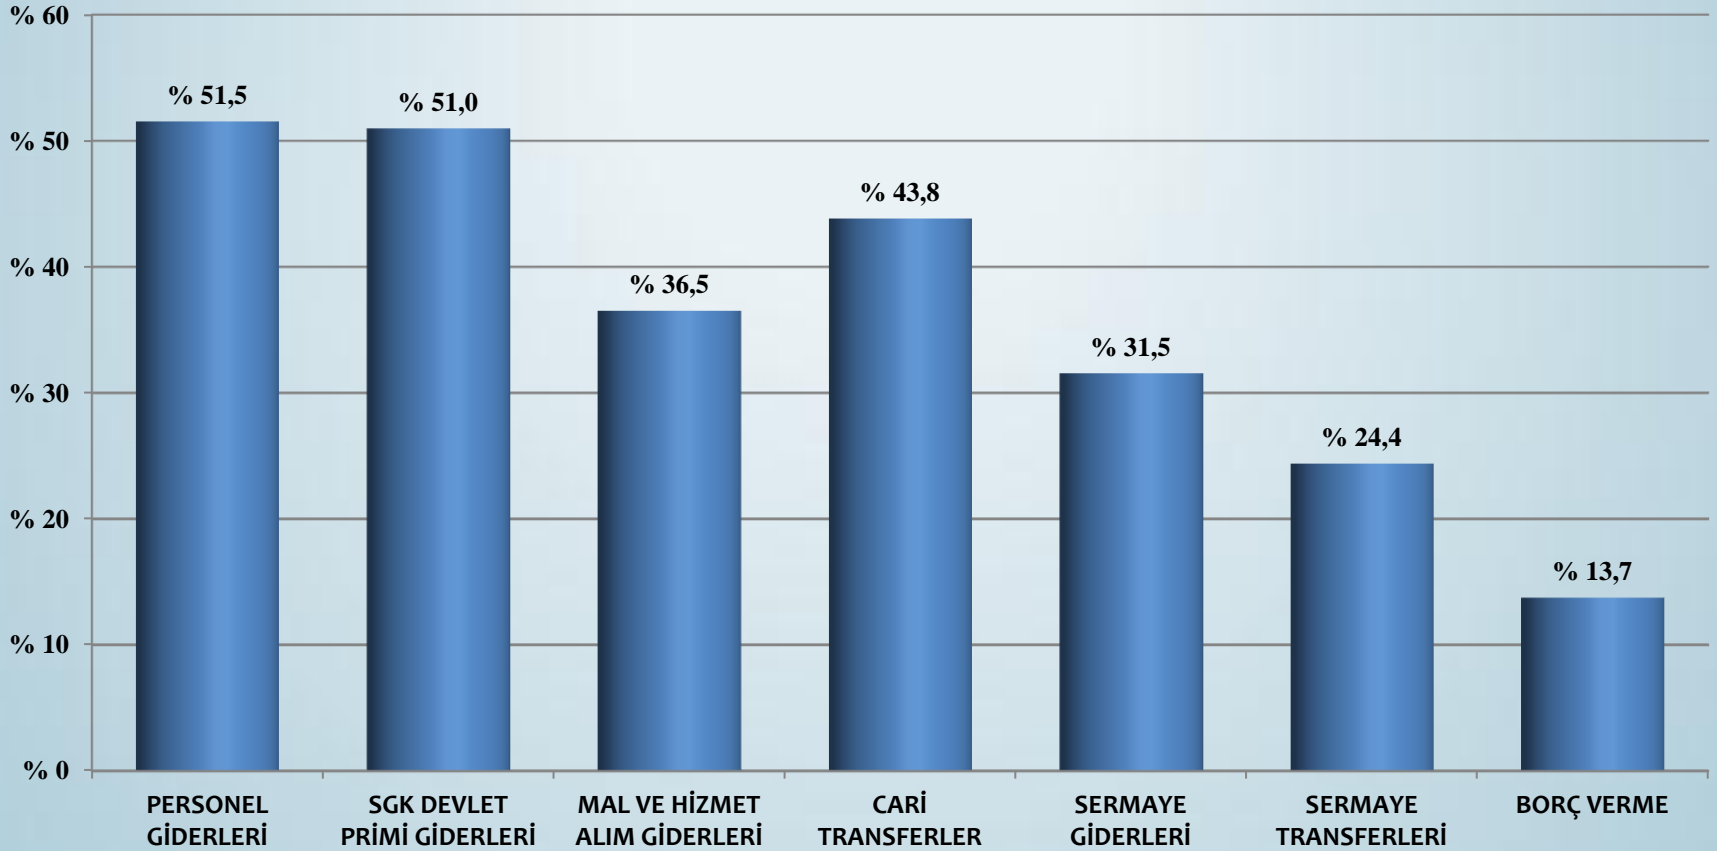


## BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK 2014 – 25 HAZİRAN 2014 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	25 Haziran 2014 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	60.405.100	57.858.206	7.961.389	<b>% 13,8</b>
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	182.179.400	177.181.631	42.693.622	<b>% 24,1</b>
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	29.510.600	34.378.369	9.075.737	<b>% 26,4</b>
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	151.028.700	206.226.502	70.451.165	<b>% 34,2</b>
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	157.293.900	157.293.900	91.375.734	<b>% 58,1</b>
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	17.801.100	17.801.100	5.462.892	<b>% 30,7</b>
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	21.870.900	21.870.900	3.435.150	<b>% 15,7</b>
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	36.069.500	36.160.500	4.634.150	<b>% 12,8</b>
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	7.838.700	7.838.700	3.622.796	<b>% 46,2</b>
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	3.808.500	3.814.500	2.090.556	<b>% 54,8</b>
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.064.100	1.064.100	568.339	<b>% 53,4</b>
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.150.800	3.174.800	1.556.491	<b>% 49,0</b>
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.295.500	10.295.500	862.261	<b>% 8,4</b>
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.019.900	4.019.900	3.123.272	<b>% 77,7</b>
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.957.400	4.042.000	1.135.828	<b>% 28,1</b>
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.398.800	3.398.800	1.457.498	<b>% 42,9</b>
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	47.934.400	41.774.400	13.922.166	<b>% 33,3</b>
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	619.200	619.200	247.216	<b>% 39,9</b>
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	24.184.100	24.184.100	11.246.509	<b>% 46,5</b>
İL MÜDÜRLÜKLERİ	562.985.400	1.044.776.101	457.167.646	<b>% 43,8</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>1.329.416.000</b>	<b>1.857.773.209</b>	<b>732.090.416</b>	<b>% 39,4</b>

(\*) Veriler 25 Haziran 2014 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.


## BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK 2014 – 25 HAZİRAN 2014 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

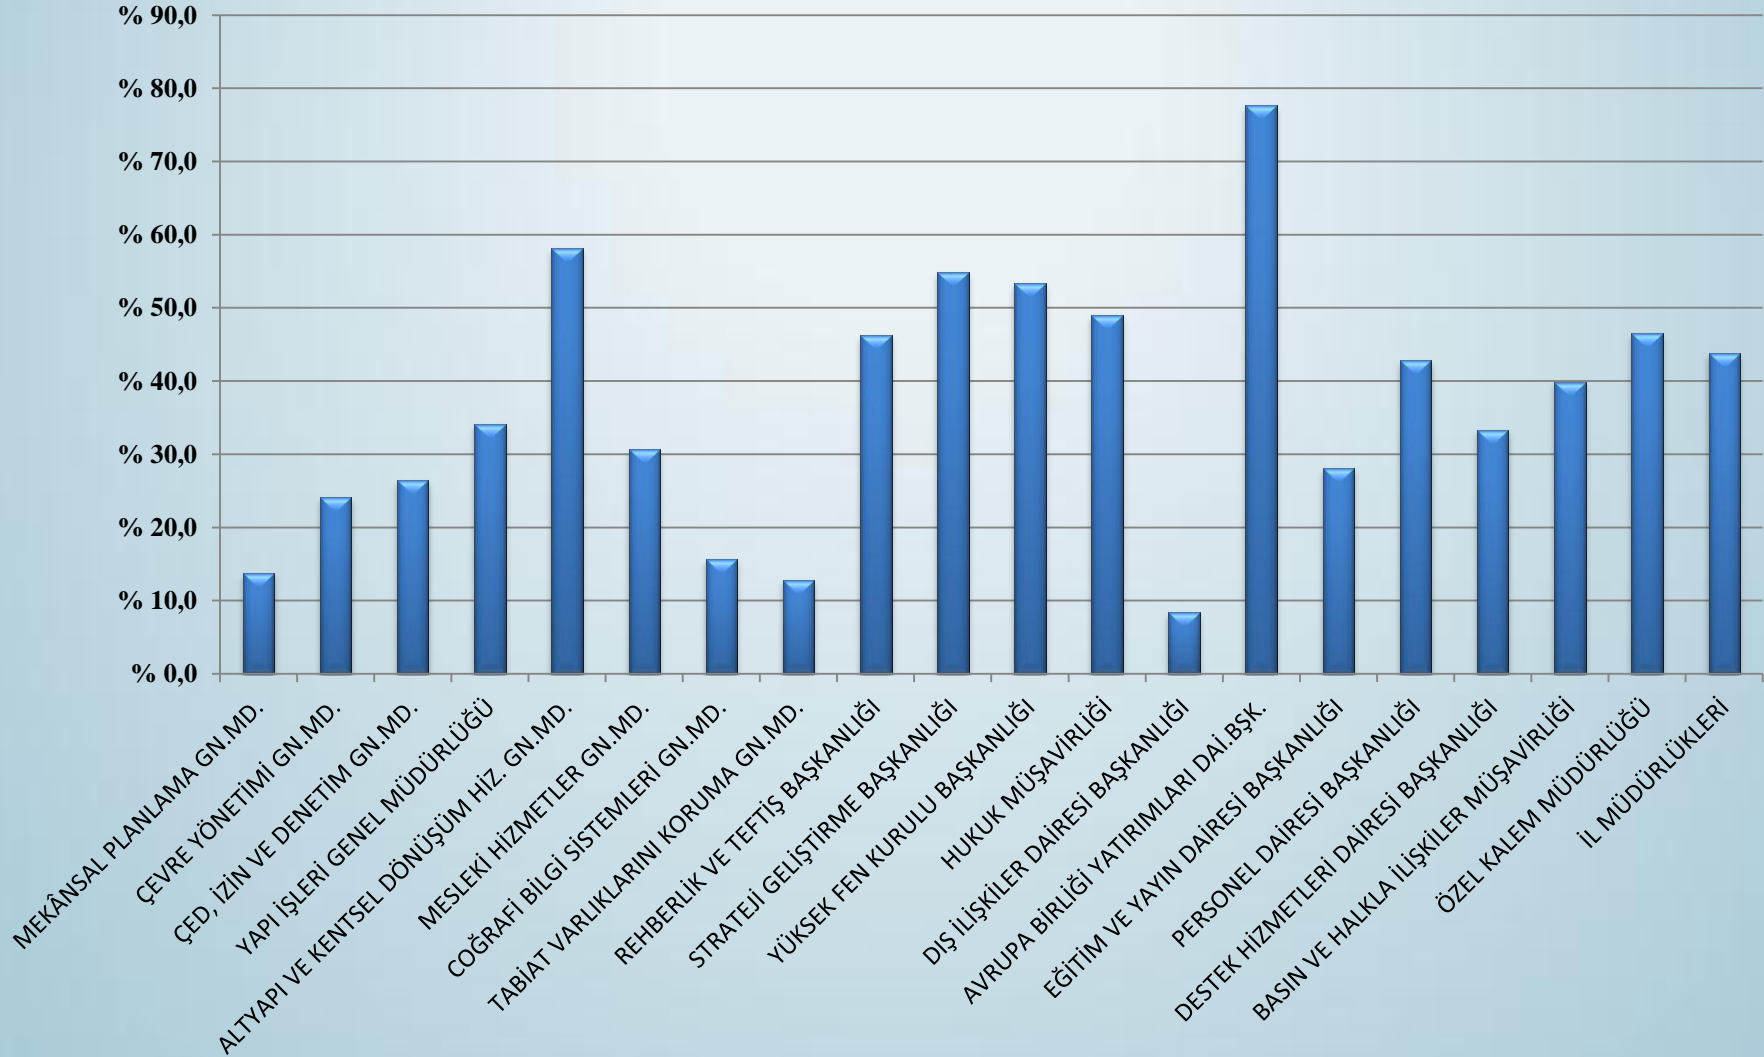

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI (1.000 TL)	2014		Gerçekleşme (%)
			REVİZE ÖDENEĞİ (1.000 TL)	HARCAMA (1.000TL)	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	6	107.186	42.856	248	% 0,6
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	16	16.334	8.486	1.123	% 13,2
ÇED, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	11	44.814	25.295	2.788	% 11,0
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	18	820.140	107.609	14.239	% 13,2
Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	7	22.287	9.410	64	% 0,7
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	12	40.736	8.138	674	% 8,3
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	10	36.522	17.910	213	% 1,2
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü <a href="#">(DETAY)</a>	14	37.456	27.381	49	% 0,2
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı <a href="#">(DETAY)</a>	3	8.394	2.320	1.949	% 84,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı <a href="#">(DETAY)</a>	2	1.600	1.600	116	% 7,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri <a href="#">(DETAY)</a>	4	83.833	36.777	1.004	% 2,7
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı <a href="#">(DETAY)</a>	2	650	650	182	% 28,0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>102</b>	<b>1.219.952</b>	<b>288.432</b>	<b>22.649</b>	<b>% 7,9</b>

## BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

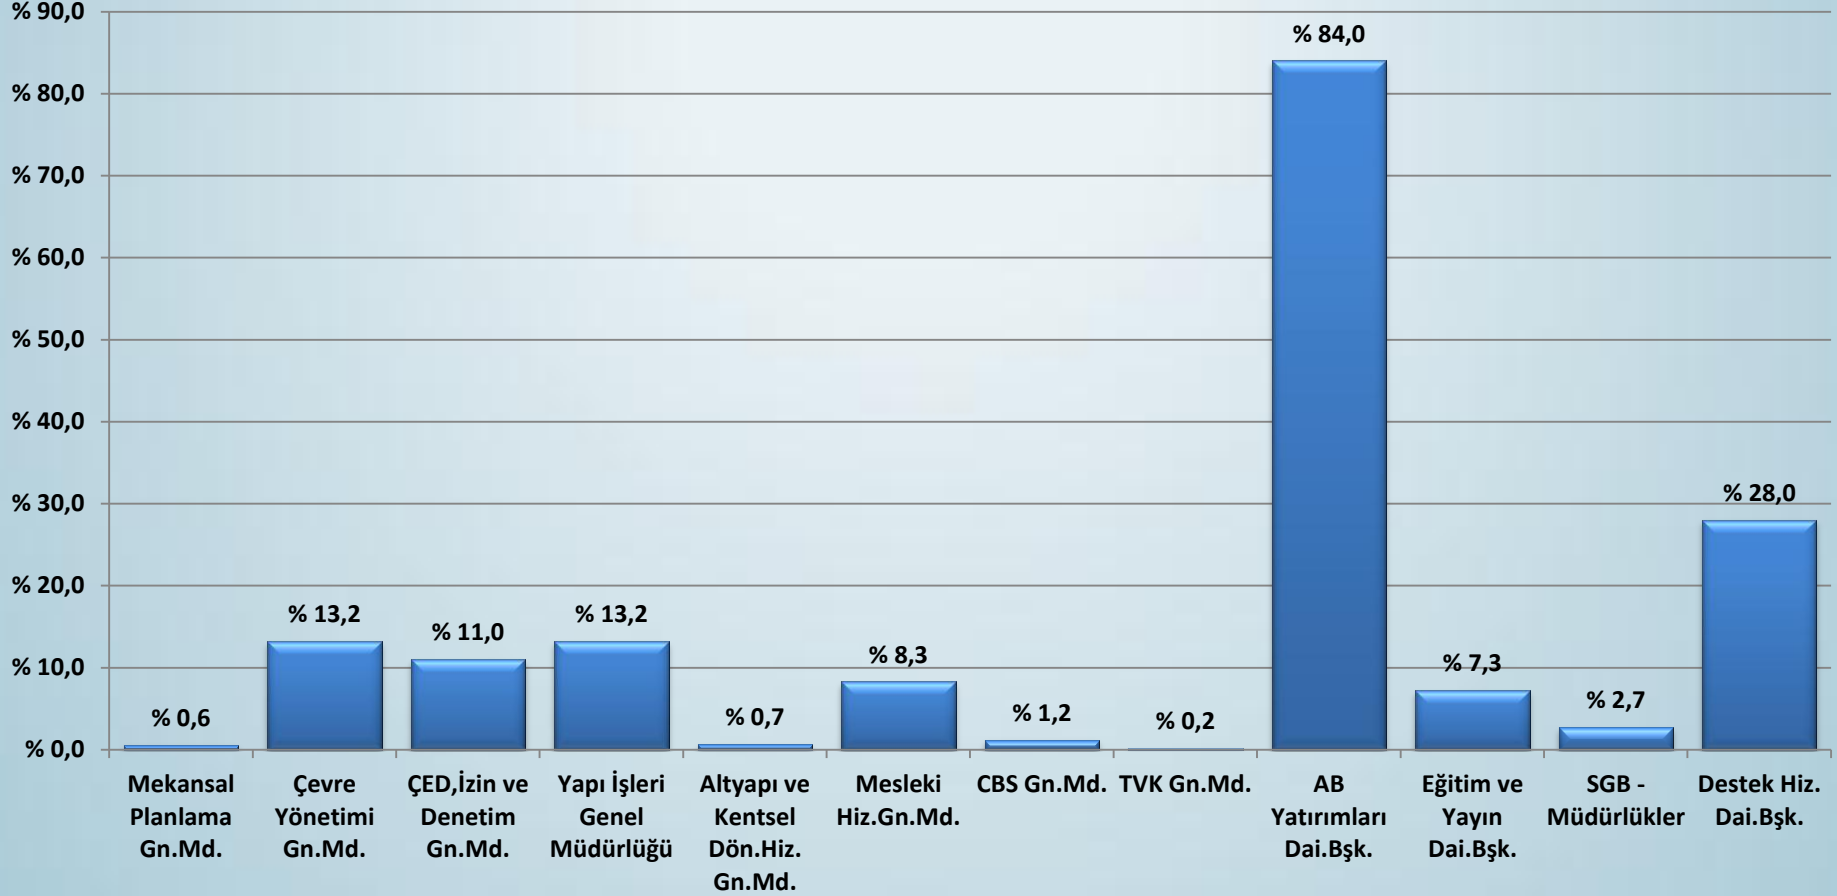

# Harcama Birimi Bazında Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2007F000100	İmar Uygulamaları (Turizm Sektörü)	2007-2014	37.000	25.500	11.500	0	% 0,0	"İmar uygulamaları projesi" kapsamında 2014 yılı ödeneği olan 11.500.000 TL'lik ödeneğin 5.750.000 TL'lik serbest bırakılan kısmı; 24.06.2014 tarih ve 9939 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile 62 belediyenin projesine tahsis edilmiştir. Bahse konu Olura istinaden ödeneklerin kullanımına ilişkin talimat yazıları yazılmaktadır.
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları Belirleme (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2014	1.000	200	800	0	% 0,0	İhale şartnameleri beklenmektedir.
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2014	60.236	35.780	24.456	248	% 1,0	1-İzmir İli Buca İlçesi Seyhan Mahallesi 87 Hektarlık Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yapıtırılması ve Raporlarının Hazırlanması İşi için (KDV dahil )79.532,00 TL ve 2-Çorum İli Osmancık İlçesi Yeni, Hıdırlık, Yazı, Ulucami, Kızılırmak, Cumhuriyet, Gemici, Çay, Güney ve Yeşilçatma Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Yaklaşık 166,24 Hektar Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yapıtırılması ve Raporlarının Hazırlanması İşi için (KDV dahil) 116.820 TL'lik ihaleleri sonuçlandırılmış olup toplam 196.352 TL' nin ödemesi gerçekleştirilecektir.
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.450	1.350	100	0	% 0,0	İhale şartnameleri beklenmektedir.
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	2.500	1.500	1.000	0	% 0,0	İhale şartnameleri beklenmektedir.
2014K090010	Özel Proje Alanları Projesi (*) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	5.000		5.000	0	% 0,0	İhale şartnameleri beklenmektedir.
<b>TOPLAM</b>			<b>107.186</b>	<b>64.330</b>	<b>42.856</b>	<b>248</b>	<b>% 0,6</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012F000090	Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (Turizm Sektörü)	2012-2014	2.000	500	1.500	736	% 49,1	Proje başlangıç, 3 ara rapor ve nihai rapor dan oluşmakta olup 3. ara raporun tarafımızca kabul edilmesine müteakip olarak 2014 yılının Nisan ayında 736.000 TL. ödeme yapılmıştır. Proje nihai raporunun kabulünden sonra yani 2014 yılı son çeyreğinde projenin tamamlanması ön görülmektedir. Bu aşamada projenin geri kalan kısmının ödenmesi yapılacak ve % 100 gerçekleştirme sağlanacaktır.
2014K100050	Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2014	200		200	0	% 0,0	Projenin TÜBİTAK-MAM'LA Sözleşme yapılarak gerçekleştirilmesi amacıyla Genel Müdürlük Oluru alınmış olup; proje süresinin 1 yıl olması ve sürenin 2015 yılına sarkacak olması nedeniyle Kalkınma Bakanlığına projenin toplam ödeneği aynı kalmak üzere 2015 yılına uzatılması, 2014 yılı ödeneğinin 100.000 TL ve 2015 yılı ödeneğinin 100.000 TL olarak düzenlenmesi yönünde yazı yazılmıştır. Kalkınma Bakanlığında gelecek cevap çerçevesinde TÜBİTAK-MAM ile sözleşme imzalanacak ve çalışmalara başlanacaktır
2013K100030	İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	2.300	0	1.000	0	% 0,0	Projenin ilk dönem ödemesine ilişkin hakediş ve ödeme belgeleri Genel Müdürlüğümüzce imzalanmış olup, ödeme ile ilgili bütçede serbest yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle ödemenin gerçekleştirilmesi için Temmuz ayı serbest bırakma işlemi beklenmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2014	2.000	166	1.834	0	% 0,0	Proje kapsamında ik çeyrekte herhangi bir rapor sunulması ve ödeme yapılması planlanmamıştır. İkinci çeyrekte projenin 1. ara raporu Bakanlığımıza sunulmuş olup raporun incelenmesi devam etmektedir. Bu bağlamda 2014 yılı ilk çeyreğinde herhangi bir ödeme yapılmamış olup, yıl içerisinde sadece son çeyrekte (yılsonu) ilgili iş bölümünün ödemesi yapılacaktır.
2012K100070	Çevresel Açidan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü)	2012-2015	1.900	209	1.182	0	% 0,0	Proje kapsamında ik çeyrekte herhangi bir rapor sunulması ve ödeme yapılması planlanmamıştır. İkinci çeyrekte projenin 1. ara raporu Bakanlığımıza sunulmuştur. Söz konusu raporun incelenmesi devam etmekte olup, bu rapora istinaden ödeme yapılması planlanmamıştır. Bu bağlamda 2014 yılı ilk ve ikinci çeyreğinde herhangi bir ödeme yapılması planlanmamış olup, yıl içerisinde sadece son çeyrekte (yıl sonu) ilgili iş bölümünün ödemesi yapılacaktır.
2014K100100	Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	800		300	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan teknik şartname için Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden talep edilen görüş 23.06.2014 tarihinde ulaşılmıştır. Söz konusu görüş değerlendirilecektir. Söz konusu yazılımın ihale sürecine başlanmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100080	Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.813	923	860	47	% 5,5	
	Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması	2013-2013	241	241	0			
	Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu	2013-2014	600	200	400	0	% 0,0	Proje, iki ara rapor ve bir final raporundan oluşmaktadır. 1. ara rapor 23 Kasım 2013 tarihinde sunulmuş ve ödeme yapılmıştır. 2. ara rapor Haziran 2014, final raporu ise Kasım 2014 de sunulacak olup, raporlardan sonra ödemeleri yapılacaktır. 2. ara rapor haziran ayında sunulmuş olup rapora ilişkin idare tarafından düzeltme yapılması istenmiştir. İdare tarafından istenen düzeltmelerin Temmuz 2014 te sunulmasına mütakip ödeme yapılacaktır.
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (1.Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi)	2013-2014	800	420	380	0	% 0,0	Proje devam etmekte olup, Ağustos ayı içerisinde ikinci ara raporun sunulmasına müteakip ödeme yapılacaktır.
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi)	2013-2015	172	62	80	47	% 58,8	İkinci ara ödeme 13 Mayıs 2014 tarihinde 47.495 TL (KDV Dahil) olarak yapılmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K100070	Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme. İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2014	678	441	237	225	% 94,9	Proje 11 Aralık 2013 tarihi ile tamamlanmıştır.
AB KATKISI			5.689	2.105	3.584	0	% 0,0	
2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	233	131	102	15	% 14,7	Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni söz konusudur. Projenin, tedarik bileşeni tamamlanmış olup, teknik yardım bileşeni 28 Haziran 2013 tarihinde başlamıştır. 2014 yılı ilk çeyrek dönemi için Hazine Müsteşarlığından gelen bir harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir. 2014 yılı ikinci çeyrek döneminde 4.921,70 (dörtbindokuzyüzyirmibir Avro yetmiş sent) karşılığı 14.466,84 TL tutarındaki ulusal katkı payı (TR21 0001 5001 58048014 3490 82) no'lu Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır.
AB KATKISI			14.020	5.328	8.692	0	% 0,0	
2010K100090	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB)	2010-2014	288	182	106	100	% 94,3	Projede yer alan aktiviteler tamamlanmış ve kapanış toplantısı 12 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, raporlama süreci devam etmektedir.
AB KATKISI			3.551	2.446	1.105	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100110	Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	1.442	1.375	67	0	% 0,0	Hazine Müsteşarlığının talebi doğrultusunda 2014 yılı içinde Bakanlık katkısı sağlanacaktır.
AB KATKISI			10.948	10.344	604	0	% 0,0	
2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirlenmeler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2012-2015	268	84	80	0	% 0,0	Söz konusu proje kapsamında toplam 8 eğitimden 7 tanesi tamamlanmış ve yasal boşluk analizi yapılmış olup, Ulusal Uygulama Planı güncelleme ve web-sitesi tasarım çalışmaları devam etmektedir.
AB KATKISI			2.412	804	965	0	% 0,0	
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2015	804	0	402	0	% 0,0	Proje kapsamında MFİB'de firmaların değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, seçilen firma ile Ağustos 2014'te sözleşme imzalanmasını müteakip ödeme yapılacaktır.
AB KATKISI			7.236	0	3.257	0	% 0,0	
2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (1) (Çevre Sektörü)	2013-2015	268	161	80	0	% 0,0	İhale süreci tamamlanmış ve ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanarak proje resmen başlatılmıştır. Projede çalışacak uzmanların değerlendirilmesi aşamasını takiben projede yer alan aktiviteler kapsamında çalışmalar başlatılacaktır.
AB KATKISI			2.412	1.447	724	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100080	Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2015	670		268	0	% 0,0	Projenin ihale süreçleri Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından yürütülmekte olup, ihale çalışmaları halen devam etmektedir. Bu sebeple ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
AB KATKISI			6.030		3.015	0	% 0,0	
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2015	670		268	0	% 0,0	Projenin ihale süreçleri Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından yürütülmekte olup, ihale çalışmaları halen devam etmektedir. Bu sebeple ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
AB KATKISI			6.030		3.015	0	% 0,0	
<b>TOPLAM</b>			<b>17.134</b>	<b>4.172</b>	<b>8.486</b>	<b>1.123</b>	<b>% 13,2</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>58.328</b>	<b>22.474</b>	<b>24.961</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100060	Çevre İznine Tabi Faaliyetlerin Yer Aldığı Listelerin Uyumlaştırılması Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	0		0	0	% 0,0	13.06.2014 tarihinde yatırım programından çıkartılmıştır.
2013K100100	Çevresel Etiket Altyapısı Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2014	709	124	585	0	% 0,0	* 03.01.2014 tarihinde Projenin "İkinci İlerleme Raporu" Yüklenici firma tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir. * 15 ISO Standardı Eğitimi için konu ile ilgili uzman eğitimciler araştırılmış, eğitim tarihleri belirlenmiştir. * 18.04.2014 tarihinde Projenin "Üçüncü İlerleme Raporu" Yüklenici firma tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir. * 18.04.2014 tarihinde Nihai Düzenleyici Etki Analizi Raporunun Taslak Hali Bakanlığımız tarafından kabul edilmiştir. * 25.04.2014 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan on ülkenin sistem kurguları ve işleyiş mekanizmalarının tercümelerinin teslimi gerçekleşmiştir. * 06.06.2014 tarihinde Taslak logoların ilk halleri Bakanlığımıza sunulmuştur. * 12.06.2014 tarihinde Nihai Edilen Beş Logo Tasarısı Bakanlığımız tarafından değerlendirilmek üzere Yüklenici firma tarafından teslim edilmiştir. * Çevresel Etiket Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması amacıyla toplantılar gerçekleştirilmektedir. 26.06.2014 tarihinde Kocaeli Sanayi Odasında proje ile ilgili toplantı gerçekleştirilecektir.
2014K100030	Çevre Denetim Aracı Alımı (Çevre Sektörü)	2014-2014	3.010		3.010	0	% 0,0	Taahhüt alımına yönelik 24.02.2014 tarihli ve 2014/6031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.06.2014 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Çevre Denetim Aracının alımına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Teknik şartnamesi hazırlanmıştır.



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100110	Çevre Kirliliği ile Mücadele Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin Denetim, İzleme ve Numune Alma Kapasitelerinin Artırılması Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	4.000		2.000	0	% 0,0	Teknik şartnamesi hazırlanmış olup, fiyat araştırması için maliyet araştırma komisyonu oluşturulmuştur. Fiyat araştırmasından sonra ihaleye çıkılacaktır.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2014	559	209	350	0	% 0,0	Yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için yazılım firmalarından 2 kere teklif istenmiştir. Gelen tekliflerdeki fiyatlar proje bütçesini aştığından ve süresinin az kalması nedeniyle; iki yıllık proje olarak öngörülen projenin ilk bütçesi olan 559.000 TL ye tekrar çıkarılması ve proje süresinin de tüm süreçlerin tamamlanabilmesi için 2015 yılına kadar uzatılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu konuda Kalkınma Bakanlığı'ndan onay almak üzere; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na iletilmesi için Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 18.06.2014 tarihli yazı gönderilmiştir.
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2015	9.015	2.620	4.200	2.231	% 53,1	*.Erzurum ve İzmir Bölgeleri için, projenin final raporunun değerlendirme süreci devam etmekte olup, Nisan 2014 sonunda tamamlanacaktır. *.Ankara Bölgesi için, proje çalışmalarına başlanmış olup, Haziran 2015' de tamamlanacaktır. *.Adana, Diyarbakır ve Konya Bölgeleri için ise, teknik şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir.  1.790.071,80 TL tutarındaki harcama Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü)	2011-2015	5.350	288	3.500	0	% 0,0	
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	3.000	140	2.250	0	% 0,0	Atakum İlçesinde yer alan mülkiyeti hazineye ait arsanın Defterdarlık Millî Emlak Müdürlüğünden tahsisi yapılmıştır. Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce; bina projesi hazırlanması işi için ihale süreci başlatılmış olup, 2014 yılı Haziran ayı içerisinde uygulama projeleri ve yaklaşık maliyeti hazırlanacaktır.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	2.350	148	1.250	0	% 0,0	Erzurum Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası işi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası tadilat projeleri hazırlanmıştır. Bina güçlendirme bedeli ile binanın yürürlükteki yönetmenliklere uygun hale getirilmesi için gereken onarım bedeli toplamı, aynı alandaki yeni bina yapım maliyetinin % 40 aştığı, ayrıca onarım yapılacak binanın mimari ihtiyaç ve fonksiyon yönünden (kat yüksekliği, mahallerin durumu, personel sayını karşılama vb.) ihtiyaçları karşılamada sıkıntılar oluşturacağı belirtilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak il müdürlüğü'nce; mevcut binanın tadilatının yapılması, binanın tamamen yıkılarak yerine yeni bina yapılması ile kentsel dönüşüm kapsamında ilin batı çıkışında bulunan bir arsanın değerlendirilmesi yönündeki alternatifler incelenmektedir. Genel Müdürlüğümüz ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde inceleme yapılmış, Yenikent ilçesinde Millî Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait bir arsa üzerinde bina yapılması uygun olacağı tespit edilmiş, Erzurum Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından arsa tahsisi yapılmaya çalışmaları devam etmektedir.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü)	2012-2015	12.000	628	5.300	0	% 0,0	
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.371	437	1.967	0	% 0,0	Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ödenek aktarıldı. • Konya THM için Selçuklu İlçesi' ndeki (42314 ada, 1 parsel 5004.85m2'lik alan) hazineye ait arazi Milli Emlak Müdürlüğü' nce arsa tahsisi yapılmıştır. İl Müdürlüğü 3495 m2'lik Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası uygulama projeleri hazırlanmış, 06.03.2014 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yüklenici ile sözleşme imzalanmış yer teslimi yapılmıştır.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	2.344	0	1.100	0	% 0,0	Bornova İlçesi' nde yer alan arsanın Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden tahsisi yapılmıştır. İzmir İl Müdürlüğünce talep edilen zemin etüd için ödenek İl Müdürlüğüne aktarıldı. İl Müdürlüğü tarafından avan projeler hazırlanıldı, uygulama projeleri ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	528	191	200	0	% 0,0	Ödeneği Adana iline aktarıldı. Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede; il müdürlüğüne tahsisli bulunan Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi 2250 Ada ve 1 nolu parsel üzerine temiz hava merkezi yapılması uygun görülmüş ve onaylanmak üzere Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Ödeneğin Genel Müdürlüğümüz bütçesinde olması sebebiyle Yapı İşleri Onay için Genel Müdürlüğümüzden talep etmiş olduğu görüş yazısı ilgili birime iletilmiştir. Ancak söz konusu arsa için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzden tahsis belgesi bekleniyor.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.757	0	2.033	0	% 0,0	Diyarbakır Temiz Hava Merkezi İnşaatı ödeneği Adana iline aktarıldı. Adana ili Yüreğir ilçesi (Karşıyaka mahallesi 10993 ada 1 parsel numaralı alanın 4965.58 m2'lik alan Milli Emlak Müdürlüğü'nce arsa tahsisi yapılmıştır. İl Müdürlüğü 2405 m2'lik Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası uygulama projeleri elde edilmiş, yaklaşık maliyeti ve ihale dosyası hazırlanmış olup ihale için 03.07.2014 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	9.030	0	6.030	422	% 7,0	
	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Bakım-Onarımı	2014-2015	2.530		2.350	422	% 18,0	Her ay düzenli olarak hakediş düzenlenmektedir.
	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması	2014-2015	5.000		2.680	0	% 0,0	17 temmuzda ihalesi yapılacak
	İstasyonlara Yedek Cihaz ve Ekipman ile Sarf-Yedek Malzeme Alımı	2014-2015	1.500		1.000	0	% 0,0	17 temmuzdaki ihale sonucuna göre yedek cihaz sayısı belirlenecek

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	833	652	181	0	% 0,0	Proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup ,6 faaliyet başlığı bulunmaktadır. 1. faaliyet kapsamında Direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları ve STK'lara 24 adet eğitim verilmiştir. 2. faaliyet olan eğitimcilerin eğitimi 3 hafta sürecek bir dizi eğitim şeklinde verilecek olup ilki 30 Haziran tarihinde başlayacaktır. 3. faaliyet olan pilot bölge çalışması Kırıkkale Tüpraş Rafinerisinde halihazırda yürütülmektedir. 4. faaliyet kapsamında yurtdışı çalışma ziyaretleri kapsamında toplamda 4 adet olan ziyaretlerden 1 tanesi İtalya'da gerçekleştirilmiştir. 5. faaliyet olan Seveso Bildirim Sisteminin yeniden yapılandırılması ve 6. faaliyet olan halkın bilgilendirmesi çalışmalarında halihazırda devam etmektedir. 146.679,72-TL tutarındaki ulusal katkı payının 19 Haziran 2013 tarihinde Ulusal Fon Hesabına aktarılmak üzere çalışmaları tamamlanmıştır.
AB KATKISI			7.236	5.608	1.628	0	% 0,0	
2014K100070	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	308		139	135	% 97,1	Söz konusu proje 12.05.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlamıştır. 24.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tüm ilgili kamu kurumları, üniversite, odalar ve STK yetkililerinin katılımıyla proje Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantıda proje faaliyetlerine yönelik sunumlar yapılmış ve projeden beklenen sonuçlar ile planlanan faaliyetlere dair bilgi verilmiştir. Proje kapsamında SÇD uygulanacak 4 pilot sektöre ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
AB KATKISI			2.774		1.041	0	% 0,0	
<b>TOPLAM</b>			<b>44.814</b>	<b>4.521</b>	<b>25.295</b>	<b>2.788</b>	<b>% 11,0</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>10.010</b>	<b>5.608</b>	<b>2.669</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Şehirleşme Sektörü)	2010-2015	163.000	64.000	5.884	5.884	% 100,0	331 adet iksa ve 448 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Dış cephe, döşeme duvar tavan kaplama, makine ve elektrik tesisatı imalatları devam ediyor. Hakediş ödemelerine göre gerçekleşme oranı yaklaşık %40,12, fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık %56'dır.
2014K090080	Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (*)	2014-2014	17.500		17.500	0	% 0,0	Ödeneğin 6.170.000 TL'si Nisan ayı içerisinde Maliye Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğe aktarılmıştır. 30.06.2014 tarihinde 25 Kalem Muhtelif Büro Mefruşat Alımı ihalesi DMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ödeneğin kalan kısımlarının aktarılmasını müteakip gerekli çalışmalar sürdürülebilecektir.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	1.130	0	1.130	25	% 2,2	Yapım işleri ile ilgili proje üretimi ve kontrollüğünde uluslararası norm ve standartlara uygun olarak CAD esaslarının oluşturulması ve iş süreçleri ve kontrol mekanizmasının analizi ve dokümantasyonu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce müşavirlik hizmeti alınması için gerekli teknik şartname çalışmaları sürdürülmektedir.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2014	3.500	110	3.390	46	% 1,4	Yapı Denetim Sistemi Uygulama, Bakım, Destek, İyileştirme, Bakanlık Merkezine Taşınması ve Merkez Bilgi İşlem Altyapısına Entegrasyonu İşi ihalesi 14.02.2014 tarihinde yapılmış olup, 124500 TL+KDV bedelli sözleşme 17.02.2014 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425000 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır.
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	2.990	360	1.630	33	% 2,0	YDS-2 Sistemi'nin kabulünün yapılması halinde, kabule müteakip söz konusu sistemin kullanımına ilişkin İl Müdürlüklerimize eğitim verilmesi düşünülmektedir.
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2015	1.300	353	350	46	% 13,1	Yatırım Takip Sistemi (YTS) yazılımının geliştirilmesi amacıyla CBS Genel Müdürlüğüne ihaleye çıkılması için yazı yazıldı. Uygun görüş beklenmektedir. Proje kapsamında donanım harcamaları yapılmıştır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2016	5.745	1.805	1.500	37	% 2,5	Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak bilinmemekle beraber şu ana kadar ödenek problemi yaşanmamıştır.
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2014	23.334	8.453	14.881	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göçebeleri-Dicle-Batman Barajı İskanı	2013-2014	5.056	0	5.056	0	% 0,0	Yaklaşık Maliyet çalışmaları devam etmektedir. Akabinde ihaleye çıkılacaktır.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2014	9.970	3.389	6.581	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2014 yılında yapılması planlanmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2014	8.308	5.064	3.244	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2014 yılında yapılması planlanmaktadır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070020	Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2014	33.030	16.520	16.510	3.999	% 24,2	Devam etmektedir. Konutlar bu yıl bitirilecek.
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2014	106.691	0	3.691	0	% 0,0	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2014	3.690		3.690	0	% 0,0	Manisa-Gördes'te Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin iskanı için yapımı planlanmaktadır. İşin İmar planı yapılmıştır. Yerin tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden istenmiş olup tahsisi 26.11.2013 tarihinde alınmıştır. İşin Projesi Yöresel şartlara göre revize edilmektedir. 2014 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
	Anamur-Alaköprü Barajı İskanı	2013-2014	103.001		1	0	% 0,0	Yapımı devam etmektedir. Ağustos ayında bitirilecektir.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2017	189.900	10.559	8.068	0	% 0,0	
	Tahtalı Barajı İskanı	2009-2014	13.209	10.559	2.650	0	% 0,0	İş tasviye edildi. İşin tamamlanmasını müteakip haksahiplerine dağıtım yapılacak. Kalan işlerin tamamlanması için ödenek revizesi yapılarak ihale talimatı verilmiştir.
	Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı	2009-2017	88.346	0	5.417	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2017	88.345	0	1	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskan isteyen aile çıkmamıştır.



**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2016	10.000	2.700	5.000	460	% 9,2	
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	5.230	2.120	2.000	209	% 10,5	Kırsal alanlarda yöresel doku ve mimari özelliklere uygun yapılaşma çalışmaları kapsamında; Marmara Bölgesi (Edirne, Bursa ve Balıkesir) için 36 tip proje elde edilmiştir. Şanlıurfa ve Erzurum İlleri için (12 şer tip) projelendirme çalışmaları sürdürülmektedir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	3.180	1.820	1.250	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama yapılmaktadır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	3.180	500	550	164	% 29,8	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1995K070030 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1995-2014	136.580	133.580	3.000	246	% 8,2	İşler devam etmektedir.
2011K070040 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	108.650	32.982	21.175	3.090	% 14,6	İşler devam etmektedir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	5.200	2.700	100	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

<b>TOPLAM</b>	<b>569.710</b>	<b>109.300</b>	<b>83.334</b>	<b>10.903</b>	<b>% 13,1</b>
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

<b>TOPLAM-08</b>	<b>250.430</b>	<b>169.262</b>	<b>24.275</b>	<b>3.336</b>	<b>% 13,7</b>
------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------

(\*\*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

<b>Genel TOPLAM</b>	<b>820.140</b>	<b>278.562</b>	<b>107.609</b>	<b>14.239</b>	<b>% 13,2</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

(\*) Bu ödenek, 2010K091030 numaralı "Bakanlık Hizmet Binası" projesinin tamamlanmasından sonra kullanılabilir.

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014E060030	Çamlıca Özel Proje Alanında Altyapı Tesisleri Etüd ve Proje İşlerinin Yapılması Projesi (2*) (Kentçi Ulaşım Sektörü)	2014-2015	2.250		10	0	% 0,0	İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler devam ediyor.
2013K060110	Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2013-2016	5.054		1.500	0	% 0,0	Protokol imzalanması ile ödenek Çamlıca Özel Proje Alanında Altyapı Tesisleri Etüd ve Proje İşlerinin yapılması Projesine Aktarılacaktır.
2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2012-2015	2.530	1.220	580	64	% 11,0	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görevli personel için Zonguldak, Afyon ve Antalya İllerinde olmak üzere 3 eğitim düzenlenmiştir.
2013K080030	Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2014	1.211	341	870	0	% 0,0	
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2014	3.000	900	2.100	0	% 0,0	TÜBİTAK-MAM ile imzalanan "İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü" çerçevesinde halen 3. Aşama çalışmalar devam etmektedir. Protokol kapsamında 1. Aşama tamamlanmış ve bu aşama için yükleniciye 1.109.837,20 TL ödeme gerçekleştirilmiş olup 2. Aşama işlere ilişkin Kısmi Kabul tamamlanmış ve 749890,00 TL ödeme için ilgili belgeler Yükleniciden beklenmektedir.

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K080050	Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2015	3.150	150	1.500	0	% 0,0	Üniversiteler ile protokol çalışması yapılacaktır.
2013K140090	Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması (Afetler Sektörü)	2013-2014	5.092	2.242	2.850	0	% 0,0	Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protololu" kapsamında Türkiye genelinde kentsel dönüşüm için belediyeler bazında deprem riski önceliklendirilmesinin yapılmasına ilişkin Kahramanmaraş, Burdur ve Muş illerinde örnek kentsel deprem riski belirlenme çalışmaları yapılmıştır. 2. aşama ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir.
<b>TOPLAM</b>			<b>22.287</b>	<b>4.853</b>	<b>9.410</b>	<b>64</b>	<b>% 0,7</b>	

(2\*) Proje ödeneği döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı (Enerji Sektörü)	2012-2016	4.033	346	952	355	% 37,3	****Hâlihazırda kullanılmakta olan BEP-TR Yazılım Sisteminin Bakım ve Onarımı İşinin hizmet alımı ihalesi 08.04.2014 yapılmış olup, ihalede en düşük teklifi veren Mimar Bilgi İletişim San.Tic.Ltd.Şti. ile kdv hariç 65.250-TL bedel üzerinden 25.04.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve aynı tarih itibarıyla işe başlanılmıştır. ***Tubitak tarafından yürütülmekte olan "BEP-TR Yazılım Metodolojisinin Geliştirilmesi Projesi" işinin kabulü yapılmış ve KDV dahil 354,000-TL tutarındaki ödemesi gerçekleştirilmiştir. ***Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yeni sürümü olacak olan BEP-TR II sistemini gerçekleştirilmek üzere yazılım için hizmet alımı ihale süreci başlatılmıştır.
2013D100010	Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması (Enerji Sektörü)	2013-2014	200	100	100	6	% 6,0	***Çevre Dostu Yeşil Bina Çalıştayı Sn. Müsteşarımız başkanlığında 19.06.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu konuda gelişme kaydedilecektir.
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2015	2.781	693	1.448	4	% 0,3	***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsü yerleşkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için hazırlanan proje dosyası, Makam Oluru alınmak suretiyle gereği yapılmak üzere Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup, 03.06.2014 günü ihalesi yapılmıştır.
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2015	705	200	225	57	% 25,3	***Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-kooperatif) yazılımının bakım ve onarım işinin hizmet alımı ihalesi 21.05.2014 yapılmış olup, ihalede en düşük teklifi veren Mimar Bilgi İletişim. Ltd. ile kdv hariç 53.750-TL bedel üzerinden 03.06.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmıştır. ***e-kooperatif yazılımının 2013 yılı bakım ve onarım işinin kabulü neticelendirilerek, kdv dahil 56,876-tl tutarında kesin hak ediş ödemesi yapılmıştır.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010060	Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	3.800	3.795	5	0	% 0,0	
2013K010700	Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün Enerji Verimli Hale Getirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2014	2.750	900	1.850	0	% 0,0	***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsündeki bulunan laboratuvar binalarının enerji verimli hale getirilmesi için hazırlanan proje dosyası, Makam Oluru alınmak suretiyle gereği yapılmak üzere Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup, 03.06.2014 günü ihalesi yapılmıştır.
2010K010080	İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	6.725	3.257	800	3	% 0,4	***Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermekte olan yapı malzemesi laboratuvarlarının deney kapasitesini ve etkinliğini arttırmak üzere ihtiyaç duyulan alet-edevat-cihaz-ekipman-donanım vb. malzemelerin alımı yapılacaktır. Bu kapsamda İzmir İl Müdürlüğü ihtiyacı olan Servo kontrollü beton test cihazı alımı ihale süreci devam etmektedir. 81 ilin ihtiyaçlarının tarafımıza bildirmesi beklenmekte olup, Temmuz ayı başında ihale süreci başlatılacaktır.
2010K010050	Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	6.225	3.667	958	66	% 6,9	***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsünde hizmet vermekte olan Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarının deney kapasitesini ve etkinliğini arttırmak üzere ihtiyaç duyulan alet-edevat-cihaz-ekipman-donanım vb. malzemelerin alımı yapılacaktır. DMO vasıtasıyla 59.472 TL lik cihaz alınmış olup; ayrıca Beton test cihazı universal çelik çekme cihazı alımı için de ihale süreci devam etmektedir.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	10.908	8.064	1.200	159	% 13,3	***Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS) yazılımının bakım ve onarımı işinin hizmet alımı ihalesi 16.05.2014 yapılmış olup, ihalede en düşük teklifi veren İnter-san Bilg.Yaz.Ltd. ile kdv hariç 77.600-TL bedel üzerinden 03.06.2014te sözleşme imzalanmış ve işe başlanmıştır. ***Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet arazi vitesli çift kabin pick-up alınacak ve ihtiyaç duyulan İL Müdürlüklerine dağıtılacaktır.. (Başbakanlık izni 26.06.2014 tarihi itibarıyla çıkmış olup, en kısa sürede ihale süreci başlatılacaktır.) ***15/18.Nisan.2014 tarihleri arasında PGD temel seviye eğitimi gerçekleştirilmiştir. ***Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmaktadır. ***06-10/Mayıs/2014 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Yapı Fuarına katılım sağlanmıştır.
2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	863	450	100	11	% 11,0	
2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	486	86	100	10	% 10,0	
2013K010080	Yapı Mütcahhtlığı Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2015	1.260	200	400	3	% 0,8	***Yapı Mütcahhtlığı Bilişim Sistemi (YAMBİS) Yazılımının Bakım ve Onarım İşinin hizmet alımı ihalesi 09.06.2014 Pazartesi günü yapılmış, iş 38.150-TL bedel ile İntersan Bilg.Yaz.Ltd. üzerinde kalmış olup, tebligatlar yapılmış ve sözleşme akdi için firma beklenmektedir. ***06/08.Kasım.2014 tarihleri arasında YAMBİS uygulamalarına yönelik eğitim yapılacaktır. ***31.05.2014 tarihinde İmar Yönetmeliği konulu Çalıştay yapılmıştır.
		<b>TOPLAM</b>	<b>40.736</b>	<b>21.758</b>	<b>8.138</b>	<b>674</b>	<b>% 8,3</b>	

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090100	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.700	200	1.500	0	% 0,0	Proje kapsamında merkez teşkilatı birimlerinde yapılan varlık envanteri çalışması tamamlanmış olup, 2014 Temmuz sonu itibarı ile politika ve prosedürler oluşturulup yayınlanacaktır. Varlık Envanteri çalışması sonrası çıkan risk analizi ve zaafiyet test veri sonuçlarına göre teknik şartname çalışmaları devam etmekte olup 2014 Ağustos ayı içerisinde ihaleye çıkılması planlanmamaktadır.
2014K090120	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.950		4.900	213	% 4,3	2013 yılı Bakım ve Onarım İhalesinin son dönemi için 52.590,54 TL ödenmiştir.2014 yılı Bakım ve Onarım İhalesi 587.150,30 TL(KDV dahil) ye yapılmıştır. Proje kapsamında merkez ve taşra birimlerinin yazılım, lisans ve donanım altyapısı gereksinimleri belirlenmiş olup teknik şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2014K090130	Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.000		1.000	0	% 0,0	Satılma süreci devam etmektedir.
2014K090150	Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı Güncelleştirme ve Optimizasyon Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.900		2.600	0	% 0,0	Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı donanım ihtiyaçları 2013 yılı Aralık ayı itibarı ile karşılanmış olup, Bakanlık yeni veri merkezinin kurulmasını müteakip ilave donanım ve yazılım ihtiyaçları için fizibilite çalışmaları başlamıştır. İş sürekliliği merkezi ve Bakanlık veri merkezinin yeni binaya taşınması işleri kapsamında hizmet alımı teknik şartnameleri hazırlanmaktadır.



**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090170	1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	10.000		500	0	% 0,0	DASK tarafından ihalesi yapılan ortofoto projesinin sözleşmesinin imzalanmasını müteakip şartnameleri hazırlanacaktır.
2014K090300	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi	2014-2015	3.400		1.500	0	% 0,0	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2014K090310	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi	2014-2015	3.000		1.000	0	% 0,0	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2014K090320	Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Projesi	2014-2015	3.000		2.000	0	% 0,0	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090160	Fiziksel ve Dijital Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Uygulaması (*) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	2.500		2.500	0	% 0,0	Projenin revizyonu için Strateji Geliştirme Başkanlığına yazılan yazının cevabı beklenmektedir.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.072	0	410	0	% 0,0	Merkezi Finans İhale Biriminin (CFCU) ihaleyi yapması beklenmektedir.
AB KATKISI			9.648	0	4.824	0	% 0,0	
<b>TOPLAM</b>			<b>36.522</b>	<b>200</b>	<b>17.910</b>	<b>213</b>	<b>% 1,2</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>9.648</b>	<b>0</b>	<b>4.824</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

(\*) Proje ödeneği döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000150	Çevre Koruma-Planlama- Düzenleme-Altyapı-Uygulama (Turizm Sektörü)	2014-2014	10.500		10.500	0	% 0,0	6 adet projeye ilişkin protokol toplam 7.850.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2014F000300	Korunan Alanlarda Çevre-Cephe- Yol-Iskele-Kıyı Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2014-2016	4.000		500	0	% 0,0	Proje için yapılan ön hazırlıklar devam etmektedir.
2014K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçme Suyu Sektörü)	2014-2014	3.769		3.769	0	% 0,0	3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 1.700.000,00 TL bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2014K060400	Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2014-2014	6.620		6.620	0	% 0,0	Proje için yapılan ön hazırlıklar devam etmektedir.
2014K080010	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2014-2014	1.000		1.000	0	% 0,0	Proje için yapılan ön hazırlıklar devam etmektedir.
1992K090010	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	1992-2014	162	152	10	0	% 0,0	Çamlı-Marmaris-MUĞLA İmar Planı onaylanmış olup ödemesi 2014 yılında gerçekleştirilecektir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090090	Hali hazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.250	500	750	0	% 0,0	1 adet projenin ihalesi yapılmış diğer projeler için ise çalışmalar devam etmektedir.
2014K090020	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	355		355	0	% 0,0	Proje için yapılan ön hazırlıklar devam etmektedir.
2014K090030	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	800		800	0	% 0,0	4 adet projeye ilişkin protokol 350.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2014K090040	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	600		600	0	% 0,0	1 adet projeye ilişkin protokol 350.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2010K100130	Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti-II (Çevre Sektörü)	2010-2014	1.042	900	142	0	% 0,0	Sözleşmesi 05.10.2012 tarihinde 470.820 TL bedelle imzalanan proje 2014 yılında tamamlanacaktır.
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	4.858	1.308	1.850	0	% 0,0	Proje için yapılan ön hazırlıklar devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2015	1.862	1.112	435	0	% 0,0	Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
	Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	590	495	55	0	% 0,0	Proje 52.510 TL'ye ihale edilmiştir. Ekim 2014'de tamamlanacaktır.
	Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	190	95	55	0	% 0,0	Proje 52.510 TL'ye ihale edilmiştir. Ekim 2014'de tamamlanacaktır.
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	240	145	55	0	% 0,0	Proje 53.100 TL'ye ihale edilmiştir. Ekim 2014'de tamamlanacaktır.
	Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	233	143	55	0	% 0,0	Proje 53.690 TL'ye ihale edilmiştir. Ekim 2014'de tamamlanacaktır.
	Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	233	143	55	0	% 0,0	Proje 53.100 TL'ye ihale edilmiştir. Ekim 2014'de tamamlanacaktır.
	Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2014-2014	55		55	0	% 0,0	Proje 52.510 TL'ye ihale edilmiştir. Ekim 2014'de tamamlanacaktır.
	Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi	2013-2014	136	91	45	0	% 0,0	Sözleşmesi 2013 yılında 134.520 TL bedelle imzalanan proje Kasım 2014 yılında tamamlanacaktır.
	Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi	2014-2015	185		60	0	% 0,0	Proje ihale aşamasındadır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K100120	Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (GEF) (Çevre Sektörü)	2009-2014	638	588	50	49	% 98,0	Proje tamamlanmıştır.
GEF Katkısı			3.103	2.837	266	266	% 100,0	
		<b>TOPLAM</b>	<b>37.456</b>	<b>4.560</b>	<b>27.381</b>	<b>49</b>	<b>% 0,2</b>	
		<b>GEF KATKISI</b>	<b>3.103</b>	<b>2.837</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>% 100,0</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2015	3.217	1.590	1.127	1.100	% 97,6	
AB KATKISI			18.231	9.017	6.381	0	% 0,0	
2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2009-2014	2.131	1.830	301	286	% 95,0	
AB KATKISI			14.753	13.061	1.692	0	% 0,0	
2009K100090	Çevre ve Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) Çevre Sektörü)	2009-2016	3.046	1.580	892	563	% 63,1	
AB KATKISI			17.258	8.558	5.054	0	% 0,0	
<b>TOPLAM</b>			<b>8.394</b>	<b>5.000</b>	<b>2.320</b>	<b>1.949</b>	<b>% 84,0</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>50.242</b>	<b>30.636</b>	<b>13.127</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100020	Çevre Konusunda Bilinçlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2014	600		600	0	% 0,0	MEB ile yapılacak protokol çerçevesinde basılı materyallerin tasarım ve basım işleri gerçekleştirilecektir.
2014K090070	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	1.000		1.000	116	% 11,6	İmar ,Kıyı,yapı ve Çevre uygulamaları Bölgesel seminerleri (Mardin,Erzurum,Çorum,İzmir,Antalya) 747.320,20 TL (KDV dahil) bedelle İhale edilmiştir. İlk ödemesi yapılmıştır.
<b>TOPLAM</b>			<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>116</b>	<b>% 7,3</b>	



**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2008K091080	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2008-2015	47.975	23.089	10.550	61	% 0,6	
	Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2013-2014	361	264	50	61	% 122,0	2013 yılında yapımına başlanan ek hizmet binası inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2015	5.245	58	3.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 16.12.2013 tarihinde <b>KDV dahil 5.244.443,92 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yüklenici firmaya arsa teslimi yapılmış olmasına rağmen ilgili Belediyesince gerekli yapı ruhsatı verilmediği için iş henüz başlatılamamıştır.
	Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.557	0	3.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 30.10.2013 tarihinde <b>KDV dahil 3.556.520,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir.
	Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	6.883	6	1.500	0	% 0,0	İhalesi 27.05.2014 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. <a href="#">İhale komisyonunun değerlendirmesi devam ediyor.</a>
	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.516	0	1.500	0	% 0,0	İhalesi 28.05.2014 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. <a href="#">İhale komisyonunun değerlendirmesi devam ediyor.</a>
	Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	5.693	0	1.500	0	% 0,0	İhalesi 04.06.2014 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. <a href="#">İhale komisyonunun değerlendirmesi devam ediyor.</a>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090100	Hizmet Binaları İnşaatı-2 (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	24.581	0	14.950	0	% 0,0	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.923		2.500	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde <b>KDV dahil 2.922.860,00 TL'ye</b> ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	7.749		3.950	0	% 0,0	2014 yılında yatırım programına alınmış olup ihale hazırlıkları devam etmektedir.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	4.764		2.500	0	% 0,0	İhalesi 04.07.2014 tarihinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	9.145		6.000	0	% 0,0	İhalesi 26.05.2014 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. <a href="#">İhale komisyonunun değerlendirmesi devam ediyor.</a>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	5.652	0	5.652	743	% 13,1	
	Taşıt Alımı	2014-2014	552		552	0	% 0,0	Taşıt alımına yönelik 24.02.2014 tarihli ve 2014/6031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.06.2014 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. <b>Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 7 adet T8 (Pick-up) tipi aracın alımına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.</b>
	Hizmet Binası Onarımı	2014-2014	3.250		3.250	229	% 7,0	Hizmet binası onarımı için, <b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 52 adet ihale talimatı gönderilmiştir.</b> <b><u>Ödeneğin tamamı talimata bağlanmıştır.</u></b>
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2014-2014	1.850		1.850	514	% 27,8	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, <b>43 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ödenek gönderilmiştir.</b>
2014G000370	Lojman Onarımı (Konut Sektörü)	2014-2014	5.625		5.625	200	% 3,6	Lojman binası onarımı için, <b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 42 adet ihale talimatı gönderilmiştir.</b> <b><u>Ödeneğin tamamı talimata bağlanmıştır.</u></b>
<b>TOPLAM</b>			<b>83.833</b>	<b>23.089</b>	<b>36.777</b>	<b>1.004</b>	<b>% 2,7</b>	

"Muhtelif İşler" ve "Lojman Onarımı" projeleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı projeleri ile ortak projedir.

(3\*) Proje maliyetinin 4.000.000 TL si döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır. Bu ödenek Diyarbakır Hizmet Binası için 2014 yılında kullanılacaktır. Toplama dahil edilmiştir.

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI****2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 25.06.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	350	0	350	141	% 40,3	
	Hizmet Binası Onarımı	2014-2014	250		250	141	% 56,4	Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Balgat ek hizmet binası giriş katı onarımı yaptırılmıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2014-2014	100		100	0	% 0,0	
2014G000370	Lojman Onarımı (Konut Sektörü)	2014-2014	300		300	41	% 13,7	Eryaman Aktürk Bloklarındaki Lojman Onarımı ve Çukurca 2. Devlet Mah. 10 nolu daire tadilatı yaptırılmıştır.
<b>TOPLAM</b>			<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>182</b>	<b>% 28,0</b>	

"Muhtelif İşler" ve "Lojman Onarımı" projeleri İl Müdürlükleri projeleri ile ortak projedir.

**01 Ocak 2014 – 25 Haziran 2014  
Dönemi  
Bütçe Gerçekleşme Raporu Sunumunu  
Arz Ederim.**

**Strateji Geliştirme Başkanlığı**
