

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 – 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkan V.

20 Ekim 2014

BAKANLIK 2014 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ İLE 2015 YILI BÜTÇE VİZESİ KARŞILAŞTIRMASI

KOD	AÇIKLAMA	2014 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	2015 Yılı Bütçesi Vize Rakamları	2015 Vize 2014 Bütçe FARKI	2015 Yılı Bütçesinin Yüzdelerik Dağılımı
01	PERSONEL GİDERLERİ	571.825.000	601.346.000	29.521.000	% 44,3
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.871.000	100.562.000	5.691.000	% 7,4
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.628.000	71.118.000	1.490.000	% 5,2
05	CARİ TRANSFERLER	196.795.000	199.522.000	2.727.000	% 14,7
06	SERMAYE GİDERLERİ	232.250.000	218.100.000	-14.150.000	% 16,0
	Bakanlık Yatırım Programı	216.250.000	201.300.000	-14.950.000	% 14,8
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.000.000	16.800.000	800.000	% 1,2
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0	0	0	% 0,0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	139.772.000	142.537.000	2.765.000	% 10,5
	Bakanlık Yatırım Programı	39.397.000	36.140.000	-3.257.000	% 2,7
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	100.375.000	106.397.000	6.022.000	% 7,8
08	BORÇ VERME	24.275.000	25.731.000	1.456.000	% 1,9
GENEL TOPLAM		1.329.416.000	1.358.916.000	29.500.000	% 100,0

BAKANLIK 2014 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ İLE 2015 YILI BÜTÇE VİZESİ KARŞILAŞTIRMASI BİRİMLER

Harcama Birimi	2014 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	2015 Yılı Bütçesi Vize Rakamları	2015 Yılı Bütçesinin Yüzdeleri Dağılımı
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	60.405.100	30.186.000	% 2,2
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	182.179.400	177.148.000	% 13,0
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	29.510.600	35.467.000	% 2,6
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	151.028.700	139.644.000	% 10,3
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	157.293.900	159.831.000	% 11,8
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	17.801.100	17.374.000	% 1,3
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	21.870.900	48.467.000	% 3,6
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	36.069.500	46.569.000	% 3,4
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	7.838.700	8.160.000	% 0,6
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	3.808.500	4.124.000	% 0,3
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.064.100	1.143.000	% 0,1
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.150.800	3.400.000	% 0,3
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.295.500	10.555.000	% 0,8
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.019.900	4.774.000	% 0,4
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.957.400	3.595.000	% 0,3
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.398.800	3.571.000	% 0,3
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	47.934.400	30.353.000	% 2,2
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	619.200	711.000	% 0,1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	24.184.100	25.921.000	% 1,9
İL MÜDÜRLÜKLERİ	562.985.400	607.923.000	% 44,7
TOPLAM	1.329.416.000	1.358.916.000	% 100,0

TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

- 2015 Bütçesi,
- 2013 Kesin Hesabı,
- 2013 İdare Faaliyet Raporu,
- 2013 Sayıştay Denetim Raporu,
- 2015 Performans Programı,

Plan ve Bütçe Komisyonu, 25 üyesi iktidar grubundan, 15 üyesi ise muhalefet üyelerinden olmak üzere 40 üyeden müteşekkildir.



2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU



- Sayıştay Raporunda genel bütçe hesaplarına ait 4 bulguya, kentsel dönüşüm hesabına ait 3 bulguya yer verilmiştir.
- Harcamalara ait muhtelif sorgular ise ilgili görevlilere tek tek işlem bazında gönderilmektedir.

GENEL BÜTÇE BULGULARI

- İPA kaynaklarının muhasebe hesaplarında gösterilmemesi ve bu kaynaklardan alınan demirbaşların kayıtlarının tutulmaması.
- Kamu ihale Kanunu çerçevesinde
 - ❖ Gecikme cezalarının hatalı hesaplanması,
 - ❖ Süre uzatımlarının verilmesinde hatalar yapıldığı,
 - ❖ Verilen iş artışlarının asıl işle ilgili olmaması,

GENEL BÜTÇE BULGULARI

- Çevre Kanunu gereğince verilen idari para cezalarının bir sistem dahilinde takip edilmemesi ve kesilen cezaların tahsilat oranının düşüklüğü.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖZEL HESABI

- Dönüşüm gelirleri arasında sayılan İller Bankası Karınının % 50 sinin özel hesaba aktarılmaması,
- Belediyelerin, Bakanlığımızca aktarılan kaynakları ayrı bir muhasebe sisteminde tutmayıp, diğer kaynaklarının içine alması,
- Belediyelerin yıllık yatırım bütçelerinin %5 ini ve harç gelirlerinin %50 sinin dönüşüm çalışmalarına ayrılmadığı,


01 Ocak 2014 – 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

BAKANLIK 01 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	30 Eylül 2014 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	571.825.000	571.825.000	436.027.705	% 76,3
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.871.000	94.871.000	72.045.132	% 75,9
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.628.000	84.440.300	47.208.514	% 55,9
05	CARİ TRANSFERLER	196.795.000	320.932.440	245.120.009	% 76,4
06	SERMAYE GİDERLERİ	232.250.000	923.420.171	396.838.819	% 43,0
	Bakanlık Yatırım Programı	216.250.000	188.826.000	44.659.096	% 23,7
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.000.000	16.000.000	2.150.000	% 13,4
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0	718.594.171	350.029.724	% 48,7
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	139.772.000	140.267.000	50.743.506	% 36,2
	Bakanlık Yatırım Programı	39.397.000	39.892.000	3.930.468	% 9,9
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	100.375.000	100.375.000	46.813.037	% 46,6
08	BORÇ VERME	24.275.000	51.204.000	21.753.090	% 42,5
GENEL TOPLAM		1.329.416.000	2.186.959.911	1.269.736.775	% 58,1

(* Veriler 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

BAKANLIK 01 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

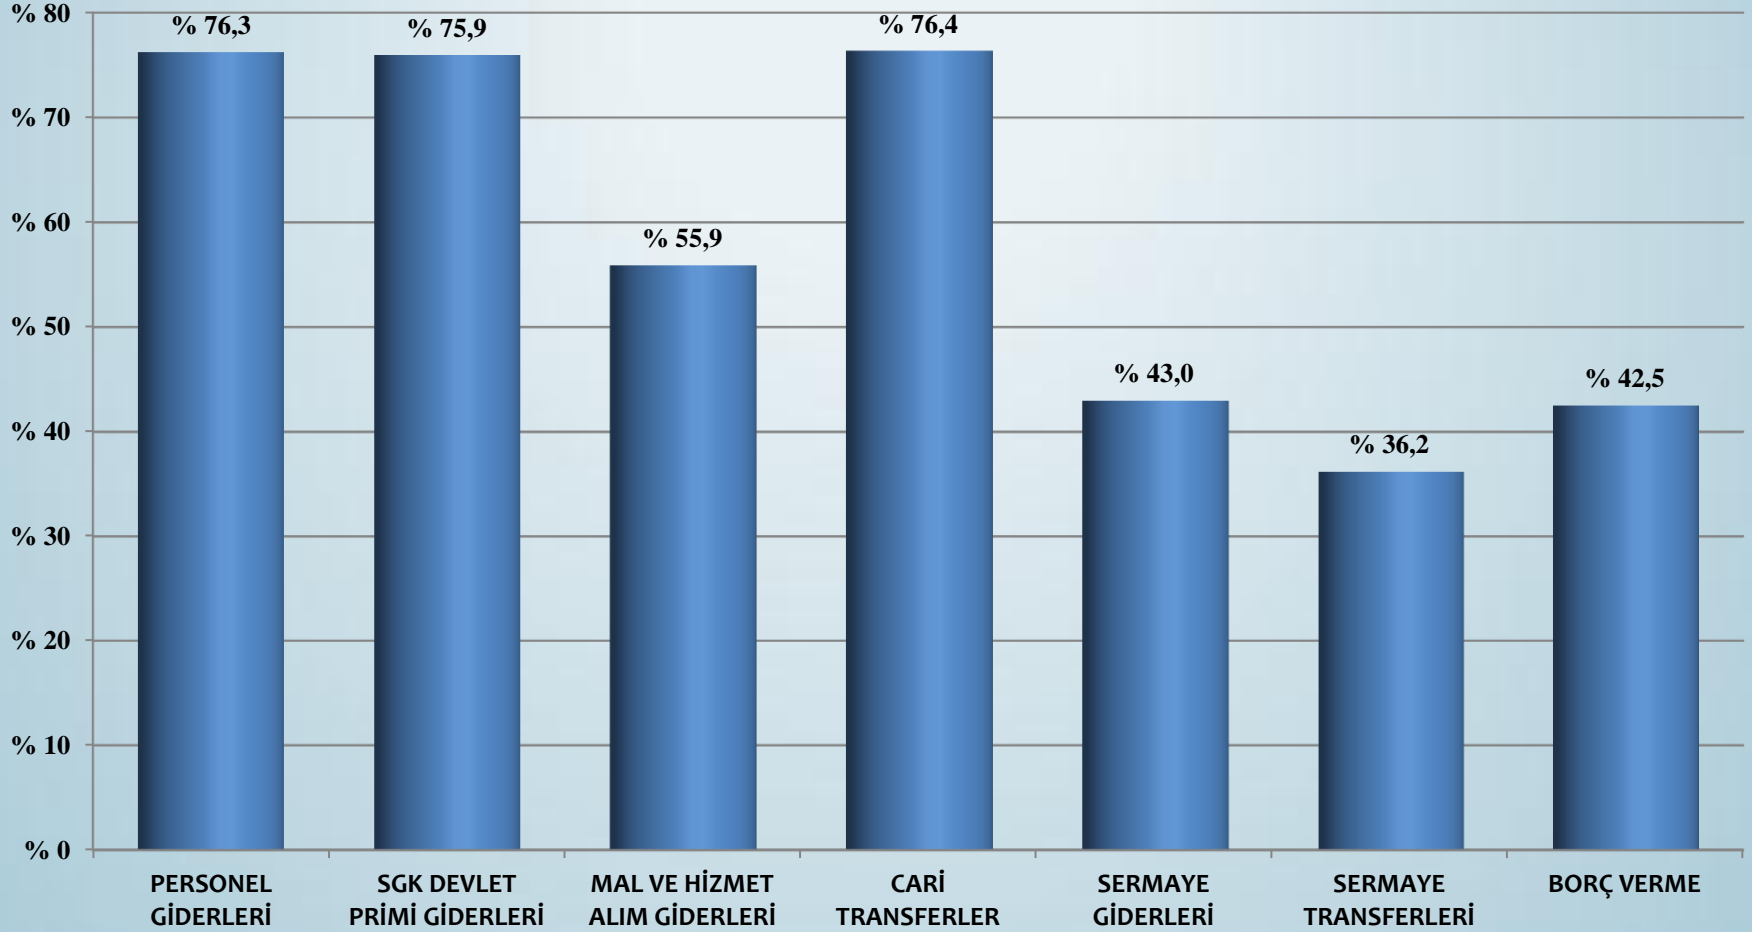


BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEK	30 Eylül 2014 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	60.405.100	58.194.406	24.815.995	% 42,6
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	182.179.400	170.621.366	82.103.085	% 48,1
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	29.510.600	41.554.474	15.070.606	% 36,3
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	151.028.700	259.010.002	125.324.454	% 48,4
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	157.293.900	285.876.900	229.626.766	% 80,3
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	17.801.100	17.801.100	7.931.931	% 44,6
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	21.870.900	21.920.900	6.227.502	% 28,4
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	36.069.500	36.200.500	7.928.582	% 21,9
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	7.838.700	7.713.700	5.313.283	% 68,9
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	3.808.500	3.784.500	2.738.886	% 72,4
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.064.100	1.064.100	843.270	% 79,2
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.150.800	3.304.800	2.238.231	% 67,7
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10.295.500	10.295.500	8.596.883	% 83,5
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.019.900	4.019.900	3.760.165	% 93,5
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.957.400	4.072.000	1.853.798	% 45,5
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3.398.800	3.398.800	2.158.887	% 63,5
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	47.934.400	31.797.400	21.907.908	% 68,9
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	619.200	619.200	449.145	% 72,5
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	24.184.100	24.194.800	16.496.347	% 68,2
İL MÜDÜRLÜKLERİ	562.985.400	1.201.515.563	704.351.050	% 58,6
TOPLAM	1.329.416.000	2.186.959.911	1.269.736.775	% 58,1

(* Veriler 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

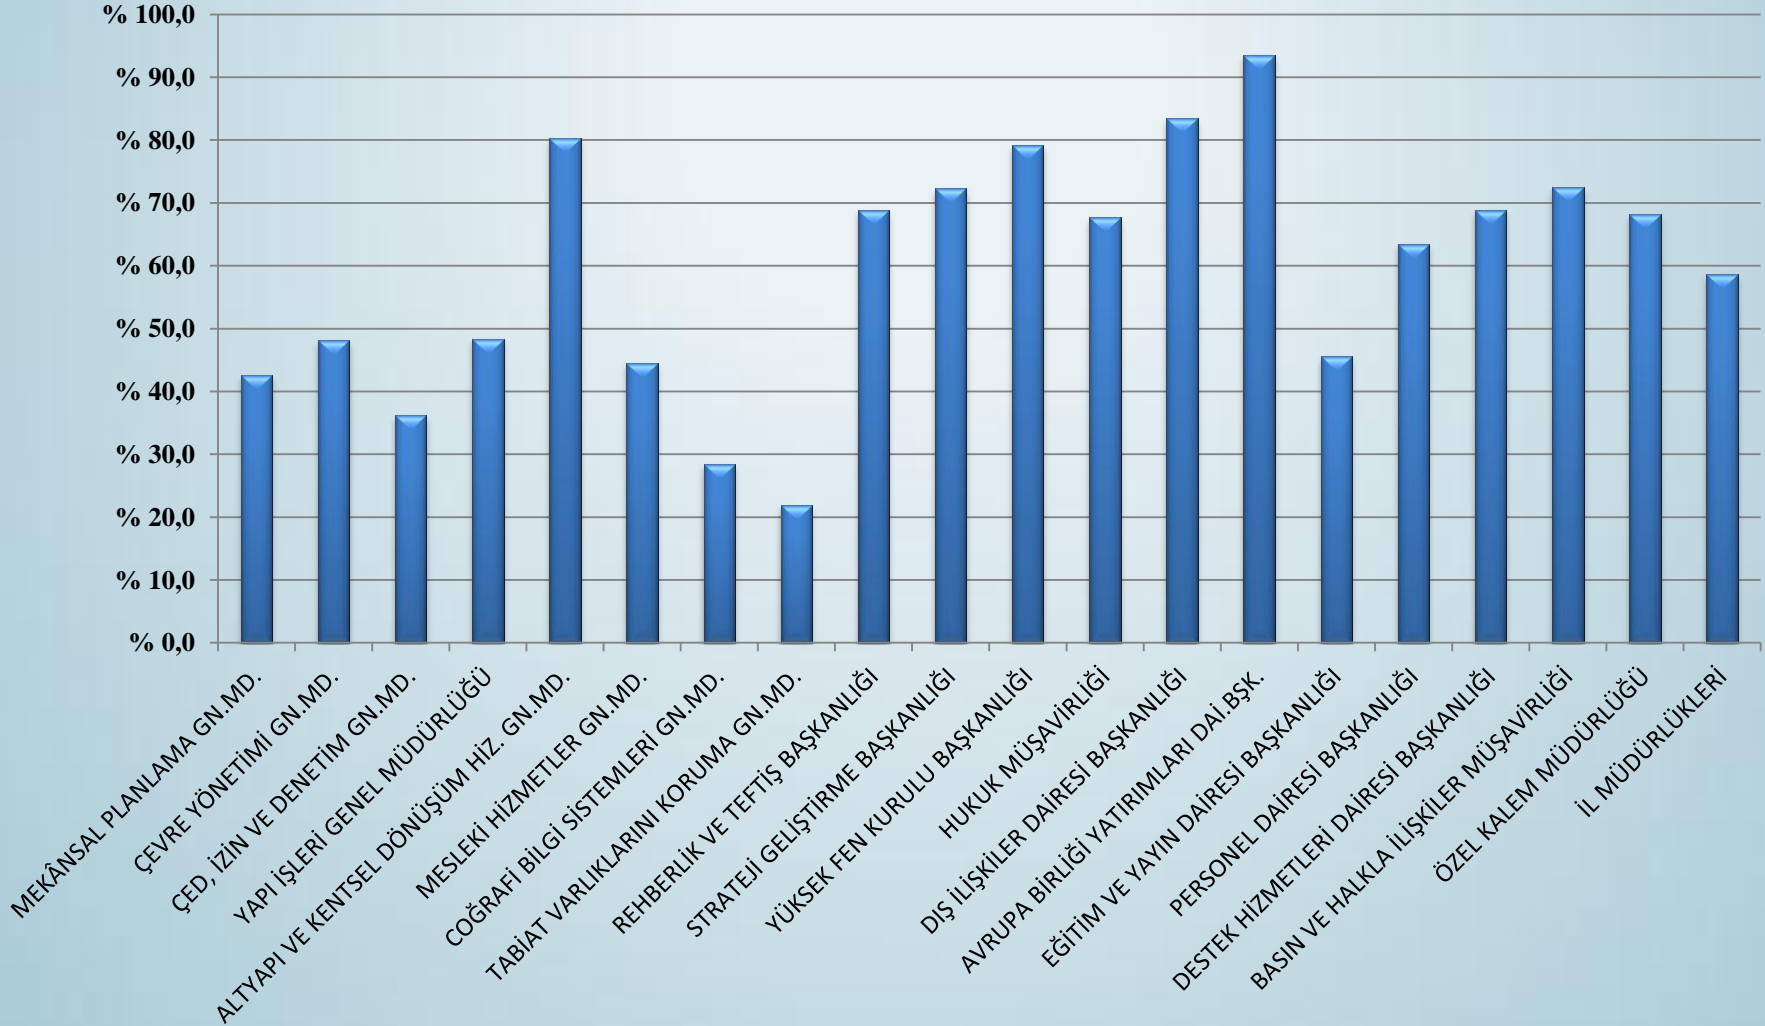


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	30 Eylül 2014		Gerçekleşme (%)
			REVİZE ÖDENEĞİ	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	7	109.386.000	42.856.000	13.135.007	% 30,6
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	18	17.589.000	8.406.000	2.571.416	% 30,6
ÇED, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	10	44.894.000	25.375.000	3.985.555	% 15,7
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	19	859.045.000	146.014.000	37.805.086	% 25,9
Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	7	22.287.000	9.410.000	828.857	% 8,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	12	40.736.000	8.138.000	743.824	% 9,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	10	36.522.000	17.910.000	1.153.852	% 6,4
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	14	37.456.000	27.381.000	849.780	% 3,1
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	8.394.000	2.320.000	1.948.680	% 84,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	1.600.000	1.600.000	469.571	% 29,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri (DETAY)	5	88.233.000	36.777.000	6.598.052	% 17,9
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	650.000	650.000	252.972	% 38,9
GENEL TOPLAM	106	1.266.792.000	326.837.000	70.342.654	% 21,5

(* Veriler 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

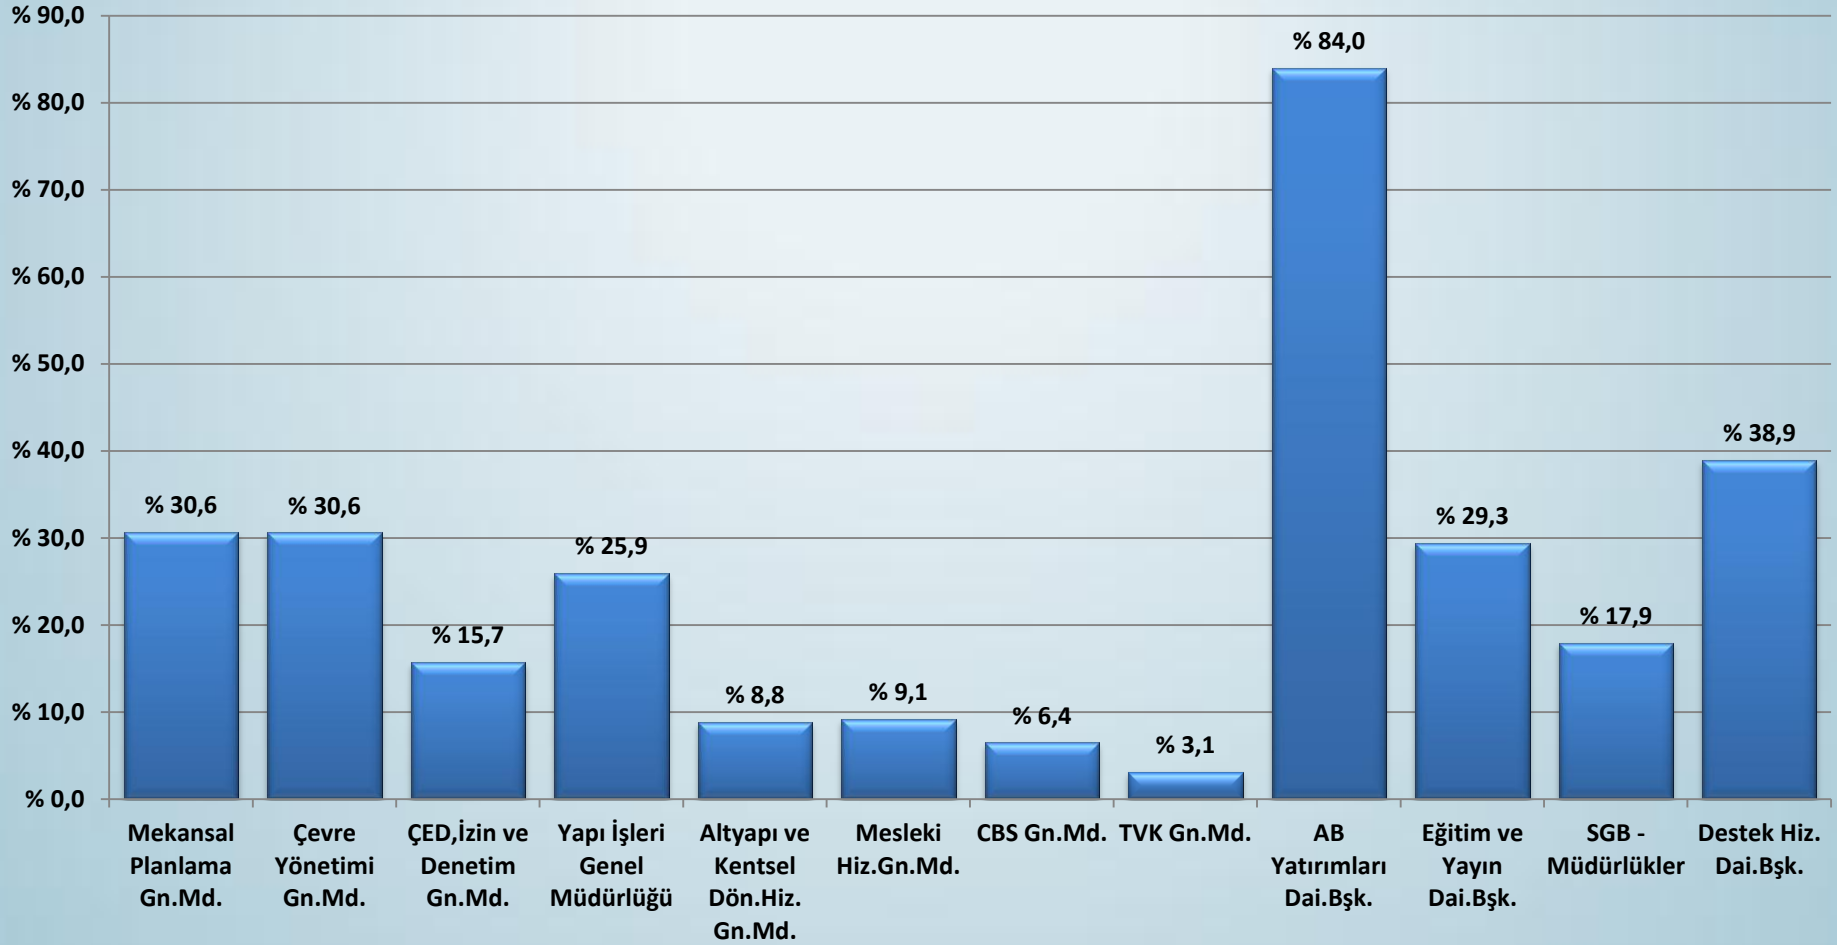

Harcama Birimi Bazında Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2007F000100	İmar Uygulamaları (Turizm Sektörü)	2007-2014	37.000	25.500	11.500	200	% 1,7	"İmar uygulamaları projesi" kapsamında 2014 yılı ödeneği olan 11.500.000 TL'lik ödeneğin 5.750.000 TL'lik serbest bırakılan kısmı 24.06.2014 tarih ve 9939 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile 62 belediyenin projesine tahsis edilmiştir. Bahse konu olura istinaden ödeneklerin kullanımına ilişkin talimat yazılmıştır. 11.08.2014 tarih ve 12790 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile de 84 turizm öncelikli belediyenin projesine 5.750.000 Türk Lirası tahsis edilmiş ve ödeneğin kullanımına ilişkin talimat yazılmıştır. Tahsis edilen 11.500.000 TL ödeneğin 1.010.000TL harcaması gerçekleştirilmiştir.
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç. Dahilinde Yapılaşma Koşulları Belirleme (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2014	1.000	200	800	0	% 0,0	Proje Kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2014	58.536	35.780	22.756	12.935	% 56,8	<p>1-Samsun İli Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde Riskli Alan İlan Edilen 29,4 Hektar Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yapıtılması ve Raporunun Hazırlanması işi için 44.840,00 TL,</p> <p>2-Samsun İli İlkadım İlçesi Ulugazi, Sait ve Kökçüoğlu Mahallelerinde Riskli Alan İlan Edilen 79,53 Hektar Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yap. ve Raporunun Haz. işi için 68.204,00 TL,</p> <p>3-Diyarbakır İli, Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İmar Planı, Kentsel Tasarım ve Uy. Projesi için 125.606,28 TL (1. Hakediş)- 30.001,50 TL (2.Hakediş),</p> <p>4-İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mah. 62/41, Şenlikköy Mah. 276/3, Arnavutköy İlçesi Ömerli Mah. 373-375-376-407-431(996) Numaralı Parsellerin Değerleme işi için 4.720,00 TL,</p> <p>5-İstanbul Küçükçekmece İnönü Mah. 3470, Bahçelievler İlçesi Yenibosna Mah. 3406, Bakırköy İlçesi Şenlikköy Mah. 297/13-34-41, Arnavutköy İlçesi Ömerli Mah. 374-431(188/1) Numaralı Parsellerin Değerleme işi için 4.720,00 TL,</p> <p>6-Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demetevler, Demetlale ve Demetgöl Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 162,11 hektarlık alanda Dönüşüm Master Planı Hazırlanması işi için 243.375,00 TL (1.Hakediş)- 146.025,00 TL (2.hakediş),</p> <p>7-İzmir İli Buca İlçesi Seyhan Mahallesinde 87 Hektarlık Alanın 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yap. ve Raporlarının Haz. işi için 79.532,00 TL,</p> <p>8-Çorum İli Osmancık İlçesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerinin Yapıtılması ve Raporlarının Hazırlanması işi için 116.820,00 TL olmak üzere toplamda 863.844,00 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.</p> <p>9- Bakanlığımız ve İller Bankası A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında 12.217.190,00 TL ödenek aktarımı yapılmıştır.</p> <p>10- 2014 Yılı sonuna kadar 2.699.996 TL ödenek harcaması yapılacaktır.</p>

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	3.350	1.350	800	0	% 0,0	Proje Kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	2.500	1.500	1.000	0	% 0,0	Proje Kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2014K090010	Özel Proje Alanları Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	5.000		5.000	0	% 0,0	Proje Kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2014K090060	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (*)	2014-2015	2.000		1.000	0	% 0,0	Proje 01.07.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Proje Kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
TOPLAM			109.386	64.330	42.856	13.135	% 30,6	

(*) Projeden harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı'nın Onayına tabidir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012F000090	Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi (Turizm Sektörü)	2012-2014	2.000	500	1.500	735	% 49,0	Proje başlangıç, 3 ara rapor ve nihai rapor dan oluşmakta olup 3. ara raporun tarafımızca kabul edilmesine müteakip olarak 2014 yılının Nisan ayında 736.000 TL. ödeme yapılmıştır. Proje nihai raporunun kabulünden sonra yani 2014 yılı son çeyreğinde projenin tamamlanması ön görülmektedir. Bu aşamada projenin geri kalan kısmının ödenmesi yapılacak ve % 100 gerçekleştirme sağlanacaktır.
2014K100050	Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	200		200	0	% 0,0	Proje süresinin 1 yıl olması ve sürenin 2015 yılına sarkacak olması nedeniyle Kalkınma Bakanlığının onayı ile projenin toplam ödeneği aynı kalmak üzere 2015 yılına uzatılmıştır. Projenin 2014 yılı ödeneği 100.000 TL ve 2015 yılı ödeneği 100.000 TL olarak düzenlenmiştir. TÜBİTAK-MAM ile Ağustos 2014'te sözleşme imzalanmıştır. 2014 yılı ödeneği olan 100.000 TL (%50) yıl sonu itibari ile gerçekleştirilecektir.
2013K100030	İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Hazırlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	2.300	0	1.035	690	% 66,7	Projenin ilk dönem ödemesi gerçekleştirilmiş olup; kalam miktar olan ikinci dönem ödemesi teknik şartnameye istinaden kasım ayında gerçekleştirilecektir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	2.000	166	944	0	% 0,0	İhale sürecine girilmiş, ancak projenin gerçekleşmesi için kalan 6 aylık sürenin yeterli olmayacağı değerlendirilerek projenin 2015 yılına uzatılması için başvurulmuş ve Kalkınma Bakanlığınca talep uygun görülerek proje 2015 sonuna kadar uzatılmıştır. Proje için TUBİTAK MAM ile sözleşme aşamasına gelinmiş olup, Ekim ayı içerisinde çalışma yapılacak ve 2014 sonunda 400.000 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.
2012K100070	Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi (Çevre Sektörü)	2012-2015	1.900	209	1.182	0	% 0,0	Proje kapsamında ik çeyrekte herhangi bir rapor sunulması ve ödeme yapılması planlanmamıştır. İkinci çeyrekte projenin 1. ara raporu Bakanlığımıza sunulmuştur. Söz konusu raporun incelenmesi devam etmekte olup, bu rapora istinaden ödeme yapılması planlanmamıştır. Bu bağlamda 2014 yılı ilk ve ikinci çeyreğinde herhangi bir ödeme yapılması planlanmamış olup, yıl içerisinde sadece son çeyrekte (yıl sonu) ilgili iş bölümünün ödemesi yapılacaktır. (Proje ihale bedeli 1.475.000 TL dir. 146.000 TL 2013 yılında ödenmiştir. 2014 yılı proje bütçesinden 930.000 TL ödeme yapılacak olup, 252.000 TL ödenek artacaktır. Bu yüzden projenin yıl içerisinde gerçekleşmesi %100 olmakla birlikte mali anlamda %79 olarak görünmektedir.)
2014K100100	Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	800		300	0	% 0,0	Projenin Teknik ve İdarfi Şartnamesi hazırlanmış, ilan ve ihale yapılmış ancak komisyonca ihale iptal edilmiştir. Projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Her hangi bir harcama gerçekleştirilememiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100080	Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.813	923	860	333	% 38,7	
	Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması	2013-2013	241	241	0			Proje, iki ara rapor ve bir final raporundan oluşmaktadır. 1. ara rapor 23 Kasım 2013 tarihinde sunulmuş ve ödeme yapılmıştır. 2. ara rapor Haziran 2014, final raporu ise Kasım 2014 de sunulacak olup, raporlardan sonra ödemeleri yapılacaktır. 2. ara rapor haziran ayında sunulmuş olup rapora ilişkin idare tarafından düzeltme yapılması istenmiştir. İdare tarafından istenen düzeltmelerin Temmuz 2014 te sunulmasına mütakip ödeme yapılacaktır.
	Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu	2013-2014	600	200	400	177	% 44,3	Proje devam etmekte olup, ikinci ara raporun sunumuna müteakip ödeme yapılmıştır.Kasım 2014'te final raporunun teslimi yapılacaktır.
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (1.Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi)	2013-2014	800	420	380	109	% 28,7	İkinci ara ödeme 13 Mayıs 2014 tarihinde 47.495 TL (KDV Dahil) olarak yapılmıştır.Proje devam etmekte olup 22.08.2014 tarihinde 108.560tl. Ödeme yapılmıştır.
	Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi (2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi)	2013-2015	172	62	80	47	% 58,8	12.08.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje 600 gündür ve 2015 Mart ayında bitecektir. Projeye ait ilk ödeme52681,50tl. Olarak Kasım 2013 de, 2.ödeme 47495,00 olark Mayıs 2014 de yapılmıştır . Son ödeme 2015 de olacaktır. Bu yıl içerisinde proje kapsamında başka ödemesi yoktur.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Çimento Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi	2014-2015	880		400	0	% 0,0	Proje 14.10.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K100070	Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme. İzin ve Kısıtlama (REACH) Süreçleri Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2014	678	441	237	237	% 100,0	Proje 11 Aralık 2013 tarihi ile tamamlanmıştır.
AB KATKISI			5.689	2.105	3.584	0	% 0,0	
2010K100070	Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	233	131	102	29	% 28,4	Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni söz konusudur. Projenin, tedarik bileşeni tamamlanmış olup, teknik yardım bileşeni 28 Haziran 2013 tarihinde başlamıştır. 2014 yılı ilk çeyrek dönemi için Hazine Müsteşarlığından gelen bir harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir. 2014 yılı ikinci çeyrek döneminde 4.921,70 Avro (dörtbindokuzyüzyirmibir Avro yetmiş sent) karşılığı 14.466,84 TL tutarındaki ulusal katkı payı (TR21 0001 5001 58048014 3490 82) no'lu Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. 2014 yılı üçüncü çeyrek döneminde ise 4.921,70 Avro (dörtbindokuzyüzyirmibir Avro yetmiş sent) karşılığı 14.245,86 TL tutarındaki ulusal katkı payı (TR21 0001 5001 58048014 3490 82) no'lu Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. 2014 yılı itibari ile toplam yaklaşık 29,000 TL ödeme yapılmıştır. Hazine Müsteşarlığı'ndan gelen harcama talebine göre kalan miktarın da ulusal fona aktarılması sağlanacaktır.
AB KATKISI			14.020	5.328	8.692	0	% 0,0	
2010K100090	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktif Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi (AB)	2010-2014	288	182	106	105	% 99,1	Projede yer alan aktiviteler tamamlanmış ve kapanış toplantısı 12 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, final rapor onaylanma aşamasındadır.
AB KATKISI			3.551	2.446	1.105	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100110	Maden Atıklarının Yönetimi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	1.617	1.375	242	242	% 100,0	Hazine Müsteşarlığının talebi doğrultusunda 2014 yılı içinde Bakanlık katkısı ödeneği gerçekleşmiştir
AB KATKISI			10.948	10.344	604	0	% 0,0	
2012K100060	AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik Kirlenmeler Tüzüğü'nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2012-2015	268	84	80	0	% 0,0	Söz konusu proje kapsamında toplam 8 eğitimden 7 tanesi tamamlanmış ve uygulama mevzuatı ile Ulusal Uygulama Planına ilişkin ilk tasarımlar hazırlanmıştır.
AB KATKISI			2.412	804	965	0	% 0,0	
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2015	804	0	402	0	% 0,0	Hazine Müsteşarlığından Bakanlığımıza gelen 10 Ekim 2014 tarihli resmi yazıya istinaden söz konusu projenin iç katkı payı ödemesi gerçekleştirilecektir.
AB KATKISI			7.236	0	3.257	0	% 0,0	
2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (1) (Çevre Sektörü)	2013-2015	268	161	80	0	% 0,0	Yüklenici firma, Foster Wheeler Italiana S.r.l firması olup, bu firma PM Group ile bir konsorsiyum oluşturarak projeyi yüklenmiştir. Projenin açılış toplantısı 22.07.2014 tarihinde Bakanlığımız, Merkezi Finans ve İhale Kurumu, EÜAŞ ve Foster Wheeler Italiana S.r.l ve PM Group firmasının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Projenin uygulanma süresi projenin başlamasından itibaren 24 ay (2 sene) dir. (22.07.2014-22.07.2016)
AB KATKISI			2.412	1.447	724	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100080	Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2015	670		268	0	% 0,0	Projenin ihale süreçleri Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından yürütülmekte olup, ihale çalışmaları halen devam etmektedir. Bu sebeple ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
AB KATKISI	6.030			3.015	0	% 0,0		
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2015	670		268	0	% 0,0	Projenin ihale süreçleri Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından yürütülmekte olup, ihale çalışmaları halen devam etmektedir. Bu sebeple ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
AB KATKISI	6.030			3.015	0	% 0,0		
2014K100120	Kesin Hesap Farkı (AB) (1) (Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi) (Çevre Sektörü)	2014-2014	200		200	200	% 100,0	Tüm ödemeler yapılmış ve proje tamamlanmıştır.
AB KATKISI	0			0	0			
TOPLAM			17.589	4.172	8.406	2.571	% 30,6	
AB KATKISI			58.328	22.474	24.961	0	% 0,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100060	Çevre İznine Tabi Faaliyetlerin Yer Aldığı Listelerin Uyumlaştırılması Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	0		0	0	% 0,0	13.06.2014 tarihinde yatırım programından çıkartılmıştır.
2013K100100	Çevresel Etiket Altyapısı Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2014	721	124	597	107	% 17,9	<p>Çevresel Etiket Altyapısı Projesi 04 Temmuz 2013 tarihinde başlamış olup 06 Ekim 2014 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 2014 yılında proje bazında gerçekleştirilen başlıca faaliyetler kısaca şu şekildedir.</p> <p>* Taslak logolar ve Bakanlığımız tarafından nihai edilen 5 (Beş) Adet Ulusal Çevresel Etiket Logosu Uzmanlar tarafından hazırlanarak Yüklenici Firma tarafından Bakanlığımıza sunulmuştur. * Ön Düzenleyici Etki Analizi ile ilgili çalışmalar nihai edilerek nihai Düzenleyici Etki Analizi Raporu Bakanlığımızın görüşleri doğrultusunda nihai edilmiştir.</p> <p>* Sertifikalı 18 ISO Standartları Eğitimi tamamlanmıştır. * AB Üyesi Ülke Uygulaması Eğitim Semineri Çek Cumhuriyetinden gelen uzmanlar tarafından verilen eğitimle Genel Müdürlüğümüz personelinin katılım sağlanması ile tamamlanmıştır. * Sertikalı Online İngilizce Dil Eğitimi devam etmektedir. * Yüklenici firma tarafından Sistem Yazılım İhtiyaç Analizi Fizibilite Raporu hazırlanarak Bakanlığımıza teslim edilmiştir.</p> <p>* 10 (on) Ülkenin Sistem Kurgusu İşleyiş Mekanizması, Mevzuatının Tercümeleleri Bakanlığımıza teslim edilmiştir. * DEA kapsamında belirlenen 10 ürün/hizmet grubu kriterlerinin tercümesinin kabulü gerçekleştirilerek Bakanlığımıza sunulmuştur. * Sistem Kurgusu ve İşleyiş Mekanizması Yüklenici Firma tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza teslim edilmiştir. * Sistem Kurgusu ve Mevzuat çalışmalarının paydaşlara tanıtılması ve görüşlerinin alınması amacıyla ilgili sektör temsilcilerinin katılımı ile seminer gerçekleştirilmiştir.</p> <p>* Proje Çıktılarının ve Yüklenici Firma tarafından Bakanlığımıza sunulan Taslak Yönetmeliğin tanıtıldığı ilgili sektör kurum/kuruluşların katıldığı bir seminer düzenlenmiştir.</p>
2014K100030	Çevre Denetim Aracı Alımı (Çevre Sektörü)	2014-2014	3.010		3.010	0	% 0,0	Devlet Malzeme Ofisi tarafından ihalesi yapılmıştır.DMO aracılığıyla temin edilecek olan 41 adet araç için toplam 3.781.452,16-TL satış bedeli bildirim yapılmıştır. Revize ödenek talebi Strateji Geliştirme Başkanlığına ulaştırılmıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100110	Çevre Kirliliği ile Mücadele Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin Denetim, İzleme ve Numune Alma Kapasitelerinin Artırılması Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	4.000		2.000	0	% 0,0	30.10.2014 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
2013K100070	Çevre Yönetimi Süreçleri Otomasyonu Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	559	0	350	0	% 0,0	25.09.2014 tarihinde ihalesi 243.000- TL (KDV Hariç) bedelle gerçekleştirilmiş olup, sözleşmeye davet yazısı gönderilmiştir.
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2015	9.015	2.620	4.200	2.231	% 53,1	İzmir Erzurum THM Final Raporu ödemesi yapıldı. Şubat 2014 tarihinde Ankara THM Ön Değerlendirme Projesine başlandı. Birinci ara rapor Ekim 2014 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuştur. Konya THM ve Adana THM Ön Değerlendirme Projeleri 16/10/2014 tarihinde sözleşme imzalanacaktır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü)	2011-2015	5.350	288	3.500	100	% 2,9	
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	3.000	140	2.250	100	% 4,4	Uygulama projesi hazırlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışması devam etmekte olup, Kasım-2014'te ihalesi yapılacaktır. Gerçekleşme oranı: % 0'dır.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	2.350	148	1.250	0	% 0,0	Tadilat projeleri hazırlanmaktadır. Gerçekleşme oranı: % 0'dır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü)	2012-2015	12.000	628	5.300	323	% 6,1	
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.371	437	1.967	323	% 16,4	İnşaat çalışması halen devam etmekte olup, 2015 yılı Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır. Gerçekleşme oranı: % 60'dır.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	2.344	0	1.100	0	% 0,0	Uygulama projesi hazırlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışması devam etmekte olup, Kasım-2014'te ihalesi yapılacaktır. Gerçekleşme oranı: % 0'dır.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	528	191	200	0	% 0,0	Uygulama projesi hazırlanmıştır. Yaklaşık maliyet çalışması devam etmekte olup, Kasım-2014'te ihalesi yapılacaktır. Gerçekleşme oranı: % 0'dır.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.757	0	2.033	0	% 0,0	İhalesi tamamlanmış olup, 03/07/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Gerçekleşme oranı: % 10'dur.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2015	9.030	0	6.030	845	% 14,0	
	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Bakım-Onarımı	2014-2015	2.530		2.350	845	% 36,0	Şubat 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında bakım-onarım yapılmaktadır. Gerçekleşme oranı: % 60
	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması	2014-2015	5.000		2.680	0	% 0,0	Temmuz-2014'te ihalesi gerçekleştirilmiştir. Samsun THM'ne bağlı 2014 yılında 11 istasyon ile 2015 yılında 9 istasyon kurulacaktır.
	İstasyonlara Yedek Cihaz ve Ekipman ile Sarf-Yedek Malzeme Alımı	2014-2015	1.500		1.000	0	% 0,0	30 Ekim 2014 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K100100	Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi (Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2010-2014	901	652	249	245	% 98,4	Proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup, proje kapsamında; 1. Direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ve STK'lardan oluşan 120 temsilciye 8 modülden oluşan eğitimler verilmiştir. 2. Eğitimcilerin Eğitimi kapsamında 24 eğitimi tamamlamış personel içerisinde seçilen 40 kişiye ilave 3 modül eğitim verilmiştir. 3. Kırıkklae Tüpraş Rafinerisinde pilot bölge çalışmaları yapılmıştır. 4. Seveso Bildirim Sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmaların Ekim ayında tamamlanarak test aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. 4. Yurt dışı çalışma ziyaretleri kapsamında 2 kez İtalya'ya bir kez de İrlanda'ya olmak üzere ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 5. Halkın bilgilendirilmesi çalışmaları devam etmekte olup, broşür hazırlanması ve film çekimlerinde ilerleme kaydedilmiştir.
AB KATKISI			7.236	5.608	1.628	0	% 0,0	
2014K100070	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	308		139	135	% 97,1	Proje 12/05/2014 tarihinde başlamış olup, başladığı tarihten bugüne kadar geçen süre zarfında yapılması beklenen tüm aktiviteler zamanında gerçekleştirilmiştir. Ulusal eş finansman kapsamında 2014 yılında ödenecek miktarın tamamı (46.000 Avro=135.253,80 TL olarak 1 Avro=2,9403 TL) Mayıs 2014 itibari ile ödenmiştir.
AB KATKISI			2.774		1.041	0	% 0,0	
TOPLAM			44.894	4.312	25.375	3.986	% 15,7	
AB KATKISI			10.010	5.608	2.669	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Şehirleşme Sektörü)	2010-2015	163.000	64.000	5.884	5.884	% 100,0	331 adet iksa ve 448 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Dış cephe, döşeme duvar tavan kaplama, makine ve elektrik tesisatı imalatları devam ediyor. Hakediş ödemelerine göre gerçekleştirme oranı yaklaşık %71,40, fiziki gerçekleştirme oranı yaklaşık %74'dür. İş artış oluru yapılacaktır.
2014K090110	Bakanlık Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	38.405		38.405	0	% 0,0	Proje 29.08.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. Ödeneği döner sermayeden karşılanıyor.
2014K090080	Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (*)	2014-2014	17.500		17.500	0	% 0,0	Proje ödeneğinin 6.170.000,-TL'si Nisan ayı içerisinde Maliye Bakanlığı tarafından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne aktarılmıştır. 30.06.2014 tarihinde 25 Kalem Muhtelif Büro Mefruşatı Alımı ihalesi DMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.3 kalem kompak arşiv, karteks dolabı, harita dolabı ihalesi için DMO'ya ödenek aktarıldı, teknik şartname hazırlanarak iletilmiştir.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	1.130	0	1.130	46	% 4,1	Yapım işleri ile ilgili proje üretimi ve kontrollüğünde uluslararası norm ve standartlara uygun olarak CAD esaslarının oluşturulması ve iş süreçleri ve kontrol mekanizmasının analizi ve dokümantasyonu ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce müşavirlik hizmeti alınması için gerekli teknik şartname çalışmaları tamamlanmıştır. Danışmanlık hizmet ihalesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Kasım ayı içinde açık ihale usulü ile hizmetin alımı ihalesi yapılacaktır.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2014	3.500	110	3.390	76	% 2,2	Yapı Denetim Sistemi Uygulama, Bakım, Destek, İyileştirme, Bakanlık Merkezine Taşınması ve Merkez Bilgi İşlem Altyapısına Entegrasyonu işi ihalesi 14.02.2014 tarihinde yapılmış olup, 124500 TL+KDV bedelli sözleşme 17.02.2014 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425000 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	2.990	360	1.630	77	% 4,7	4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata yönelik uygulamalar hakkında İl Müdürlükleri eğitiminin 17-20.11.2014 tarihlerinde ve Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarların denetiminde görev alan İl Müdürlüklerimiz bünyesindeki değerlendirme heyetlerine TS EN ISO/ICE 17025 ve İç Tetkik Eğitiminin 20-22.10.2014 tarihlerinde yapılması planlanmakta olup, YDS-2 Sistemi'nin kabulünün yapılması halinde, kabule müteakip söz konusu sistemin kullanımına ilişkin İl Müdürlüklerimize eğitim verilmesi düşünülmektedir.
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2015	1.300	353	350	46	% 13,1	Yatırım Takip Sistemi (YTS) yazılımının geliştirilmesi için ihale işlemi gerçekleştirildi. Sözleşme imzalandı. Süreç devam etmektedir.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2016	5.745	1.805	1.500	37	% 2,5	Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak bilinmemekle beraber şu ana kadar ödenek problemi yaşanmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2015	23.334	8.453	5.058	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göçebeleri-Dicle-Batman Barajı İskanı	2013-2014	5.056	0	5.056	0	% 0,0	2005 yılında köy hizmetlerince geçici kabulü yapılmış olup konutlardaki hasarlardan dolayı kesin kabulü yapılamamıştır. İş teftiş tarafından 2009 yılında incelenmiş sorumluları hakkında işlem tesis edilmiştir. Teftiş kurulu raporu doğrultusunda müteahhit namı hesabına ikmal ihalesi talimatı verilmiş olup ihale süreci başlamıştır. Ödenek tamamen harcanamayacaktır.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2015	9.970	3.389	1	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2015	8.308	5.064	1	0	% 0,0	Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131 konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070020	Bulanık Alparslan I Barajı İskanı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2014	33.030	16.520	12.510	8.416	% 67,3	Devam etmektedir. 2014 yılında tamamlanması planlanmaktaydı. Ancak terör olayları nedeniyle iş durmuştur.
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2015	106.691	0	1.001	0	% 0,0	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2015	6.303		1.000	0	% 0,0	2014 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır. İşin proje bedelinin artırılması için Kalkınma Bakanlığında revize talep edilmiş ancak Kalkınma Bakanlığı talebimizi 2 ay sonra yanlış olarak değerlendirmiş olup yeniden revize onayı için Bakan onayına sunulmuştur. 01.10.2014 tarihinde revizenin onaylanacağı bilgisi alınmıştır. ihale sürecine ivedilikle başlanacaktır.
	Anamur-Alaköprü Barajı İskanı	2013-2014	100.388		1	0	% 0,0	Konutlar bitme aşamasındadır.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2017	189.900	10.559	2.652	582	% 21,9	
	Tahtalı Barajı İskanı	2009-2014	13.209	10.559	2.650	582	% 22,0	İşin ikmal onarım ihalesi yapılmıştır. 2014 te bitirilecektir.
	Hasankeyf-İlisu Barajı İskanı	2009-2017	88.346	0	1	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. 11 Temmuz 2014 tarih 2591 sayılı Bakan Oluru ile 5.416.000 TL 08.1 tertitine aktarma yapılmıştır.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2017	88.345	0	1	0	% 0,0	Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskan isteyen aile çıkmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2016	10.000	2.700	1.000	517	% 51,7	Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı işi için ödenek gönderilmiş olup ihalesi yapılmıştır. İş tamamlanmıştır.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2015	5.230	2.120	2.000	209	% 10,5	Kırsal alanlarda yöresel doku ve mimari özelliklere uygun yapılaşma çalışmaları kapsamında; Marmara Bölgesi (Edirne, Bursa ve Balıkesir) için 36 tip proje elde edilmiştir. Şanlıurfa ve Erzurum İlleri için (12 şer tip) projelendirme çalışmaları sürdürülmektedir. bunlardan Şanlıurfa yöresine ait mimari uygulama projeleri hazırlanmakta olup, teslim aşamasındadır. Erzurum yöresine ait ön projeler Genel Müdürlüğümüzde hazırlanmış olup, uygulama projeleri ihalesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	3.180	1.820	250	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama yapılmaktadır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	3.180	500	550	162	% 29,5	10-14 Kasım 2014 tarihinde eğitim planlanmıştır. Harcama gerçekleşecektir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1995K070030 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1995-2014	137.080	133.580	3.500	2.251	% 64,3	İşler devam etmektedir.
2011K070040 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	108.650	32.982	47.604	19.502	% 41,0	İşler devam etmektedir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2016	5.200	2.700	100	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

TOPLAM	608.115	109.300	94.810	16.052	% 16,9
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

TOPLAM-08	250.930	169.262	51.204	21.753	% 42,5
------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

Genel TOPLAM	859.045	278.562	146.014	37.805	% 25,9
-------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

(*) Bu ödenek, 2010K091030 numaralı "Bakanlık Hizmet Binası" projesinin tamamlanmasından sonra kullanılabilir.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014E060030	Çamlıca Özel Proje Alanında Altyapı Tesisleri Etüd ve Proje İşlerinin Yapılması Projesi (2*) (Kentçi Ulaşım Sektörü)	2014-2015	2.250		10	0	% 0,0	
2013K060110	Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2013-2016	5.054		1.500	0	% 0,0	
2012K080030	Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2012-2015	2.530	1.220	580	95	% 16,4	2014 yılı içerisinde proje kapsamında Bakanlığımız "6306 Sayılı Kanunun Uygulamaları: Riskli Alan İlan Edilmesi, Riskli Alan Uygulamaları, Rezerv Yapı Alanı Belirlenmesi, Riskli Yapı Tespiti, Riskli Yapı Uygulama Süreci, Finansal Destekler" eğitimi, 21-23.04.2014 tarihlerinde Zonguldak'ta, 05-07.05.2014 ve 21-23.05.2014 tarihlerinde Afyonkarahisar'da, "6306 Sayılı Kanunun Mevzuatve Uygulamalarına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri" eğitimi 17.09.2014-19.09.2014 tarihleri arasında Erzurum İlinde düzenlenmiştir.
2013K080030	Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2014	1.211	341	870	0	% 0,0	
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2014	3.000	900	2.100	734	% 35,0	Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK MAM arasında imzalan "İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Amacıyla Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında 2. Aşama (laboratuvar ölçekli) çalışmalar tamamlanmış olup, halen 3. Aşama (endüstriyel ölçekli çalışmaların tamamlanması ve ara değerlendirme raporunun hazırlanması) devam etmektedir.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K080050	Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2015	3.150	150	1.500	0	% 0,0	YıldızTeknik Üniversitesi ile 25.09.2014 tarihinde protokol imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
2013K140090	Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması (Afetler Sektörü)	2013-2014	5.092	2.242	2.850	0	% 0,0	Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protololu" kapsamında Türkiye genelinde kentsel dönüşüm için belediyeler bazında deprem riski önceliklendirilmesinin yapılmasına ilişkin Kahramanmaraş, Burdur ve Muş illerinde örnek kentsel deprem riski belirlenme çalışmaları yapılmıştır. 2. aşama ile ilgili hazırlıklar devam etmektedir.
TOPLAM			22.287	4.853	9.410	829	% 8,8	

(2*) Proje ödeneği döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012D100020	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı (Enerji Sektörü)	2012-2016	4.033	346	512	355	% 69,3	<p>***Hâlihazırda kullanılmakta olan BEP-TR Yazılım Sisteminin Bakım ve Onarımı İşinin hizmet alımı için Mimar Bilgi İletişim San.Tic.Ltd.Şti. ile kdv hariç 65,250-TL bedel üzerinden 25.04.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmış olup, 20,798-TL tutarındaki ilk hak edışı ödenmiştir.</p> <p>***Tubitak tarafından yürütülerek tamamlanan "BEP-TR Yazılım Metodolojisinin Geliştirilmesi Projesi " işinin kabulü yapılmış ve KDV dahil 354,000-TL tutarındaki ödemesi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>***Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yeni sürümü olacak olan BEP-TR II sistemini gerçekleştirilmek üzere hizmet alımı işinin ihalesi 27.Ağustos.2014 çarşamba günü yapılmıştır, ihale komisyonunun değerlendirme süreci devam etmektedir.</p>
2013D100010	Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması (Enerji Sektörü)	2013-2014	200	100	100	9	% 9,0	<p>***19.06.2014 tarihinde İlbank tesislerinde Yeşil Bina konulu çalıştay düzenlenmiştir. ***26.08.2014 tarihinde İlbank tesislerinde Otopark konulu çalıştay düzenlenmiştir.</p>
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2015	2.781	693	1.888	4	% 0,2	<p>***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsü yerleşkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması işi Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale edilerek, kdv hariç 1,856,180-tl bedel üzerinden 23.07.2014 tarihinde FD Pro.Müh.İnş.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmış olup, bu projeden 340,293-TL tutarındaki ilk hakediş ödemesi yapılmıştır.</p> <p>***Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması işi ihalesi İl Müdürlüğüne 25.09.2014 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 638.000 TL ile Teknolus Enerji Ltd. Şti. firmasına ihale edilmiş olup, sözleşme imzalanma aşamasındadır. 752.840 TL tutarındaki ödeneğin aktarımı yapılmıştır.</p> <p>***15-17/Eylül/2014 tarihleri arasında Enerji Denetçisi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. (149,500-TL yolluk ödeneği İl Müdürlüklerine gönderilmiştir.) ***Bina Isıtma ve Soğutma Enerji Gereksinimlerini Sınırlayan U Değerlerinin Tespiti AR-GE Projesi olarak Karabük Üniversitesi ile KDV hariç 300.000 TL lik protokol imzalanmış olup; 2014 yılı içerisinde ilk etap ödemesi olarak 35.400 TL ödenecektir.</p>

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2015	705	200	225	57	% 25,3	***e-kooperatif yazılımının 2013 yılı bakım ve onarım işinin kabulü neticelendirilerek, kdv dahil 56,876-TL tutarında kesin hak ediş ödemesi yapılmıştır. ***Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-kooperatif) yazılımının bakım ve onarım işinin hizmet alımı için Mimar Bilgi İletişim. Ltd. ile kdv hariç 53,750-TL bedel üzerinden 03.06.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış 1. hakediş olarak 31,712,50 TL ödenmiştir.
2010K010060	Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı (Genel İdare Sektörü)	2010-2014	3.800	3.795	5	0	% 0,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K010700	Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün Enerji Verimli Hale Getirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2014	2.750	900	1.850	67	% 3,6	***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsündeki bulunan laboratuvar binalarının enerji verimli hale getirilmesi işi Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale edilerek, kdv hariç 1,856,180-tl bedel üzerinden 23.07.2014 tarihinde FD Pro.Müh.İnş.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmış olup, bu projeden 1,850,000-tl tutarındaki ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.
2010K010080	İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	6.725	3.257	800	3	% 0,4	***Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermekte olan yapı malzemesi laboratuvarlarının deney kapasitesini ve etkinliğini arttırmak üzere ihtiyaç duyulan alet-edevat-cihaz-ekipman-donanım vb. malzemelerin alımını yapmak üzere İl Müdürlüklerimizin ihtiyaçları tespit edilmiş olup, ihalesi 29.08.2014 cuma günü yapılmış ancak uygun teklif çıkmadığından ihale iptal edilmiştir. Yıl sonuna az bir zaman dilimi kalması nedeniyle tekrar ihaleye çıkılmak yerine bahse konu alımın DMO yoluyla teminine karar verilmiş ve buna göre işlemlere başlanılmıştır. (839.958 TL kredi açılmıştır.) 02.10.2014 tarihinde DMO tarafından ihalesi yapılmış olup, ihale sürecinin devam ettiği bilgisi alınmıştır.
2010K010050	Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	6.225	3.667	958	66	% 6,9	***Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsünde hizmet vermekte olan Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarının deney kapasitesini ve etkinliğini arttırmak üzere ihtiyaç duyulan alet-edevat-cihaz-ekipman-donanım vb. malzemelerin alımını yapmak üzere ihtiyaçlar tespit edilmiş olup, ihalesi 15.08.2014 cuma günü yapılmıştır. İhale kararı onaylanmış ve isteklilere bildirilmiş olup, KİK na itirazın şikayet başvurusu yapılması nedeniyle Kurum kararı beklenmektedir. 2014/UM.II-3357 nolu karar ile şikayet başvurusu KİK tarafından 09.10.2014 tarihinde reddedilmiş olup; tebligat işlemleri neticesinde sözleşme imzalanacaktır.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	10.908	8.064	1.200	159	% 13,3	<p>***Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS) yazılımının bakım ve onarımı işinin hizmet alımı için Inter-san Bilg.Yaz.Ltd. ile kdv hariç 77,600-TL bedel üzerinden 03.06.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmıştır.</p> <p>***Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet arazi vitesli çift kabin pick-up alınacak ve ihtiyaç duyulan İl Müdürlüklerine dağıtılacaktır. DMO'ya 906.100 TL'lik kredi açılmıştır.</p> <p>***15/18.Nisan.2014 tarihleri arasında PGD temel seviye eğitimi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>***24-26/Kasım/2014 tarihleri arasında PGD ileri seviye eğitimi gerçekleştirilecektir.</p> <p>***Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmaktadır.</p> <p>***06-10/Mayıs/2014 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Yapı Fuarına katılım sağlanmıştır.</p> <p>***MOBİLPGD uygulamasına yönelik yazılımın gerçekleştirilmesi için 43,000-TL+KDV bedel üzerinden Inter-san Bilg.Yaz.Ltd. ile 17.07.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmıştır. ***Mobil PGD uygulamasında kullanılmak üzere tablet bilgisayar alımı ihalesi yapılmış olup; kabul süreci devam etmektedir.</p>
2010K010120	Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	863	450	100	11	% 11,0	
2010K010130	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2015	486	86	100	10	% 10,0	<p>***İstanbul Teknik Üniversitesi ile Gürültü konusunda KDV dahil 98.000 TL'lik protokol imzalanmış olup; 1. ve 2. etap ödemesi olarak 2014 yılı içerisinde 48.000 TL ödeme gerçekleştirilecektir.</p>

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K010080	Yapı Mütcaahhtılığı Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2013-2015	1.260	200	400	3	% 0,8	***Yapı Mütcaahhtılığı Bilişim Sistemi (YAMBİS) Yazılımının Bakım ve Onarım İşinin hizmet alımı ihalesi 09.06.2014 Pazartesi günü yapılmış ve iş 38,150-TL bedel ile İntersan Bilg.Yaz.Ltd. üzerinde kalmış olup, yüklenici sözleşme yapmak üzere çağırılmıştır. ***31.05.2014 tarihinde İbank tesislerinde imar yönetmeliği konulu çalıştay düzenlenmiştir. ***03/05.Kasım.2014 tarihleri arasında YAMBİS uygulamalarına yönelik eğitim yapılacaktır.
		TOPLAM	40.736	21.758	8.138	744	% 9,1	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090100	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.700	200	1.500	441	% 29,4	Danışmanlık ihalesi yapılmış olup, çıkan rapor doğrultusunda gerekli teknik önlemler alınması maksadıyla 2. ihaleye çıkılmış ve sözleşme imzalanmıştır. 2014 Aralık ayı itibaiyle teknik kurulumlar bitirilmiş olacaktır.
2014K090120	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.950		4.900	713	% 14,6	9 adet işin ihalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Ayrıca proje kapsamında merkez ve taşra birimlerinin yazılım, lisans ve donanım altyapısı gereksinimleri belirlenmiş olup, hazırlanan teknik şartname DMO ya gönderilerek ihale edilmiş sözleşme imzalanmıştır.
2014K090130	Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	2.000		1.000	0	% 0,0	1 adet iş ihale edilmiştir.
2014K090150	Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı Güncelleştirme ve Optimizasyon Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	4.900		2.600	0	% 0,0	Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı donanım ihtiyaçları 2013 yılı Aralık ayı itibarı ile karşılanmış olup, Bakanlık yeni veri merkezinin kurulmasını müteakip ilave donanım ve yazılım ihtiyaçları için fizibilite çalışmaları başlamıştır. İş sürekliliği merkezi ve Bakanlık veri merkezinin yeni binaya taşınması işleri kapsamında hizmet alımı teknik şartnameleri hazırlanmıştır. 22-c kapsamında firmaya sözleşme davetinde bulunulmuştur.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090170	1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	10.000		500	0	% 0,0	İhalesi DASK tarafından, Teknik Koordinatörlüğü Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çalışmaları programa uygun olarak devam etmektedir
2014K090300	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi	2014-2015	3.400		1.500	0	% 0,0	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. İhale çalışmaları devam etmektedir.
2014K090310	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi	2014-2015	3.000		1.000	0	% 0,0	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. İhale çalışmaları devam etmektedir.
2014K090320	Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Projesi	2014-2015	3.000		2.000	0	% 0,0	Proje 16.06.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır. 3 adet iş ihale edilmiştir. Sözleşmeleri imzalanmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090160	Fiziksel ve Dijital Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Uygulaması (*) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	2.500		2.500	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2015	1.072	0	410	0	% 0,0	Proje değişikliği ve şartname değişikliği yapıldı. AB Bakanlığı ve Merkezi Finans İhale birimine ihalesinin yapılması için gönderildi.
AB KATKISI			9.648	0	4.824	0	% 0,0	
TOPLAM			36.522	200	17.910	1.154	% 6,4	
AB KATKISI			9.648	0	4.824	0	% 0,0	

(*) Proje ödeneği döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000150	Çevre Koruma-Planlama- Düzenleme-Altyapı-Uygulama (Turizm Sektörü)	2014-2014	10.500		10.500	400	% 3,8	Ödeneğin tamamı protokle bağlanmış olup, iş devam etmektedir.
2014F000300	Korunan Alanlarda Çevre-Cephe- Yol-Iskele-Kıyı Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2014-2016	4.000		500	0	% 0,0	İhale Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmış olup, ş devam etmektedir.
2014K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (İçme Suyu Sektörü)	2014-2014	3.769		3.769	189	% 5,0	Ödeneğin tamamı protokle bağlanmış olup, iş devam etmektedir.
2014K060400	Atıksu Yönetimi Hizmetleri Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2014-2014	6.620		6.620	0	% 0,0	Ödeneğin tamamı protokle bağlanmış olup, iş devam etmektedir.
2014K080010	Korunan Alanlarda Atık Yönetimi Hizmetleri (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2014-2014	1.000		1.000	0	% 0,0	Ödeneğin tamamı protokle bağlanmış olup, DMO'dan temin süreci devam etmektedir.
1992K090010	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	1992-2014	162	152	10	0	% 0,0	Plan İtirazları inceleme aşamasındadır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090090	Hali hazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2013-2014	1.250	500	750	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2014K090020	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	355		355	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2014K090030	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	800		800	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2014K090040	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	600		600	0	% 0,0	Ödeneğin tamamı protokle bağlanmış olup, iş devam etmektedir.
2010K100130	Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti-II (Çevre Sektörü)	2010-2014	1.042	900	142	0	% 0,0	Sözleşmesi 05.10.2012 tarihinde 470.820 TL bedelle imzalanan proje 2014 yılında tamamlanacaktır.
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2015	4.858	1.308	1.850	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2015	1.862	1.112	435	212	% 48,7	Projeler ihale edilmiştir.
	Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	590	495	55	37	% 67,3	Proje 53.100 TL'ye ihale edilmiştir. Kasım 2014'de tamamlanacaktır
	Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	190	95	55	37	% 67,3	Proje 53.100 TL'ye ihale edilmiştir. Kasım 2014'de tamamlanacaktır
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	240	145	55	37	% 67,3	Proje 53.100 TL'ye ihale edilmiştir. Kasım 2014'de tamamlanacaktır
	Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	233	143	55	38	% 69,1	Proje 53.690 TL'ye ihale edilmiştir. Kasım 2014'de tamamlanacaktır
	Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2011-2015	233	143	55	37	% 67,3	Proje 53.100 TL'ye ihale edilmiştir. Kasım 2014'de tamamlanacaktır
	Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi	2014-2014	55		55	26	% 47,3	Proje 52.510 TL'ye ihale edilmiştir. Kasım 2014'de tamamlanacaktır
	Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi	2013-2014	136	91	45	0	% 0,0	Sözleşmesi 2013 yılında 134.520 TL bedelle imzalanan proje Aralık 2014 yılında tamamlanacaktır.
	Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi	2014-2015	185		60	0	% 0,0	Proje 96.760 TL ye ihale edilmiştir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K100120	Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi (GEF) (Çevre Sektörü)	2009-2014	638	588	50	49	% 98,0	Proje tamamlanmıştır.
GEF Katkısı			3.103	2.837	266	266	% 100,0	
		TOPLAM	37.456	4.560	27.381	850	% 3,1	
		GEF KATKISI	3.103	2.837	266	266	% 100,0	

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2015	3.217	1.590	1.127	1.100	% 97,6	Proje kapsamında 3 ayrı hizmet alımı sözleşmesi yapılmış olup, projeler devam etmektedir. Ayrıca sözleşmelerin 2016 yılı ortasına kadar uzatılması öngörülmektedir.
AB KATKISI			18.231	9.017	6.381	0	% 0,0	
2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2009-2014	2.131	1.830	301	286	% 95,0	Proje kapsamında 2 ayrı hizmet alımı sözleşmesi yapılmış olup, projeler devam etmektedir. Ayrıca sözleşmelerin 2016 yılı ortasına kadar uzatılması öngörülmektedir.
AB KATKISI			14.753	13.061	1.692	0	% 0,0	
2009K100090	Çevre ve Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) Çevre Sektörü)	2009-2016	3.046	1.580	892	563	% 63,1	1 adet Daire Başkanlığının Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Teknik Destek hizmet alımı sözleşmesi devam etmekte olup, 2015 yılında sona erecektir. Proje kapsamında 20 adet uzman ve 1 adet asistan hizmet alımı bulunmakta olup, hizmet devam etmektedir. 1 adet proje için İletişim Eylem Planı Teknik Destek hizmeti alımı ilanı yayınlanmıştır. 1 adet yeni dönem Daire Başkanlığının Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Teknik Destek hizmet alımı şartname çalışması devam etmektedir.
AB KATKISI			17.258	8.558	5.054	0	% 0,0	
TOPLAM			8.394	5.000	2.320	1.949	% 84,0	
AB KATKISI			50.242	30.636	13.127	0	% 0,0	

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI**2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100020	Çevre Konusunda Bilinçlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2014	600		600	147	% 24,5	365000 adet Afiş bastırılması işi 148.489 TL (KDV Hariç) bedelle ihale edilmiştir
2014K090070	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	1.000		1.000	322	% 32,2	son iki toplatıya ait toplam 274.993 TL ödemede bulunulacaktır
TOPLAM			1.600	0	1.600	469	% 29,3	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2008K091080	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2008-2015	47.975	23.089	10.200	768	% 7,5	
	Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2013-2014	361	264	61	61	% 100,0	2013 yılında yapımına başlanan ek hizmet binası inşaatı 2014 yılı içerisinde tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2015	5.245	58	2.639	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 16.12.2013 tarihinde KDV dahil 5.244.443,92 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi yeni başlamıştır.
	Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.557	0	3.000	707	% 23,6	Hizmet binası yapım işi 30.10.2013 tarihinde KDV dahil 3.556.520,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir.
	Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	6.883	6	1.500	0	% 0,0	İhalesi 27.05.2014 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Sözleşmesi imzalanmıştır.
	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	3.516	0	1.500	0	% 0,0	İhalesi 28.05.2014 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Sözleşmesi imzalanmıştır.
	Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2015	5.693	0	1.500	0	% 0,0	İhalesi 04.06.2014 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Sözleşmesi imzalanmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090100	Hizmet Binaları İnşaatı-2 (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2015	24.581	0	10.900	410	% 3,8	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.923		2.500	367	% 14,7	Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde KDV dahil 2.922.860,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	7.749		1.200	19	% 1,6	İhale hazırlıkları tamamlandı, ilan aşamasında.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	4.764		1.200	24	% 2,0	İhalesi 04.07.2014 tarihinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılmış ve iptal edilmiştir. 2. ihale gerçekleştirilmiş olup, ihale komisyonu tarafından değerlendirme aşamasındadır.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	9.145		6.000	0	% 0,0	İhalesi 26.05.2014 tarihinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Sözleşmesi imzalanmıştır.
2014K090090	Hizmet Binası Etüd-Proje İşleri (Giresun-Kocaeli-Tokat- Kahramanmaraş-Ankara)	2014-2014	250	0	250	0	% 0,0	Proje 18.07.2014 tarihinde yatırım programına alınmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	9.802	0	9.802	3.404	% 34,7	
	Taşıtl Alımı	2014-2014	602		602	0	% 0,0	Taşıtl alınma yönelik 24.02.2014 tarihli ve 2014/6031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.06.2014 tarihinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 7 adet T8 (Pick-up) tipi araç alımı için 21 Temmuz 2014 tarihinde Devlet Malzeme Ofisine 552.000 TL tutarında kredi açılmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2014-2014	6.950		6.950	2.300	% 33,1	Hizmet binası onarımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 52 adet ihale talimatı gönderilmiştir. Ödeneğin tamamı talimata bağlanmıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2014-2014	2.250		2.250	1.104	% 49,1	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, 52 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne toplam 1.626.000 TL ödenek gönderilmiştir.
2014G000370	Lojman Onarımı (Konut Sektörü)	2014-2014	5.625		5.625	2.016	% 35,8	Lojman binası onarımı için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 42 adet ihale talimatı gönderilmiştir. Ödeneğin tamamı talimata bağlanmıştır.
TOPLAM			88.233	23.089	36.777	6.598	% 17,9	

"Muhtelif İşler" ve "Lojman Onarımı" projeleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı projeleri ile ortak projedir.

(3*) Proje maliyetinin 6.000.000 TL si döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır. Bu ödenek Diyarbakır Hizmet Binası için 2014 yılında kullanılacaktır. Toplama dahil edilmiştir.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	REVİZE 2014 YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2014 30.09.2014 ARASI HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090080	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2014-2014	350	0	350	192	% 54,9	
	Hizmet Binası Onarımı	2014-2014	250		250	192	% 76,8	Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Balgat ek hizmet binası giriş katı onarımı yaptırılmıştır Mekansal Planlama Gn Md Tadilat İşİ
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2014-2014	100		100	0	% 0,0	
2014G000370	Lojman Onarımı (Konut Sektörü)	2014-2014	300		300	61	% 20,3	Eryaman Aktürk Bloklarındaki Lojman onarımı Çukurca 2 Devlet Mah 10 Nolu daire tadilatları yaptırılmıştır Eryaman 4 Devlet Mah de bulunan 47/2-9-17 nolu kamu konutları tadilatları yaptırılmıştır
TOPLAM			650	0	650	253	% 38,9	

"Muhtelif İşler" ve "Lojman Onarımı" projeleri İl Müdürlükleri projeleri ile ortak projedir.

**2015 Yılı Bütçe Bilgileri
ve
01 Ocak 2014 – 30 Eylül 2014 Dönemi
Bütçe Gerçekleşme Raporu Sunumunu
Arz Ederim.**

Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkan V.
