

2016 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

3. Dönem Gerçekleşme Raporu

Strateji Geliştirme Başkanlığı


18.10.2016

BAKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2016 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	694.086.000,00	694.085.000,00	523.306.730,77	% 75,4
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	121.870.000,00	121.871.000,00	89.997.254,44	% 73,8
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.955.000,00	79.948.519,46	45.072.701,77	% 56,4
05	CARİ TRANSFERLER	373.407.000,00	373.407.000,00	109.742.688,27	% 29,4
06	SERMAYE GİDERLERİ	245.130.000,00	963.761.900,41	375.605.856,17	% 39,0
	Bakanlık Yatırım Programı	227.380.000,00	203.448.000,00	50.142.563,30	% 24,6
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	17.750.000,00	57.250.000,00	2.160.208,55	% 3,8
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	703.063.900,41	323.303.084,32	% 46,0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	148.507.000,00	150.678.000,00	42.279.912,77	% 28,1
	Bakanlık Yatırım Programı	34.876.000,00	37.047.000,00	1.323.813,41	% 3,6
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	113.631.000,00	113.631.000,00	40.956.099,36	% 36,0
08	BORÇ VERME	27.480.000,00	36.480.000,00	15.531.578,50	% 42,6
GENEL TOPLAM		1.686.435.000,00	2.420.231.419,87	1.201.536.722,69	% 49,6

BAKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

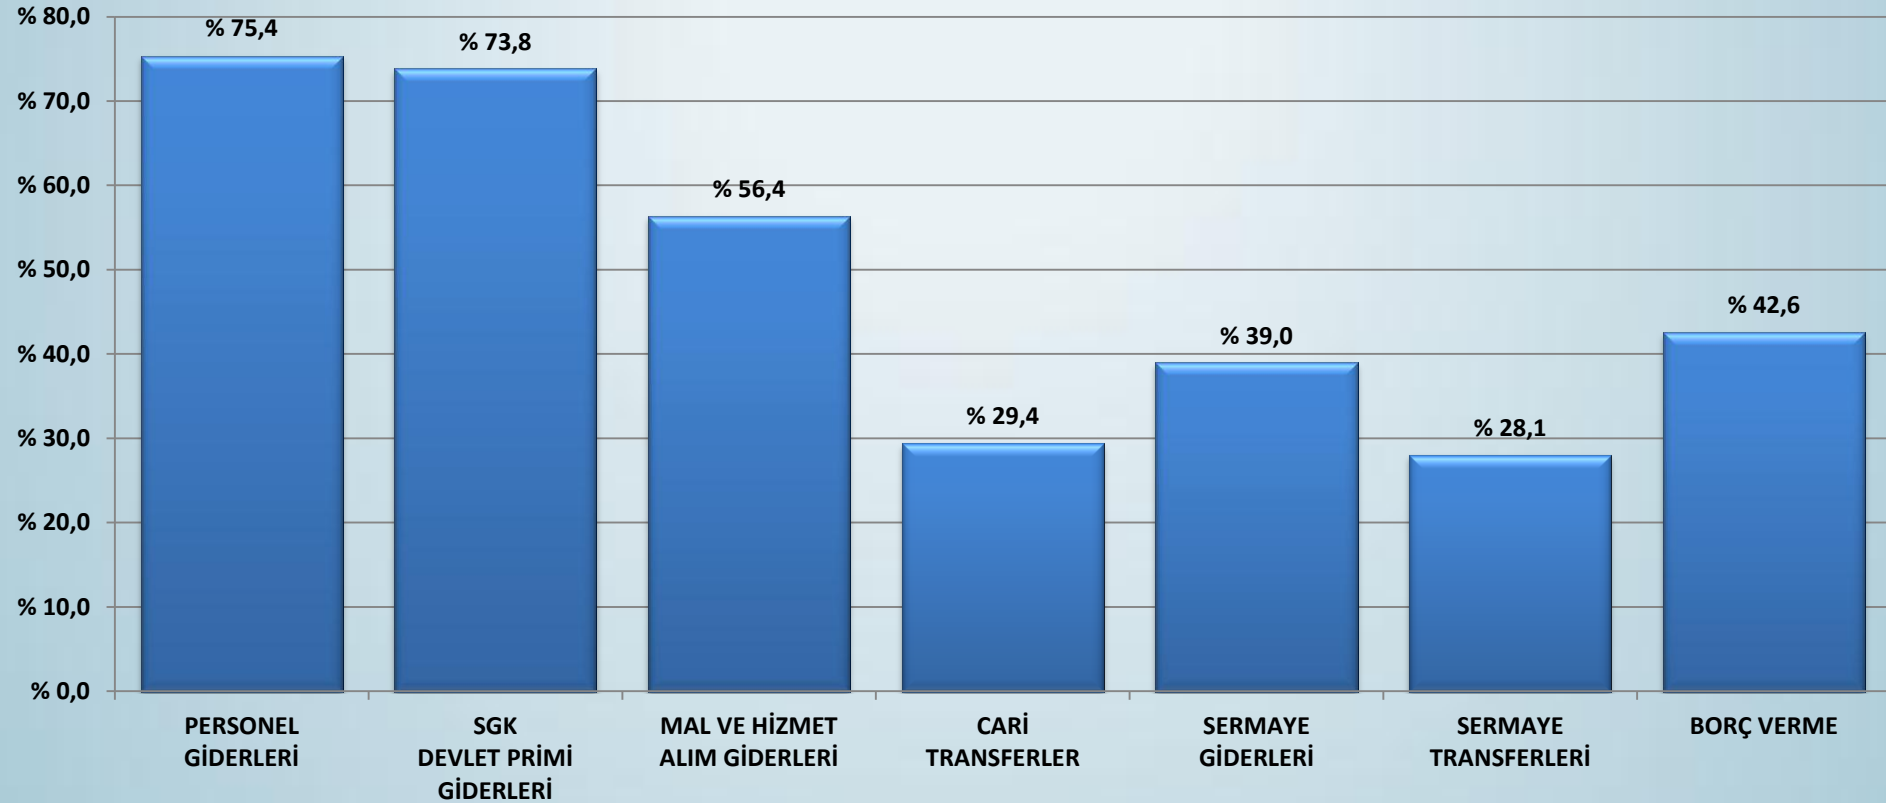

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	30.09.2016 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	28.757.000,00	29.911.106,00	13.993.317,42	% 46,8
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	198.376.000,00	199.205.000,00	55.996.171,51	% 28,1
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	42.530.000,00	44.441.000,00	28.372.082,23	% 63,8
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	157.578.000,00	220.412.359,67	67.008.777,83	% 30,4
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	321.125.000,00	321.125.000,00	109.324.741,96	% 34,0
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	21.628.000,00	21.628.000,00	10.189.812,24	% 47,1
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	35.998.000,00	38.310.877,86	11.884.062,65	% 31,0
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	79.372.000,00	64.325.677,79	11.456.671,31	% 17,8
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	9.249.000,00	9.219.000,00	5.878.842,64	% 63,8
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	12.843.000,00	10.852.800,00	3.128.378,62	% 28,8
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	1.291.000,00	1.291.000,00	1.392.250,10	% 107,8
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.984.000,00	4.168.600,00	2.821.343,05	% 67,7
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13.001.000,00	14.501.000,00	10.984.167,63	% 75,7
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6.097.000,00	6.451.000,00	2.178.405,56	% 33,8
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.225.000,00	4.125.000,00	950.325,34	% 23,0
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.024.000,00	4.024.000,00	2.960.726,84	% 73,6
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	33.461.000,00	33.461.000,00	22.079.470,74	% 66,0
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	811.000,00	811.000,00	537.353,32	% 66,3
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	29.429.000,00	29.409.500,00	18.395.162,34	% 62,5
İL MÜDÜRLÜKLERİ	682.656.000,00	1.362.614.498,55	822.004.659,36	% 60,3
TOPLAM	1.686.435.000,00	2.420.287.419,87	1.201.536.722,69	% 49,6

(*) Veriler e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2016 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2016 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	30 Eylül 2016		Gerçekleşme ORANI (%)
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	77.251.000,00	10.800.000,00	473.689,91	% 4,4
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	18	25.529.000,00	11.405.000,00	2.143.494,27	% 18,8
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	129.178.000,00	41.921.000,00	19.945.759,32	% 47,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	19	1.019.911.000,00	93.215.000,00	27.838.018,29	% 29,9
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn. Md. (DETAY)	5	19.200.000,00	7.050.000,00	1.054.300,00	% 15,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	43.448.000,00	10.038.000,00	1.408.198,21	% 14,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	15	54.655.000,00	26.600.000,00	4.342.818,19	% 16,3
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	11	123.687.000,00	36.359.000,00	2.039.014,38	% 5,6
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	16.219.000,00	4.323.000,00	0,00	% 0,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (DETAY)	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	8	167.260.000,00	74.992.000,00	16.672.164,64	% 22,2
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	3	4.150.000,00	1.650.000,00	628.746,48	% 38,1
Hukuk Müşavirliği (DETAY)	1	444.000,00	134.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	111	1.681.932.000,00	319.487.000,00	76.546.203,69	% 24,0
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	109	1.343.491.000,00	264.626.000,00	66.997.953,69	% 25,3
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	3	338.441.000,00	54.861.000,00	9.548.250,00	% 17,4

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2016 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

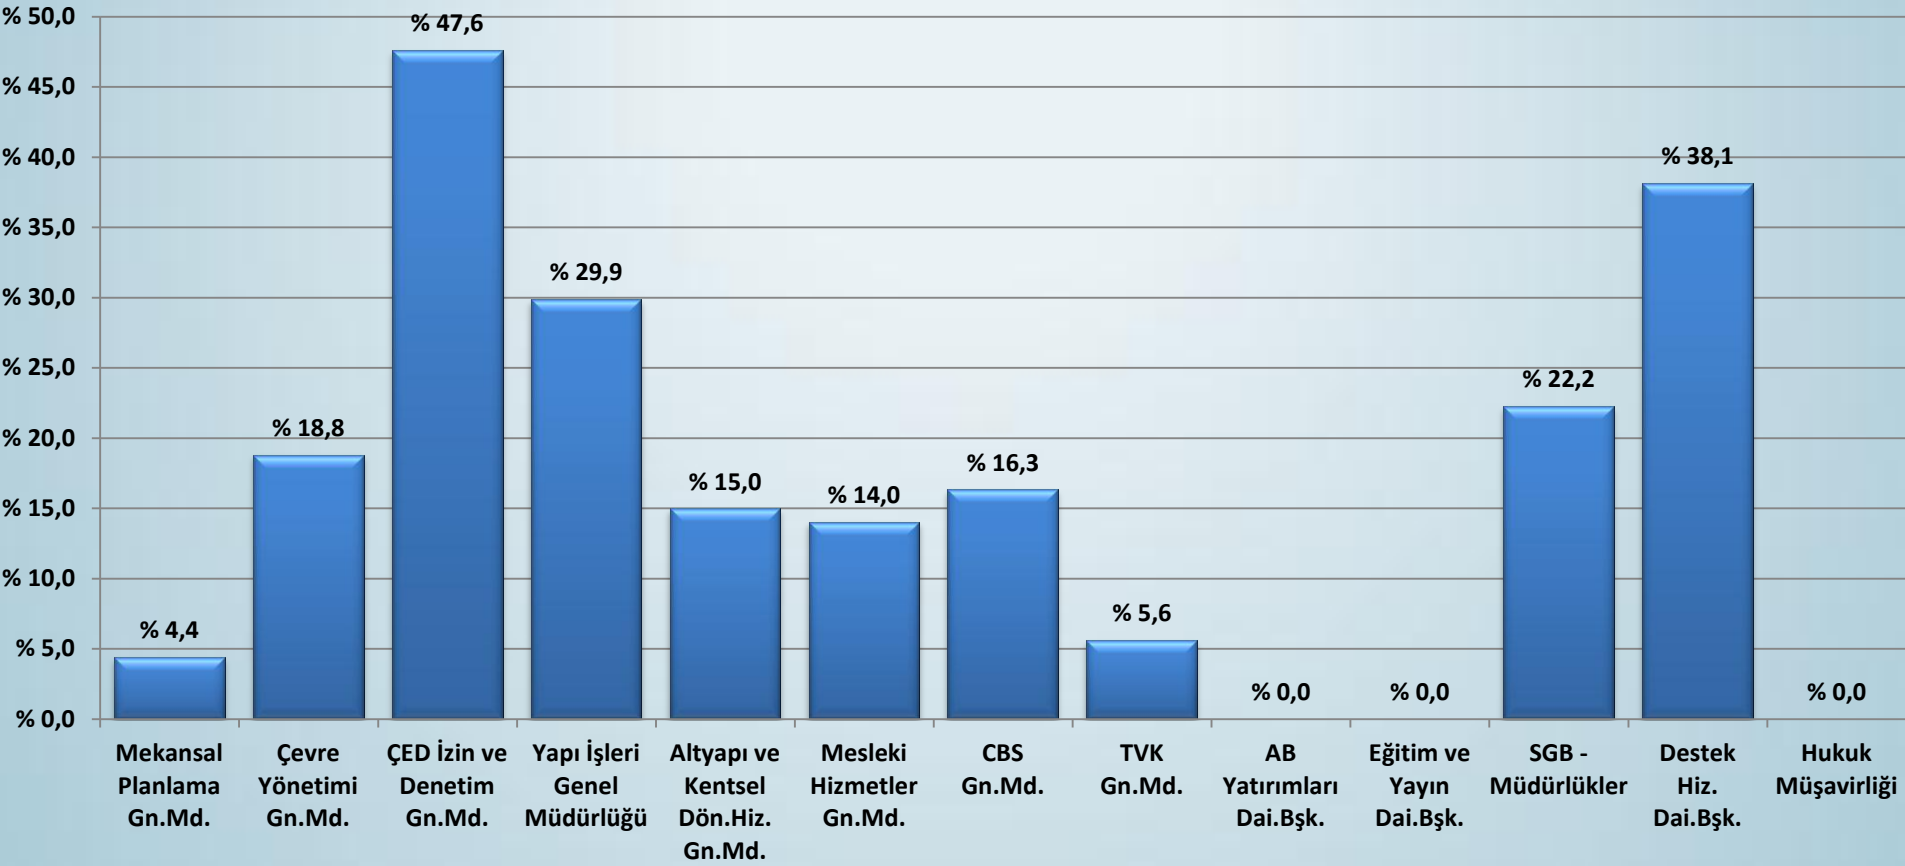

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	2.000	200	800	0	% 0,0	Daha önce iptal edilen ihale kapsamında elde edilen bir kısım çalışmalar Bakanlığımızca değerlendirilmiştir. 10/08/2016 tarihinde ihale yeniden yapılmış, ancak herhangi bir firmaya verilememiştir. Şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2012K090090	Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projeleri (Şehirleşme Sektörü)	2012-2016	60.426	58.291	2.135	0	% 0,0	Proje kapsamında bu yıl içerisinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
2015K090020	Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	1.150	50	1.100	474	% 43,1	Proje kapsamında 1. Aşamaya ilişkin rapor 18.04.2016 tarihinde kabul tutanağı düzenlenerek kabul edilmiştir. Projenin 2. Aşaması 23.08.2016 tarihinde kabul edilmiştir. Projenin 3. Aşaması kapsamında 28.09.2016 tarihinde Ankara'da çalıştay düzenlenmiştir. 3. Aşama 03.10.2016 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiş olup inceleme aşamasındadır. Gelinen durum itibarıyla, ilk 2 aşama sonucunda projenin toplam bedelinin %45'i ödenmiş olup, projede gelinen durumda ise işin %50'si tamamlanmış ve tarafımızca kabul edilmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında 2. aşama olarak 473.689 TL ödenmiştir.
2013K090030	Çevre Düzeni Planları (Şehirleşme Sektörü)	2013-2017	3.860	2.660	1.000	0	% 0,0	Kilis İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İşine ilişkin ihale süreci tamamlanmış ve 05.09.2016 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi ise 14.10.2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K090110	Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması İşi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2013-2017	2.915	50	1.265	0	% 0,0	İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmekte iken, söz konusu ihale iptal edilmiş olup, şu aşamada AR-GE projesi kapsamında protokol/şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2014K090060	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2014-2017	2.000	200	1.000	0	% 0,0	Eylül ayı başı itibariyle Balıkesir-Çanakkale ve Aydın-Muğla Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarının ihale süreçleri tamamlanmış olup sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır.
2015K090010	Özel Proje Alanları (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	2.900	100	2.000	0	% 0,0	Proje kapsamında bu yıl içerisinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
2016K090020	GAP ve KOP İleri Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	2.000		1.500	0	% 0,0	GAP ve KOP Bölgesinde Örnek İmar Uygulamalarının Yapılması Projesi" adı ile çalışmalarımız Nisan ayı itibariyle başlamış olup, proje teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyet çalışmaları bitirilerek ihale süreçleri tamamlanmıştır. Yüklenici firmalar ilgili alanlarda çalışmalara başlamış ve Tapu Müdürlüklerinden ve Kadastro Müdürlüklerinden alanlara ilişkin mülkiyet bilgilerini toplanmıştır. İlgili Belediyelerden ise İmar planları alınmıştır. Bakanlığımız tarafından 29-30 Eylül 2016 tarihinde Karaman İli Ermenek İlçesinde ve 06-07 Ekim 2016 tarihinde ise Adıyaman İlinde proje açılış toplantıları gerçekleştirilmiştir. Konya Meram İmar Uygulama projesinin ihalesisonuçlanmış olup, sözleşme aşamasındadır.
8 Proje		06 ve 07 TOPLAM	77.251	61.551	10.800	474	% 4,4	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K060210	Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi (Kanalizasyon Sektörü)	2015-2017	3.000	1.600	1.395	797	% 57,1	Proje TÜBİTAK ile 09.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak başlanmış olup, projenin 2015 yılında tamamlanamayacağı öngörüldüğünden proje 2017 yılına uzatılmıştır. 2016 yılı ödeneği aynı kalmak koşuluyla 1.400 TL (KDV dahil) ve 2017 yılı bütçesine 1.300 TL (KDV dahil) aktarılmıştır. Projeye ait Başlangıç raporuna projenin 2015 yılı bütçesinden (1.600 TL) aktarılan 300 TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır. Proje ait 1. Ara Rapor 06.04.2016 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup, 796.500 TL ödeme yapılmıştır. 02.11.2016 tarihinde 2. Ara Raporun Bakanlığımıza sunulması beklenmekte olup, raporun kabulüne müteakip 1.300 TL (KDV Hariç) ödeme yapılacaktır.
2016K060210	Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2017	3.000		300	0	% 0,0	28.07.2016 tarihinde imzalanan Protokol ile proje başlamıştır. Başlangıç Raporu Bakanlığımıza sunulmuş olup, değerlendirilmektedir. Başlangıç raporunun kabulüne müteakip Birinci Ara Ödemesi yapılacaktır.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2017	2.000		445	0	% 0,0	ODTÜ ile yapılacak Protokol imzalanma aşamasına gelmiştir.
2015K080010	Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Bölgesel Bazda Belirlenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2017	1.500	0	1.247	0	% 0,0	TÜBİTAK ile 3/e kapsamında 09.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje çalışmalarına başlanılmıştır. II. ve III. İlerleme raporu ile Ara raporu sunulmuş olup eksiklik bildirilmiştir.
2015K080020	Düzensiz Depolama Sahalarının Rehabilitasyonuna Yönelik Envanter Çalışması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2017	3.000	0	2.366	0	% 0,0	Satın alma komisyonu oluşturulmuş, Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım konulu 2014/6228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 05.10.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Proje çalışmalarına başlanılmıştır. I. İlerleme Raporu 10/12/2015 tarihinde teslim edilmiş ve kabul edilmiş eksiklik bildirilmiştir. II. İlerleme raporu, III. İlerleme raporu sunulmuş olup eksiklik bildirilmiştir.
2015K080030	Katı Atık Ana Planının Güncellenmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2015-2017	2.000	0	1.887	0	% 0,0	TUBİTAK ile 3/e kapsamında 09.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje çalışmalarına başlanılmış olup I'inci İlerleme Raporu onaylanmıştır. II. ve III. İlerleme raporu sunulmuş olup eksiklik bildirilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100130	Entegre Çevre İznine Tabi Tesislerin Değerlendirilmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	1.933	0	560	260	% 46,4	
	Çimento Tesisleri	2014-2017	933	0	40	0	% 0,0	İstanbul Teknik Üniversitesi ile 30.09.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve ilk ödeme olan 468,400 TL Aralık 2015 te ödenmiştir. Proje halen devam etmekte olup İkinci ve son ödeme Final Raporu'nun sunulması ve onaylanmasını müteakip yapılacaktır.
	Otomotiv Tesisleri	2015-2017	1.000	0	520	260	% 50,0	Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 12.10.2015 tarihinde protokol imzalanarak proje başlamıştır. Başlangıç raporu teslim edilerek uygun bulunmuş ve ilk ödeme olan 460,200 TL Aralık 2015 te ödenmiştir. Saha Ziyaretleri Plan Raporunun sunulması ve onaylanmasını müteakip Şubat 2016'da 259,600 TL ödeme yapılmıştır. Son ödeme, Final Raporu'nun sunulması ve onaylanmasını müteakip yapılacak olup Aralık 2016 da proje tamamlanacaktır.
2013K100170	Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2016	1.944	1.310	634	0	% 0,0	Proje için 2015 yılı için ayrılmış olan bütçe 1.434.000 TL olup, 2015 yılı içerisinde projeye ait 1. ve 2. ilerleme raporuna toplam 800.000 TL ödeme yapılmıştır. Projenin 2015 yılında tamamlanamayacağı öngörüldüğünden projenin süresi Haziran 2016 yılına uzatılmıştır. Bu kapsamda, 2015 Aralık'ta ödenmesi planlanan 634.000 TL, 2016 yılı bütçesine aktarılmıştır. Projeye ait Taslak Nihai Rapor 21.06.2016 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup, raporun incelenmesi tamamlandıktan sonra 634.000 TL yükleniciye ödeme yapılacaktır.
2015K100050	İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2017	4.000	0	2.110	957	% 45,4	Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 12.10.2015 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yüklenici tarafından projeye ilişkin başlangıç raporu, 11.11.2015 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup bunun üzerine Yükleniciye 2015 yılında proje bütçesinin % 10'u oranında (383.500 TL) ödeme yapılmıştır. 2016 yılında ise proje ilişkin birinci ara rapor 7 Nisan 2016 tarihinde sunulmuştur. Bakanlığımızca yapılan muayene ve kontroller sonucunda tespit edilen eksikliklerin Yüklenici tarafından giderilmesi ile birinci ara rapor nihai olarak Bakanlığımıza 17.06.2016 tarihinde tekrar sunulmuştur. Bunun üzerine, Yükleniciye proje bütçesinin % 25'i oranında (gecikme cezalı olarak 902.687,50 TL) ödeme yapılmıştır.
2016K100040	Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2017	600		300	0	% 0,0	13 Haziran 2016 tarihi itibari ile projenin sözleşmesi imzalanmış olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Proje 2 yıl sürecek olup, 01.01.2016-30.09.2016 döneminde Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (4*) (Çevre Sektörü)	2016-2017	2		1	0	% 0,0	Projenin başlatılmasına yönelik olarak, ilgili kurumlarla imzalanmak üzere protokoller hazırlanmış ve gönderilmiştir. İmzadan gelen protokoller Kalkınma Bakanlığına iletildikten sonra proje tutarı ve ödenek revize edilecektir.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2018	2.800		1.000	0	% 0,0	Proje 2016 yılı programına alınmış olup, henüz teknik şartname hazırlanma ve ihale aşamasındadır.
2013K100090	Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	900	345	555	0	% 0,0	2013K100090 Nolu 'Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesinin' genel amacı, sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve raporlanması ile ilgili tespit edilen boşlukların giderilmesi, Ulusal Sera Gazı Envanterinin, sera gazı projeksiyonlarının ve iklim değişikliği ulusal bildirimlerinin hazırlanması konusunda teknik düzeyde kapasitenin artırılması olup, bu dönemde proje kapsamında kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları ve saha ziyaretleri devam etmiştir. Proje Nisan 2017 tarihinde bitecektir.
AB KATKISI			8.100	3.645	4.455	0	% 0,0	
2013K100180	Büyük Yakma Tesisleri (LCP) Direktifi'nin Uygulanması İle Daha İyi Hava Kalitesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2016	300	150	150	129	% 86,0	22 Temmuz 2016 tarihinde proje tamamlanmış olup Merkezi İhale Kurumundan ödeme emri geldiğinde son ödeme yapılacaktır.
AB KATKISI			2.700	1.350	1.350	1.200	% 88,9	
2014K100090	Gemi Kaynaklı Atıkların Oluşturduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	750	585	165	0	% 0,0	Proje 12 Mart 2015 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje süresi 2 yıl olup; 01.01.2016-30.09.2016 döneminde Hazine Müsteşarlığı'ndan harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.
AB KATKISI			6.750	3.375	3.375	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100080	Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi (IPA) (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2017	750	0	300	0	% 0,0	Proje kapsamında Türkiye'nin katkısı proje başlangıcında ödenmiş olup, firmaya ödemeler CFCU aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Firmaya proje başlangıcında 900,000 € ödeme yapılmıştır.
AB KATKISI			6.750	0	3.375	0	% 0,0	
2015K100060	Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	750	0	10	0	% 0,0	01.01.2016-30.06.2016 döneminde Hazine Müsteşarlığından harcama talebi olmadığından, herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir.
AB KATKISI			6.750	0	2.700	0	% 0,0	
2015K100150	Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	300	120	90	0	% 0,0	Proje 5 Kasım 2016 tarihinde başlamış olup, açılış toplantısı 16 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin süresi 24 aydır. Proje kapsamında Ekim 2016 tarihine kadar 4 eğitim, 1 çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş olup, projeye ilişkin websitesi, düzenleyici etki analizi, yasal boşluk analizi çalışmaları başlatılmış ve devam etmektedir.
AB KATKISI			2.700	675	1.350	0	% 0,0	
18 Proje		06 ve 07 TOPLAM	25.529	4.110	11.405	2.143	% 18,8	
		AB KATKISI	33.750	9.045	16.605	1.200	% 7,2	

(4*) Projenin ilgili kurumlarla mutabakat halinde teklifini müteakip proje tutarı ve ödeneği revize edilecektir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100290	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-1 (Çevre Sektörü)	2011-2016	7.420	3.420	4.000	945	% 23,6	
	Samsun Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2016	5.720	1.720	4.000	945	% 23,6	Samsun THM bina inşaatının 2016 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
	Erzurum Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2011-2015	1.700	1.700	0			Erzurum THM bina inşaatı tamamlanmıştır.
2012K100120	Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Çevre Sektörü)	2012-2016	22.156	9.333	13.700	6.629	% 48,4	
	Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	4.156	4.156	900	0		Konya THM bina inşaatı tamamlanmıştır.
	İzmir Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	6.140	1.140	5.000	4.033	% 80,7	İzmir THM bina inşaatının 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
	Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2016	7.823	0	7.800	2.596	% 33,3	Diyarbakır THM bina inşaatının 2016 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
	Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı	2012-2015	4.037	4.037	0			Adana THM bina inşaatı tamamlanmıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100020	Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi (Çevre Sektörü)	2015-2016	1.500	600	900	0	% 0,0	Her bir deniz için kılavuz dokümanları, final raporu, strateji belgesi hazırlanacaktır. Aralık sonu itibarıyla proje geniş katımlı kapanış toplantısı ile kapatılacaktır. Yüklenicinin Aralık ayında Muayene ve Kabul işlemleri yapılacak olup; proje bedelinin % 60' lık kısmının (897.744 TL-KDV hariç) ödemesi gerçekleştirilecektir.
2010K100030	Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2010-2017	9.556	6.974	1.814	517	% 28,5	Konya Ön değerlendirme projesi kapsamında 4. ara rapor ve final raporunun hakedişi yapılmıştır. (124.950+333.200) Adana Ön Değerlendirme projesinin de 4. ara rapor ve final raporunun hakedişi yapılmıştır. (85.500+228.000)
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu	2015-2017	3.000	0	1.000	0	% 0,0	Projenin İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmesine yönelik protokol hazırlanmış olup, Strateji Geliştirme Başkanlığına görüşe gönderilmiştir. Aralık ayında Muayene ve Kabul işlemleri yapılacak olup; proje bedelinin 2016 yılı harcama bedeli olan 1.000.000 TL'nin ödemesi gerçekleştirilecektir.
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	29.840	8.800	4.540	2.104	% 46,3	Bakım-Onarım projesi hakedişlerinde en son Temmuz ayının hakedişi yapılmıştır. Geriye 6 ay daha yapılacak hakediş bulunmaktadır. 2016 yılı ödeneğinde MTHM'inde bakım onarım kalibrasyon işi de bulunmaktadır. (Toplam 936.000 ödenek gönderilmiş olup 623.984 TL.harcanmıştır.)
	Döner Sermaye	2015-2019	54.866	4.565	15.661	9.548	% 61,0	Erzurum merkezli olmak üzere Erzurum Temiz Hava Merkezine bağlı 11 ilde toplam 16 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurulmuştur. İzmir merkezli olmak üzere İzmir Temiz Hava Merkezine bağlı 6 ilde toplam 39 adet istasyon kurulacaktır. Ancak İzmir THM'de 1.kısım olan 19 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100070	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2014-2016	345	138	207	202	% 97,6	SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi 12 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla başlamış olup, 2016 Mayıs itibarı ile tamamlanmıştır. Proje çerçevesinde 4 sektörde (Enerji, Su Yönetimi, Tarım, Bölgesel Kalkınma) SÇD Raporu ve SÇD Rehberleri hazırlanmış olup, Taslak SÇD Yönetmeliği revize edilmiştir. Kurumsal kapasite geliştirilmesi faaliyetleri çerçevesinde 1000 kişiye SÇD eğitimi verilmiştir. Projenin Teknik Şartnamesinde yer alan tüm faaliyetler gerçekleştirilmiş olup proje tamamlanmıştır. Proje çerçevesinde 2016 yılı için Bakanlığımızca (62,900 Avro) ulusal katkı payı ödenmiştir.
AB KATKISI			3.105	2.251	854	845	% 98,9	
2016K100080	Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2016-2017	495		99	0	% 0,0	Projenin ihale değerlendirme süreci 23.08.2016 tarihinde başlamış olup, ÇED Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilen Komisyon tarafından çalışmalar tamamlanmıştır. Raporun AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmasını müteakip sözleşme imzalanarak projenin uygulanmasına başlanacaktır.
AB KATKISI			2.805		561	0	% 0,0	
8 Proje		06 ve 07 TOPLAM	74.312	29.265	18.560	10.397	% 56,0	
		DÖNER SERMAYE	54.866	4.565	23.361	9.548	% 40,9	
		GENEL TOPLAM	129.178	33.830	41.921	19.945	% 47,6	
		AB KATKISI	5.910	2.251	1.415	845	% 59,7	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binası İnşaatı (Döner Sermaye)	2010-2016	197.000	192.000	5.000	0	% 0,0	Kesin kabul aşamasındadır.
	Bakanlık Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler (Döner Sermaye)	2014-2016	38.405	37.405	1.000	0	% 0,0	Kesin kabul aşamasındadır.
2010K010070	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	2.500	920	1.000	69	% 6,9	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 26-28 Mayıs tarihinde Merkez ve Taşra Teşkilatından 350 personelimizin katılımı ile hazırlanan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları eğitimi yapılmıştır. Bu kapsamda eğitim değerlendirme raporu kitapçığı hazırlanmıştır ve eğitim değerlendirmesi yapılmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesine dokümanlar kamuya açık olarak eklenmiş, yazılım için deneme süreci tamamlanmak üzere. "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları"nın mevzuat düzenlemesi (genelge vb...) ve yayımlanması için hazırlıklar devam etmektedir.
2010K010090	Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü)	2010-2018	3.600	1.600	1.300	510	% 39,2	Bakanlığımızca, 2016 yılı içerisinde "4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları Eğitimi" adı altında eğitimin düzenlenmesi planlanmaktadır.
2012K010460	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	3.500	927	1.100	89	% 8,1	Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme Ve Geliştirilmesi İşi ihalesi 25.01.2016 tarihinde yapılmış olup, 165.000,00 TL+KDV bedelli sözleşme 29.01.2016 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda, Yapı Denetim Sisteminin bakım, destek ve iyileştirmesine ilişkin süreç devam etmektedir. Ayrıca YDS-2 Sistemi'nin ihalesi yapılmış olup, 425.000,00 TL+KDV bedelli sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve pilot illerde uygulama aşamasındadır. Ayrıca mevcut yazılım bakımının ve yeni yazılım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2012K010470	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (Genel İdare Sektörü)	2012-2017	1.300	498	400	107	% 26,8	Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve İskan Dairesi Başkanlığı yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Afetler Sektörü)	2015-2016	2.000	1.000	1.000	0	% 0,0	Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Hasar Tespit Hizmetinde görev yapacak personellere, görev sırasında kullanılmak üzere 650 adet Afet Müdahale Çantasının temini amacıyla ihale çalışmaları başlatılmıştır.
2016K140120	Afet ve Acil Durum Müdahale Aracı Alımı (Afetler Sektörü)	2016-2016	1.400		1.400	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığında bütçesi onaylanmış olan 18 adet (15 Taşra, 3 merkez) kapalı kasa 4x4 arazi aracı alımının yapılması planlanmış olup, Devlet Malzeme Ofisi ile yapılan çalışmalarda kabul aşamasına gelinmiştir.
2006K070010	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2006-2018	6.030	2.700	1.500	227	% 15,1	Gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2017	24.776	11.966	2.065	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2016	5.576	3.513	2.063	0	% 0,0	1. kısım tamamlandı. Güçlendirme ihalesi yapılacak.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2017	10.477	3.389	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2017	8.723	5.064	1	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor.
2009K070020	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2009-2018	149.724	0	7.419	0	% 0,0	
	Hasankeyf-İhsu Barajı İskanı	2009-2018	59.559	0	2	0	% 0,0	İhsu Barajı İskanı için iskan duyurusuna çıkılmış olup başvurular alınmıştır. İncelemeye geçilmiştir.
	Yusufeli -Yusufeli Barajı İskanı	2009-2018	90.165	0	7.417	0	% 0,0	Yusufeli Barajında hak sahipliği başvuruları alınmış olup inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2018	10.500	2.533	3.000	0	% 0,0	İş devam ediyor. (Kütahya-Kureşler köyü ve Erzurum-Taşagül köylerinin altyapıları için kullanılacaktır.)
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	5.400	1.800	1.500	253	% 16,9	Şanlıurfa, Denizli, Muğla, Uşak, Erzurum, Kars, Iğdır, Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerine ait projeleri kapsayan 2. kitap çalışmaları devam etmektedir.. (51 tip konut projesi, 10 tip köy konağı projesi) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Konya, Karaman, Aksaray illerine ait projelerin elde edilme süreci devam etmektedir. (39 tip konut, 9 tip köy konağı) Adana, İçel, Hatay, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Bingöl, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt illerine ait projeler için ihale çalışmaları devam etmektedir. (35 tip konut, 5 tip köy konağı)
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2018	3.340	1.826	500	0	% 0,0	Gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2017	214.620	115.700	2.920	2.507	% 85,9	
	Gördes-Gördes Barajı İskanı	2013-2016	6.618	3.700	2.918	2.507	% 85,9	27 konut ve alt yapı inşaatı işleri tamamlanmış olup dağıtım aşamasına gelmiştir.
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2017	208.002	112.000	2	0	% 0,0	Üst yapı işi tamamlandı. Tarımsal arazilerin ihalesi 30 Martta yapılmış olup ihalenin sonuçlanmasını müteakip yer teslimi yapılacaktır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	3.165	1.000	550	0	% 0,0	Yıl içerisinde 1 adet eğitim yapılması planlanmakta olup, yıl sonuna doğru gerçekleşmesi planlanmaktadır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2019	125.801		12.581	0	% 0,0	İş ihale aşamasındadır. 29.09.2016 tarihli Bakan Oluruya için 2016 Yılı Yatırım Ödeneği artırılmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2011-2018	118.650	84.000	30.430	15.532	% 51,0	Yatırım Programında yer alan toplam 90 adet köyde işler süratle devam etmektedir. 7 adet köy Ağustos ayında yatırım programına alınmış olup, konut edindirme çalışmaları devam etmektedir.
	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (06.5-Ödeneği)		43.000	0	12.500	8.544	% 68,4	Kırsal dönüşüm projelerinden ihaleli olarak yapılacak olan projelerdir. 3 köyde çalışmalar devam etmekte olup bunlar; Kırsal Dönüşüm kapsamında; 1-Kütahya-Arslanapa İlçesi-Kureysler köyü (30 hak sahibi) 2-Kahramanmaraş-Göksu İlçesi-Güçüksu köyü (76 hak sahibi) 3- Karaman-Merkez-Güldere Köyü (73 hak sahibi) Kütahya- Arslanapa-Kureysler köyünde altyapı ve üstyapı proje çalışmaları tamamlanmıştır. İşin ihalesi yapılmış olup yer teslimi yapılarak inşaatlara başlanmıştır. Kahramanmaraşta ise yer teslimi yapılmış olup işler devam etmektedir.
2011K070050 (**)	<i>Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2011-2018	5.200	2.800	50	0	% 0,0	İşler devam etmektedir.
2011K070020 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2016-2020	60.000		6.000	0	% 0,0	İşler devam etmektedir.
19 Proje		06 ve 07 TOPLAM	600.656	142.470	50.735	12.306	% 24,3	
		08 TOPLAM	183.850	86.800	36.480	15.532	% 42,6	
		DÖNER SERMAYE	235.405	229.405	6.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	1.019.911	458.675	93.215	27.838	% 29,9	

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe İleri ve Yenilikçi Malzeme Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	3.000		300		% 0,0	Bu iki proje, "Kentsel Dönüşümün Sürdürülebilirliğini Artıracak Teknolojilerin Geliştirilmesi" adı altında birleştirilmiş ve 4734 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında harcanması üzere protokolü hazırlanmıştır. Ancak protokol, taraf olan Üniversitesi ile henüz imzalanamamıştır. 2017 yılı içerisinde protokol tekrardan ele alınacaktır.
2016K010110	Altyapı Tesisleri Yapımında Kullanılan Yapı Malzemelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	3.500		350		% 0,0	
2013K080040	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2013-2016	6.200	4.400	1.800		% 0,0	Gazi Üniversitesi ile 19.03.2015 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde 4. Aşama ara raporu tamamlanmıştır.
2015K090050	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.500	0	3.000	454	% 15,1	Bu projenin ihalesi gerçekleştirilmiş ve proje başlatılmış olup projenin ilk aşaması tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Projenin genişletilerek 2017 yılına sarkması gereği hâsıl olmuştur.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2016	3.000	1.400	1.600	600	% 37,5	Bu proje kapsamında yazılım tasarımına ilişkin esaslar raporlanmıştır. Yazılımın oluşturulmasında kullanılacak metodoloji ve adımlar, iş akış planı olarak sunulmuştur. Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda belirtilen hesap kuralları ve risk değerlendirme yöntemi ile uyumlu bir yapısal analiz programının oluşturulma safhaları devam etmektedir. İş paketlerikapsamında yazılıma yönelik algoritma oluşturulması, gelişmelerin raporlanması ve arayüz programının oluşturulması devam etmektedir.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	19.200	5.800	7.050	1.054	% 15,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015D000020	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması - İpa 2011 (AB) (Enerji Sektörü)	2015-2016	1.001	600	401	35	% 8,7	Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi 2017 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanacak olup; talep edilmesi halinde aktarılabilecek 361.000 TL tutarında ödenek bulunmaktadır.
AB KATKISI	9.000		5.400	3.600		% 0,0		
2012D100020	Yeşil Bina ve Binalarda Enerji Performansı Yazılımları (Enerji Sektörü)	2012-2018	4.033	1.798	1.480	100	% 6,8	<p>* Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-Tr) Projesi 2015-2016 Yılları Bakım,Onarım, Güncelleme, İyileştirme ve Destek Hizmetleri Alımı İşleri için yılın ilk 9 ayında 3 adet hakediş ödemesi yapılmıştır.</p> <p>* Sürdürülebilir Yeşil Bina İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine İlişkin Temel Değerlendirme Kılavuzu Ve Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi Yazılımına Hazırlık Projesi kapsamında 21.09.2016 tarihinde işin % 30'luk kısmını kapsayan 1. etap işlerinin bitirildiğine dair tutanak hazırlanmıştır.</p> <p>* Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) İkinci Versiyon Projesi Yazılım Hizmet Alımı İşleri kabul işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kabul işleminin tamamlanmasına müteakip hakediş düzenlenecektir.</p>
2012D100030	Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları (Enerji Sektörü)	2012-2017	2.450	2.200	200	88	% 44,0	<p>* Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere Termal Görüntüleme Cihazı ile "U" Değeri Ölçüm Cihazı temin edilmiştir.</p> <p>* Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında 08/03/2016 tarihinde ve 21/04/2016 tarihinde Almanya'da gerçekleştirilen konferans ve atölye çalışmasına katılım sağlanmış, 27/04/2016 tarihinde İtalya'ya Teknik Gezi düzenlenmiştir.</p> <p>* Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi dahilinde 6-11 Kasım 2016 tarihlerinde İngiltere'ye 15 kişinin iştirak edeceği Teknik Gezi düzenlenmesi, 9 kişiyle Uluslararası konferanslara katılım sağlanması, yurtiçinde çeşitli görevlerde bulunulması planlanmaktadır.</p>
2013G000520	Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-Kooperatif) (Konut Sektörü)	2013-2017	810	390	150	36	% 24,0	Proje kapsamında bakım, onarım, güncelleme, iyileştirme ve destek çalışmaları devam etmekte olup, yüklenici firmaya 1,2 ve 3 nolu hakedişleri ödenmiştir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2017	13.894	10.694	1.400	336	% 24,0	Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi yazılımının bakım ve onarımı işi hak ediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Nisan 2016 tarihinde PGD Elemanları İleri ve Temel seviye eğitimi kapsamında organizasyon ve yolluk ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmıştır. Mayıs ayı içerisinde İstanbul'da gerçekleştirilen Yapı Fuarına katılım ile merkez birim Denetim Elemanları PGD faaliyetleri yollukları ödenmiştir. (PGD Arazi araçları DMO ile görüşülmüş 10 adet araç alımı yapılacaktır. Ekim ve kasım aylarında yapı fuarlarına katılım sağlanacaktır. Yılı sonu değerlendirme toplantısı yapılacak olup, burada kullanılacak eğitim dokümanları. Broşür vb basımı gerçekleştirilecektir.)
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	4.270	700	1.500	57	% 3,8	Proje ile, Edirne ve Antalya İl Müdürlüklerimize bağlı laboratuvarlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınması uygun görülen, 200 ton kapasiteli servo kontrollü beton test preslerinin alım işleri gerçekleştirilerek, ihaleyi alan firmalarca Edirne ve Antalya İl Müdürlüklerimize teslimatları sağlanmıştır.
2015K010070	Yerleşme ve Yapılaşmaya Yönelik Mevzuatın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	1.250	250	500	9	% 1,8	Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağının hazırlanmasına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun öneri ve değerlendirmelerinin neticesinde yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağı hazırlanmıştır.
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2017	4.900	150	1.127	230	% 20,4	Proje kapsamında 81 il müdürlüğüne ustalık eğitimi tanıtım harcamaları için 429.000,00 TL ödenek aktarımı yapıldı.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	4.800	830	1.000	112	% 11,2	1) İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmekte olan "Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması İş Protokolü" tamamlanmış olup "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik" 04.02.2016 tarihli ve 29614 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmıştır. 2) Niğde Üniversitesi ile yürütülen "Doğal Kayaların Oyumlasta Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapıların Projelendirme Tasarım ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" kapsamında hazırlanan Yönetmelik taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine 02.03.2016 tarihinde gönderilmiş olup toplanan görüşler ilgili Üniversitemin değerlendirmesinden geçmiştir. Yönetmelik hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 3) İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 27.05.2016 tarihinde imzalanan "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Kapsamında Uygulama Kılavuzu Hazırlanması Projesi" hizmet uygulaması protokolü kapsamında elde edilecek Uygulama Kılavuzunun Bakanlığımızca basılı ve dijital olarak çoğaltılması ve dağıtılması ile birlikte Bakanlığımız ve diğer kamu kurumlarında çalışan teknik personeller ve çelik yapıların tasarım, yapım ve denetim alanlarını da kapsayan tüm sektör çalışanlarına kaynak Kılavuz oluşturulacaktır. Protokol devam etmektedir. 4) "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik" in sektördeki tüm paydaşlara aktarılması için Genel Müdürlüğümüz ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 5) Yılsonuna kadar kurulması planlanan "Yapı Araştırma Merkezi" nin hukuki altyapısı ile organizasyonel yapı ve çalışma usullerinin yurt dışındaki benzer örnekleri incelenerek belirlenmesi planlanmaktadır. Hazırlanacak olan "Yapı Araştırma Merkezi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" nin idarenin görüşüne sunulması planlanmaktadır. 6) "Kayadan Oyma Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği" nin 2016 yılının 2. yarısında yayımlanması planlanmaktadır. 7) 2016 yılının 2. yarısında Bakanlığımızın planlı eğitimleri kapsamında 01-04 Kasım 2016 tarihlerinde II müdürlüklerinde görevli teknik personele Yapı Sistemleri Mevzuatı Eğitimi verilmesi planlanmaktadır. 8) 2016 yılının 2. yarısında "Binalarda Su Yalıtımı Uygulama Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" imzalanması planlanmaktadır. 9) 2016 yılının 2. yarısında "Ahşap Yapıların Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü" imzalanması planlanmaktadır. 10) 2016 yılının 2. yarısında "Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Kapsamında Uygulama Kılavuzu Hazırlanması Projesi" hizmet uygulaması protokolünün yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2015K010100	Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri Fenni Mesul ve Yapı Belgeleri Takip Sistemi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	2.000	250	550	0	% 0,0	Şartname hazırlanmıştır.
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Arttırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	450		150	3	% 2,0	Konu ile ilgili olarak yolluk ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2016K010080	Yapı Mütcahhtiliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Bakım ve İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2017	600		250	220	% 88,0	Yambis yazılımı ve Şantiye şefi biçim sistemi yazılımı hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı ihale çalışmaları devam etmektedir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	990		330	182	% 55,2	Projede Muayene ve Kabul işlemleri tamamlanmış ve hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000		500	0	% 0,0	Protokol hazırlanmıştır.Protokolü gerçekleştirmek için üniversite hocalarının listesi belirlenmiş, Makama sunulmuştur.
2016K090050	Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000		500	0	% 0,0	Protokol hazırlanmıştır.Protokolü gerçekleştirmek için üniversite hocalarının listesi belirlenmiş, Makama sunulmuştur.
15 Proje		06 ve 07 TOPLAM	43.448	17.862	10.038	1.408	% 14,0	
		AB KATKISI	9.000	5.400	3.600	0	% 0,0	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090170	1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2014-2016	4.500	4.000	500	4	% 0,9	2016 yılı için ayrılan ödenek ortofoto ve Fogrametrik halihazır üretimi işi için kullanılacaktır.
2015K090460	Siber Güvenlik Alt Yapısı Kurulumu Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	2.500	1.100	1.400	0	% 0,0	CBS alt yapısı kurulumu işi kapsamında, kurulan siber güvenlik operasyon merkezi bakanlığımız veri merkezi lokasyonunda hizmete girmiştir. Bahsi geçen proje kabul aşamasındadır.
2015K090470	Kimlik Yönetim Sistemi Kurulması Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	1.600	900	700	0	% 0,0	CBS alt yapısı kurulumu işi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 12 bakanlık uygulamasıproje kapsamında kurulan kimlik yönetimi sistemi altyapısına başarıyla enteger edilmiştir.Proje kabul aşamasındadır.
2015K090410	Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı (4*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	1.700	0	1.500	0	% 0,0	2016 yılı yatırım pargramında yer alan dipnot gereği revize formu hazırlanmış. Revize formunun onayı beklenmektedir.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Fizibilite Etüdü Projesi (5*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	1.700	0	1.500	0	% 0,0	projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığının müzadesine tabi olup gerekli onayın verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
2015K090440	Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	2.905	700	2.000	468	% 23,4	"soru bankası ve onlinesınav sistemi" hizmet alım işi uzaktan eğitim portalının geliştirilmesine yönelik lisans alımı gerçekleştirilmiştir. Dünya CBS günü organizasyon çalışmaları kapsamında toplantı yeri ve organizasyon firmasına yönelik alım hizmetleri yapılmaktadır. ayrıca "coğrafi bilgi sistemleri meslek gruplarına yönelik belgelendirme sınav merkezi ve yetkilendirme süreçleri hizmet alım işi yapılmaktadır.
2015K090450	Bakanlık Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesi Projesi (6*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	13.500	7600	1.600	0	% 0,0	Proje kapsamında bakanlığımızın ihtiyacı olan depolama, sunucu, yedekleme cihazları ve lisans ürünleri temini için çalışmalar tamamlanmış ihale süreci başlatılmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090500	e-Plan Otomasyonu Projesi (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	3.500	2.600	700	129	% 18,5	e-plan otomasyon sistemi sunucu ve masafistü yazılımları geliştirilmiş olup pilot çalışmasına devam edilmektedir.
2015K090600	Bulut Bilişim Tabanlı Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (7*) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	5.000	0	1.000	0	% 0,0	projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığının müzadesine tabi olup gerekli onayın verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
2016K090420	Hali hazır Harita Üretimine Yönelik 1/1000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.600		1.500	0	% 0,0	insansız hava araçları ile True(Gerçek) Ortofoto üretimi 1-) Bolu balıkesir bölgesi 2-) Kars bölgesi 3-) Niğde,Konya bölgesi4-) Osmaniye bölgesi5-) Kayseri bölgesi,6-) grupI(Sakarya nehri) bölgesi 7-)grup II Erzincan (iliç) bölgesi "8-) grup III(Oskan Hes barajı, karapınar barajı, bahçeköy barajı) bölgesi" için ihaleler tamamlanmış ve yüklenici firmalarla yapılan sözleşmeler uyarınca söz konusu işler plan ve metodoji uyarınca yürütülmektedir.
2016K090430	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.400		700	0	% 0,0	2016 yılı yatırım pargramında yer alan dipnot gereği revize formu hazırlanmış. Revize formunun onayı beklenmektedir.
2016K090440	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	2.600		2.000	55	% 2,8	Ras Ticaret Entegrasyonu (Yazılım Temini) tamamlanmış olup, projede kalan ödenek Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesini araştırılması ve geliştirilmesi işi için kullanılacak olup teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2016K090450	Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi (3*) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	9.950		9.900	3.140	% 31,7	Proje kapsamında bakanlığımızın ihtiyacı olan depolama, sunucu, yedekleme cihazları ve lisans ürünleri temini için çalışmalar tamamlanmış ihale süreci başlatılmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100040	Çevre Bilgi Sistemi Projeleri (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
	Firma Bilgi Sistemi Otomasyonu	2015-2016	1.000	0	1.000	85	% 8,5	proje kapsamında bir adet işin ihalesi kısım 2015'te yapılmıştır. İş yıl sonunda tamamlanacaktır. Sözleşme bedeline (478.000,00TL) birinci hakediş ödemesi olarak (projenin % 15 i) 84.606,00 TL
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2018	1.200	0	600	461	% 76,8	merkezi finans ve ihale birimi tarafından sözleşmesi yapılmış olup %40 lık mali gerçekleşme olmuştur.
AB KATKISI			10.800	0	5.400	4.100	% 75,9	
15 Proje		06 ve 07 TOPLAM	54.655	16.900	26.600	4.343	% 16,3	
		AB KATKISI	10.800	0	5.400	4.100	% 75,9	

(3*) Revize proje formu Kalkınma Bakanlığına sunulduktan sonra harcama yapılabilir.

(4*) Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

(5*) Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir. Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir.

(6*) Revize Fizibilite Etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaz.

(7*) Projede harcama yapılması Kalkınma Bakanlığı müsaadesine tabidir. İçişleri Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak fizibilite çalışmasının Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını müteakip uygulama yapılabilir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014F000300	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi Projesi (Turizm Sektörü)	2014-2017	2.163	708	500	66	% 13,2	Göksu ÖÇKB Kuş gözlem kulesine irtibat bürosu yapılması işi tamamlanmıştır.14/03/2016 tarihinde 66.460,59 TL bedel ile son hakkeleş ödemesi yapılmıştır.
2016F000050	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi (07 Ödeneği) (2*) (Turizm Sektörü)	2016-2016	24.564		24.564	0	% 0,0	11 adet projeye ilişkin protokoller toplanmış 15.200.000,00 TL (KDV dahil)bedelle imzalanmıştır. Diğer projeler için çalışmalar devam etmektedir.
2016K050400	Su Temini Hizmetleri Projesi (07 Ödeneği) (İçmesuyu Sektörü)	2016-2016	2.000		2.000	498	% 24,9	3 adet projeye ilişkin protokoller toplam 2.000.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.
2016K090030	Korunan Alanlarda Rekreasyon Alanı Düzenlemeleri (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	4.075		4.075	0	% 0,0	5 adet projeye ilişkin protokoller toplam 4.075.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.
2016K090070	Hali hazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	600		600	0	% 0,0	3 adet projeye ilişkin ihaleler yapılmış olup toplam 452.707,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
2016K090050	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2017	1.000		825	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090080	İmar Planı Yapımı (07 Ödeneği) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	538		538	0	% 0,0	Protokollü işlerimizde sözleşmeler imzalanmış ve gönderilmiştir.Çalışmalar devam etmektedir.
2016K090090	İmar Uygulaması (07 Ödeneği) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	300		300	0	% 0,0	4 adet projeye ilişkin protokoller toplam 300.000,00 TL (KDV dahil) bedelle imzalanmıştır.
2013K100020	Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yeniden Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2013-2016	6.420	4.020	2.400	1.165	% 48,5	• “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” ve “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” doğrultusunda doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla tüm Türkiye’de Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projeleri devam etmektedir. 21 bölgede gerçekleştirilen 22 adet Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’nden; Antalya TVK Bölge İlleri, Nevşehir TVK Bölge İlleri, Muğla TVK Bölge İlleri, Samsun TVK Bölge İlleri, İzmir TVK Bölge İlleri, Tuz Gölü ÖÇKB ve Kayseri TVK Bölge İlleri’nde gerçekleştirilen projelerin hakedişleri yapılmıştır. Geride kalan 16 adet projenin hakedişlerinin ise 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2017	78.812	7.928	0	0		Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında proje yapılmaktadır. Proje için 2016 yılına tahsis edilen 32.000.000 TL ödenegin tamamı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na aktarılmıştır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2018	3.215	2.046	557	310	% 55,7	Projenin arazi çalışmaları tamamlanmıştır.
11 Proje		06 ve 07 TOPLAM	123.687	14.702	36.359	2.039	% 5,6	

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2009K050400	IPA Yatırım Paketi Hazırlama Projesi (AB) (İçme Suyu Sektörü)	2009-2016	5.175	3.575	1.600	0	% 0,0	
AB KATKISI			29.325	20.267	9.058	1.822	% 20,1	
2009K080310	IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2009-2016	3.550	2.977	573	0	% 0,0	
AB KATKISI			20.114	16.870	3.244	1.645	% 50,7	
2009K100090	Çevre Operasyonel Programının Uygulanması ve Yönetiminin Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2009-2017	7.494	3.257	2.150	0	% 0,0	
AB KATKISI			42.463	17.109	11.169	2.122	% 19,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	16.219	9.809	4.323	0	% 0,0	
		AB KATKISI	91.902	54.246	23.471	5.589	% 23,8	

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090820	İmar ve Mühendislik Hizmetleri Geliştirme Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2016-2016	1.000		1.000	0	% 0,0	Bölgesel Eğitim organizasyonu 29 Eylül 2016 tarihinde ihale edilmiş olup eğitim takvimine göre Ankara,Kayseri,Afyonkarahisar, İzmir ve Antalya İllerinde yıl sonuna kadar eğitimler gerçekleştirilecektir.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.000	0	1.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2016	20.486	16.686	3.800	3.582	% 94,3	
	Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2012-2015	5.245	5.245	0	0		Hizmet binası yapım işi 16.12.2013 tarihinde KDV dahil 5.244.443,92 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	3.300	2.300	1.000	806	% 80,6	Hizmet binası yapım işi 30.10.2013 tarihinde KDV dahil 3.556.520,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %99' dur. HİZMETE AÇILACAK DURUMDADIR.
	Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	5.100	3.800	1.300	1.300	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 27.05.2014 tarihinde KDV dahil 5.027.980 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	2.600	2.200	400	400	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 28.05.2014 tarihinde KDV dahil 2.466.200 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2013-2016	4.241	3.141	1.100	1.076	% 97,8	Hizmet binası yapım işi 04.06.2014 tarihinde KDV dahil 4.189.000 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %99' dur. HİZMETE AÇILACAK DURUMDADIR.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K090100	Hizmet Binaları İnşaatı-2 (Şehirleşme Sektörü)	2014-2017	26.295	8.923	8.914	5.140	% 57,7	
	Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2015	2.923	2.923	0	0		Hizmet binası yapım işi 28.04.2014 tarihinde KDV dahil 2.922.860,00 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	7.796	0	2.855	1.116	% 39,1	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde KDV dahil 8.362.660,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %45' dir.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2017	4.717	0	1.200	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde KDV dahil 6.613.900,00 TL'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %45' dir.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2016	10.859	6.000	4.859	4.024	% 82,8	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde KDV dahil 9.140.280 TL'ye ihale edilmiştir. HİZMETE AÇILMIŞTIR.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090810	Hizmet Binaları İnşaatı-3 (Şehirleşme Sektörü)	2015-2017	25.441	3.700	9.000	4.412	% 49,0	
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.293	100	2.300	1.146	% 49,8	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde KDV dahil 6.872.320,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %45' dir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	6.032	0	700	0	% 0,0	Tahsis edilen arsanın zemin etüd sonuçlarına göre zeminde iyileştirme yapılması gerektiği için projenin uygulanmasının ekonomik olmadığı kanaatine varılmıştır. Yeni arsa tahsisi için çalışma yapılmaktadır.
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	8.824	1.900	3.500	1.208	% 34,5	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde KDV dahil 8.555.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %65' dir.
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2017	5.292	1.700	2.500	2.058	% 82,3	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde KDV dahil 4.794.340,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %55' dir.
2016K090890	Hizmet Binaları İnşaatı-4 (Döner Sermaye Projesi) (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	45.170		25.000	0	% 0,0	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	35.320		20.000	0	% 0,0	23.08.2016 tarihinde ihale edilmiş olup, değerlendirme aşamasındadır.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	5.100		2.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	4.750		2.500	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090880	Hizmet Binaları İnşaatı-5 (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	24.090		2.500	0	% 0,0	
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.407		850	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	8.345		900	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2018	7.338		750	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2016-2016	504		504	0	% 0,0	7 adet T5 (Minibüs) tipi aracın DMO dan temini için kredi açılmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2016-2016	5.532		5.532	1.250	% 22,6	Hizmet binası onarımı için, İl Müdürlüklerine talimatlar verilmiş olup, yıl sonunda ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2016-2016	3.250		3.250	1.035	% 31,8	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı için, İl Müdürlüklerine talimatlar verilmiş olup, yıl sonunda ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
2016G000110	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2016-2016	6.200		6.200	1.253	% 20,2	Lojman binası onarımı için, İl Müdürlüklerine talimatlar verilmiş olup, yıl sonunda ödeneğin tamamı kullanılacaktır.
2016K100080	Çevre Yönetiminde Kapasite Geliştirme (3*) (Çevre Sektörü)	2016-2016	10.292		10.292	0	% 0,0	Bu proje 2016 yılı yatırım programı çevre sektöründe yürütülen diğer önemli projelerin mali yönden desteklenmesi için Kalkınma Bakanlığı tarafından programa alınmıştır.
8 Proje		06 ve 07 TOPLAM	122.090	29.309	49.992	16.672	% 33,3	
		DÖNER SERMAYE	45.170	0	25.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	167.260	29.309	74.992	16.672	% 22,2	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016G000110	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2016-2016	150		150		% 0,0	
2016K090800	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binası Onarımı	2016-2016	250		250	250	% 100,0	Gölbaşı Ek Hizmet Binası Pis su tesisatı ve kanalizasyon onarımı, Bakanlığımız otoparklarında kullanılmak üzere kollu bariyer yaptırılması, Soğütözü ve Balgat ek hizmet binalarındaki levhaların sökülmesi nakliyesi ve takılması, Bakanlığımız 2. kat ve -1 kat tadilatlarının yapılması, hizmet binamızdaki birimlerdeki elektrik tesisatı, su tesisatı tamiratu ve diğer hizmet binası bina onarımları ile Reaktif Güç Panosu yaptırılması işine harcamalar yapılmıştır.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2016-2016	750		750	379	% 50,5	Makam ve Merkez Hizmet Binası Birimlerinde kullanılmak üzere masa,sandalye,dolap,vb. mefruşat alımları, Sağlık Ünitesi Bölümlerinde kullanılmak üzere Buzdolabı, muayene ve acil servis sedyesi, buhar otoklav cihazı ve diş hekimliğinde kullanılmak üzere diş dolgu cihazı, Bakanımız ve Bakanlığımız toplantı ve çok amaçlı salonlarında kullanılmak üzere projeksiyon cihazları, motorlu perdeler ve görüntü aktarma cihazları alımı, Basın toplantı salonuna ses ve görüntü cihazları ile görüntü aktarma cihazı alınması, Protokol yemek salonuna projeksiyon cihazı, motorlu perde ve görüntü aktarıcı alınması ve hizmet binamız mutfağında kullanılmak üzere fırın, Hamur açma makinesi ve Börek pişirme ocağı alınmıştır.
2010K091030	Bakanlık Hizmet Binası (Destek ve Yapı İşleri Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (Döner Sermaye)	2015-2016	3.000	2.500	500	0	% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.150	0	1.150	629	% 54,7	
		DÖNER SERMAYE	3.000	2.500	500	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	4.150	2.500	1.650	629	% 38,1	

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2015 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2016 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2016 30.09.2016 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K100160	Çevre Sorumluluk Direktifinin Uygulanması Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2015-2017	444	178	134	0	% 0,0	01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında proje kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler aşağıda belirtilmekte olup, projenin 4. çeyrek dönemine girilmiştir: -Proje takımına yönelik olarak (21 kişi) 23/02/2016 tarihinde Çevresel Sorumluluk Direktifi ve 04/03/2016 tarihinde de Düzenleyici Etki Analizi hakkında tam günlük bir eğitim düzenlenmiştir. -29/04/2016 tarihinde taslak Boşluk Analizi Raporu Bakanlığımızca sunulmuştur. -05-06 Mayıs 2016 tarihinde "AB Çevre Hukuk ve Politikası" konulu ve 09-10 Mayıs 2016 tarihinde "Çevresel Sorumluluğa Farklı Yaklaşımlar" başlıklı iki seminer gerçekleştirilmiştir. -16/05/2016 tarihinde taslak Düzenleyici Eki Analizi Raporu Bakanlığımızca sunulmuştur. -31 Mayıs- 1 Haziran 2016 ve 2 - 3 Haziran 2016 tarihlerinde farklı paydaşlara olmak üzere "Çevresel Sorumluluk Direktifi Nedir" konulu iki seminer gerçekleştirilmiştir. -15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında sırasıyla "Mali Sorumluluk", "Örnek Olay Çalışmaları" ve "Model Çevresel Sorumluluk Direktifi" konularında üç çalıştay düzenlenmiştir.
AB KATKISI			3.996	1.050	1.896	491	% 25,9	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	444	178	134	0	% 0,0	
		AB KATKISI	3.996	1.050	1.896	491	% 25,9	
