

# 2018 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 2. Dönem Gerçekleşme Raporu


(01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 Dönemi)

## BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ

### 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2018 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	795.594.000,00	805.594.000,00	416.126.057,11	% 51,7
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	134.776.000,00	138.776.000,00	71.456.735,68	% 51,5
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.681.000,00	90.132.734,77	38.777.509,15	% 43,0
05	CARİ TRANSFERLER	429.844.000,00	438.714.618,63	194.713.400,08	% 44,4
06	SERMAYE GİDERLERİ	292.780.000,00	799.629.466,34	340.183.994,26	% 42,5
	Bakanlık Yatırım Programı	273.752.000,00	274.860.197,95	37.529.753,91	% 13,7
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.028.000,00	19.028.000,00	8.748.763,34	% 46,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	505.741.268,39	293.905.477,01	% 58,1
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	162.177.000,00	874.898.000,00	745.382.607,91	% 85,2
	Bakanlık Yatırım Programı	32.018.000,00	33.318.000,00	841.607,91	% 2,5
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	130.159.000,00	130.159.000,00	33.120.000,00	% 25,4
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	711.421.000,00	711.421.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	24.901.000,00	91.899.000,00	66.350.894,37	% 72,2
	Bakanlık Yatırım Programı	24.901.000,00	31.899.000,00	6.350.894,37	% 19,9
	IPA-I Projeleri Ek Ödeneği-İLBANK ödemesi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	% 100,0
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.922.753.000,00</b>	<b>3.239.643.819,74</b>	<b>1.872.991.198,56</b>	<b>% 57,8</b>


## BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

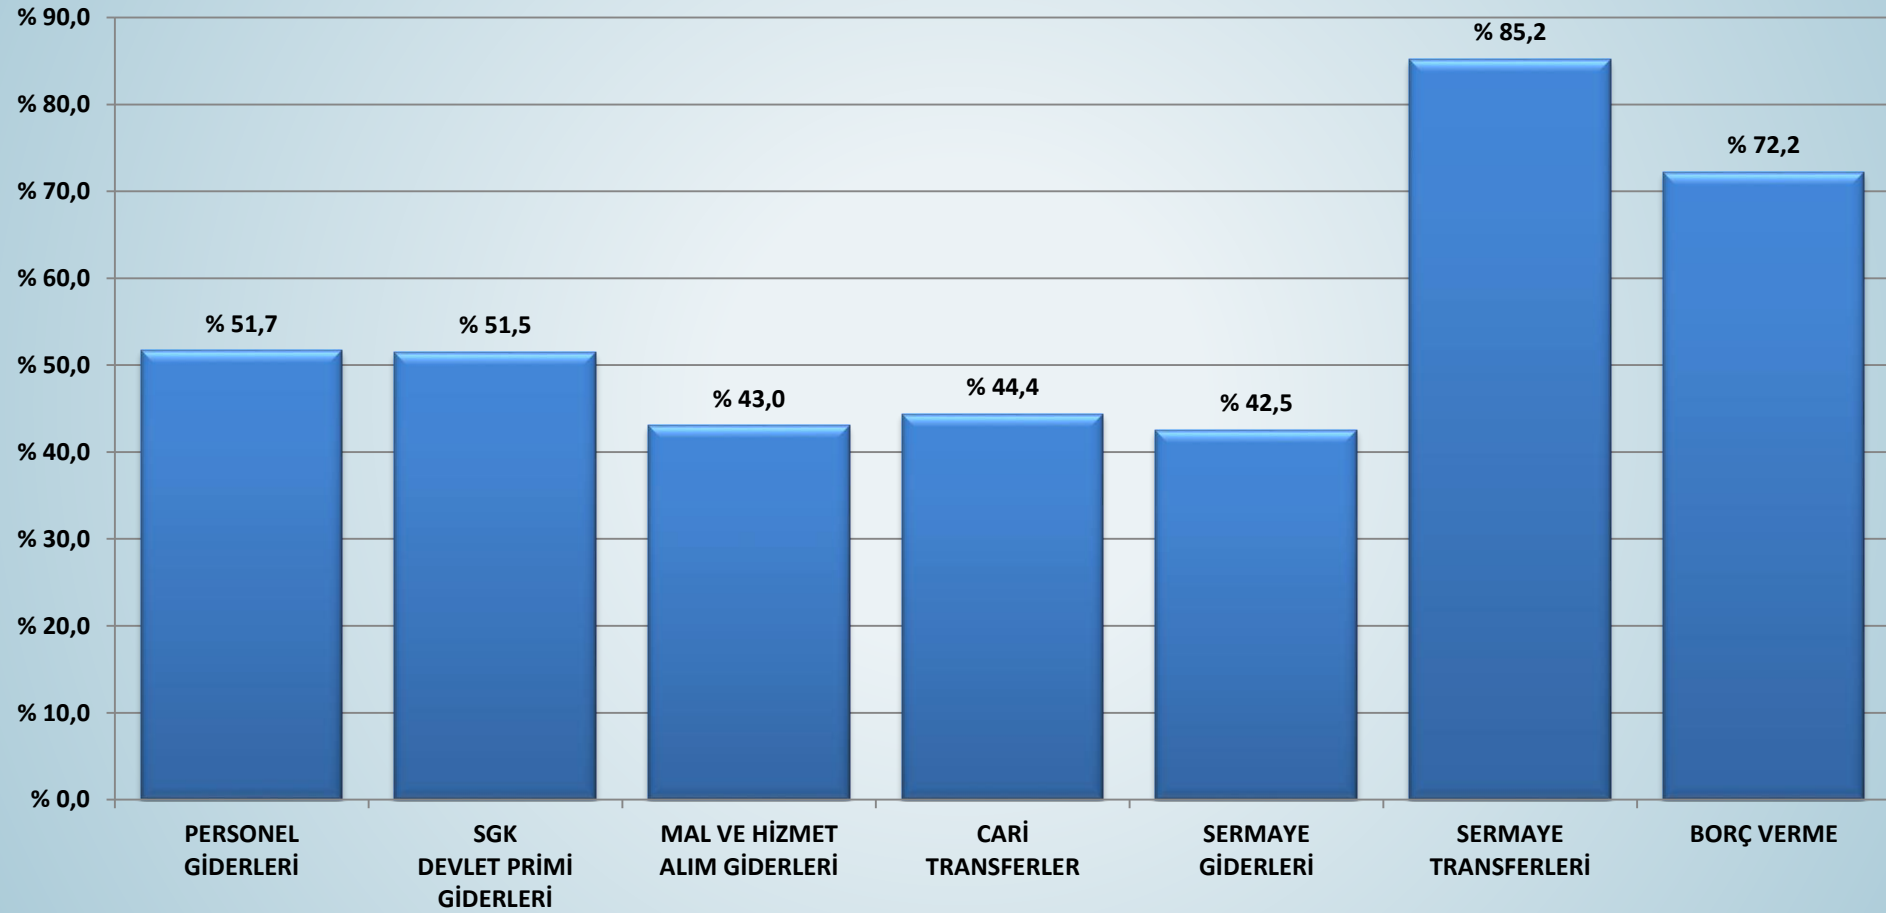

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	30 Haziran 2018		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	7	13.900.000,00	7.460.000,00	450.206,54	% 6,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	20	158.525.000,00	17.250.000,00	1.517.097,22	% 8,8
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	145.451.000,00	36.664.000,00	1.244.581,28	% 3,4
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	20	1.234.414.000,00	165.631.000,00	23.380.526,28	% 14,1
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz.Gn.Md. (DETAY)	4	13.614.000,00	7.100.000,00	116.822,62	% 1,6
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	9	24.675.000,00	5.025.000,00	117.294,26	% 2,3
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	9	84.506.000,00	37.964.000,00	3.019.163,35	% 8,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	19	110.941.000,00	42.778.000,00	13.290.267,17	% 31,1
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	1	13.710.000,00	1.343.000,00	330.979,50	% 24,6
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	4	205.687.000,00	72.204.000,00	13.347.665,97	% 18,5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	2.600.000,00	2.600.000,00	355.652,00	% 13,7
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>100</b>	<b>2.008.023.000,00</b>	<b>396.019.000,00</b>	<b>57.170.256,19</b>	<b>% 14,4</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAKLI PROJELER</b>	<b>93</b>	<b>1.837.092.000,00</b>	<b>328.930.000,00</b>	<b>56.153.256,19</b>	<b>% 17,1</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAKLI PROJER</b>	<b>7</b>	<b>170.931.000,00</b>	<b>67.089.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>% 1,5</b>


## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

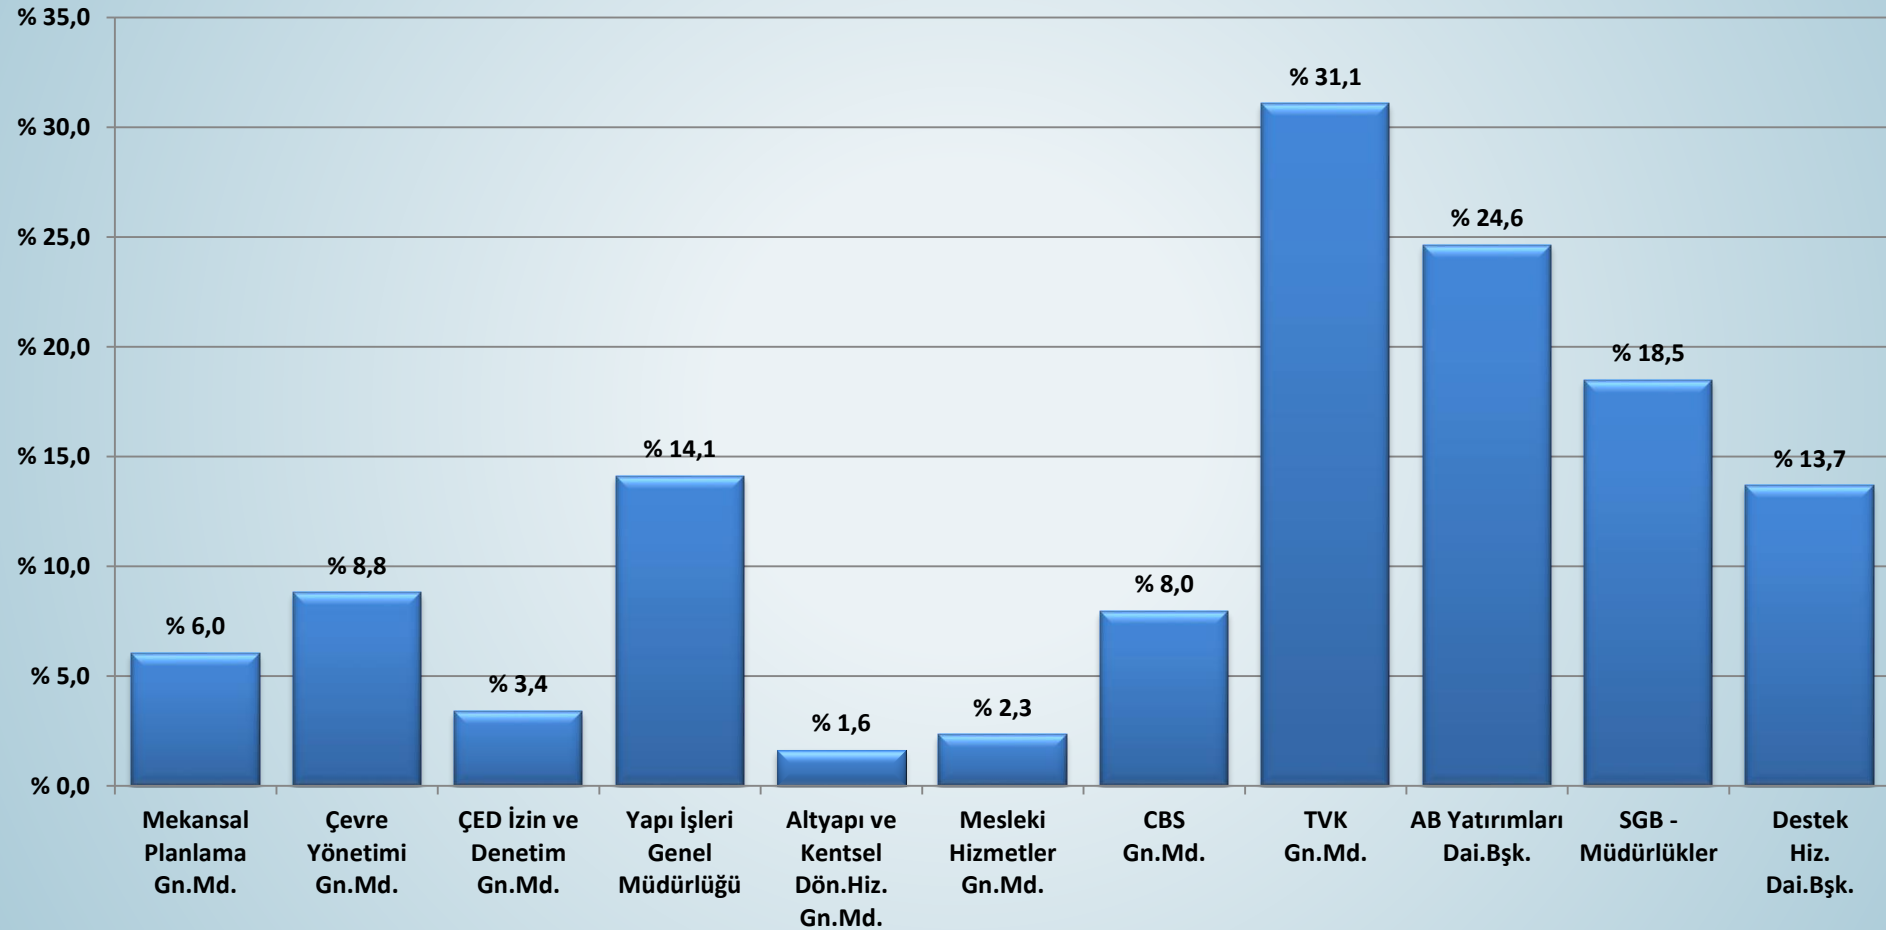

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	30.06.2018 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25.913.000,00	25.913.000,00	9.680.014,35	% 37,4
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	228.627.000,00	288.408.140,40	105.187.641,47	% 36,5
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	58.866.000,00	61.767.113,84	18.317.202,75	% 29,7
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	221.421.000,00	254.823.669,19	73.312.283,93	% 28,8
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	371.844.000,00	1.083.265.000,00	892.756.767,57	% 82,4
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19.275.000,00	18.825.000,00	8.131.792,92	% 43,2
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	50.468.000,00	51.112.481,68	10.181.339,15	% 19,9
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	56.993.000,00	47.865.631,36	7.752.364,77	% 16,2
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	8.671.000,00	8.671.000,00	4.274.088,92	% 49,3
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	4.628.000,00	4.628.000,00	2.551.444,58	% 55,1
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	2.059.000,00	2.059.000,00	1.079.982,62	% 52,5
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.996.000,00	3.996.000,00	2.252.983,90	% 56,4
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17.591.000,00	26.457.478,23	21.073.986,09	% 79,7
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.380.000,00	4.380.000,00	1.801.428,45	% 41,1
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.631.000,00	2.631.000,00	798.438,27	% 30,3
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.653.000,00	4.653.000,00	2.546.285,83	% 54,7
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	39.723.000,00	43.378.298,98	22.078.413,52	% 50,9
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	770.000,00	770.000,00	397.161,54	% 51,6
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	26.983.000,00	26.983.000,00	14.001.991,52	% 51,9
İL MÜDÜRLÜKLERİ	773.261.000,00	1.279.057.006,06	674.815.586,41	% 52,8
<b>TOPLAM</b>	<b>1.922.753.000,00</b>	<b>3.239.643.819,74</b>	<b>1.872.991.198,56</b>	<b>% 57,8</b>

## HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

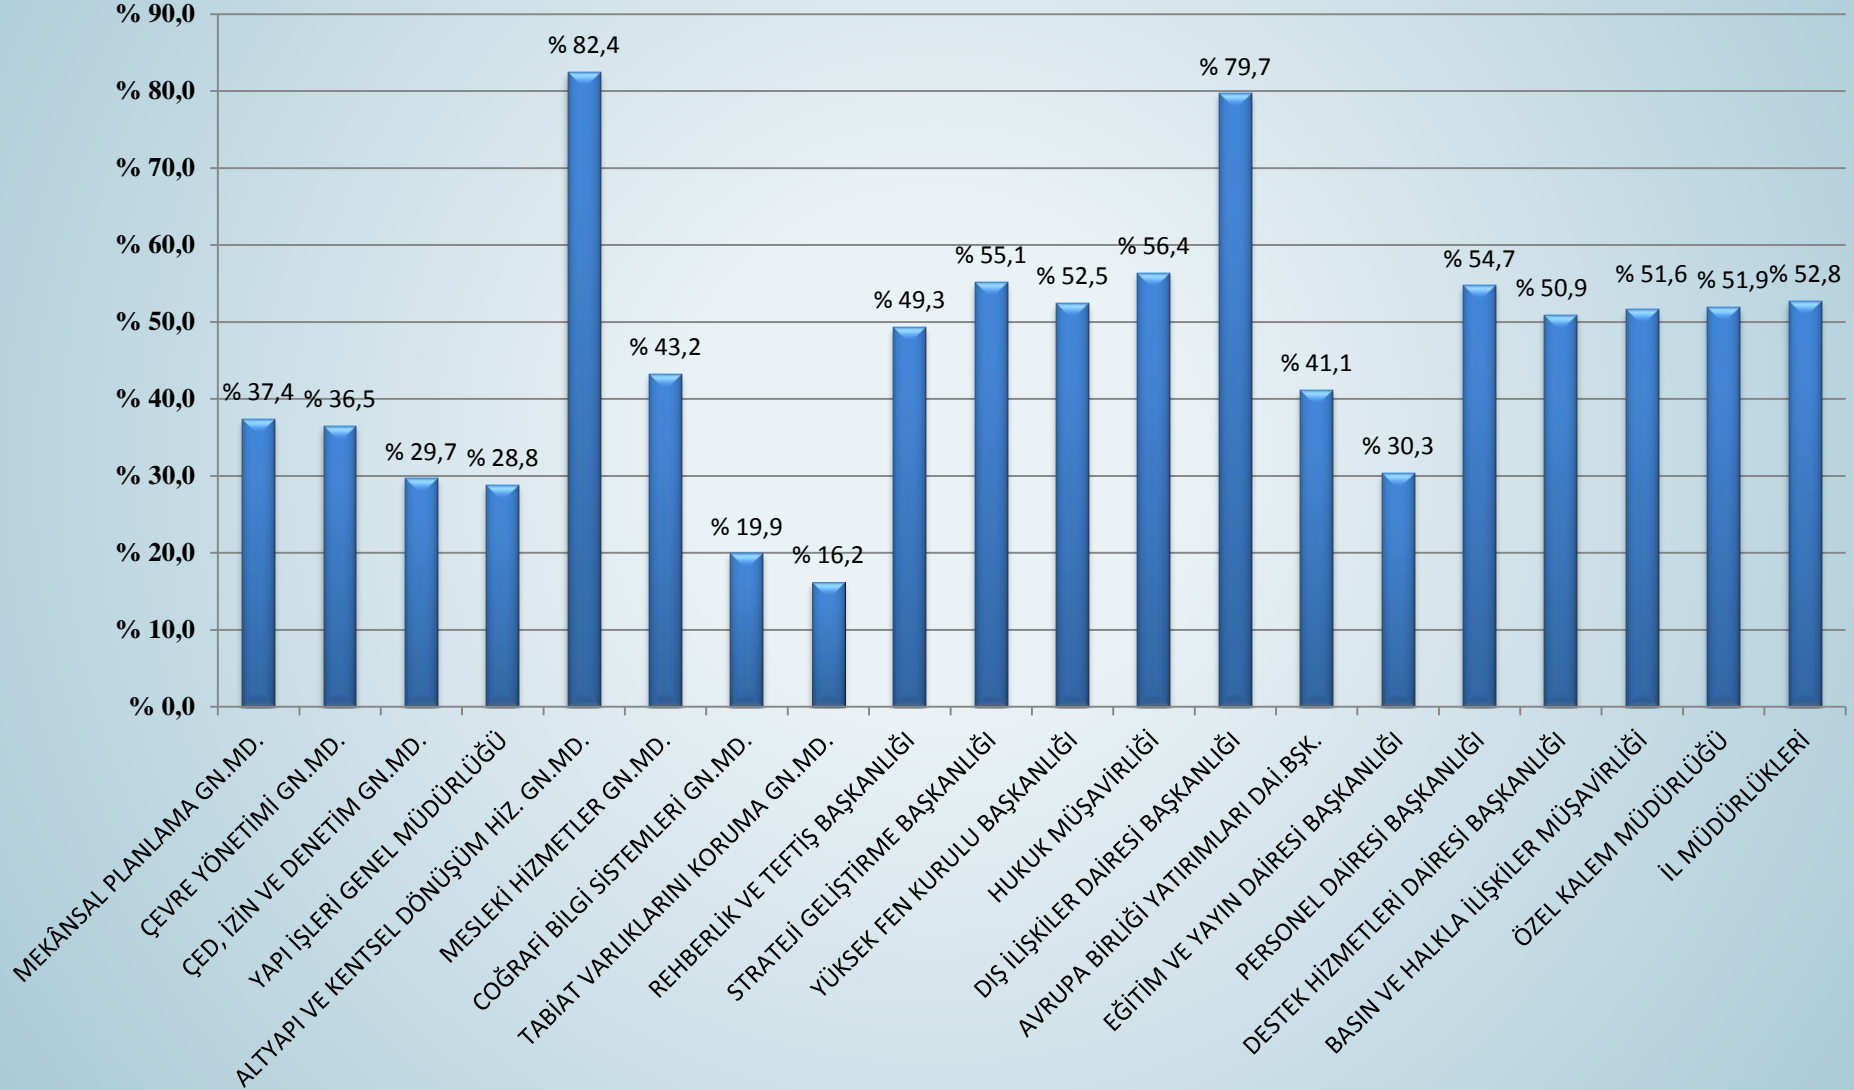

**Arz Ederim...**



**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	2.000	540	1.460	450	% 30,8	31.07.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol imzalanarak Projeye başlanmış olup, projenin birinci aşaması 28.11.2017 tarihinde, ikinci aşaması 28.03.2018 tarihinde tamamlanmış olup 2018 yılı içerisinde 449.500 TL ödeme yapılmıştır. Projenin 3. aşaması kapsamında Kartepe/Maşukiye, Söke/Güllübağçe, Gürün/Karadoruk pilot yerleşmelerde arazi çalışmalarına başlanmıştır.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	2.000	0	750	0	% 0,0	Proje çalışmaları sürdürülmektedir.
2018K090220	GAP ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları (Dipnot:145) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	800		800	0	% 0,0	Projelerde uygulamalar kesinleşerek, kontrol için Kadastro Müdürlüklerine gönderilmiş olup, yapılan kontrollerde son aşamaya gelmiş olup tamamlanmasını müteakip, proje dosyası Tapu Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve İmar Uygulamasının tescilleri sağlanarak proje tamamlanacaktır.
2018K090040	İmar Planları İzleme ve Denetim Modeli (Dipnot: 147) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	2.000		800	0	% 0,0	Yatırım Programının 147 no.lu dip notu uyarınca 30.01.2018 tarihinde Kalkınma Bakanlığı ile yapılan istişare toplantısı neticesinde gündeme gelen "İmar Planı İzleme, Değerlendirme ve Denetim Sisteminin Kurulması Projesi Değerlendirme Raporu Taslağı" hazırlanarak, öneri ve değerlendirmeleri alınmak üzere 21.03.2018-43034 sayılı yazımız ile Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Rapor; meri mevzuat hükümleri ile mevcut durum analiz edilerek, konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca daha önce hazırlanan kanun tasarıları, halen devam eden projeler ve güncel tartışmalar irdelenmiş olup, rapor taslağında "proje fikri" hakkındaki değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.  Kalkınma Bakanlığında 11.04.2018, 18.04.2018 ve 03.05.2018 tarihlerinde gerçekleştirilen teknik toplantılar neticesinde hazırlanan "Proje Teklif Formu", "Proje Takvimi ve İş Programı Taslağı" e-posta ile Kalkınma Bakanlıği uzmanlarına iletilmiştir.
2018K090210	Kıyı Yapılarının Topulaştırılması Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	1.500		500	0	% 0,0	Proje çalışmaları sürdürülmektedir.

**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090600	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	1.000		500	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış olup, Trabzon- Ordu- Giresun ve Tekirdağ- Edirne- Kırilareli Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi için ihaleye çıkılacaktır.
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	4.600	0	2.650	0	% 0,0	Proje çalışmaları sürdürülmektedir.
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2019	3.000	0	1.650	0	% 0,0	Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Yerbilimsel Etüt Dairesi tarafından yürütülecek olan bu projeye ilişkin, 06.06.2018 tarihinde ihaleye çıkılmış olup ihale süreci halen devam etmektedir. Bu nedenle projeye ilişkin herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmediğinden gerçekleşme oranı 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında %0.0'dır.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2019	1.600	0	1.000	0	% 0,0	Proje çalışmaları sürdürülmektedir.
<b>7 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>13.900</b>	<b>540</b>	<b>7.460</b>	<b>450</b>	<b>% 6,0</b>	

Dipnot: 145 2016K090020 numaralı projenin sonuç raporu Kalkınma Bakanlığına sunulmadan harcama yapılamaz.

Dipnot: 147 Proje formu Kalkınma Bakanlığı ile birlikte hazırlanacaktır. Teknik şartnamesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaz.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K060210	Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	3.500	2.070	1.430	1.017	% 71,1	28.07.2016 tarihinde imzalanan protokolle başlayan proje kapsamında 7 bölgede yapılması planan çalışmalar tamamlanmış, teknik gezilerin ilki gerçekleştirilmiş ve projeye ait III. Ara Rapor incelenerek rapor sonrası III. ödeme yapılmıştır. Deneme yakmasına ve senaryolara yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2019	2.500	1.270	730	0	% 0,0	Proje kapsamında havzaya özgü kirleticilerin belirlenmesi amacıyla Nilüfer Çayı Alt Havzası ve Yeşilirmak Havzasında belirlenen istasyonlarda numune alma ve analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde Bursa’da eğitim programı düzenlenmiştir. 30.03.2018 tarihinde Proje kapsamında hazırlanan Yönetim Planı ve Maliyet Analiz Raporları Bakanlığımıza sunulmuş olup incelenmesi tamamlanmıştır. 19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da “Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında önerilen uygulama planı, bu planı hayata geçirirken karşılaşılabilecek teknik, mali ve idari zorluklar tartışıldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında elde edilen çıktılarn mevzuata aktarılması yönünde Düzenleyici Etki analizi çalışmaları devam etmektedir.
2018K060290	Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri (Kanalizasyon Sektörü)	2018-2020	6.629		511	0	% 0,0	Türkiye’de Endüstriyel ve Kentsel Deşarjlar için Çevresel Kalite Standartlarını (ÇKS) Sağlamaya Yönelik Deşarj Standartlarının Belirlenmesi ve Uygulanmasına Dair Uygulama Planı ve Maliyet Tahmini Projesi adı altında çalışılacak bu proje için nihai fiyat teklifi alınmış ve Bakan Oluru alınması için Strateji Geliştirme Başkanlığı’na yazı yazılmış olup; Bakan Oluru alınması süreci devam etmektedir.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	1.000	150	50	0	% 0,0	İhale süreci sonlandırılmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	100.000	0	50	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2017 yılı ödeneği Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza aktarılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2018K080010	İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2018-2021	1.000		50	0	% 0,0	Projenin teknik şartname hazırlama süreci devam etmekte olup tamamlanmasını müteakip ihale işlemlerine başlanacaktır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.500	500	2.000	0	% 0,0	Ulusal katkının takibinin yapılması amacıyla 2017 Yılı Yatırım Programının DKH-Sosyal-Çevre Sektöründe 2016K100050 numaralı "Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi" eklenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu projenin yürütülmesi işi 06.11.2017 tarihinde imzalanan bir protokol ile Medipol Üniversitesine verilmiştir. Proje faaliyetlerine başlanmış olup 2020 yılında bitirilmesi öngörülen projenin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraflarca sunulan ulusal bildirimler teknik detaylarda incelenerek bir sentez rapor hazırlanmıştır.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	1.000	1.000	500	% 50,0	Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Belirlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Uygulamanın Kolaylaştırılmasının Sağlanması Projesi 3 Şubat 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Dokuz Eylül Üniversitesi yürütücülüğünde başlamıştır. Proje kapsamında sektörel kontrol listeleri ve uygulama kılavuzları hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca demir çelik üretimi, demir dışı metal üretimi, tekstil, şeker üretimi, büyük yakma tesisleri, çimento üretimi, cam üretimi tesisleri, tuğla ve kiremit üretimi, beyaz eşya üretimi ve 1seramik üretim tesisleri yerinde ziyaret edilmiştir. Entegre Demir Çelik Üretim Tesisleri, Demir Dışı Metal Üretim Tesisleri, Şeker Üretim Tesisleri ve Tekstil Üretim Tesisleri ile ilgili kılavuzlar tamamlanmış ve sektör görüşüne açılmıştır. Proje kapsamında Mayıs ayında I. Sektörel Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 20.04.2018 tarihinde Proje II. Ara raporu sunulmuş olup, onaylanmış ve ödeme gerçekleştirilmiştir.
2018K100020	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	8.000		2.850	0	% 0,0	Toplulaştırılmış tadat edilmemiş projedir. Bu proje altında yer alan Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi protokolü İstanbul Teknik Üniversitesi ile 27.06.2018 tarihinde imzalanmıştır ve Karayolu Taşıtlarının Kirleticilik Tespiti projesi protokolü Hacettepe Üniversitesi ile 21.06.2018 tarihinde imzalanmıştır. Bu proje altında yer alan Koku Oluşturan Emisyonların Yönetimi Projesi ve Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi için teknik şartnameleri hazırlanmış olup, Protokol hazırlık aşamasındadır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100290	Tersanelerin Deniz Etkilerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.500		700	0	% 0,0	İhale süreci, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile yürütülmektedir. Söz konusu üniversite ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanmış olup, 02.07.2018 tarihi itibarı ile proje çalışmaları fiilen başlamıştır.
2018K100300	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.700		300	0	% 0,0	Projeye ilişkin ihale süreci tamamlanmış olup, 29.06.2018 tarihi itibarıyla Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında protokol imzalanmıştır.
2018K100310	Deniz Çöplerinin Önlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.200		477	0	% 0,0	Teknik şartname ile ilgili çalışmalar devam etmektedir
2018K100410	EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000		1.500	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi hazırlanmış olup, Karabük Üniversitesinden şartnameye ilişkin fiyat teklifi ve makam oluru alınmıştır. Protokol hazırlık aşamasındadır. Temmuz ayı içinde protokolün imzalanarak projenin başlaması hedeflenmektedir.
2018K100670	Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2019	3.000		1.300	0	% 0,0	Projenin teknik şartname hazırlama süreci devam etmekte olup tamamlanmasını müteakip ihale işlemlerine başlanacaktır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100190	İklim Değişikliği Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (AB)	2018-2018	206		206	0	% 0,0	Proje fişi ve teknik şartnamesi tamamlanmış olup AB Delegasyonunda onay aşamasındadır.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		1.166		1.166	0	% 0,0	
2018K100390	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB)	2018-2021	2.401		960	0	% 0,0	Kısa liste 22.05.2018 tarihinde yayınlanmış olup ihale için AB Yatırım Dairesi Başkanlığı tarafından firma davetleri yapılmıştır. İhale süreci halen devam etmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		13.597		5.438	0	% 0,0	
2018K100400	KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB)	2018-2021	2.057		343	0	% 0,0	Proje henüz başlamadığı için herhangi bir harcama olmamıştır.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		11.652		1.942	0	% 0,0	
2018K100610	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB)	2018-2021	7.541		800	0	% 0,0	AB Delegasyonundan gelen görüşler doğrultusunda proje fişi revizyonu süreci devam etmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		42.730		12.257	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100040	Türkiye'de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	4.341	1.668	1.343	0	% 0,0	***2018 Yılı Yatırım Programı DKH-Sosyal-Çevre Sektöründe yer alan 2017K100040 numaralı "Türkiye'de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)" nin detayı tadat edilmiş toplulaştırılmış proje detayına "Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardımı Projesi" nin eklenmesi ve projede 2018 yılı için ihtiyaç duyulan ödeneğin karşılanmasına ilişkin talep Kalkınma Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur.
AB KATKISI			39.074	14.670	12.209	0	% 0,0	
	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	16/08/2017 tarihinde başlayan 23 aylık LULUCF Projesi kapsamında, ulusal sera gazı emisyon envanterinin LULUCF bölümünün geliştirilmesine yönelik olarak, OSİB Orman Genel Müdürlüğü ve GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kurumların konu ile ilgili personelinin katılımıyla, 2018 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, bilimsel araştırmalarla envanterin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin rapor hazırlanmış, eğitim ve destek ihtiyaçları analizi raporu hazırlanmış, eğitimlerin programlanması çalışmaları gerçekleştirilmiş, çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	Projenin açılış toplantısı 21/06/2017 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir. Projede 1. aktivite olan "kanunsal boşluk analizi" ve 2. aktivite olan "Hazırlık Çalışmaları" tamamlanmıştır.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	Projenin Eğitim Bileşeni kapsamında 09.01.2018 ile 17.01.2018 tarihlerinde kamu kurumları, üniversiteler, STK ve özel sektör mensubu katılımcılarla "Odak Grup Toplantıları" gerçekleştirilmiştir. 10.01.2018 tarihinde "Proje Yönetim Döngüsü" eğitimi düzenlenmiştir. 08.05.2018 ve 09.05.2018 tarihlerinde hibe faydalanıcılarına yönelik "Raporlama Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	1.599	834	383	0	% 0,0	Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen izleme ziyaretlerinin ikincisinde, 37 hibe faydalanıcısı yerinde ziyaret edilmiştir. Üçüncü izleme ziyareti gerçekleştirilen proje sayısı ise 11 olmuştur. Hibe programının başlangıcından itibaren toplamda 88 izleme ziyareti tamamlanmıştır. Hibe faydalanıcılarından Marmara Üniversitesi, kurum içinde aldığı kararla hibeden faydalanmayacağını belirtmiş olup, herhangi bir harcama ve faaliyet yapılmadığından hibe sözleşmesi feshedilmiştir.
			14.396	7.335	3.530	0	% 0,0	
2018K100700	Kesin Hesap Farkı (Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi) (Çevre Sektörü)	2018-2018	650		650	0	% 0,0	Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Kapasite Geliştirme Projesi'nin 125.000 €'luk ulusal katkı tutan ulusal fona aktarılmış olup 15 Şubat 2018 tarihi itibarıyla tamamlanan bahse konu projenin tüm faaliyetleri eksiksiz olarak tamamlanmıştır.
<b>20 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>158.525</b>	<b>6.658</b>	<b>17.250</b>	<b>1.517</b>	<b>% 8,8</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>108.219</b>	<b>14.670</b>	<b>33.012</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100200	OLFAKTOMETRE Cihazı Alımı (Çevre Sektörü)	2018-2018	250		250	0	% 0,0	Cihaz alımı için yapılan teknik araştırmalar devam etmektedir.
2018K100630	Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri Kapasite Geliştirme (Çevre Sektörü)	2018-2018	500		500	77	% 15,3	Laboratuvar tezgah,çeker ocak,kimyasal dolapları doğrudan temin yolu ile yapılmış olup KDV dahil 76.083,80 TL ödeme yapılmıştır.Cihaz alımı ihalesi 19.06.2018 tarihinde yapılmış olup ancak yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeni ile ihale iptal edilmiştir.İhale cihazlara göre yenilenecektir.Mevcut verilen ödenek ile ön işlem laboratuvarı için çalışmalarımız yürütülmekte olup ancak cihazların bir çoğunun yurt dışı kökenli olması ve dövizdeki dalgalanmalar nedeni ile ödeneğin yeterli olmayacağı düşünülmektedir.
2018K100470	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.000		1.500	0	% 0,0	Proje teknik şartnamesi hazırlanmış olup protokol imzalanma aşamasındadır.
2018K100520	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi-FAZ II (Çevre Sektörü)	2018-2019	3.000		1.500	0	% 0,0	Teknik şartname tamamlanmış olup işin başlatılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
2018K100620	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyonu, Entegrasyonu ve Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2019	4.000		2.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış olup yaklaşık maliyet hesap cetveli oluşturulmuştur. Süreç devam etmektedir.



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100660	Kümülatif Etki Değerlendirme Projeleri (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.000		1.800	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen "jeotermal enerji santrallerinin etkilerinin kümülatif değerlendirilmesi" ve "termik santrallerin etkilerinin kümülatif değerlendirilmesi" ile "Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Uygulamalarının Yaygınlaştırılması İşleri" projelerinin hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. Taslak Şartnameler hazırlanmış olup, son düzeltmeler yapılmaktadır.
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2020	70.098	17.500	16.998	1.168	% 6,9	<p>Projenin Lab. Ölç.ve İz. Da. Bşk. tarafından yürütülen kısmı ile ilgili ; 2017 yılı hava kalitesi izleme istasyonları bakım-onarım ve kalibrasyon işi kapsamında 2017 Aralık ve 2018 Ocak aylarına ait hakedişler ödenmiştir (495.210,60 TL.) . Ayrıca 2018 yılı bakım-onarım ve kalibrasyon işi Nisan 2018'de başlamış olup hizmet süresi 9 ay'dır. Şimdiye kadar herhangi bir hakediş ödemesi firmalara yapılmamıştır.</p> <p>Projenin Marmara Temiz Hava Merkezi tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 6.1 Ödeme Kaleminden Yapılacak Olan Harcama İçin 29.05.2108 Tarihinde İhale Yapılmış, 20.06.2018 Tarihinde KDV Dahil 4.288.120,00.- bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. 6.2 Ödeme Kaleminden Ocak,Şubat,Mart, Nisan, Mayıs, Aylarına Hakedişler Ödenmiş Olup 30.06.2018 itibari ile KDV Dahil 605.340,00.-TL</p> <p>Ayrıca; Hava Kirliliğinin İzlenmesi amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının taşıma gideri, enerji ihtiyacının temini, elektrik aboneliği vb. iş ve işlemlere için Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri/İl Müdürlükleri tarafından ihtiyaç duyulan ödenek talepleri aktarma yoluyla gerçekleştirilmekte olup ilk 6 ayda Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, Yozgat, Düzce, Çankırı, Karabük ve Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 67.330,68 TL. harcama görülmektedir.</p>
	Döner Sermaye	2015-2019	58.408	33.735	12.114	0	% 0,0	Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi İstasyon Kurulumu Projesine ait ihale, 18.06.2018 tarihinde ihale komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. İhaleyi alan firma ile Bakanlığımız arasında sözleşme imzalanma aşamasındadır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100050	Türkiye'de E-PRTR Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.195	641	2	0	% 0,0	25.05.2017 tarihinde başlamış olan Türkiye'de E-PRTR Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) 25.05.2019 tarihinde tamamlanacaktır. Şu anda proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 2018 yılı içerisinde ulusal katkı payı ödemesi bulunmamaktadır.
AB KATKISI			9.822	5.924	2	0	% 0,0	
<b>8 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>87.043</b>	<b>18.141</b>	<b>24.550</b>	<b>1.245</b>	<b>% 5,1</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>58.408</b>	<b>33.735</b>	<b>12.114</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>145.451</b>	<b>51.876</b>	<b>36.664</b>	<b>1.245</b>	<b>% 3,4</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>9.822</b>	<b>5.924</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	16.500	8.500	8.000	1.017	% 12,7	Bakanlık hizmet binası kesin hesabı onaylanmıştır.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Dipnot: 182) (Afetler Sektörü)	2015-2018	5.580	3.213	2.367	0	% 0,0	Projeye ilişkin ön çalışmalar yapılmaktadır.
2017K140090	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Alımı (Afetler Sektörü)	2018-2018	493		493	0	% 0,0	Projeye ilişkin ön çalışmalar yapılmaktadır.
2018K010080	Yüksek ve Sismik Yalıtımlı Bina Tasarım-Onay Yön. (Genel İdare Sektörü)	2018-2018	750		750	0	% 0,0	18.03.2018 tarihinde yayınlanan 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin 1.3 maddesine göre 'Özel Konularda Tasarım Gözetimi ve Kontrolü' hizmetinin alınması zorunlu hale getirilmiştir. Proje kapsamında 'Tasarım Gözetimi ve Kontrolü ile ilgili usul ve esaslar' belirlenecektir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 1- Konuya ilişkin dokümanlar toplanmıştır.(Daha önce yapılan yurtdışı incelemelerindeki tespitler, İMO'nun çalışmaları, TBDY ilgili bölümü, MHGM ile irtibata geçilmesi, TBDY komisyonundaki akademisyenler ile görüşülmesi) 2- Genel Müdürlük Bünyesinde iki adet toplantı yapılmıştır. (Tasarım gözetiminde bulunması gereken mühendislik disiplinlerinin belirlenmesi, çalışma gruplarının zümre şeklinde teşkil edilmesi, teşkil edilecek komisyon ve denetleme kurulu ile ilgili görüşler bir sonraki toplantıda tekrar değerlendirilmek üzere maddeler halinde sıralanması) 3- Hizmet alınma esas taslak protokol hazırlanmıştır. 4-Proje ile ilgili olarak mevzuat yönünden araştırmalar devam etmektedir.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K010090	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)					1.144		
	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi	2018-2018	1.300		1.300	381	% 29,3	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları değerlendirme analizleri kitapçığı hazırlanmıştır. ADD-On yazılımı ve yazılım kurulum son haline getirilmiştir. Yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin gereksinim raporu ve yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin sistemin kontrol ve test raporu hazırlanmıştır. "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları" sözleşme gereği tamamlanmış, kabul işlemi yapılmıştır. Konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi (genelge vb...) ve yayımlanması için hazırlıklar devam etmektedir. CADD standartlarının yaygınlaştırılması ve standardın kullanıldığı örnek projelerin elde edilmesi amacıyla, 2018 yılı Haziran Ayı sonu itibarıyla bu standardın kullanıldığı projelerin elde edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2018-2018	1.368		1.368	502	% 36,7	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme ve Geliştirilmesi İşi ihalesi 23.05.2018 tarihinde 145.000 TL + KDV bedel ile, Ulusal Yapı Denetim Sistemi Veritabanı Veri Düzenleme ve İyileştirilmesi İşi ihalesi 24.05.2018 tarihinde 175.000 TL + KDV bedel ile yapılmış olup, 12.06.2018 tarihinde sözleşmeleri imzalanmıştır. Ayrıca ihalesi yapılan YDS-2 yazılımının 27.02.2018 tarihinde kabulü yapılmış olup sistemin devreye alınması sürecine ilişkin Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ortak çalışma protokolü yapılmış, konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2018-2018	1.100		1.100	261	% 23,7	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere Bilgisayar destekli çizim programları (Plaxis, SAP200, STA4CAD) lisans alımı yapılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüze yazıcı, tarayıcı, tablet ve yüksek özellikli bilgisayar alımları yapılmıştır.
2018K070120	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2020	4.500		1.500	93	% 6,2	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farkları bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2019	27.544	11.966	500	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2019	6.073	3.513	496	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlandı. Yaklaşık 80 konutun güçlendirme ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İskan Kanununa 25.05.2018 tarihinde geçici madde eklenmiş olup yıkıp yeniden yapılacak konutlar belirlenmektedir. Bu aşamadan sonra yapım safhasına geçilecektir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2019	11.970	3.389	2	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2019	9.501	5.064	2	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır.
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2020	30.000	5.000	4.000	0	% 0,0	
	Muhtelif İskan Konutları Altyapı İşleri	2010-2020	23.000	5.000	100	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça köylerin alt yapı inşaatları için kullanılacaktır.
	İlisu Barajı İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2019	7.000		3.900	0	% 0,0	Konutlar kredi vermek suretiyle yapılacağından ödenekler 2011K070020 projesine aktarılacaktır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	198.112	26.304	31.000	6.716	% 21,7	İşler devam ediyor.
	Arslanapa-Kureysler Köyü İskanı	2015-2018	5.996	5.986	10	0	% 0,0	İş bitmiştir.
	Göksu-Gücüksu Köyü İskanı	2015-2018	16.700	16.000	700	735	% 105,0	İş devam etmektedir. Bu yıl bitecektir.
	Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2019	21.000	0	3.500	0	% 0,0	İhalesi yapıldı .Yer teslimi yapılıyor.
	Muhtelif İskan İşleri (Samsun-Vezirköprü-Susuz Köyü)	2011-2020	154.416	4.318	26.790	5.981	% 22,3	İşlerin ihale çalışmaları devam etmektedir.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	196.798	160.725	7.537	1.564	% 20,8	
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2019	187.263	158.725	2	0	% 0,0	Üst yapı ve alt yapı işleri tamamlandı. Tarım arazisi ıslah işlerine devam edilmektedir. 1. etap ihale tamamlanmıştır. 2. etap ihale yapılmış olup sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimi yapılacaktır.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2018	9.535	2.000	7.535	1.564	% 20,8	Doğanpınar Barajı yapımından etkilenen 28 ailenin yeni yerleşim yeri Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Kaşyolu Köyü olarak belirlenmiş olup iş devam etmektedir.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	5.000	3.000	1.000	262	% 26,2	2018 yılı Haziran Ayı sonu itibariyle Ülkemiz genelinde 55 ilde çalışmalar yapılmış olup toplamda 237 adet yöresel koşullara uygun çözümleri içeren, yöresel doku ve malzemelerin günümüz yöntem ve teknolojisi ile kullanıldığı, yöresel doku ve mimari kimliklerin korunduğu, yöresel malzemenin kullanıldığı, güvenli kırsal yapı projeleri elde edilmiştir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	3.819	1.826	500	0	% 0,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2020	3.620	1.400	500	0	% 0,0	2018 yılı hizmetçi eğitim programına alınmadığından eğitim yapılamayacaktır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2021	135.236	8.913	40.000	6.193	% 15,5	İş devam etmektedir.
2018K070020	Bozkır Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	151.932		15.815	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir. Eylül ayında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070030	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	33.588		5.000	0	% 0,0	İş yatırım programına alındıktan sonra yeni yerleşim yeri olacak alanla ilgili hukuki süreç başlamıştır. (Mahkemelik olmuştur.) Mahkeme sonucuna göre işlem yapılabilecektir.
2018K070130	İlusu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2020	68.113		2	0	% 0,0	İlusu Barajı İskanı için iskan duyurusuna çıkılmış olup başvurular alınmıştır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
2018K070140	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	103.114		11.000	0	% 0,0	Yusufeli Barajında hak sahipliği başvuruları alınmış olup inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	5.947	2.800	50	0	% 0,0	Talep oldukça harcama yapılmaktadır.
2011K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2021	240.000	22.000	31.849	6.391	% 20,1	İşler devam etmektedir. 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan illere 30.06.2018 tarihi itibarıyla toplam da, 18.378.283 TL ödenek gönderilmiş olup bu ödeneğin 6.393.534 TL'si harcanmıştır.
<b>20 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>971.967</b>	<b>222.347</b>	<b>125.732</b>	<b>15.972</b>	<b>% 12,7</b>	
		<b>08 TOPLAM</b>	<b>245.947</b>	<b>24.800</b>	<b>31.899</b>	<b>6.391</b>	<b>% 20,0</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>16.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>1.017</b>	<b>% 12,7</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.234.414</b>	<b>255.647</b>	<b>165.631</b>	<b>23.380</b>	<b>% 14,1</b>	

Dipnot: 182 Harcama yapılması Kalkınma Bakanlığının iznine tabidir.

(\*\*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.



**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	6.500	2.500	4.000	0	% 0,0	Bu proje kapsamında, 07.03.2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ile bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde, 30.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, protokolün ilk üç aylık sürecinde yüklenici firma, yeni bir yerleşim birinin Bakanlığımızca daha evvelden hazırlanmış olan Süperkent Mahalle Standartlarına uygunluğunu sağlayacak teknolojilerin belirlenmesi işini yapmıştır. Yüklenici firma, 16.06.2017 tarihinde söz konusu iş kapsamında belirledikleri teknolojilere ilişkin olarak ilk raporlarını teslim etmiş olup, Bakanlığımızca uygulanması uygun bulunan teknolojiler belirlenmiş ve bu teknolojilerin pilot alanda uygulanmasına yönelik daha detaylı analizlerin ve uygulama projelerinin çizilmesi safhasına geçilmiştir. Bu kapsamda pilot uygulama alanına ilişkin yol kesitleri, içme suyu ve yağmur suyu hasadı sistemi projeleri ile tarım-otopark kulelerine, elektrik orta ve düşük gerilim projelerinin yapılması, ısı dağıtım şebekesinin ön projelerinin hazırlanması ve akıllı kent sistemlerinin geliştirilmesi iş kalemlerine ilişkin tutarın ödemesi yapılmıştır. Projenin, Protokol kapsamında 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmekte olup, 2018 yatırım yılı içerisinde 3.450.000,00 TL'lik ödeme yapılması planlanmaktadır.
2017K090120	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	1.815	1.015	800	117	% 14,6	Projenin 1. Etapı kapsamında riskli alan ilan edilen Aydın/İlıcabaşı, Ankara/Kahramankazan, İstanbul/Esenler, İstanbul/Gaziosmanpaşa, Mardin/Nusaybin, Şırnak/Cizre bölgelerinde anket ve derinlemesine görüşme yapılması işi için 22.03.2017 tarihinde, ihale gerçekleştirilmiştir. 106.600,00 TL+KDV bedel ile ihale uhdesinde kalan ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Limited Şirketi saha çalışmalarını tamamlayarak teslim etmiş, çalışmanın hakkeidişi yapılmıştır. Sahaya inilerek 3757 kişi üzerinde anket çalışması yapılmış, Mardin/Nusaybin ve Şırnak/Cizre ilçeleri için ilçede bulunan kanaat önderleri ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş olup incelemelerin raporları teslim alınmıştır. 2. Etap olarak ise; Politika-plan-proje belirlemek için "Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli ve Rehberi"nin üretilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm literatür taraması, Bakanlık kentsel dönüşüm verilerinin incelenmesi, mevcut Bakanlık araştırmalarının değerlendirilmesi, ön bulgu raporlarının hazırlanması ve bu minvalde gelişim toplantılarının hazırlanması aşaması 1.aşaması tamamlanmıştır.2. aşama Mülakata Dayalı Alan araştırmasının hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.3. aşama Kentsel Dönüşüm İçin Yönetişim Çalıştayı düzenlenmiş ve Kentsel Dönüşüm Stratejik Öneri Klavuzu hazırlanmıştır.

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090320	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	2.200		2.200	0	% 0,0	“Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” ve uygulama rehberi çerçevesinin tüm il ve ilçelere örnek teşkil edecek bir kılavuz niteliğinde belge oluşturulmasına yönelik ön çalışmalar tamamlanmış olup, 22/06/2018 tarihli ve E.108437 sayılı Makam Olur’u ile protokol onaylanmıştır.Araştırma Kurumu ile protokolün imzalanmasını müteakiben çalışmalara başlanacaktır. Söz konusu proje kapsamında Ulusal Strateji Belgesi Taslağı da yeniden ele alınacaktır
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2018	3.099	2.999	100	0	% 0,0	01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında herhangi bir harcama yapılmamış olup, proje ödeneğinin 3.300.000,00 TL ve iş bitim tarihinin 2018 yılı olarak belirlendiği projede, tarafımıza sunulan 5. gelişme raporuna yönelik yapılan işlerin tümüne bu güne kadar 3.200.000,00 TL harcanmıştır. Projede % 97 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>13.614</b>	<b>6.514</b>	<b>7.100</b>	<b>117</b>	<b>% 1,6</b>	

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D000070	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2021	3.150		975	15	% 1,6	* Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında 30 Ocak -3 Şubat 2018 tarihleri arasında Almanya'ya düzenlenen teknik geziye katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır. * Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile yürütülen "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında 6-9 Şubat 2018 tarihleri arasında Almanya'ya düzenlenen teknik geziye katılım sağlayan personelin harcırah ödemesi yapılmıştır. * 27 Nisan 2018 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Türk Alman Çevre Yürütme Kurulu 15. Toplantısına katılım sağlayan personelin harcırah ödemesi yapılmıştır. * 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ENIPE 2018 fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır. * 29-30 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır. * 15-18 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen hizmet içi eğitime katılım sağlayan personelin harcırah ödemeleri yapılmıştır.
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Artırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2018	12.800	12.250	550	89	% 16,1	Proje kapsamında ikinci 6 aylık dönemde planlandığı gibi; -YMDS yazılımının yenilenmesi ve idamesi tablet alımları, -İleri seviye eğitim ve değerlendirme toplantıları, -TSE test ve deney ücretleri, -Fuar etkinlikleri yolluklar vb. gerçekleştirilmektedir.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	2.445	1.375	1.070	10	% 1,0	Talepte bulunan 38 İl Müdürlüğü ve Merkez laboratuvarımıza, laboratuvar cihazlarının alımı gerçekleştirilmektedir.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	780	530	250	0	% 0,0	İllerden tanıtım ve kişisel koruyucu donanım temini için ödenek talebi olmadığından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Artırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	330	180	150	1	% 0,7	Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları denetimleri ve Teknik Şartnamelere ilişkin eğitimler gerçekleştirilmektedir.
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	560	230	330	0	% 0,0	Projede Muayene ve Önkabul işlemleri tamamlanmıştır.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	3.400	800	700	2	% 0,3	2018 yılı 2. Döneminde gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonuna kadar hedeflenen yatırım gerçekleşme oranına ulaşacağı değerlendirilmektedir.

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K010090	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Mühendisliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve Şantiye Şefi Bilişim Sistemi (e-Şantiye Şefi) Bakım, Onarım ve Güncelleme Projesi	2018-2018	50		50	0	% 0,0	Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan projenin 500.000 TL olan 2018 yılı ödeneğinden 450.000 TL lik kısım 07.03.2018 tarihli ve E.42419 sayılı OLUR çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır.
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	710	210	500	0	% 0,1	Üniversitenin ikinci aşama için sunduğu rapor Teknik Kabul Komisyonunca yeterli bulunmamıştır. Projenin üçüncü aşaması olan pilot tasarım projeleri hazırlanması işinde proje alanına ilişkin karşılıklı mutabakat sağlanamamıştır. Üniversite ile yapılan Protokol 20.11.2017 tarihinde feshedilmiştir. Projede yeni bir ilerleme kaydedilmemiştir.
<b>9 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>24.225</b>	<b>15.575</b>	<b>4.575</b>	<b>118</b>	<b>% 2,6</b>	

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090410	CBS Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	0	3.000	0	% 0,0	Proje çalışmaları başlatıldı. Ulusal ve kurumsal analiz ve olgunluk modeli oluşturma aşaması devam etmektedir. Yılsonunda tamamlanması öngörülmektedir.
2017K090370	Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	4.800	1.800	3.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış, ihale kapsamında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Uyum Hizmetlerinin Analiz Edilmesi ve Güvenlik İzleme Destek Hizmeti çalışmaları başlamıştır. Zafiyet yazılımı ürünü kuruldu. 20000-1 BT Hizmet Yönetimi Sistemi danışmanlık hizmeti başlamıştır. Güvenlik testlerinin bir kısmı tamamlanmıştır.
2017K090380	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının İyileştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000	3.300	3.700	0	% 0,0	2017 yılında iller altyapı için switch temini yapılmıştır. 2018 yılında sıfırdan yapılacak 25 il Müdürlüğü binası için projeye başlanılmış olup, 7 il Müdürlüğünün kablolanması tamamlanmıştır. Kabuller iş bitiminde yapılacağından şimdilik herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.
2017K090390	Veri Arşiv Sisteminin Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	5.100	2.600	2.500	0	% 0,0	Sistem devrede olup arşivleme işlemleri devam etmektedir. Kapasite artırımı için olur alındı şartname çalışmaları devam etmektedir.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	0	3.500	0	% 0,0	Uygulama Analiz Planı teslim edilmiş olup Mevcut Durum Analiz Raporu çalışmaları devam etmektedir
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (Dipnot:142) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	5.000	0	2.000	0	% 0,0	Proje dip notuna istinaden "Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı ile Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Mevcut Durum Analiz Raporu Hazırlanması" projesi kapsamında Bulut Kent Bilgi Sistemi Fizibilitesi Raporu hazırlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı'na resmi olarak gönderilmiş olup dipnotun kalkması için çalışmalar devam etmektedir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090360	Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000	15300	6.300	2.986	% 47,4	ARALIK 2017 - OCAK -ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS 2018 bakım onarım hakediş ödemeleri yapılmış olup; bu harcamalar dışında TUBİTAK - EKİNOKS YAZILIM - AGMLAB -ETİQA - DESTEK - ödemeleri yapılmıştır bu harcamalar dışında herhangi bir harcama bulunmamaktadır.
2018K090630	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	24.000	0	13.000	33	% 0,3	
	TUCBS Altyapısının Kurulumu	2018-2019	7.500		4.000	33	% 0,8	Proje çalışmaları başlatılmak üzere sözleşme imzalandı. Sözleşme takvimine göre teslim alındığı dönemlere (kesin kabul yapılması ile) denk gelen göstergeler çizelgeye işlenecektir.
	Metaveri Editörünün Modernizasyonu	2018-2019	6.000		3.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
	Coğrafi Veri Uyumlaştırma Projesi	2018-2019	6.500		3.500	0	% 0,0	
	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesi	2018-2019	4.000		2.500	0	% 0,0	Proje çalışmaları başlatılmak üzere sözleşme imzalandı. Sözleşme takvimine göre teslim alındığı dönemlere (kesin kabul yapılması ile) denk gelen göstergeler çizelgeye işlenecektir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K010090	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Mütcahhitliđi Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve Şantiye Şefi Bilişim Sistemi (e-Şantiye Şefi) Bakım, Onarım ve Güncelleme Projesi	2018-2018	450		450	0	% 0,0	Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan projenin 500.000 TL olan 2018 yılı ödeneğinden 450.000 TL lik kısım 07.03.2018 tarihli ve E.42419 sayılı OLUR çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. Hizmetin temini için teknik şartname sonlanma aşamasındadır.
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2018	1.606	642	964	0	% 0,0	
AB KATKISI			14.459	5.783	8.676	0	% 0,0	
<b>9 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>84.956</b>	<b>23.642</b>	<b>38.414</b>	<b>3.019</b>	<b>% 7,9</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>14.459</b>	<b>5.783</b>	<b>8.676</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

Dipnot: 142 Fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir. 2017K010680 numaralı Bulut Belediye Projesi ile koordineli yürütülecektir.



**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000200	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme (Turizm Sektörü)	2018-2018	11.000	0	11.000	0	% 0,0	
	Balıkgöl Çevre Düzenlemesi	2018-2018	1.000		1.000	0	% 0,0	Şanhurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Çal Mağarası Çevre Düzenlemesi	2018-2018	1.000		1.000	0	% 0,0	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Köyceğiz Çevre Düzenlemesi	2018-2018	3.000		3.000	0	% 0,0	Köyceğiz (Muğla) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi	2018-2018	2.500		2.500	0	% 0,0	Gökçeada (Çanakkale) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
	Gölbaşı Çevre Düzenleme Projesi	2018-2018	3.500		3.500	0	% 0,0	Gölbaşı (Adıyaman) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000630	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2018-2020	1.583		455	0	% 0,0	Gölbaşı (Ankara) Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Mogan Gölü Kıyı bandı rekreasyon alanı Çevre/Peyzaj Düzenlemesi Uygulama Projesininin Hazırlanması İşi. İhalesi Doğrudan temin yoluyla Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyonu ve Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2017-2019	10.950	2.900	6.000	511	% 8,5	Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yıllara sari olarak yürütülen projede 2017 yılında 2.900.000,00TL, 2018 yılı ilk çeyreğinde ise 510.628,41TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup imalat yapım çalışmaları devam etmektedir.
2018F000240	Tortum Gölü Yarım Ada Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.500		4.500	0	% 0,0	Uzundere (Erzurum) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
2018F000010	Uzungöl Çevre Düzenleme Tadilat Tamirat (DOKAP) (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	450		450	0	% 0,0	Uzungöl Çevre Düzenleme Tadilat Tamirat Yapım İşleri için, Genel Müdürlüğümüzce Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale ve Ödeme Yetkisi verilerilerek gerekli iş ve işlemlere başlanılmıştır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000740	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	3.000		3.000	0	% 0,0	Uygulama projeleri bekleniyor hazırlık çalışmaları devam etmekte.
2018F000750	Pileki Mağarası Patika ve Çevre Düzenlemesi (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	650		650	0	% 0,0	İyidere (Rize) Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanması planlanan mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
2018F000030	Demirkapı ve Arpaözü Turizm Amaçlı Yol İyileştirme (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2018	2.500		2.500	0	% 0,0	Demirkapı ve Arpaözü Turizm Amaçlı Yol İyileştirme Yapım İşi için, Genel Müdürlüğümüzce Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale ve Ödeme Yetkisi verilerek gerekli iş ve işlemlere başlanılmıştır.
2018F000040	Kınık Mahallesi Çevre Düzenlemesi (Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.000		3.000	0	% 0,0	Kaş (Antalya) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanması planlanan mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K050050	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2020	12.306		3.815	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz ile Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi için Eşmekaya Belediye Başkanlığı arasında, Selime (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi için Selime Belediye Başkanlığı arasında, Tuzyaka (Konya) İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Her üç projede sözleşme imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2020	27.475		12.375	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz ile Sultanhanı (Aksaray) İçmesuyu Temini Yapım İşi için Sultanhanı Belediye Başkanlığı arasında, Çamlıhemşin (Rize) İçmesuyu Temini Yapım İşi için Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı arasında, Eşmekaya (Aksaray) İçmesuyu Temini 2.Etap Yapım İşi için Eşmekaya Belediye Başkanlığı arasında imzalanması planlanan mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
2016K090060	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2019	2.292	992	600	0	% 0,0	1-Datça-Bozburun ÖÇKB Muğla İli, Datça İlçesi, Cumalı ve Karaköy Mahalleleri İmar Planı Kurum Görüşleri Almıyor. 2-Saros ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Sözleşme imzalandı Çalışmalar Devam Ediyor. 3-Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray İli, Merkez İlçe, Yeşilova Beldesi İmar Planı Sözleşme İmzalandı çalışmalar devam ediyor. 4-Fethiye-Göcek ÖÇKB Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kaya ve Keçi Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Tarım Bakanlığı Görüşü Bekleniyor. 5-Fethiye-Göcek ÖÇKB Muğla İli, Fethiye İlçesi, Hisaröntü ve Ovacık Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı İhale Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090270	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	800	0	400	0	% 0,0	1-Patara ÖÇKB Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Karaköy Mahallesi İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Bekleniyor. 2-Kaş-Kekova ÖÇKB Antalya İli, Demre İlçesi, Üçağız Mahallesi ve Kale Yerleşimi İmar Planı Protokol İmzalandı sözleşme Bekleniyor. 3-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Muğla İli, Köyceğiz İlçesi Merkezi İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Bekleniyor. 4-Saros ÖÇKB Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Cevizli, Sütluce, Burhanlı, Pazarlı, İlgardere Köyleri Koruma Amaçlı İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Geldi. 5-Belek ÖÇKB Antalya İli, Manavgat İlçesi, Yavrudoğan, Büklüce, Denizyaka, Denizkent, Perakende ve Kısalar Mahalleleri İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Bekleniyor. 6-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Muğla İli, Köyceğiz İlçesi Kıyı Dolgu Alanı İmar Planı Protokol İmzalandı Sözleşme Bekleniyor. 7-Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etütü Sözleşme İmzalandı Çalışmalar Devam Ediyor. 8-Tuz Gölü ÖÇKB Konya İli, Cihanbeyli İlçesi Kırkışla, Karşıyaka ve Yeşilöz Mahalleleri, İmar Planına Esas Jeolojik/Jeoteknik Etütü Protokolü 22.05.2018 tarih ve 84533 sayılı Genel Müdürlük Makam oluru ile İptal Edilmiştir.
2018K090420	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	991		991	0	% 0,0	Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisinde bulunan 38 yerleşim yerinin Sayısal Fotogrametrik Halihazır Haritalarının üretilmesi işi kapsamında, Daire Başkanlığımızca işin yapılacağı alanlara ait tahdit krokileri netleştirilmiştir. İhalenin hazırlanma aşamasında görevli olacak personellere ilişkin Genel Müdürlük Olurları alınmıştır. İlgili personellerce Teknik şartname hazırlanarak, yaklaşık maliyet tespiti yapılmıştır. Hazırlanan tüm dokümanlar ihale yapılmak üzere Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilmiş ve ihaleler tamamlanmıştır. İş alan Yüklenici firmalarca çalışmalara başlanmıştır.
2018K090430	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	342		342	0	% 0,0	Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisinde bulunan yerleşim yerlerinde ilgili Belediyelerce yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) mali katkı yapılmasına ilişkin , 10 yerleşim yeri ile ilgili Genel Müdürlüğümüz ile ilgili Belediyeler arasında protokoller imzalanmış olup, protokoller doğrultusunda Konya İli, Cihanbeyli Belediyesi ve Trabzon İli, Çaykara Belediyesince 5 yerleşim yerinin imar uygulaması yapım işinin ihaleleri tamamlanarak, ihaleyi alan firmalarca çalışmalara başlanılmıştır. Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Yenikent Beldesinde bulunan 5 yerleşim yerinde Yenikent Belediyesince yapılacak imar uygulaması yapımına ilişkin ihale süreci devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2018	54.178	41.678	12.500	12.500	% 100,0	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 15.07.2016 tarihinde yapılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlenmesi İşbirliği protokolü" kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Göl dip ve yüzey alanından su bitkileri toplama çalışmalarına Haziran ayı başı itibari ile başlanılmıştır. Susuzlaştırma tesisi altyapı çalışmaları tamamlanmış, gölde çamur tarama çalışmalarına başlanmıştır. 2018 yılı ödeneği olan 12.500.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na aktarılmıştır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2019	3.049	1.701	425	37	% 8,7	Proje numarası altında yer alan Belek, Göksu Deltası ve Köyceğiz-Dalyan kumsal alanlarında Deniz kaplumbağalarının popülasyonlarının korunması ve izlenmesi, Gölbaşı ÖÇKB sevgi çiçeği, koruma ve izleme projesi, Tuz Gölü ÖÇKB'de Toy Kuşu ve Bozkır Kartalı koruma ve izleme projesi, koruma ve izleme projesi ihaleleri tamamlanmış, projelerin 1. Ara raporları teslim alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu proje altında yer alan Pamukkale ÖÇKB Yönetim Planı hazırlama projesi ihalesi de Haziran ayı içinde tamamlanmıştır. Koruma ve İzleme projeleri Kasım ayı itibariyle tamamlanacaktır.
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.250	0	350	0	% 0,0	Ön rapor teslim edilmiş olup, Proje teşkilatı gerekli incelemeleri yaptı, gerekli düzeltmeler ilgili firmaya bildirildi; Firma istenen düzeltmeleri yapma aşamasında olduğundan ödeme için hakediş düzenlenmemiştir.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2020	2.300	175	1.000	242	% 24,2	2018 yılı Yatırım programı 2 dönem itibariyle ödemeler yapıldı çalışmalar devam etmektedir.
2018K100530	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2018	400		400	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.
<b>19 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>110.941</b>	<b>47.446</b>	<b>42.778</b>	<b>13.290</b>	<b>% 31,1</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>43.075</b>	<b>0</b>	<b>21.975</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>154.016</b>	<b>47.446</b>	<b>64.753</b>	<b>13.290</b>	<b>% 20,5</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100500	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	13.710		1.343	331	% 24,6	Çevre ve İklim Değişikliği Sektör Operasyonel Programı kapsamında 3. eylem dahilinde uzman maaşlarının ödemesi ile 3. Sektörel İzleme komitesini toplantısının organize edilmesinin ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
AB KATKISI			77.690		19.423	2.796	% 14,4	
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>13.710</b>	<b>0</b>	<b>1.343</b>	<b>331</b>	<b>% 24,6</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>77.690</b>	<b>0</b>	<b>19.423</b>	<b>2.796</b>	<b>% 14,4</b>	

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2020	135.435	49.489	29.900	9.815	% 32,8	
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	8.805	8.705	150	145	% 96,7	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.362.660,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	5.873	5.773	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.613.900,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	10.665	10.565	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde <b>KDV dahil 9.140.280 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2016 yılında <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	5.393	5.293	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde <b>KDV dahil 6.872.320,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	9.131	8.531	600	500	% 83,3	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde <b>KDV dahil 8.555.000,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	5.572	5.472	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde <b>KDV dahil 4.794.340,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde <b>HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>



**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2019	12.262	1.400	4.000	2.205	% 55,1	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde <b>KDV dahil 9.770.400,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %43' dir.</b>
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	11.879	0	2.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde <b>KDV dahil 10.437.100 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 29.03.2018 tarihinde imzalandı.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2019	8.383	2.060	5.000	2.007	% 40,1	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde <b>KDV dahil 6.652.840,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %70' dir.</b>
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	10.645	0	2.000	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. <b>Arsa sorunu çözüldü ve Projesi tamamlanmak üzere.</b>
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	19.500	0	7.450	1.338	% 18,0	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde <b>KDV dahil 17.039.200 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.01.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %20' dir.</b>
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	12.266	0	4.000	2.162	% 54,1	Hizmet binası yapım işi 15.01.2018 tarihinde <b>KDV dahil 8.782.740 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.02.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %30' dur.</b>
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	13.071	0	4.000	1.458	% 36,5	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde <b>KDV dahil 10.924.440 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 28.02.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %20' dir.</b>
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2017-2018	1.990	1.690	300	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 27.03.2017 tarihinde <b>KDV dahil 1.335.760,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 14.04.2017 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi yıl içerisinde tamamlandı ve HİZMETE AÇILDI.</b>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	<b>Döner Sermaye</b>	<b>2016-2020</b>	<b>52.948</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	35.320	0	19.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	8.001	0	2.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. <b>Arsa sorunu çözülmeye çalışılıyor.</b>
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	9.627	0	4.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 08.02.2018 tarihinde <b>KDV dahil 6.629.240 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 10.04.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %20' dir.</b>

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2018-2018	300		300	0	% 0,0	3 adet T5 (Minibüs) tipi aracın alınımının yapılabilmesi için gerekli olan Bakanlar Kurulu Kararının ihdas edilmesi için 18.01.2018 tarihinde Başbakanlığa talep yazısı gönderilmiştir.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2018-2018	3.700		3.700	1.544	% 41,7	
	Hizmet Binası Onarımı	2018-2018	3.500		3.500	1.988	% 56,8	
2018G000170	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2018-2018	4.570		4.570	0	% 0,0	
2018F000750	Çiçek Pasajı Canlandırma ve Yenileme Projesi (Turizm Sektörü)	2018-2018	5.234		5.234	0	% 0,0	Proje, Mersin İli Akdeniz Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde yer alan "Çiçek Pasajı" olarak bilinen Gökçay İş Merkezinin kentin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısındaki yerinin canlandırılması amacıyla yenilenmesi işidir. Kalkınma Bakanlığı'nın 27.02.2018 tarihli yazısı ile yatırım programına alınmış olup, Maliye Bakanlığı'nın 07.03.2018 tarihli yazısı ile de ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. 07.03.2018 tarihinde Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale talimatı verilmiştir.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>152.739</b>	<b>49.489</b>	<b>47.204</b>	<b>13.347</b>	<b>% 28,3</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>52.948</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>205.687</b>	<b>49.489</b>	<b>72.204</b>	<b>13.347</b>	<b>% 18,5</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 30.06.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018G000170	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2018-2018	2.000		2.000	59	% 3,0	Çankaya Çukurca Mahallesi 5 ve 7. Bloklara Kapı ve Alçıpan Yapıtılması İşi. Elvankent banka Blokları A36 dairenin bakım ve onarımı yapılmıştır.
2018K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2018-2018	300		300	78	% 26,0	Yemekhanede kullanılmak üzere Ocak alımı ve Hizmet Binası Girişinde Kullanılmak üzere sehba alımları yapılmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2018-2018	300		300	219	% 73,0	Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Z447 nolu odasında tadilat yapıtırılması, Yemekhaneye Soğutma Ünitesi için Tadilat Yapıtırılması, Yangın Alarm Sisteminin Yerinin Değıştirilmesi İşleri Yapıtırılmıştır. Hizmet Binası döner kapılar yapıtırılması, Müteşarlık Makam Katı ve Yemekhane Bölümü Tadilatı
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>356</b>	<b>% 13,7</b>	
