

2018 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

1. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 Dönemi)

Strateji Geliştirme Başkanlığı


05.04.2018

BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2018 – 31 Mart 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2018 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	795.594.000,00	795.594.000,00	207.894.127,85	% 26,1
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	134.776.000,00	134.776.000,00	35.188.850,65	% 26,1
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.681.000,00	90.273.103,41	16.652.605,12	% 18,4
05	CARİ TRANSFERLER	429.844.000,00	433.214.618,63	86.989.901,13	% 20,1
06	SERMAYE GİDERLERİ	292.780.000,00	673.833.875,41	82.739.846,52	% 12,3
	Bakanlık Yatırım Programı	273.752.000,00	278.986.000,00	7.280.113,79	% 2,6
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.028.000,00	19.028.000,00	3.009.142,19	% 15,8
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	375.819.875,41	72.450.590,54	% 19,3
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	162.177.000,00	162.177.000,00	1.105.628,41	% 0,7
	Bakanlık Yatırım Programı	32.018.000,00	32.018.000,00	510.628,41	% 1,6
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	130.159.000,00	130.159.000,00	595.000,00	% 0,5
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
08	BORÇ VERME	24.901.000,00	84.901.000,00	60.245.000,00	% 71,0
	Bakanlık Yatırım Programı	24.901.000,00	24.901.000,00	245.000,00	% 1,0
	IPA-I Projeleri Ek Ödeneği-İLBANK ödemesi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	% 100,0
GENEL TOPLAM		1.922.753.000,00	2.374.769.597,45	490.815.959,68	% 20,7


BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 – 31 Mart 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

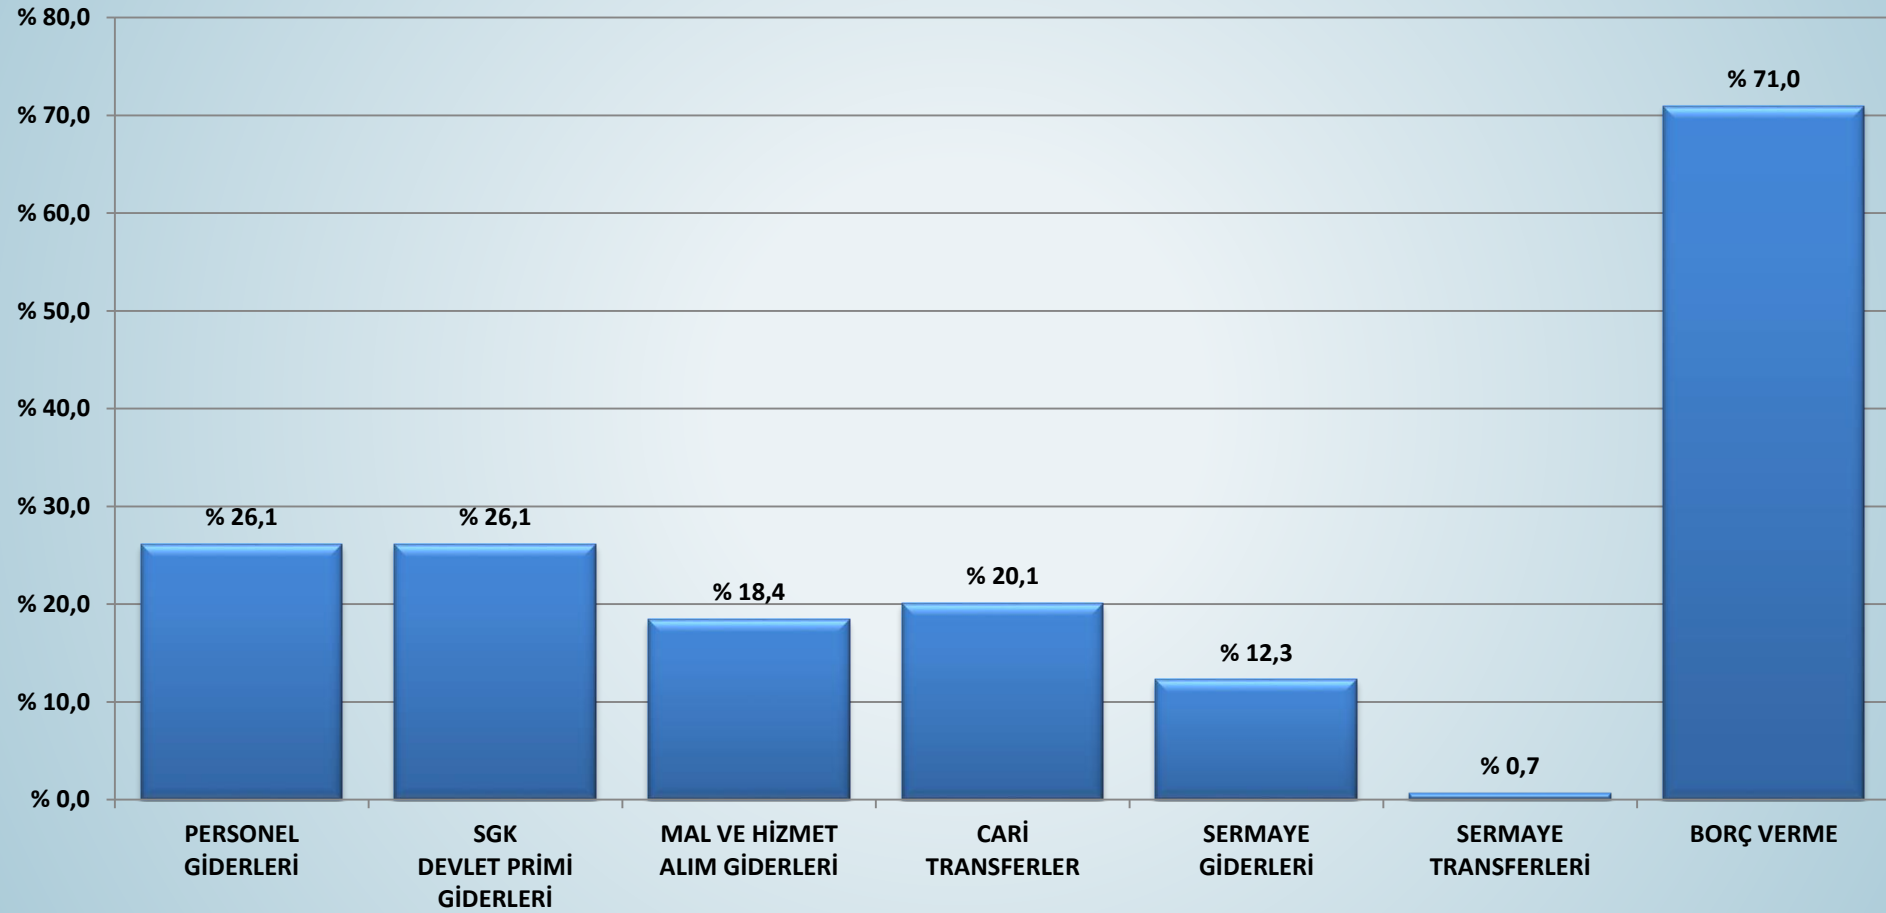

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2018 – 31 Mart 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	Proje Sayısı	REVİZE PROJE TUTARI	31 Mart 2018		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEK	HARCAMA	
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü (DETAY)	7	13.900.000,00	7.460.000,00	0,00	% 0,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (DETAY)	19	157.875.000,00	17.250.000,00	0,00	% 0,0
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (DETAY)	8	145.451.000,00	36.664.000,00	747.612,60	% 2,0
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	20	1.220.602.000,00	165.631.000,00	3.154.466,96	% 1,9
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hiz.Gn.Md. (DETAY)	4	13.614.000,00	7.100.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü (DETAY)	9	24.675.000,00	5.025.000,00	25.531,89	% 0,5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (DETAY)	9	84.506.000,00	37.964.000,00	1.217.616,37	% 3,2
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (DETAY)	14	110.941.000,00	42.778.000,00	510.628,41	% 1,2
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı (DETAY)	1	13.710.000,00	1.343.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı-İl Müdürlükleri (DETAY)	4	205.687.000,00	72.204.000,00	2.238.934,97	% 3,1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (DETAY)	2	2.600.000,00	2.600.000,00	140.951,00	% 5,4
GENEL TOPLAM	94	1.993.561.000,00	396.019.000,00	8.035.742,20	% 2,0
GENEL BÜTÇE KAYNAKLI PROJELER	91	1.865.705.000,00	350.905.000,00	8.035.742,20	% 2,3
DÖNER SERMAYE KAYNAKLI PROJER	3	127.856.000,00	45.114.000,00	0,00	% 0,0


HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2018 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2018 – 31 Mart 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

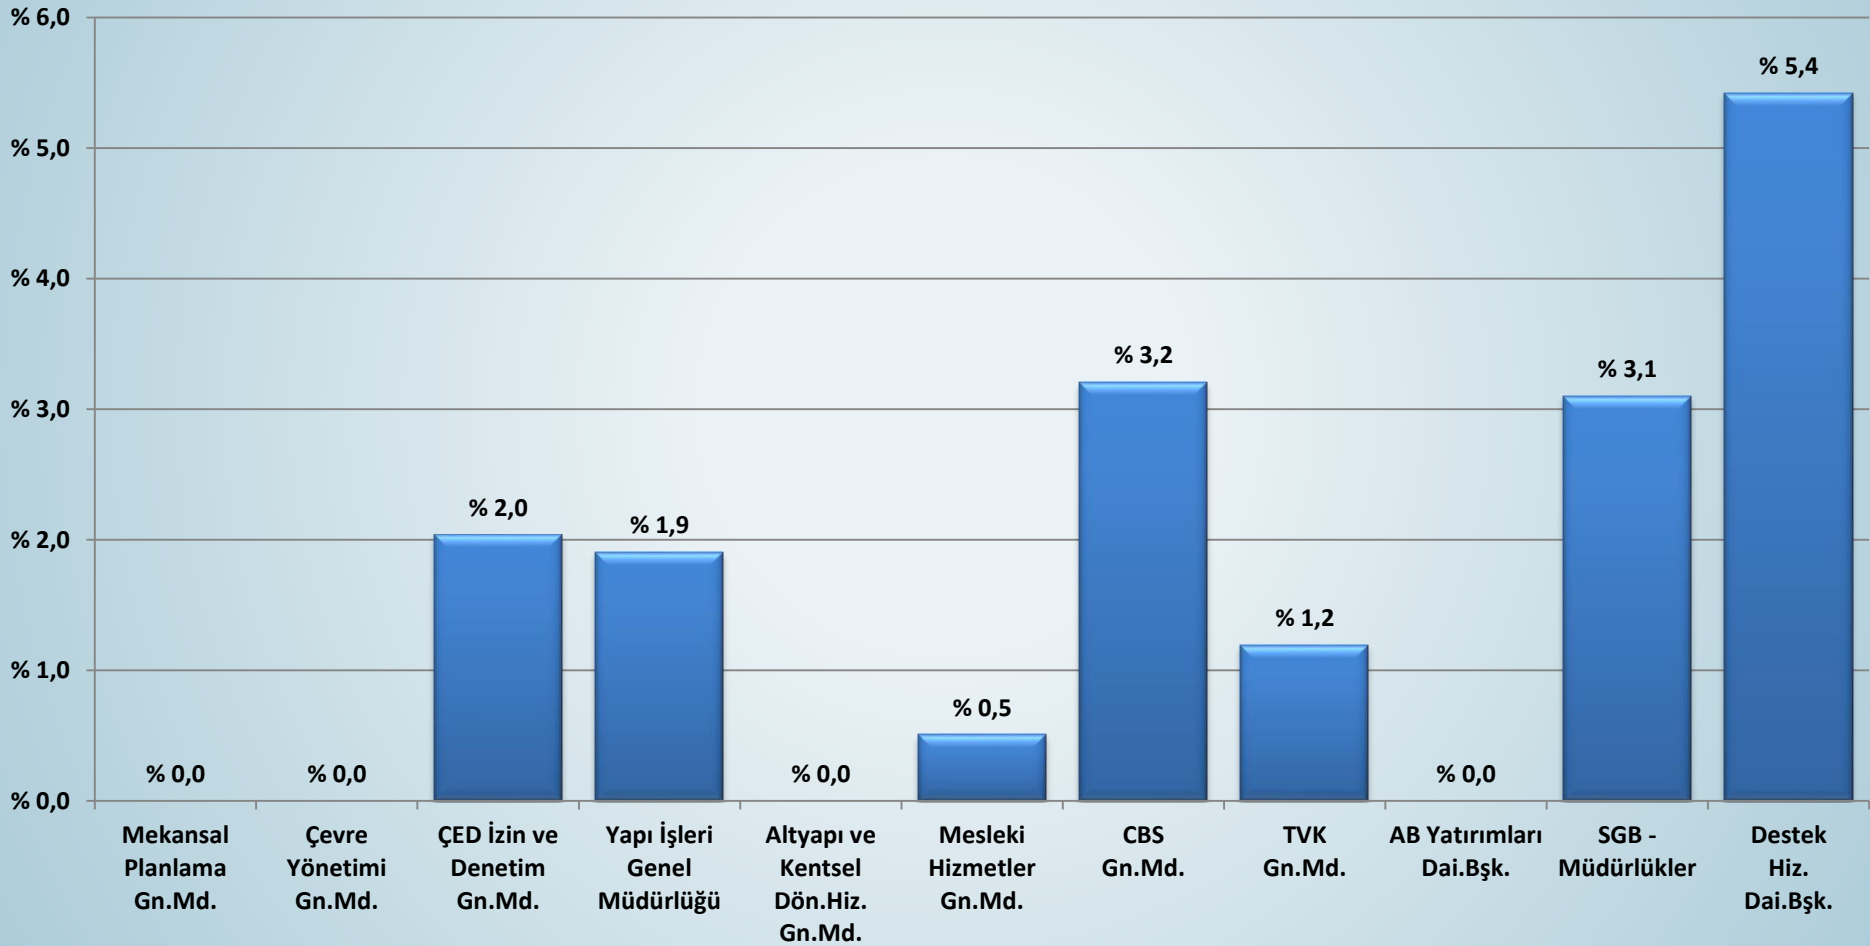

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	Başlangıç Ödeneği	Revize Ödeneği	31.03.2018 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25.913.000,00	25.913.000,00	4.758.863,35	% 18,4
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	228.627.000,00	288.408.140,40	66.042.698,20	% 22,9
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	58.866.000,00	61.474.113,84	9.914.795,43	% 16,1
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	221.421.000,00	238.706.938,24	19.236.232,82	% 8,1
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GEN. MÜD.	371.844.000,00	371.844.000,00	90.274.365,14	% 24,3
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19.275.000,00	19.275.000,00	4.362.234,88	% 22,6
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	50.468.000,00	50.662.481,68	4.967.563,70	% 9,8
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	56.993.000,00	56.716.000,00	4.126.630,49	% 7,3
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	8.671.000,00	8.671.000,00	2.295.540,72	% 26,5
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI	4.628.000,00	4.628.000,00	1.423.938,99	% 30,8
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI	2.059.000,00	2.059.000,00	580.683,74	% 28,2
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.996.000,00	3.996.000,00	1.163.129,90	% 29,1
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17.591.000,00	20.957.478,23	713.154,37	% 3,4
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.380.000,00	4.380.000,00	776.386,22	% 17,7
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2.631.000,00	2.631.000,00	347.892,83	% 13,2
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4.653.000,00	4.653.000,00	1.365.006,18	% 29,3
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	39.723.000,00	40.128.298,98	9.992.398,41	% 24,9
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ	770.000,00	770.000,00	190.632,08	% 24,8
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	26.983.000,00	26.983.000,00	7.448.188,27	% 27,6
İL MÜDÜRLÜKLERİ	773.261.000,00	1.141.913.146,08	260.835.623,96	% 22,8
TOPLAM	1.922.753.000,00	2.374.769.597,45	490.815.959,68	% 20,7

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2018 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

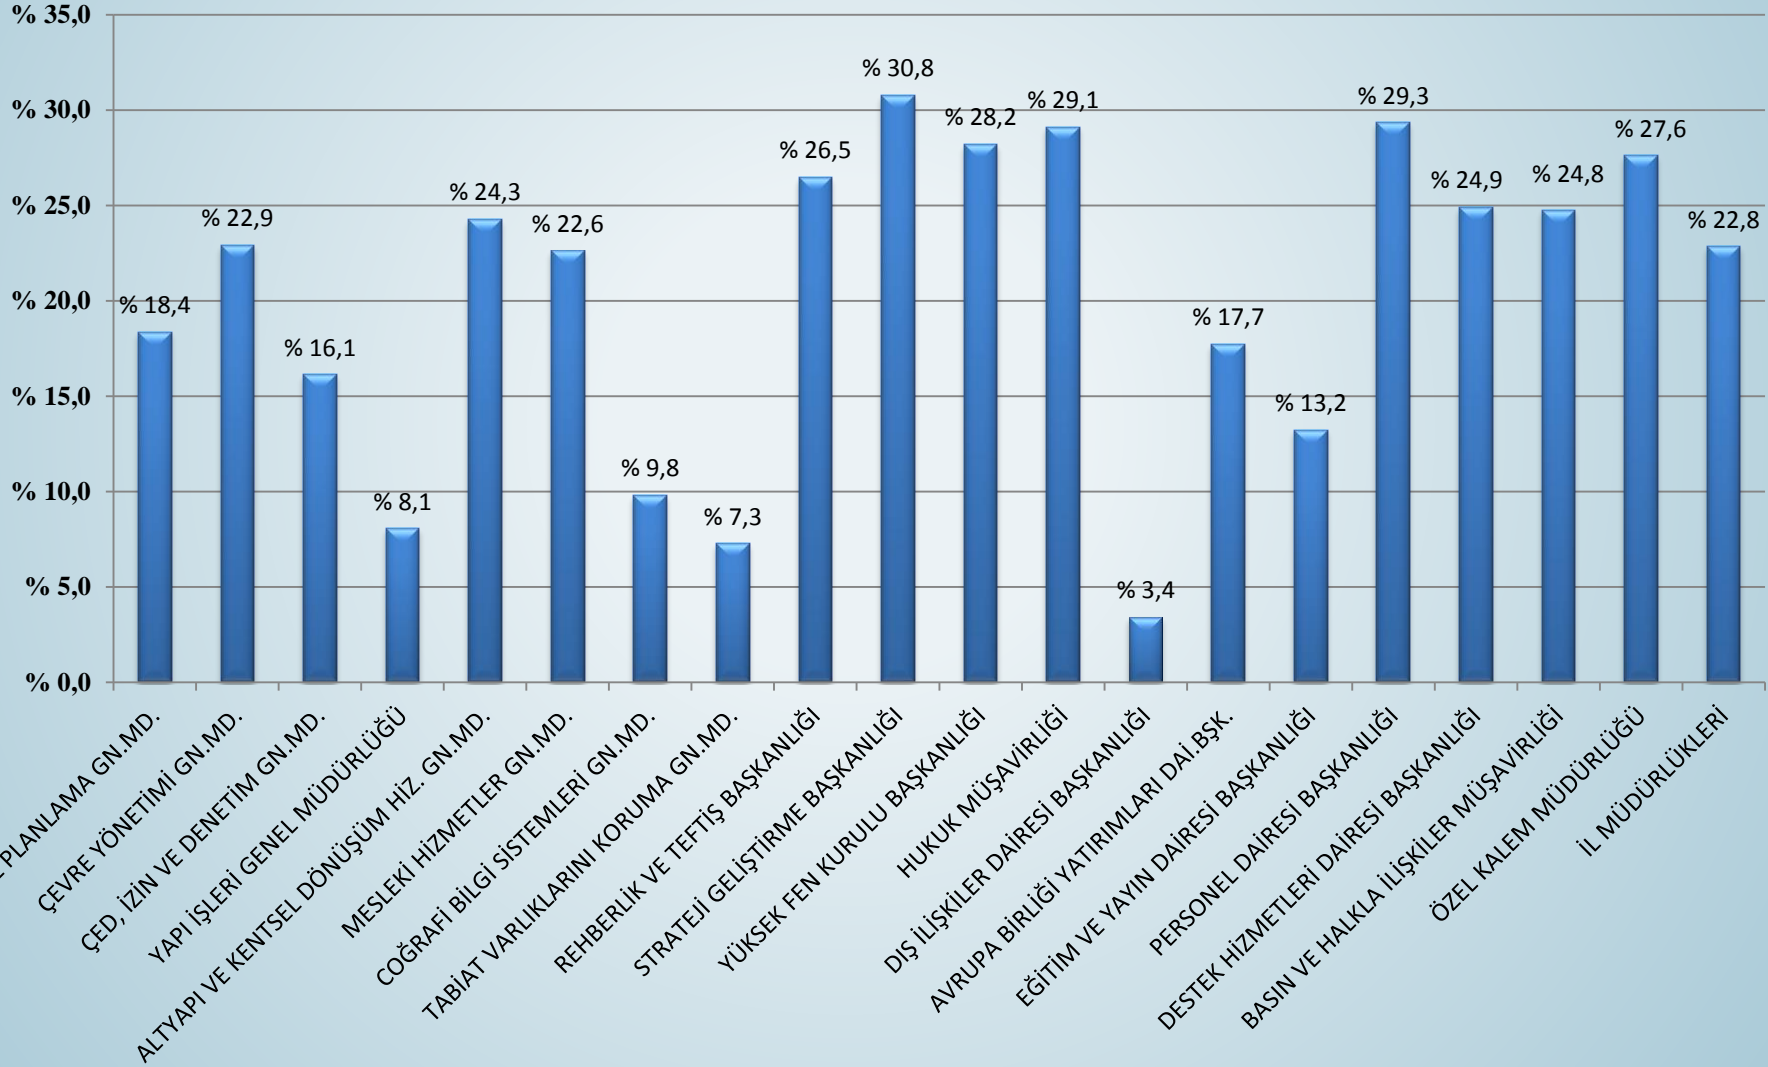

Arz Ederim...

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070030	Köylerde Yöresel Özellik ve İhtiyaç Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2018	2.000	540	1.460	0	% 0,0	Protokol imzalanmıştır. İş devam ediyor. Ödemeler 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	2.000	0	750	0	% 0,0	İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı'na ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre ve Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının hazırlanması işi için Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmış olup imzalanan protokol kapsamında plan çalışmaları sürdürülmektedir.
2018K090220	GAP ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları (Dipnot:145) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	800		800	0	% 0,0	Mardim- Midyat, Yozgat- Sorgun işi için Teknik şartname hazır. İhale edilecektir.
2018K090040	İmar Planları İzleme ve Denetim Modeli (Dipnot: 147) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	2.000		800	0	% 0,0	"Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi" başlığı altında Daire Başkanlığımız tarafında 2017 yılı içerisinde "Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlke ve Kriterlerinin Geliştirilmesi Proje" yürütülmüş ve sonuçlanmıştır.
2018K090210	Kıyı Yapılarının Toplaştırılması Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	1.500		500	0	% 0,0	Teknik şartname hazır. İhale usulü belirlenecektir.
2018K090600	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	1.000		500	0	% 0,0	Teknik şartname hazır. Trabzon- Ordu- Giresun, Tekirdağ- Edirne- Kırklareli işleri için ihaleye çıkılacaktır.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	4.600	0	2.650	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2019	3.000	0	1.650	0	% 0,0	İhale işlemlerine başlanılmıştır.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2019	1.600	0	1.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazır. Satınalma işlemlerinin başlatılması için talimat bekleniliyor.
7 Proje		06 ve 07 TOPLAM	13.900	540	7.460	0	% 0,0	

Dipnot: 145 2016K090020 numaralı projenin sonuç raporu Kalkınma Bakanlığına sunulmadan harcama yapılamaz.

Dipnot: 147 Proje formu Kalkınma Bakanlığı ile birlikte hazırlanacaktır. Teknik şartnamesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaz.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K060210	Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2018	3.500	2.070	1.430	0	% 0,0	28.07.2016 tarihinde imzalanan protokolle proje başlamış olup, arıtma çamurunun karakterizasyonuna yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 7 bölgede yapılması planan çalıştayların Ocak-Mart döneminde dördü tamamlanmıştır. III. Ara Rapor idareye teslim edilmiş olup, rapor inceleme sürecindedir.
2016K060230	Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Kanalizasyon Sektörü)	2016-2019	2.500	1.270	730	0	% 0,0	Proje kapsamında havzaya özgü kirlenmelerin belirlenmesi amacıyla Nilüfer Çayı Alt Havzası ve Yeşilirmak Havzasında belirlenen istasyonlarda numune alma ve analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde Bursa'da eğitim programı düzenlenmiştir. Ayrıca 30.03.2018 tarihinde Proje kapsamında hazırlanan Yönetim Planı ve Maliyet Analiz Raporları Bakanlığımıza sunulmuş olup inceleme aşamasındadır. Ayrıca, 19-20.04.2018 tarihlerinde Ankara'da "Çevresel Kalite Standartları Bazlı Deşarj Standartlarına Geçiş" konusunda düzenlenecek olan çalışmaya ilişkin hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2018K060290	Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri (Kanalizasyon Sektörü)	2018-2020	6.629		511	0	% 0,0	"Türkiye'de Endüstriyel ve Kentsel Deşarjlar İçin Çevresel Kalite Standartlarını (ÇKS) Sağlamaya Yönelik Deşarj Standartlarının Belirlenmesi ve Uygulanmasına Dair Uygulama Planı ve Maliyet Tahmini Projesi" adı altında çalışılacak bu proje için nihai fiyat teklifi alınmış ve Bakan Oluru alınması için Strateji Geliştirme Başkanlığı'na yazı yazılmış olup; Bakan Oluru alınmasını müteakip kısa süre içerisinde Yüklenci ile protokol yapılarak proje çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	1.000	150	50	0	% 0,0	İhale süreci sonlandırılmadığından herhangi bir harcama yapılmamıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	100.000	0	50	0	% 0,0	Kalkınma Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2017 yılı ödeneği Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza aktarılmamıştır. Bu nedenle herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2018K080010	İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2018-2021	1.000		50	0	% 0,0	Projenin teknik şartname hazırlama süreci devam etmekte olup tamamlanmasını müteakip ihale işlemlerine başlanacaktır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.500	500	2.000	0	% 0,0	Ulusal katkının takibinin yapılması amacıyla 2017 Yılı Yatırım Programının DKH-Sosyal-Çevre Sektöründe 2016K100050 numaralı "Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi" eklenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu projenin yürütülmesi işi 06.11.2017 tarihinde imzalanan bir protokol ile Medipol Üniversitesine verilmiştir. Proje faaliyetlerine başlanmış olup 2020 yılında bitirilmesi öngörülen projenin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraflarca sunulan ulusal bildirimler teknik detaylarda incelenerek bir sentez rapor hazırlanmıştır.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	1.000	1.000	0	% 0,0	Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Belirlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Uygulamanın Kolaylaştırılmasının Sağlanması Projesi 3 Şubat 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Dokuz Eylül Üniversitesi yürütücülüğünde başlamıştır. Proje kapsamında sektörel kontrol listeleri ve uygulama kılavuzları hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca demir çelik üretimi, demir dışı metal üretimi, tekstil, şeker üretimi, büyük yakma tesisleri, çimento üretimi ve cam üretim tesisleri yerinde ziyaret edilmiş ve üretim prosesleri hakkında bilgi alınmıştır. 2017 yılında 15 Demir-Çelik ve Demir dışı metal üretimi, 8 tekstil, 3 Şeker üretimi, 1 Çimento, 4 Cam üretim tesisi yerinde incelenmiştir. 2018 Yılı ilk çeyreğinde 2 Demir dışı metal üretimi, 2 Kireç Üretim Sektörü, 1 Otomotiv üretim tesisi, 2 Cam üretim tesisi, 2 Tuğla ve Kiremit Üretim tesisi, 1 Beyaz Eşya üretim tesisi ve 1 Seramik üretim tesisi yerinde ziyaret edilmiştir. Entegre Demir Çelik Üretim Tesisleri, Demir Dışı Metal Üretim Tesisleri, Şeker Üretim Tesisleri ve Tekstil Üretim Tesisleri ile ilgili kılavuzları tamamlanmıştır. 2018 yılı ilk çeyreğinde ödemeye esas sunulması gereken rapor bulunmamaktadır.
2018K100020	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2020	8.000		3.500	0	% 0,0	Toplatılmış tadat edilmemiş projedir. Bu proje altında yer alan Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi ve Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespiti projeleri için Teknik şartname ve Protokol hazırlama aşamasındadır. Bu proje altında yer alan Koku Oluşturan Emisyonların Yönetimi Projesi ve Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi için teknik şartnameleri hazırlanmış olup, Protokol hazırlık aşamasındadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100290	Tersanelerin Deniz Etkilerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.500		700	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
2018K100300	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.700		300	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
2018K100310	Deniz Çöplerinin Önlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.200		477	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
2018K100410	EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000		1.500	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi tamamlanmış olup, tekliflerin alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2018K100670	Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2019	3.000		1.300	0	% 0,0	Projenin teknik şartname hazırlama süreci devam etmekte olup tamamlanmasını müteakip ihale işlemlerine başlanacaktır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100190	İklim Değişikliği Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (AB)	2018-2018	206		206	0	% 0,0	Proje fişi ve teknik şartnamesi tamamlanmış olup AB Delegasyonunda onay aşamasındadır.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		1.166		1.166	0	% 0,0	
2018K100390	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB)	2018-2021	2.401		960	0	% 0,0	14 Şubat 2018 tarihinden itibaren projenin ihale dosyaları ihale komisyonu tarafından incelenmiş olup 21 Mart tarihinde ihale değerlendirme 1. aşaması tamalanmıştır. İhale süreci halen devam etmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		13.597		5.438	0	% 0,0	
2018K100400	KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB)	2018-2021	2.057		343	0	% 0,0	Proje henüz başlamamıştır.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		11.652		1.942	0	% 0,0	
2018K100610	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB)	2018-2021	7.541		800	0	% 0,0	AB Delegasyonundan gelen görüşler doğrultusunda proje fişi revizyonu süreci devam etmektedir.
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		42.730		12.257	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100040	Türkiye'de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)	2017-2019	4.341	1.668	1.343	0	% 0,0	
AB KATKISI	(Çevre Sektörü)		39.074	14.670	12.209	0	% 0,0	
	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	16/08/2017 tarihinde başlayan 23 aylık LULUCF Projesi kapsamında, ulusal sera gazı emisyon envanterinin LULUCF bölümünün geliştirilmesine yönelik olarak, OSİB Orman Genel Müdürlüğü ve GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kurumların konu ile ilgili personelinin katılımıyla, 2018 yılının Ocak ayında envanter hazırlama eğitimleri, Şubat ayında envanterin mevcut durumunun değerlendirilmesi çalışması, Mart ayında bilimsel araştırmalarla envanterin nasıl geliştirilebileceğini değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	Projenin açılış toplantısı 21 Haziran 2017 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir. Projede 1. aktivite olan "kanunsal boşluk analizi" tamamlanmış olup sektörel toplantıları gerçekleştirilmektedir.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	914	278	320	0	% 0,0	Projenin 14 Ağustos 2017'de başlamış olup projenin açılış toplantısı 27 Eylül 2017 tarihinde yapılmıştır. Proje web sayfası, iletişim strateji belgesi, eğitim modülleri başlıkları hazırlanmıştır.
			8.226	2.445	2.893	0	% 0,0	
	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	1.599	834	383	0	% 0,0	Hibe projeleri 15 Eylül 2017'de başlamış olup hibe projelerinin tanıtımı 27 Eylül 2017 tarihinde yapılmıştır. 38 adet hibe projesi yürütülmektedir. Hibe uygulayıcılarına raporlama eğitimi gerçekleştirilmiştir. Proje web sayfası ve izleme uygulaması oluşturulmuştur. 38 adet projenin birinci izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
			14.396	7.335	3.530	0	% 0,0	
19 Proje		06 ve 07 TOPLAM	157.875	6.658	17.250	0	% 0,0	
		AB KATKISI	108.219	14.670	33.012	0	% 0,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100200	OLFAKTOMETRE Cihazı Alımı (Çevre Sektörü)	2018-2018	250		250	0	% 0,0	Cihaz alımı için yapılan teknik araştırmalar devam etmektedir.
2018K100630	Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri Kapasite Geliştirme (Çevre Sektörü)	2018-2018	500		500	0	% 0,0	Konya Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün Laboratuvar Kurulumu için ihale talimatı alınmış olup öncelikle kurulacak ön işlem laboratuvarının alt yapısı (tezgah,çeker ocak,robotik kol gibi) için doğrudan temin yapılmış (65.000+KDV) ancak, henüz teslim edilmemiştir.Cihaz alımları açık ihale ile yapılacak olup teknik şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2018K100470	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	4.000		1.500	0	% 0,0	Proje Teknik Şartname aşamasındadır.
2018K100520	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi-FAZ II (Çevre Sektörü)	2018-2019	3.000		1.500	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
2018K100620	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyonu, Entegrasyonu ve Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2019	4.000		2.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
2018K100660	Kümülatif Etki Değerlendirme Projeleri (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.000		1.800	0	% 0,0	Daire Başkanlığımızca Taslak Teknik Şartname hazırlanmış olup, ihale sürecine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2020	70.098	17.500	16.998	748	% 4,4	Projenin Lab. Ölç.ve İzl. Da. Bşk. tarafından yürütülen kısmı ile ilgili ; 2017 yılı Bakım Onarım işine ait Aralık ve Ocak 2018 ayına ait hakedişler ödenmiştir. 2018 yılına ait projenin ihalesi de 01 Mart 2018 tarihinde yapılmıştır. Projenin Marmara Temiz Hava Merkezi tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 6.1 Mamul Mal Alımı kaleminden yapılması planlanan harcama için 26.04.2108 tarihinde ihale yapılacaktır. 6.2 Menkul Sermaye Üretim Gideri kaleminden Ocak ve Şubat aylarına ait 31.03.2018 tarihinde KDV dahil 242.136,00.-TL hakediş ödemesi yapılmıştır. Diğer taraftan, Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında taşıma gideri elektrik bağlantı işlemleri için ihtiyaç duyulan ödenek talepleri aktarma yoluyla gerçekleştirilmektedir.
	Döner Sermaye	2015-2019	58.408	33.735	12.114	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2017K100050	Türkiye'de E-PRTR Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)	2017-2019	1.195	641	2	0	% 0,0	25.05.2017 tarihinde başlamış olan Türkiye'de E-PRTR Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) 25.05.2019 tarihinde tamamlanacaktır. Şu anda proje ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 2018 yılı içerisinde ulusal katkı payı ödemesi bulunmamaktadır.
AB KATKISI	9.822		5.924	2	0	% 0,0		

8 Proje

06 ve 07 TOPLAM	87.043	18.141	24.550	748	% 3,0
DÖNER SERMAYE	58.408	33.735	12.114	0	% 0,0
GENEL TOPLAM	145.451	51.876	36.664	748	% 2,0
AB KATKISI	9.822	5.924	2	0	% 0,0

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	16.500	8.500	8.000	0	% 0,0	Bakanlık Hizmet Binası İnşaatı işine ait kesin hesap düzenlenmiş olup, inceleme aşamasındadır. İncelemenin tamamlanmasını müteakip ödemesi yapılacaktır. CBS Veri Merkezi ve İlave İşler işine ait kesin hesap çalışmaları devam etmektedir.
2015K140150	Afet ve Acil Durum Müdahale Ekipmanları Alımı (Dipnot: 182) (Afetler Sektörü)	2015-2018	5.580	3.213	2.367	0	% 0,0	Projeye ilişkin ön çalışmalar yapılmaktadır.
2017K140090	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Alımı (Afetler Sektörü)	2018-2018	493		493	0	% 0,0	Projeye ilişkin ön çalışmalar yapılmaktadır.
2018K010080	Yüksek ve Sismik Yalıtımlı Bina Tasarım-Onay Yön. (Genel İdare Sektörü)	2018-2018	750		750	0	% 0,0	18.03.2018 tarihinde yayımlanan 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin 1.3 maddesine göre 'Özel Konularda Tasarım Gözetimi ve Kontrolü' hizmetinin alınması zorunlu hale getirilmiştir. Proje kapsamında 'Tasarım Gözetimi ve Kontrolü ile ilgili usul ve esaslar' belirlenecektir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 1- Konuya ilişkin dokümanları toplanmıştır.(Daha önce yapılan yurtdışı incelemelerindeki tespitler, İMO'nun çalışmaları, TBDY ilgili bölümü, MHGM ile irtibata geçilmesi, TBDY komisyonundaki akademisyenler ile görüşülmesi) 2- Genel Müdürlük Bünyesinde iki adet toplantı yapılmıştır. (Tasarım gözetiminde bulunması gereken mühendislik disiplinlerinin belirlenmesi, çalışma gruplarının zümre şeklinde teşkil edilmesi, teşkil edilecek komisyon ve denetleme kurulu ile ilgili görüşler bir sonraki toplantıda tekrar değerlendirilmek üzere maddeler halinde sıralanmıştır. 3- Hizmet alınma esas taslak protokol hazırlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K010090	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi	2018-2018	1.300		1.300	102	% 7,8	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları değerlendirme analizleri kitapçığı hazırlanmıştır. ADD-On yazılımı ve yazılım kurulum son haline getirilmiştir. Yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin gereksinim raporu ve yapım projelerinin çevrimiçi yönetilmesine ilişkin sistemin kontrol ve test raporu hazırlanmıştır. "Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları" sözleşme gereği tamamlanmış, kabul işlemi yapılmıştır. Konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi (genelge vb...) ve yayımlanması için hazırlıklar ve devam etmektedir. CADD standartlarının yaygınlaştırılması ve standardın kullanıldığı örnek projelerin elde edilmesi amacıyla 2018 yılı ilk çeyrek sonunda bu standardın kullanıldığı projelerin elde edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2018-2018	1.368		1.368	0	% 0,0	Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılımı Bakım, Destek, İyileştirme ve Geliştirilmesi İş'i'nde 2018 yılında da hizmet alımı yapılacak olup, şu an ihale aşamasındadır. Ayrıca ihalesi yapılan YDS-2 yazılımının 27.02.2018 tarihinde kabulü yapılmış olup, sistemin devreye alınması sürecine ilişkin Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ortak çalışma protokolü yapılarak çalışmalara başlanmıştır.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2018-2018	1.100		1.100	38	% 3,5	2018 yılı proje sürecinde vizyon projeler başlığı altında e-levha, e-hakediş ve yaklaşık maliyet otomasyon işlerine çıkılacaktır.Planlanmış ve planlanmamış Genel Müdürlüğümüze ait otomasyon + yazılım, donanım ihtiyaçları proje kapsamında yürütülmektedir.
2018K070120	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2020	4.500		1.500	22	% 1,5	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir.Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2019	27.544	11.966	500	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2019	6.073	3.513	496	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlandı. Yaklaşık 80 konutun güçlendirme ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca sorunun çözümüne yönelik yöre milletvekilleri tarafından kanun çalışması yürütüldüğünden sonucu takip edilmektedir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2019	11.970	3.389	2	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2019	9.501	5.064	2	0	% 0,0	Hak sahipliği iptali var. Danıştay'dan mahkeme sonucu bekleniyor. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır.
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2020	30.000	5.000	4.000	0	% 0,0	
	Muhtelif İskan Konutları Altyapı İşleri	2010-2020	23.000	5.000	100	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça köylerin alt yapı inşaatları için kullanılacaktır.
	Ilısu Barajı İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2019	7.000		3.900	0	% 0,0	Konutlar kredi vermek suretiyle yapılacağından ödenekler 2011K070020 projesine aktarılacaktır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	198.112	26.304	31.000	1.099	% 3,5	
	Arslanapa-Kureysler Köyü İskanı	2015-2018	5.996	5.986	10	0	% 0,0	İş bitmiştir.
	Göksu-Gücüksu Köyü İskanı	2015-2018	16.700	16.000	700	0	% 0,0	İş devam etmektedir. Bu yıl bitecektir.
	Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2019	29.075	0	9.075	0	% 0,0	İşin ihalesi 06.04.2018 tarihinde yapılmış olup sözleşme çalışmaları devam etmektedir.
	Muhtelif İskan İşleri	2011-2020	146.341	4.318	21.215	1.099	% 5,2	İşlerin ihale çalışmaları devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2019	196.798	160.725	7.537	0	% 0,0	
	Anamur- Alaköprü Barajı İskanı	2013-2019	187.263	158.725	2	0	% 0,0	Üst yapı ve alt yapı işleri tamamlandı. Tarım arazisi ıslah işlerine devam edilmektedir. 1.etap ihale işeri tamamlanmıştır. 2.etap yatırıma teklif edilmiştir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2018	9.535	2.000	7.535	0	% 0,0	Doğanpınar Barajı yapımından etkilenen 28 ailenin yeni yerleşim yeri Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Kaşyolu Köyü olarak belirlenmiş olup iş devam etmektedir.
2011K070010	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2019	5.000	3.000	1.000	47	% 4,7	2017 Yılı itibarıyla 13 adet İlde (Erzincan, Bayburt, Artvin, Ardahan, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Batman, Gaziantep, K.Maraş, Malatya, Adıyaman) gerçekleştirme sağlanmış, bunlardan başka Erzincan'da yüksek yoğunluklu yöresel konut projesi de tamamlanmıştır. 13 il için de (Adana, İçel, Hatay, Osmaniye, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkâri, İstanbul, Canakkale, Tekirdağ, Kırklareli) 2018 Yılında örnek kırsal konut projeleri
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	3.819	1.826	500	0	% 0,0	Tamamlanarak yatırımdan çıkmış işlerde kesin hesap farkı çıkması halinde hukuki problem yaşanmaması amacıyla kullanılan bir ödenek olup gerek duyuldukça harcama yapılmaktadır.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2020	3.620	1.400	500	0	% 0,0	2018 yılı eğitim programına alınmadığından eğitim yapılamayacaktır.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2021	135.236	8.913	40.000	1.601	% 4,0	İş devam etmektedir.
2018K070020	Bozkır Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	138.120		15.815	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070030	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	33.588		5.000	0	% 0,0	İş yatırım programına alındıktan sonra yeni yerleşim yeri olacak alanla ilgili hukuki süreç başlamıştır. (Mahkemelik olmuştur.) Mahkeme sonucuna göre işlem yapılabilecektir.
2018K070130	İlusu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2020	68.113		7.000	0	% 0,0	İlusu Barajı İskanı için iskan duyurusuna çıkılmış olup başvurular alınmıştır. 710 haksahibi belirlenmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
2018K070140	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	103.114		11.000	0	% 0,0	Yusufeli Barajında hak sahipliği başvuruları alınmış olup inceleme çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak olup ödenek DSİ tarafından temin edilecektir.
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2020	5.947	2.800	50	0	% 0,0	Talep oldukça harcama yapılmaktadır.
2011K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2021	240.000	22.000	24.851	245	% 1,0	İşler devam etmektedir.
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	958.155	222.347	132.730	2.909	% 2,2	
		08 TOPLAM	245.947	24.800	24.901	245	% 1,0	
		DÖNER SERMAYE	16.500	8.500	8.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	1.220.602	255.647	165.631	3.154	% 1,9	

Dipnot: 182 Harcama yapılması Kalkınma Bakanlığının iznine tabidir.

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	6.500	2.500	4.000	0	% 0,0	Bu proje kapsamında, 07.03.2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) ile bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde, 30.03.2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, protokolün ilk üç aylık süreci başlamıştır. Bu süreçte, yüklenici firma, yeni bir yerleşim biriminin Bakanlığımızca daha evvelden hazırlanmış olan Süperkent Mahalle Standartlarına uygunluğunu sağlayacak teknolojilerin belirlenmesi işini yapacaktır. Yüklenici firma, 16.06.2017 tarihinde söz konusu iş kapsamında belirledikleri teknolojilere ilişkin olarak ilk raporlarını teslim etmiş olup, gelinen tarih itibarıyla Bakanlığımızca bu teknolojiler incelenmektedir. Bakanlığımızca uygulanması uygun bulunan teknolojiler belirlenmiş ve bu teknolojilerin Bakanlığımızca belirlenecek bir pilot alanda uygulanmasına yönelik daha detaylı analizlerin ve uygulama projelerinin çizilmesi safhasına geçilmiştir. Bu kapsamda pilot uygulama alanına ilişkin yol kesitleri, içme suyu ve yağmur suyu hasadı sistemi projeleri ile tarım-otopark kulelerine ilişkin ilk teslim alınmış, bedeli olan 1.260.000,00 TL'lik tutarın ödemesi yapılmıştır. (Ayrıca protokol kapsamında 550.847,46 TL'lik Avans ödemesi yapılmıştır.) Ayrıca, 18.12.2017 tarihinde yapılan ikinci hakediş ödemesi kapsamında, "Elektrik Orta ve Düşük Gerilim Projelerinin Yapılması", "Isı Dağıtım Şebekesinin Ön Projesinin Tasarlanması" ve "Akıllı Kent Sistemlerinin Geliştirilmesi" işlerine ait 1.790.000,00 TL'lik tutarın ödemesi yapılmış ve bu hakedişte avans kapatılmıştır. 2018 yılı içerisinde ilk teslimlerin 31.05.2018 tarihine kadar alınması planlanmaktadır.
2017K090120	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	1.815	1.015	800	0	% 0,0	Projenin 1. Etapı kapsamında riskli alan ilan edilen Aydın/İlçebaşı, Ankara/Kahramankazan, İstanbul/Esenler, İstanbul/Gaziosmanpaşa, Mardin/Nusaybin, Şırnak/Cizre bölgelerinde anket ve derinlemesine görüşme yapılması işi için 22.03.2017 tarihinde, ihale gerçekleştirilmiştir. 106.600,00 TL+KDV bedel ile ihale uhdesinde kalan ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Limited Şirketi saha çalışmalarını tamamlayarak teslim etmiş, çalışmanın hakedişi yapılmıştır. Sahaya inilerek 3757 kişi üzerinde anket çalışması yapılmış, Mardin/Nusaybin ve Şırnak/Cizre ilçeleri için ilçede bulunan kanaat önderleri ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş olup incelemelerin raporları teslim alınmıştır. 2. Etap olarak ise; Politika-plan-proje belirlemek için "Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli ve Rehberi"nin üretilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm literatür taraması, Bakanlık kentsel dönüşüm verilerinin incelenmesi, mevcut Bakanlık araştırmalarının değerlendirilmesi, ön bulgu raporlarının hazırlanması ve bu minvalde gelişim toplantılarının hazırlanması aşaması 1.aşaması tamamlanmıştır.2. aşama Mülakata Dayalı Alan araştırmasının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090320	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	2.200		2.200	0	% 0,0	"Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi" projesine ilişkin dipnotun kaldırılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, Üniversite ile protokolün imzalanmasını müteakiben çalışmalara başlanacaktır.
2015K140160	Riskli Yapıların Tespiti İçin Yapısal Analiz Yapılması (Afetler Sektörü)	2015-2018	3.099	2.999	100	0	% 0,0	01.01.2018-31.03.2018 tarihleri arasında herhangi bir harcama yapılmamış olup, proje ödeneğinin 3.300.000,00 TL ve iş bitim tarihinin 2018 yılı olarak belirlendiği projede, tarafımıza sunulan 5. gelişme raporuna yönelik yapılan işlerin tümüne bugüne kadar 3.200.000,00 TL harcanmıştır. Projede % 97 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	13.614	6.514	7.100	0	% 0,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D000070	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2021	3.150		975	15	% 1,5	Yazılımın teminine ilişkin çalışmalar başlamıştır.
2010K010110	Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Artırılması (Genel İdare Sektörü)	2010-2018	12.800	12.250	550	11	% 2,0	TSE'ye deney ücreti ödemesi yapılmıştır.
2015K010060	Merkez ve İl Laboratuvarları Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	2.445	1.375	1.070	0	% 0,0	1. dönemde proje kapsamında yurtiçi geçici görev yolluk ödemesi yapılmıştır.
2015K010080	Yapı Ustalarına Eğitim Verilerek MYK Tarafından Belgelendirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2018	780	530	250	0	% 0,0	İllerden tanıtım ve kişisel koruyucu donanım temini için ödenek talebi olmadığından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2016K010070	Yapı Malzemelerini Düzenleyen Şartname Sayısının Artırılması (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	330	180	150	0	% 0,0	YMDS kapsamında, Veritabanı Onaylanmış Kuruluşlar Bölümü Etkinleştirilmesi İşiyile ilgili sözleşmesi yapılan firmaya 2018 Nisan ayında ödeme yapılacaktır.
2016K010090	Müellif Takip ve Bilgi Sistemi (MÜTABİS) Tasarımı (Genel İdare Sektörü)	2016-2018	560	230	330	0	% 0,0	Projede Muayene ve Önkabul işlemleri tamamlanmıştır.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	3.400	800	700	0	% 0,0	2018 yılı 1. Döneminde gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonuna kadar hedeflenen yatırım gerçekleşme oranına ulaşılacağı değerlendirilmektedir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K010090	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Mühendisliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve Şantiye Şefi Bilişim Sistemi (e-Şantiye Şefi) Bakım, Onarım ve Güncelleme Projesi	2018-2018	500		500	0	% 0,0	Proje Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülecektir. Projenin 450.000 TL lik ödeneği Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır.
2016K090040	Kadim Şehirler (Şehirleşme Sektörü)	2016-2018	710	210	500	0	% 0,0	Üniversitenin ikinci aşama için sunduğu rapor Teknik Kabul Komisyonunca yeterli bulunmamıştır. Projenin üçüncü aşaması olan pilot tasarım projeleri hazırlanması işinde proje alanına ilişkin karşılıklı mutabakat sağlanamamıştır. Üniversite ile yapılan Protokol 20.11.2017 tarihinde feshedilmiştir.
9 Proje		06 ve 07 TOPLAM	24.675	15.575	5.025	26	% 0,5	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090410	CBS Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2018	3.000	0	3.000	0	% 0,0	Proje Türksat A.Ş. ile imzalana sözleşme kapsamında sunulan proje planına uygun olarak devam etmektedir.
2017K090370	Siber Güvenlik Operasyon Merkezinin İdamesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	4.800	1.800	3.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış, ihale kapsamında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Uyum Hizmetlerinin Analiz Edilmesi ve Güvenlik İzleme Destek Hizmeti çalışmaları başlamıştır.
2017K090380	Taşra Teşkilatı Bilgi İşlem Altyapısının İyileştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	7.000	3.300	3.700	0	% 0,0	Proje ile ilgili olarak ihale yapılmış olup, sözleşme imza aşamasındadır.
2017K090390	Veri Arşiv Sisteminin Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	5.100	2.600	2.500	0	% 0,0	Proje Kapsamında Veri Depolama Ünitelerinin kapasite artırımına yönelik satınalma süreci devam etmektedir.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	0	3.500	0	% 0,0	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesinin yapılmasına ilişkin sözleşme imza aşamasında olup, Bu kapsamda 01.01.2018 -31.03.2018 tarihleri arasında projeye ilişkin harcama ve gerçekleştirme bulunmamaktadır.
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (Dipnot:142) (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	5.000	0	2.000	0	% 0,0	Bulut KBS Projesinin devamı niteliğinde olan Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi kapsamında harcama yapılması 2018 yılı Yatırım Programında yer alan dipnotta belirtildiği üzere Kalkınma Bakanlığının müsaadesine tabi olup dipnotun kaldırılması için fizibilite etüdü çalışmaları tamamlanmış ve Kalkınma Bakanlığı'na sunulmuştur, ayrıca İçişleri Bakanlığı Bulut Belediye Projesi ekibi ile teknik koordinasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda sunulan proje fişi Kalkınma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler üzerine revize edilmiş ve tekrar sunulmuştur. Dipnotun Kalkınma Bakanlığı tarafından kaldırılmasının ardından işin ihalesi yapılabilecek ve sisteme ilişkin fonksiyonların geliştirilmesine başlanabilecektir. Bu kapsamda 01.01.2018 -31.03.2018 tarihleri arasında projeye ilişkin harcama ve gerçekleştirme bulunmamaktadır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090360	Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000	15300	6.300	1.218	% 19,3	Proje kapsamında Aralık 2017 - Ocak -Şubat 2018 bakım onarım hakediş ödemeleri yapılmış olup; bu harcamalar dışında herhangi bir harcama bulunmamaktadır.
2018K090630	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	24.000	0	13.000	0	% 0,0	
	TUCBS Altyapısının Kurulumu	2018-2019	7.500		4.000	0	% 0,0	TUBİTAK ile sözleşme aşamasındadır. Harcama yapılmamıştır
	Metaveri Editörünün Modernizasyonu	2018-2019	6.000		3.000	0	% 0,0	Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. Harcama yapılmamıştır
	Coğrafi Veri Uyumlaştırma Projesi	2018-2019	6.500		3.500	0	% 0,0	Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. Harcama yapılmamıştır
	Ulusal Coğrafi Veri Servislerinin Yönetilmesi	2018-2019	4.000		2.500	0	% 0,0	Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. Harcama yapılmamıştır

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013K100060	INSPIRE Kapasite Artırımı (AB) (Çevre Sektörü)	2013-2018	1.606	642	964	0	% 0,0	Proje faaliyetleri 1 Mart 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin onaylanmasına ilişkin proje çıktılarının kontrolü çalışmaları devam etmektedir. Projenin yazılım bileşenlerinin ToR'a ve yazılım gereksinim dokümanlarına uygunluğunun tam olarak sağlanmasının ardından projenin onaylandığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığına bildirilerek 2018 yılı gerçekleşmesi tamamlanacaktır. Bu kapsamda 01.01.2018 -31.03.2018 tarihleri arasında projeye ilişkin harcama ve gerçekleşme bulunmamaktadır.
AB KATKISI			14.459	5.783	8.676	0	% 0,0	
9 Proje		06 ve 07 TOPLAM	84.506	23.642	37.964	1.218	% 3,2	
		AB KATKISI	14.459	5.783	8.676	0	% 0,0	

Dipnot: 142 Fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılabilecektir. 2017K010680 numaralı Bulut Belediye Projesi ile koordineli yürütülecektir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000200	Korunan Alanlarda Turizm Yatırımlarını Destekleme (Turizm Sektörü)	2018-2018	11.000	0	11.000	0	% 0,0	
	Balıkgöl Çevre Düzenlemesi	2018-2018	1.000		1.000	0	% 0,0	Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
	Çal Mağarası Çevre Düzenlemesi	2018-2018	1.000		1.000	0	% 0,0	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
	Köyceğiz Çevre Düzenlemesi	2018-2018	3.000		3.000	0	% 0,0	Köyceğiz (Muğla) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
	Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi	2018-2018	2.500		2.500	0	% 0,0	Gökçeada (Çanakkale) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
	Gölbaşı Çevre Düzenleme Projesi	2018-2018	3.500		3.500	0	% 0,0	Gölbaşı (Adıyaman) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
2018F000630	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2018-2020	1.583		455	0	% 0,0	Gölbaşı (Ankara) Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Mogan Gölü Kıyı bandı rekreasyon alanı Çevre/Pezyaj Düzenlemesi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi. İhalesi Doğrudan temin yoluyla Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi imzalanma aşamasındadır. Akyaka (Muğla) Azmak Kıyı Bandı Düzenleme Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi. İhalesi Pazarlık usulü yöntemiyle Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi imzalanma aşamasındadır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2017-2019	10.950	2.900	6.000	511	% 8,5	Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yıllara sari olarak yürütülen projede 2017 yılında 2.900.000,00TL, 2018 yılı ilk çeyreğinde ise 510.628,41TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup imalat yapım çalışmaları devam etmektedir.
2018F000240	Tortum Gölü Yarım Ada Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.500		4.500	0	% 0,0	Uzundere (Erzurum) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İhale süreci devam etmektedir.
2018K050050	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2020	12.306		3.815	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz ile Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşleri için Eşmekaya Belediye Başkanlığı arasında, Selime (Aksaray) Belediyesi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşleri için Selime Belediye Başkanlığı arasında, Tuzyaka (Konya) İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşleri için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. Her üç projede ihale süreci devam etmektedir.
2016K090060	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2016-2019	2.292	992	600	0	% 0,0	Saros ÖÇKB 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ihale edilmiş ve çalışmalar başlamıştır. Diğer işlerde ihale öncesi işlemler sürdürülmektedir.
2017K090270	İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	800	0	400	0	% 0,0	Cihanbeyli ve Eşmekaya Belediye Başkanlıkları ile Protokol imzalanmıştır. Diğer Protokol hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2018K090420	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	991		991	0	% 0,0	Proje kapsamında, Halihazır Haritalarının yapılacağı yerleşim yerlerine ait tahdit krokileri netleştirilmiştir. Teknik Şartnameler hazırlanarak, Genel Müdürlük Olurları alınmıştır. Firmalardan işe ilişkin teklifler alınarak yaklaşık maliyet tutanakları düzenlenmiştir. İşe ait Gerekli dökümanlar tamamlanarak, ihale yapılmak üzere Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca 3 işe ait firmalardan teklifler alınmış olup, yaklaşık maliyet belirleme iş ve işlemleri devam etmektedir.
2018K090430	İmar Uygulaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2018	342		342	0	% 0,0	Proje kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamalarına Genel Müdürlüğümüzce yapılacak yerleşim yerlerine ait düzenleme alanları netleştirilmiştir. İlgili Belediyelerce yapılacak imar uygulamalarına Genel Müdürlüğümüzce maddi katkı yapılmasına ilişkin Genel Müdürlüğümüz ile Belediyeler arasında protokoller düzenlenerek, Genel Müdürlük Olurları alınmıştır. İlgili Belediyelerce ihale işlemleri devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2018	54.178	41.678	12.500	0	% 0,0	Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında proje yapılmaktadır.
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2019	3.049	1.701	425	0	% 0,0	Proje ihale çalışmaları devam etmektedir.
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.250	0	350	0	% 0,0	Projeye ait ön rapor teslim edilmiş olup kontrol teşkilatınca inceleme aşamasındadır.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2020	2.300	175	1.000	0	% 0,0	Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi I. Hakediş ödemesi. Nisan ayında gerçekleşmiştir.
2018K100530	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2018	400		400	0	% 0,0	İhale süreci başlatılmıştır.
14 Proje		06 ve 07 TOPLAM	110.941	47.446	42.778	511	% 1,2	

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100500	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	13.710		1.343	0	% 0,0	Daire Başkanlığımız tarafından 01/01/2018-31/03/2018 tarihleri arasında IPA II kapsamında herhangi bir harcama olmamıştır.
AB KATKISI			77.690		19.423	0	% 0,0	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	13.710	0	1.343	0	% 0,0	
		AB KATKISI	77.690	0	19.423	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2020	135.435	49.489	29.900	1.817	% 6,1	
	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	8.805	8.705	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 03.12.2015 tarihinde KDV dahil 8.362.660,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	5.873	5.773	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 24.12.2015 tarihinde KDV dahil 6.613.900,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2014-2018	10.665	10.565	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 26.05.2014 tarihinde KDV dahil 9.140.280 TL 'ye ihale edilmiştir. 2016 yılında HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	5.393	5.293	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 04.11.2015 tarihinde KDV dahil 6.872.320,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	9.131	8.531	600	500	% 83,3	Hizmet binası yapım işi 04.05.2015 tarihinde KDV dahil 8.555.000,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2015-2018	5.572	5.472	100	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 25.08.2015 tarihinde KDV dahil 4.794.340,00 TL 'ye ihale edilmiştir. 2017 yılı Eylül ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2019	12.262	1.400	4.000	535	% 13,4	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde KDV dahil 9.770.400,00 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %35' dir.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	11.879	0	2.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde KDV dahil 10.437.100 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 29.03.2018 tarihinde imzalandı.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2019	8.383	2.060	5.000	782	% 15,6	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde KDV dahil 6.652.840,00 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %45' dir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	10.645	0	2.000	0	% 0,0	14.01.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2017 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. Arsa sorunu çözüldü ve Projesi tamamlanmak üzere.
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	19.500	0	7.500	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde KDV dahil 17.039.200 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.01.2018 tarihinde imzalandı.
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	12.266	0	4.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 15.01.2018 tarihinde KDV dahil 8.782.740 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.02.2018 tarihinde imzalandı.
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	13.071	0	4.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde KDV dahil 10.924.440 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 28.02.2018 tarihinde imzalandı.
	Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	2017-2018	1.990	1.690	300	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 27.03.2017 tarihinde KDV dahil 1.335.760,00 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 14.04.2017 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %95' dir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Döner Sermaye	2016-2020	52.948	0	25.000	0	% 0,0	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	35.320	0	19.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	8.001	0	2.000	0	% 0,0	31.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2016 yılı yatırım programı ile programa alınmıştır. İhale talimatı verilmiştir. Arsa sorunu çözülmeye çalışılıyor.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2016-2020	9.627	0	4.000	0	% 0,0	Hizmet binası yapım işi 08.02.2018 tarihinde KDV dahil 6.629.240 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 10.04.2018 tarihinde imzalandı.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Taşıt Alımı	2018-2018	300		300	0	% 0,0	3 adet T5 (Minibüs) tipi aracın alınımının yapılabilmesi için gerekli olan Bakanlar Kurulu Kararının ihdas edilmesi için 18.01.2018 tarihinde Başbakanlığa talep yazısı gönderilmiştir.
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2018-2018	3.700		3.700	115	% 3,1	
	Hizmet Binası Onarımı	2018-2018	3.500		3.500	307	% 8,8	
2018G000170	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2018-2018	4.570		4.570	0	% 0,0	
2018F000750	Çiçek Pasajı Canlandırma ve Yenileme Projesi (Turizm Sektörü)	2018-2018	5.234		5.234	0	% 0,0	Proje, Mersin İli Akdeniz Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde yer alan "Çiçek Pasajı" olarak bilinen Gökçay İş Merkezinin kentin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısındaki yerinin canlandırılması amacıyla yenilenmesi işidir. Kalkınma Bakanlığı'nın 27.02.2018 tarihli yazısı ile yatırım programına alınmış olup, Maliye Bakanlığı'nın 07.03.2018 tarihli yazısı ile de ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. 07.03.2018 tarihinde Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ihale talimatı verilmiştir.
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	152.739	49.489	47.204	2.239	% 4,7	
		DÖNER SERMAYE	52.948	0	25.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	205.687	49.489	72.204	2.239	% 3,1	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2018 31.03.2018 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018G000170	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2018-2018	2.000		2.000	3	% 0,2	Çankaya Çukurca Mahallesi 5 ve 7. Bloklara Kapı ve Alçıpan Yapıtılması İşi.
2018K090520	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2018-2018	300		300	57	% 19,0	Yemekhanede kullanılmak üzere Ocak alımı ve Hizmet Binası Girişinde Kullanılmak üzere sehba alımları yapılmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2018-2018	300		300	81	% 27,0	Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Z447 nolu odasında tadilat yapıtırılması, Yemekhaneye Soğutma Ünitesi için Tadilat Yapıtırılması, Yangın Alarm Sistemin Yerinin Değıştirilmesi İşleri Yapıtırılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.600	0	2.600	141	% 5,4	
