

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü



Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan
personelimiz;

Personel



Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013-2014 Yatırım Programı



Tapu Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Tesisleri

Yaklaşık maliyeti tamamlanmıştır. (Onay tarihi: 24.04.2014) İhale süreçleri başlatılmıştır. Ödenek revizyonu için yaklaşık maliyet tutarı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013-2014 Yatırım Programı






Merkez Akkaya Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası Tesisleri İnşaatı Yapım İşİ.

Uygulama projeleri adaptasyonu, vaziyet planı çalışmaları devam etmektedir.
Zemin etüt yapım işi ödeneği gelmiş olup, ihale talimatı beklenmektedir.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013-2014 Yatırım Programı

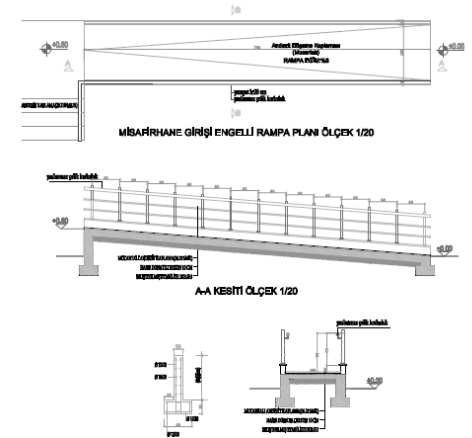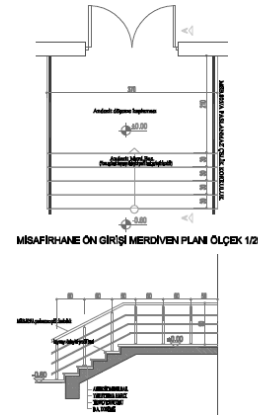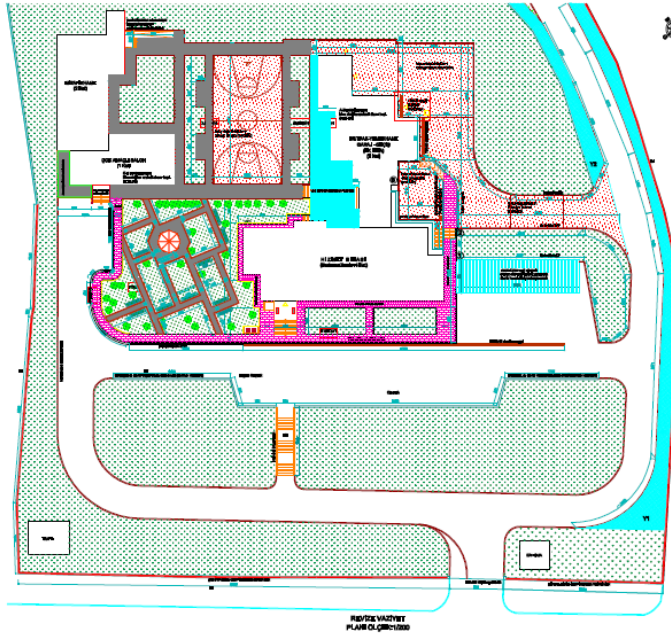


Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Çevre Düzenleme İşİ

Vaziyet Planı ve Detayları

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013-2014 Yatırım Programı

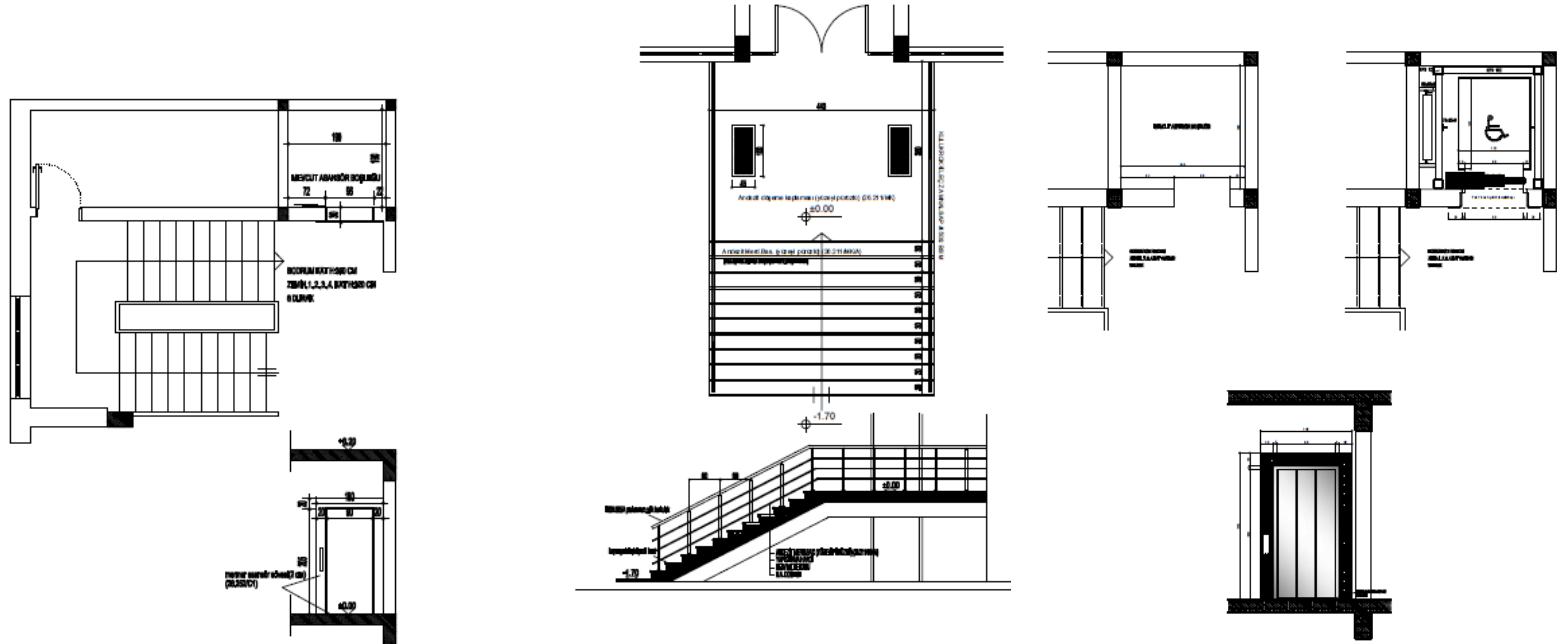


Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Asansör Yapım İş

Plan, Kesit, Cephe ve Detay Çizimleri

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013-2014 Yatırım Programı

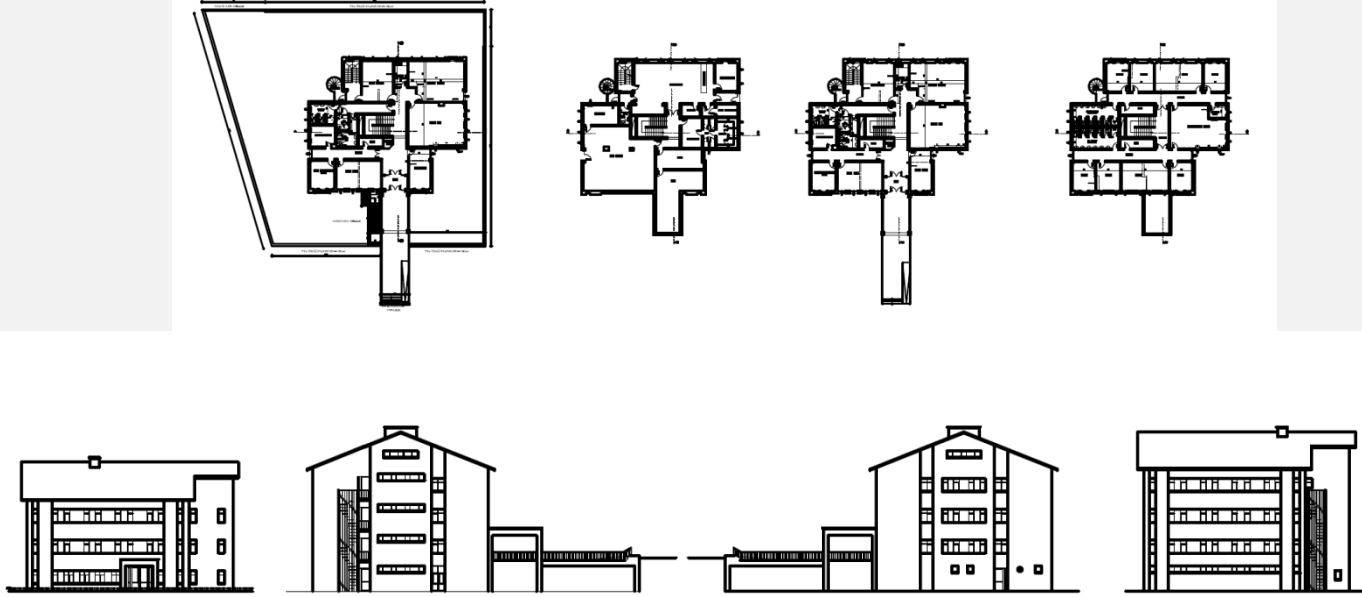


Kastamonu Merkez Ticaret Lisesi Pansiyonu Tadilat İşİ

Plan ve Cephe Çizimleri

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013-2014 Yatırım Programı

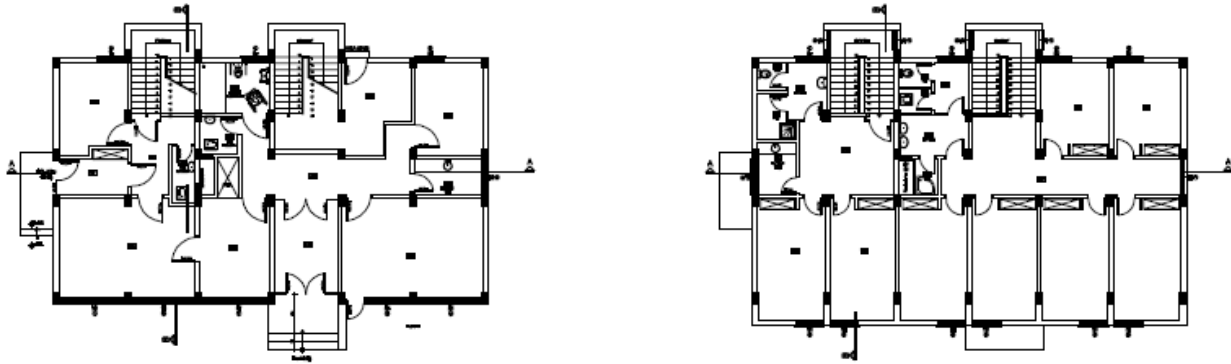


Kastamonu Merkez Huzurevi- Yaşlı İlk Kabul Tadilat İşİ

Revize proje çizimi ve yaklaşık maliyet yapım aşamasındadır.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013-2014 Yatırım Programı

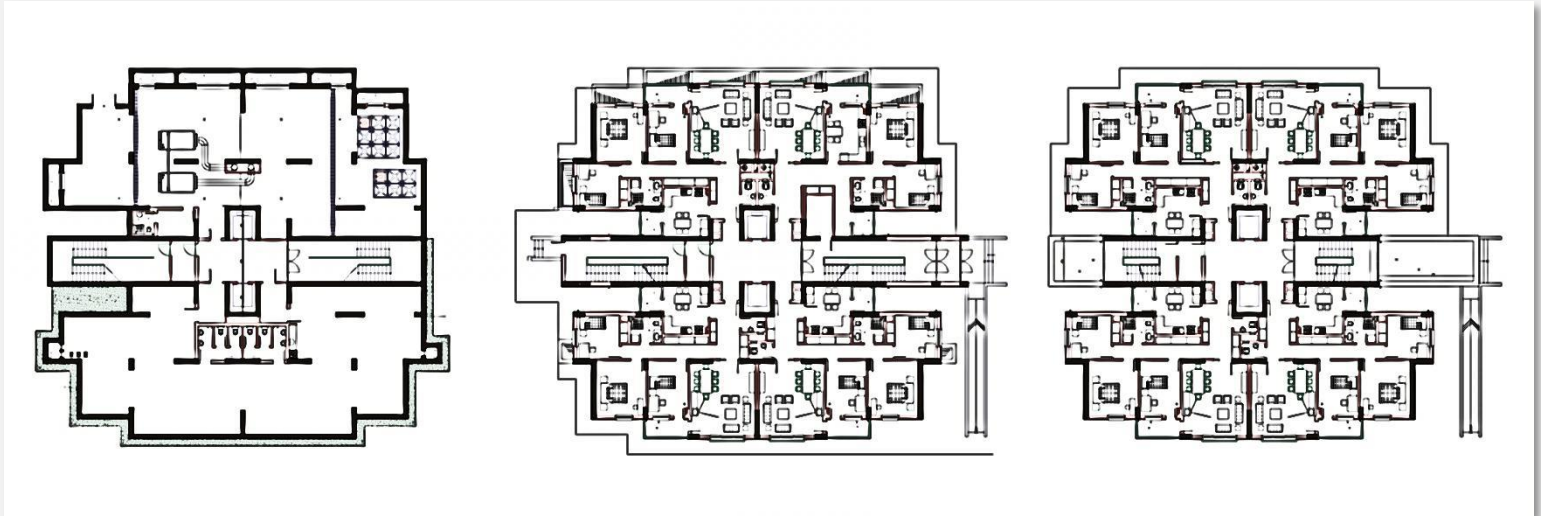

Merkez Jandarma Subay Astsubay Lojman İnşaatı (32 Daire) Yapım İşi

B+Z+5 katlı Uygulama projeleri tamamlanmıştır. (Yapı İşleri Genel Md.)
Plankote, zemin etüt raporu hazırlanmıştır. Vaziyet planı yapım aşamasındadır.
Tesisat proje adaptasyonu yapılacaktır.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

PLANKOTELER

- 1) Jandarma Bölge Komutanlığı Subay Astsubay Lojmanları
- 2) İşkur İl Müdürlüğü Hizmet Binası

ZEMİN ETÜDÜ

- 1) Jandarma Bölge Komutanlığı Subay Astsubay Lojmanları (Yapıldı)
- 2) İşkur İl Müdürlüğü Hizmet Binası (İhale yapıldı, işe başlanılacak)
- 3) Akkaya Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası İnşaatı (İhalesi yapılacaktır)

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013-2014 Yılları Yatırım Programı
Hazırlanan Röleve Projeleri

RÖLEVE PROJELERİ

- 1) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Lojman Binası Röleve Projesi
- 2) 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Spor Salonu Bakım ve Onarım İşİ
- 3) İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü Röleve Projesi
- 4) 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Lojman Röleve Projesi

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2012 Ve 2013 Yılları Yatırım Programı

S. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİĞİ	REVİZE PROJE MALİYETİ	YATIRIM PROGRAMI YILI	BİTİŞ YILI
1	GENEL İDARE SEKTÖRÜ	KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ.	BİNA ONARIMI	450.000,00	2012	2012
2	EĞİTİM SEKTÖRÜ	KREDİ VE YURLAR KURUMU KASTAMONU YURDU DEPREM DAYANIMININ BELİRLENMESİ.	ETÜT PROJE	114.755,00	2012	2012
3	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ	KASTAMONU SAHİL GÜVENLİK İNEBOLU BİRLİK BİNA ONARIMLARI İNŞAATI.	BİNA ONARIMI	163.770,00	2012	2012
4	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ	KASTAMONU MERKEZ AKKAYA JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI TESİSLERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ.	ETÜT PROJE + İNŞAAT	2.000.000,00	2012	2013
5	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ	MERKEZ JANDARMA SUBAY ASTSUBAY LOJMAN İNŞAATI (32 DAİRE) YAPIM İŞİ.	ETÜT PROJE	60.000,00	2012	2012
6	TARIM	İNEBOLU METEOROLOJİ İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ RASAT PARK ONARIMI.	BİNA ONARIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ	30.000,00	2012	-
7	KONUT SEKTÖRÜ	JANDARMA PERSONEL LOJMANI ETÜT PROJE HAZIRLAMA	ETÜT PROJE	60.000,00	2013	2013
8	GENEL İDARE SEKTÖRÜ	TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAAT İŞİ	ETÜT PROJE + İNŞAAT	8.000.000,00	2012	2015
9	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ	AKKAYA JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ ETÜT PROJE HAZIRLAMA (Tesis Yeri Ön İnceleme)	ETÜT PROJE	30.000,00	2013	2013
10	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ	SG İNEBOLU DESTEK ÜNİTESİ (PREFABRİK) YAPIMI	İNŞAAT	500.000,00	2013	2013
11	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ	AKKAYA JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ	İNŞAAT	2.000.000,00	2013	2014
12	SOSYAL İSTİHDAM VE ÇALIŞTIRMA SEKTÖRÜ	İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	ETÜT PROJE + İNŞAAT	1.000.000,00	2013	2014

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2014 Yılı Yatırım Programı

S. NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİĞİ	REVİZE PROJE MALİYETİ	YATIRIM PROGRAMI YILI	BİTİŞ YILI
1	GENEL İDARE SEKTÖRÜ	TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAAT İŞİ	ETÜT PROJE + İNŞAAT	8.000.000,00	2012	2015
2	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ	KASTAMONU MERKEZ AKKAYA J.KRK.K'LİĞİ HİZMET BİNASI İNŞAAT İŞİ	ETÜT PROJE	3.500.000,00	2013	2016
3	KONUT SEKTÖRÜ	MERKEZ JANDARMA SB.-ASTSB. LOJMAN İNŞAAT (40 DAİRE)	ETÜT PROJE	60.000,00	2014	2014
4	GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ	İNEBOLU SAHİL GÜVENLİK DESTEK ÜNİTESİ (PREFABRİK) YAPIMI	İNŞAAT	500.000,00	2014	2015
5	İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI SEKTÖRÜ	KASTAMONU İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI	ETÜT PROJE + İNŞAAT	1.105.000,00	2012	2015
6	İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI SEKTÖRÜ	KASTAMONU İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI SONDAJLI ZEMİN ETÜDÜ	ETÜT PROJE + İNŞAAT	13.137,00	2014	2014
7	EĞİTİM SEKTÖRÜ	KASTAMONU YURDU D,E BLOK, İDARİ BİNA VE LOJMAN BİNALARI DEP.DAY.TEST.ENJ.PERF.ENG.ÖĞ.TS911 DÜZ. PRJ.	BÜYÜK ONARIM + TADİLAT	145.641,00	2014	2014

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013 yılı Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

İLGİLİ İDARE		İŞİN ADI
1)	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANLARI ONARIMI
2)	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ASANSÖR YAPIM İŞİ
3)	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
4)	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	SULUCA, KUŞÇULAR VE SAPACA İSKAN KONUTLARI YAPIM İŞİ
5)	KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ	DR. MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ
6)	MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ	KATI ATIK BERTARAF TESİSİ VE AKTARMA İSTASYONLARI YAPIM İŞİ
7)	PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMESİ
8)	5. JANDARMA EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI	HİZMET BİNALARI ONARIMI İŞİ
9)	5. JANDARMA EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI	LOJMAN ONARIMI İŞİ
10)	TAŞKÖPRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ	TAŞKÖPRÜ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ
11)	GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ	GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI VE ASANSÖR YAPIM İŞİ
12)	KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ	DR MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ
13)	İNEBOLU METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ	İNEBOLU METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE RASAT PARK ONARIMI İŞİ

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2014 yılı Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

[illegible]

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2014 yılı Yaklaşık Maliyet İşlemleri

[illegible]

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ASANSÖR YAPIM İŞİ

Müteahhidi	Kastamonu Uzman Elk. İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti.
Sözleşme Bedeli	105.000,00 TL
İhale Usulü	4734/19 - Götürü Bedel
İhale Tarihi	20.06.2013
Sözleşme Tarihi	08.07.2013
Yer Teslim Tarihi	12.07.2013
İşin Bitim Tarihi	<i>Sözleşmeye Göre</i> 08.10.2013
	<i>İlâve Süreye Göre</i> ---
Son Hakediş ile Yapılan Toplam Harcama	105.000,00 TL
Uygulama Yılına (2013) Ait	<i>Sözleşme Ödeneği</i> 105.000,00 TL
	<i>Program Ödeneği</i> 105.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%




AÇIKLAMALAR

Geçici kabulü yapılmıştır.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ASANSÖR YAPIM İŞİ

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

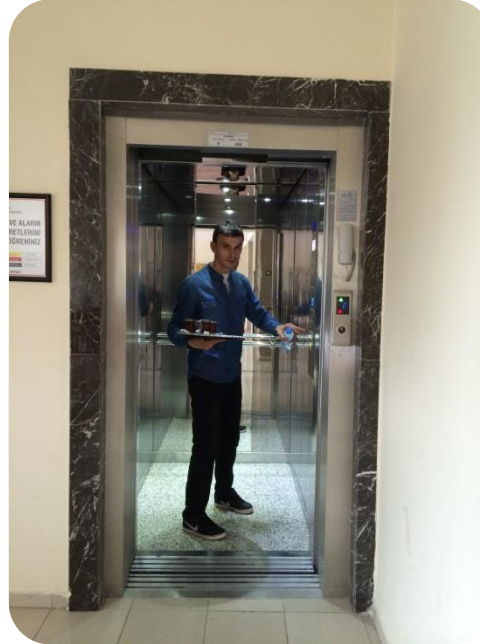

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Müteahhidi	AY-NA İnş. Tic. Ltd. Şti.	
Sözleşme Bedeli	126.100,00 TL	
İhale Usulü	4734/21-a – Pazarlık	
İhale Tarihi	16.07.2013	
Sözleşme Tarihi	14.08.2013	
Yer Teslim Tarihi	16.08.2013	
İşin Bitim Tarihi	<i>Sözleşmeye Göre</i>	14.11.2013
	<i>İlâve Süreye Göre</i>	---
Son Hakediş ile Yapılan Toplam Harcama	126.100,00 TL	
Uygulama Yılına (2013) Ait	<i>Sözleşme Ödeneği</i>	150.000,00 TL
	<i>Program Ödeneği</i>	150.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%	
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%	




AÇIKLAMALAR

Geçici kabulü yapılmıştır.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

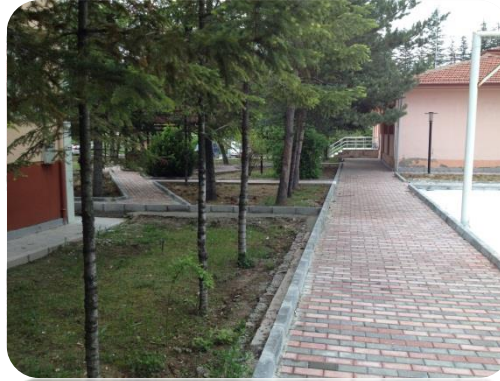

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI NİZAMİYE ONARIM İŞİ

Müteahhidi	Yılmaz Kardeşler İnş. Dek.	
Sözleşme Bedeli	14.980,00 TL	
İhale Usulü	4734/22-a – Doğrudan Temin	
İhale Tarihi	---	
Sözleşme Tarihi	---	
Yer Teslim Tarihi	22.04.2014	
İşin Bitim Tarihi	<i>Sözleşmeye Göre</i>	22.05.2014
	<i>İlâve Süreye Göre</i>	---
Son Hakediş ile Yapılan Toplam Harcama	---	
Uygulama Yılına (2014) Ait	<i>Sözleşme Ödeneği</i>	---
	<i>Program Ödeneği</i>	---
Nakdi Gerçekleşme (%)	---	
Fiziki Gerçekleşme (%)	80,00%	



AÇIKLAMALAR

Yapı Toplam Alanı (m²) = 45,00 m²

Yapımı devam etmektedir.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

KASTAMONU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ VE AKTARMA İSTASYONLARI YAPIM İŞİ

Müteahhidi	Hasekioğlu Müh. İnş. Ltd. Şti. Hasan YÜKSEL, Mehmet CİVELEKOĞLU O.G.
Sözleşme Bedeli	7.484.000,00 TL
İhale Usulü	4734/19 - Götürü Bedel
İhale Tarihi	06.09.2011
Sözleşme Tarihi	10.10.2011
Yer Teslim Tarihi	19.10.2011
İşin Bitim Tarihi	Sözleşmeye Göre 19.10.2012
	İlâve Süreye Göre 22.07.2013
Son Hakediş ile Yapılan Toplam Harcama	3.464.347,57 TL
Uygulama Yılına (2012) Ait	Sözleşme Ödeneği ---
	Program Ödeneği ---
Nakdi Gerçekleşme (%)	% 51,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	% 85,00



AÇIKLAMALAR

Yapı Toplam Alanı (m²) =

Ödenek yetersizliğinden iş durdurulmuş olup 01.04.2013 itibari ile işe başlanılmıştır.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

KASTAMONU GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU VE LOJMAN BİNALARININ MANTOLANMASI, 2. HİZMET BİNASI ÇATI ONARIMI VE ASANSÖR YAPIM İŞİ

Müteahhidi	Şenol KIZILABDULLAH
Sözleşme Bedeli	146.300,00 TL
İhale Usulü	4734/19 - Götürü Bedel
İhale Tarihi	03.09.2013
Sözleşme Tarihi	23.09.2013
Yer Teslim Tarihi	26.09.2013
İşin Bitim Tarihi	Sözleşmeye Göre 26.11.2013
	İlâve Süreye Göre ---
Son Hakediş ile Yapılan Toplam Harcama	146.300,00 TL
Uygulama Yılına (2012) Ait	Sözleşme Ödeneği ---
	Program Ödeneği ---
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%



AÇIKLAMALAR

Yapı Toplam Alanı (m²) =

Geçici kabulü yapılmıştır.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

KASTAMONU TAŞKÖPRÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ

Müteahhidi	METSAN Tur. Nak. İnş. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Sözleşme Bedeli	79.000,00 TL
İhale Usulü	4734/19 - Götürü Bedel
İhale Tarihi	28.08.2013
Sözleşme Tarihi	18.09.2013
Yer Teslim Tarihi	24.09.2013
İşin Bitim Tarihi	Sözleşmeye Göre İlâve Süreye Göre
	07.12.2013 ---
Son Hakediş ile Yapılan Toplam Harcama	79.000,00 TL
Uygulama Yılına (2013) Ait	Sözleşme Ödeneği Program Ödeneği
	--- ---
Nakdi Gerçekleşme (%)	100,00%
Fiziki Gerçekleşme (%)	100,00%



AÇIKLAMALAR

Yapı Toplam Alanı (m²) = 78,975

İş tamamlandı, geçici kabul aşamasında.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri


KASTAMONU ADALET SARAYI HİZMET BİNASI KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLİ OTOMATİK KAPI YAPIMI İŞİ

Müteahhidi		AY-NA İnş. Tic. Ltd. Şti.		
Sözleşme Bedeli		131.900,00 TL		
İhale Usulü		4734/19 - Götürü Bedel		
İhale Tarihi		28.08.2013		
Sözleşme Tarihi		01.11.2013		
Yer Teslim Tarihi		05.11.2013		
İşin Bitim Tarihi	<i>Sözleşmeye Göre</i>	19.12.2013	AÇIKLAMALAR	
	<i>İlâve Süreye Göre</i>	21.12.2013		
Son Hakediş ile Yapılan Toplam Harcama		137.569,85 TL		
Uygulama Yılına (2013) Ait	<i>Sözleşme Ödeneği</i>	---		Geçici kabulü yapılmıştır.
	<i>Program Ödeneği</i>	---		
Nakdi Gerçekleşme (%)		100,00%		
Fiziki Gerçekleşme (%)		100,00%		

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ SULUCA KÖYÜ 64 İSKÂN KONUTU YAPIM İŞİ

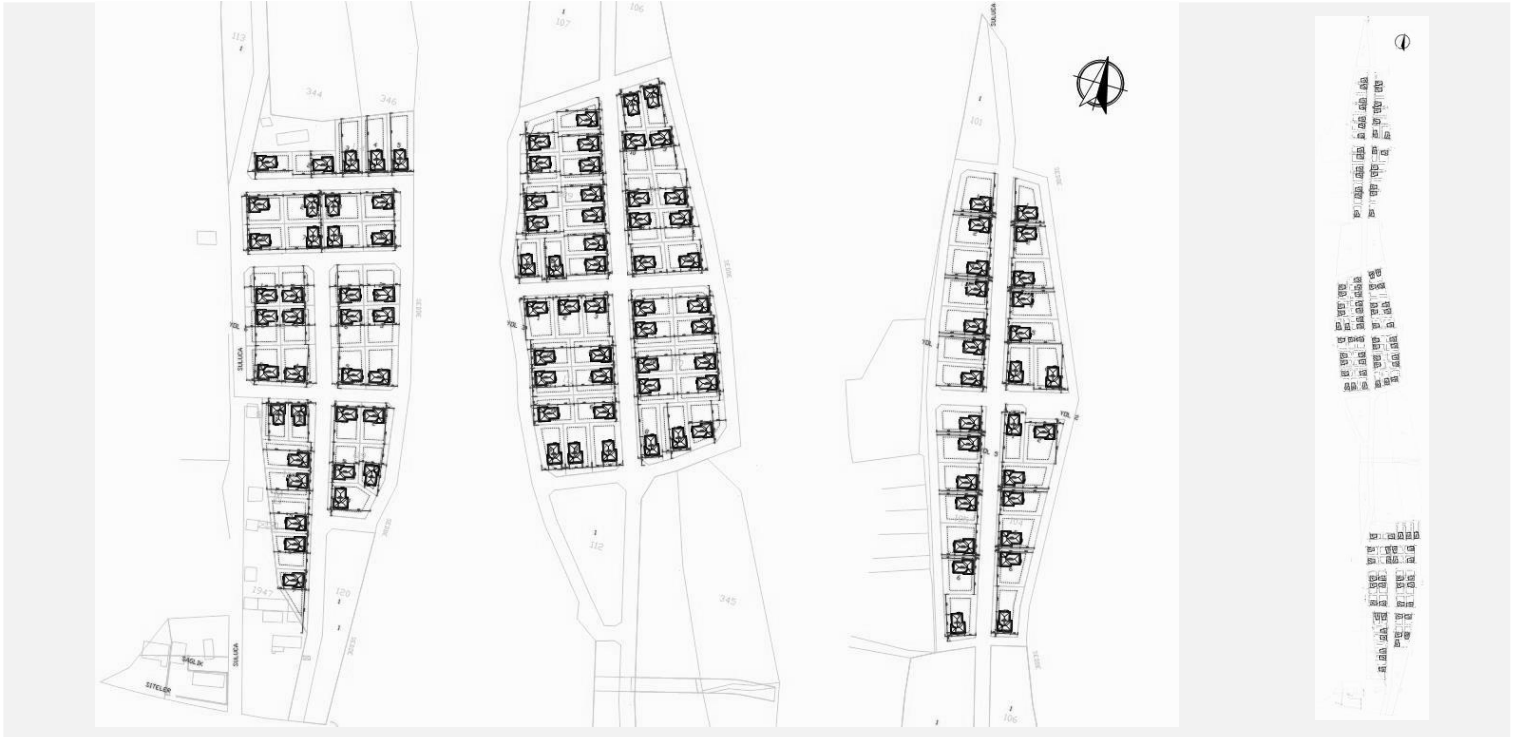

Yerleşim plânı tarafımızca hazırlanan iskân konutlarının inşaatı devam etmektedir.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Yapı Denetim (Kontrollük) İşlemleri

KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ SULUCA KÖYÜ 64 İSKÂN KONUTU YAPIM İŞİ



Yerleşim plânı tarafımızca hazırlanan iskân konutlarının inşaatı devam etmektedir.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ SULUCA KÖYÜ 64 İSKÂN KONUTU YAPIM İŞİ

2013 yılı için kişi başı 53.000,00.-TL,
2014 yılı için kişi başı 55.000,00.-TL,
ödenek bulunmaktadır.

Toplamda 64 haksahibi bulunmaktadır.

Şu ana kadar yapılan toplam hakediş ödemesi : 272.250,00.-TL

İLERLEME DURUMU :

39 Kişi → %0 → Hafriyat ve grobeton.
17 Kişi → %15 → Subasman bitti.
8 Kişi → %30 → Kat betonları bitti.

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

2013 Yılı Ödenek Temini ve Yaklaşık
Maliyet Çalışmaları

	Devam eden Ödenek Temini	Tamamlanan Ödenek Temini	Devam eden Yaklaşık Maliyet	Tamamlanan Yaklaşık Maliyet
İdare	1	9	---	8
Tarım	---	1	---	1
Adalet	---	---	---	2
Sağlık	---	2	1	---
Güvenlik	1	24	3	10
Eğitim	2	2	1	4
Sosyal Hizmetler	---	---	1	---
Kültür	---	2	---	1
TOPLAM	1	20	3	10

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Teknik İnceleme, Denetim, Komisyon,
Diğer Görevlendirmeler (2013-2014)

• MAHALİNDE YAPILAN TEKNİK İNCELEMELER (EĞİTİM TESİSLERİNİN STATİK DURUMLARININ GÖZLEMSEL İNCELEMESİ VE TESPİT RAPORU YAZILMASI İLE İLGİLİ EVRAKLAR.)	6
• ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN MÜŞTEREK TEKNİK İNCELEME VE RAPOR	2
• DEĞER TESPİTİ	31
• BİMER BAŞVURULARI	1
• GEZİCİ PATLAYICI MADDE DEPOLARININ DENETLENMESİ	5
• İHALE KOMİSYONLARINDA UZMAN ÜYE GÖREVLENDİRİLMESİ	1
• KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ YAPILARI İÇİN İHTİYAÇ RAPORU HAZIRLANMASI	2
• YIKIM MALİYET RAPORLARI	4
• DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KANTİN İŞLETMELERİ SARFIYAT BEDEL TESPİTLERİ	18
• KKYDP İL PROJE İNCELEME VE YÜRÜTME KOMİSYONU	
• ÖZEL KURULUŞLARA UYGUNLUK GÖRÜŞÜ VERİLMESİ	8
• RİSKLİ KAMU YAPILARININ TESPİTİ	1

TEŞEKKÜRLER

