



2019 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

1. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2019 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.264.444.000,00	1.295.857.148,45	350.082.432,65	% 27,0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	220.900.000,00	228.161.530,69	58.021.744,69	% 25,4
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	93.052.000,00	96.358.962,89	15.207.204,58	% 15,8
05	CARİ TRANSFERLER	572.867.000,00	1.618.943.695,88	1.116.052.329,12	% 68,9
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	393.384.000,00	433.918.000,00	82.007.000,00	% 18,9
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-İmar Barışı	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	150.000.000,00	150.000.000,00	32.000.000,00	% 21,3
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	22.665.000,00	23.907.695,88	0,00	% 0,0
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	6.818.000,00	11.118.000,00	2.045.329,12	% 18,4
06	SERMAYE GİDERLERİ	177.331.000,00	885.686.161,20	402.040.936,47	% 45,4
	Bakanlık Yatırım Programı	158.154.000,00	172.409.502,35	16.024.090,14	% 9,3
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.177.000,00	419.177.000,00	322.703.337,24	% 77,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	294.099.658,85	63.313.509,09	% 21,5
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	230.000.000,00	829.025.788,04	617.391.867,86	% 74,5
	Bakanlık Yatırım Programı	78.625.000,00	83.650.788,04	138.867,86	% 0,2
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	151.375.000,00	151.375.000,00	23.253.000,00	% 15,4
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	594.000.000,00	594.000.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	14.692.000,00	14.692.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM		2.573.286.000,00	4.968.725.287,15	2.558.796.515,37	% 51,5



BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

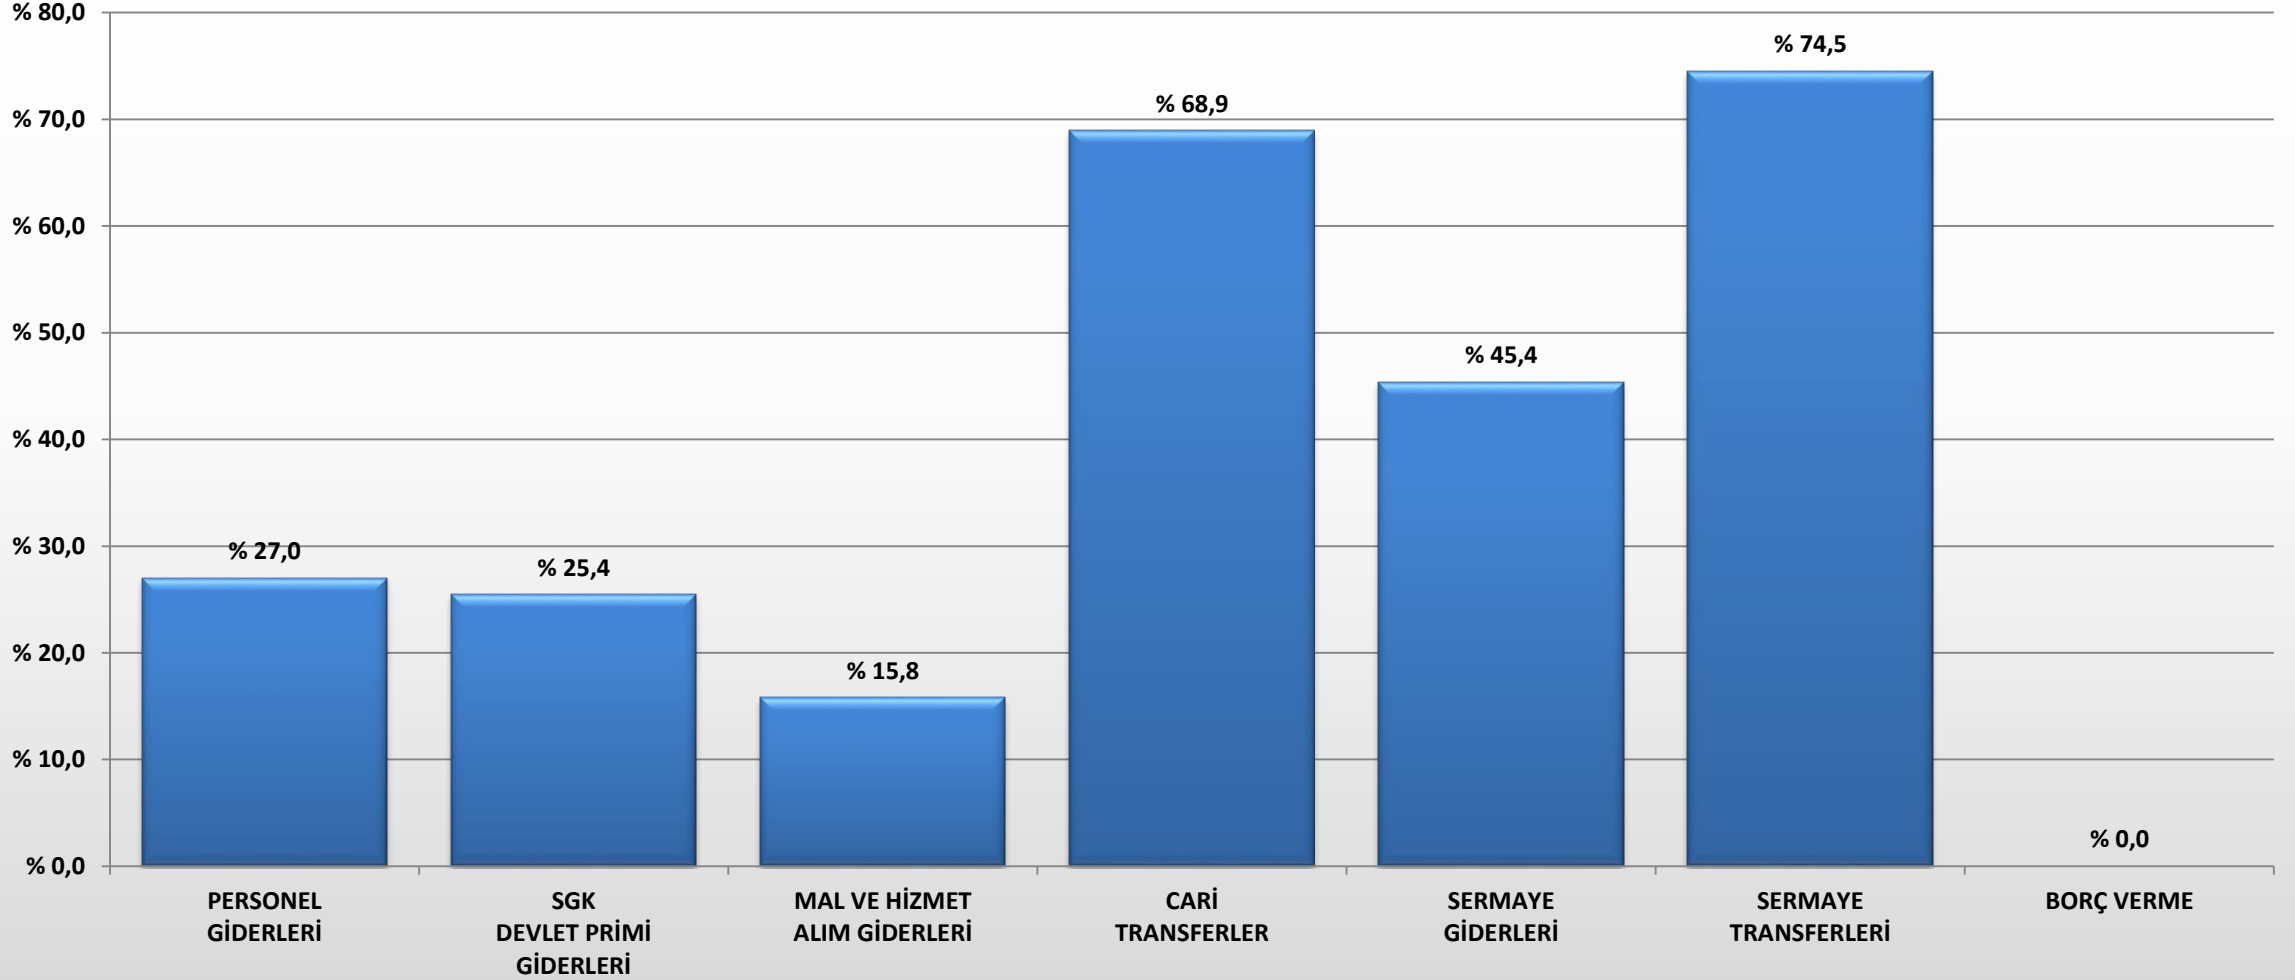




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2019 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2019 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	4	14.300.000,00	6.750.000,00	0,00	% 0,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	17	177.480.000,00	64.904.000,00	0,00	% 0,0
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	5	132.046.000,00	19.847.000,00	233.068,00	% 1,2
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	17	2.098.770.000,00	82.871.000,00	3.819.054,48	% 4,6
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	2	8.700.000,00	1.550.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	5	8.208.000,00	2.483.000,00	0,00	% 0,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	5	74.690.000,00	24.280.000,00	156.289,00	% 0,6
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	1	20.475.000,00	2.200.000,00	643.000,00	% 29,2
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	12	138.205.000,00	34.314.000,00	138.867,86	% 0,4
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	4	1.513.410.000,00	4.070.000,00	50.912,12	% 1,3
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	3	160.443.000,00	27.357.000,00	11.862.837,00	% 43,4
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	600.000,00	600.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	74	4.351.327.000,00	275.226.000,00	16.904.028,46	% 6,1
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	71	4.169.483.000,00	251.471.000,00	6.839.028,46	% 2,7
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	3	181.844.000,00	23.755.000,00	10.065.000,00	% 42,4
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği		457.531.000,00	419.177.000,00	322.703.337,24	% 77,0



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

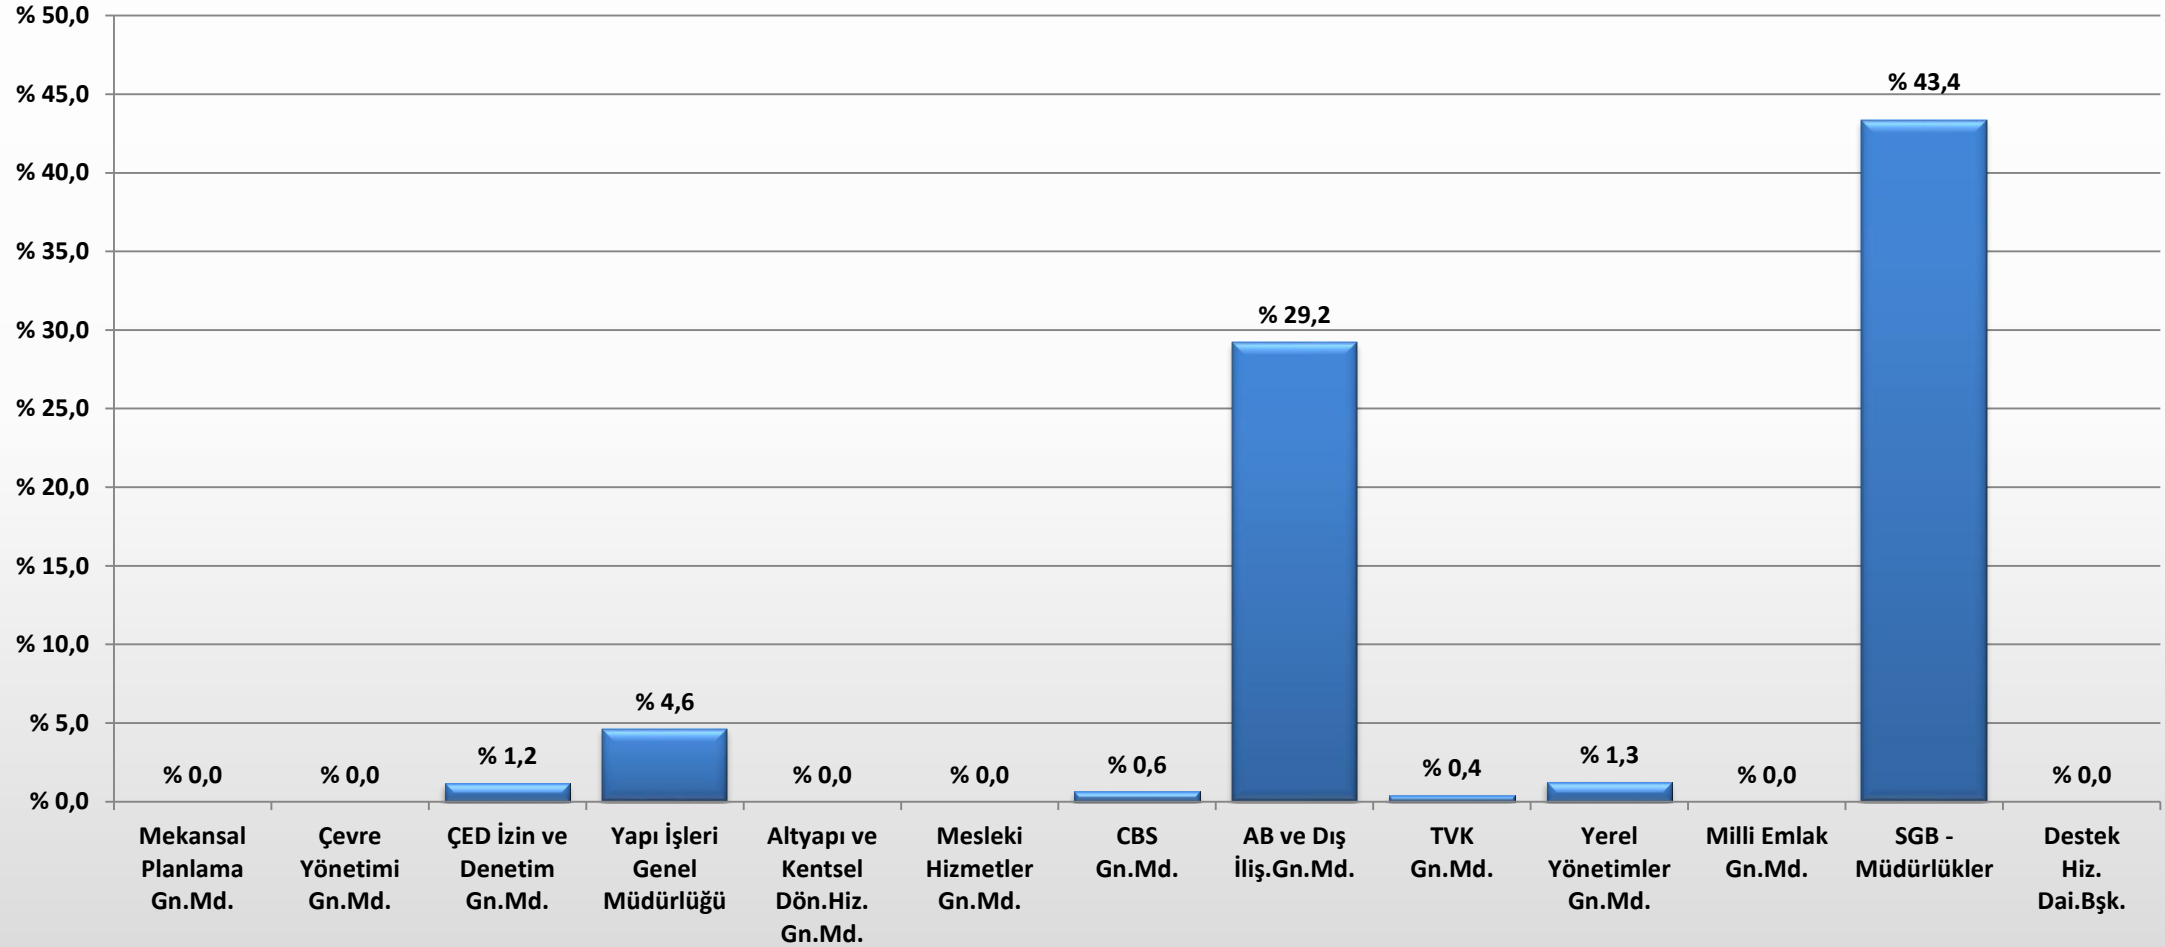




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2019 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	32.656.000,00	32.656.000,00	6.398.202,71	% 19,6
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	247.420.000,00	247.420.000,00	30.506.038,93	% 12,3
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	67.778.000,00	68.796.582,08	11.078.073,32	% 16,1
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	167.602.000,00	170.214.942,10	21.366.966,94	% 12,6
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	420.846.000,00	2.055.380.000,00	1.682.014.571,40	% 81,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	24.949.000,00	24.949.000,00	5.447.302,59	% 21,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	44.632.000,00	44.632.000,00	4.104.680,71	% 9,2
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	33.198.000,00	34.450.695,88	1.854.573,32	% 5,4
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	55.215.000,00	59.879.906,84	5.130.382,82	% 8,6
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	8.987.000,00	8.997.000,00	1.384.948,50	% 15,4
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	81.772.000,00	481.772.000,00	332.177.542,77	% 68,9
Personel Genel Müdürlüğü	7.416.000,00	7.416.000,00	1.700.023,89	% 22,9
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	6.180.000,00	6.200.000,00	1.546.310,22	% 24,9
Özel Kalem Müdürlüğü	33.395.000,00	33.395.000,00	1.915.558,16	% 5,7
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	86.634.000,00	91.243.508,76	12.632.927,66	% 13,8
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	2.878.000,00	2.878.000,00	507.284,22	% 17,6
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	10.897.000,00	10.897.000,00	2.881.512,56	% 26,4
Strateji Geliştirme Başkanlığı	157.937.000,00	157.937.000,00	34.093.106,46	% 21,6
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.106.000,00	1.106.000,00	238.294,68	% 21,5
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	3.430.000,00	3.430.000,00	2.011.019,37	% 58,6
İl Müdürlükleri	1.078.358.000,00	1.425.074.651,49	399.807.194,14	% 28,1
TOPLAM	2.573.286.000,00	4.968.725.287,15	2.558.796.515,37	% 51,5



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

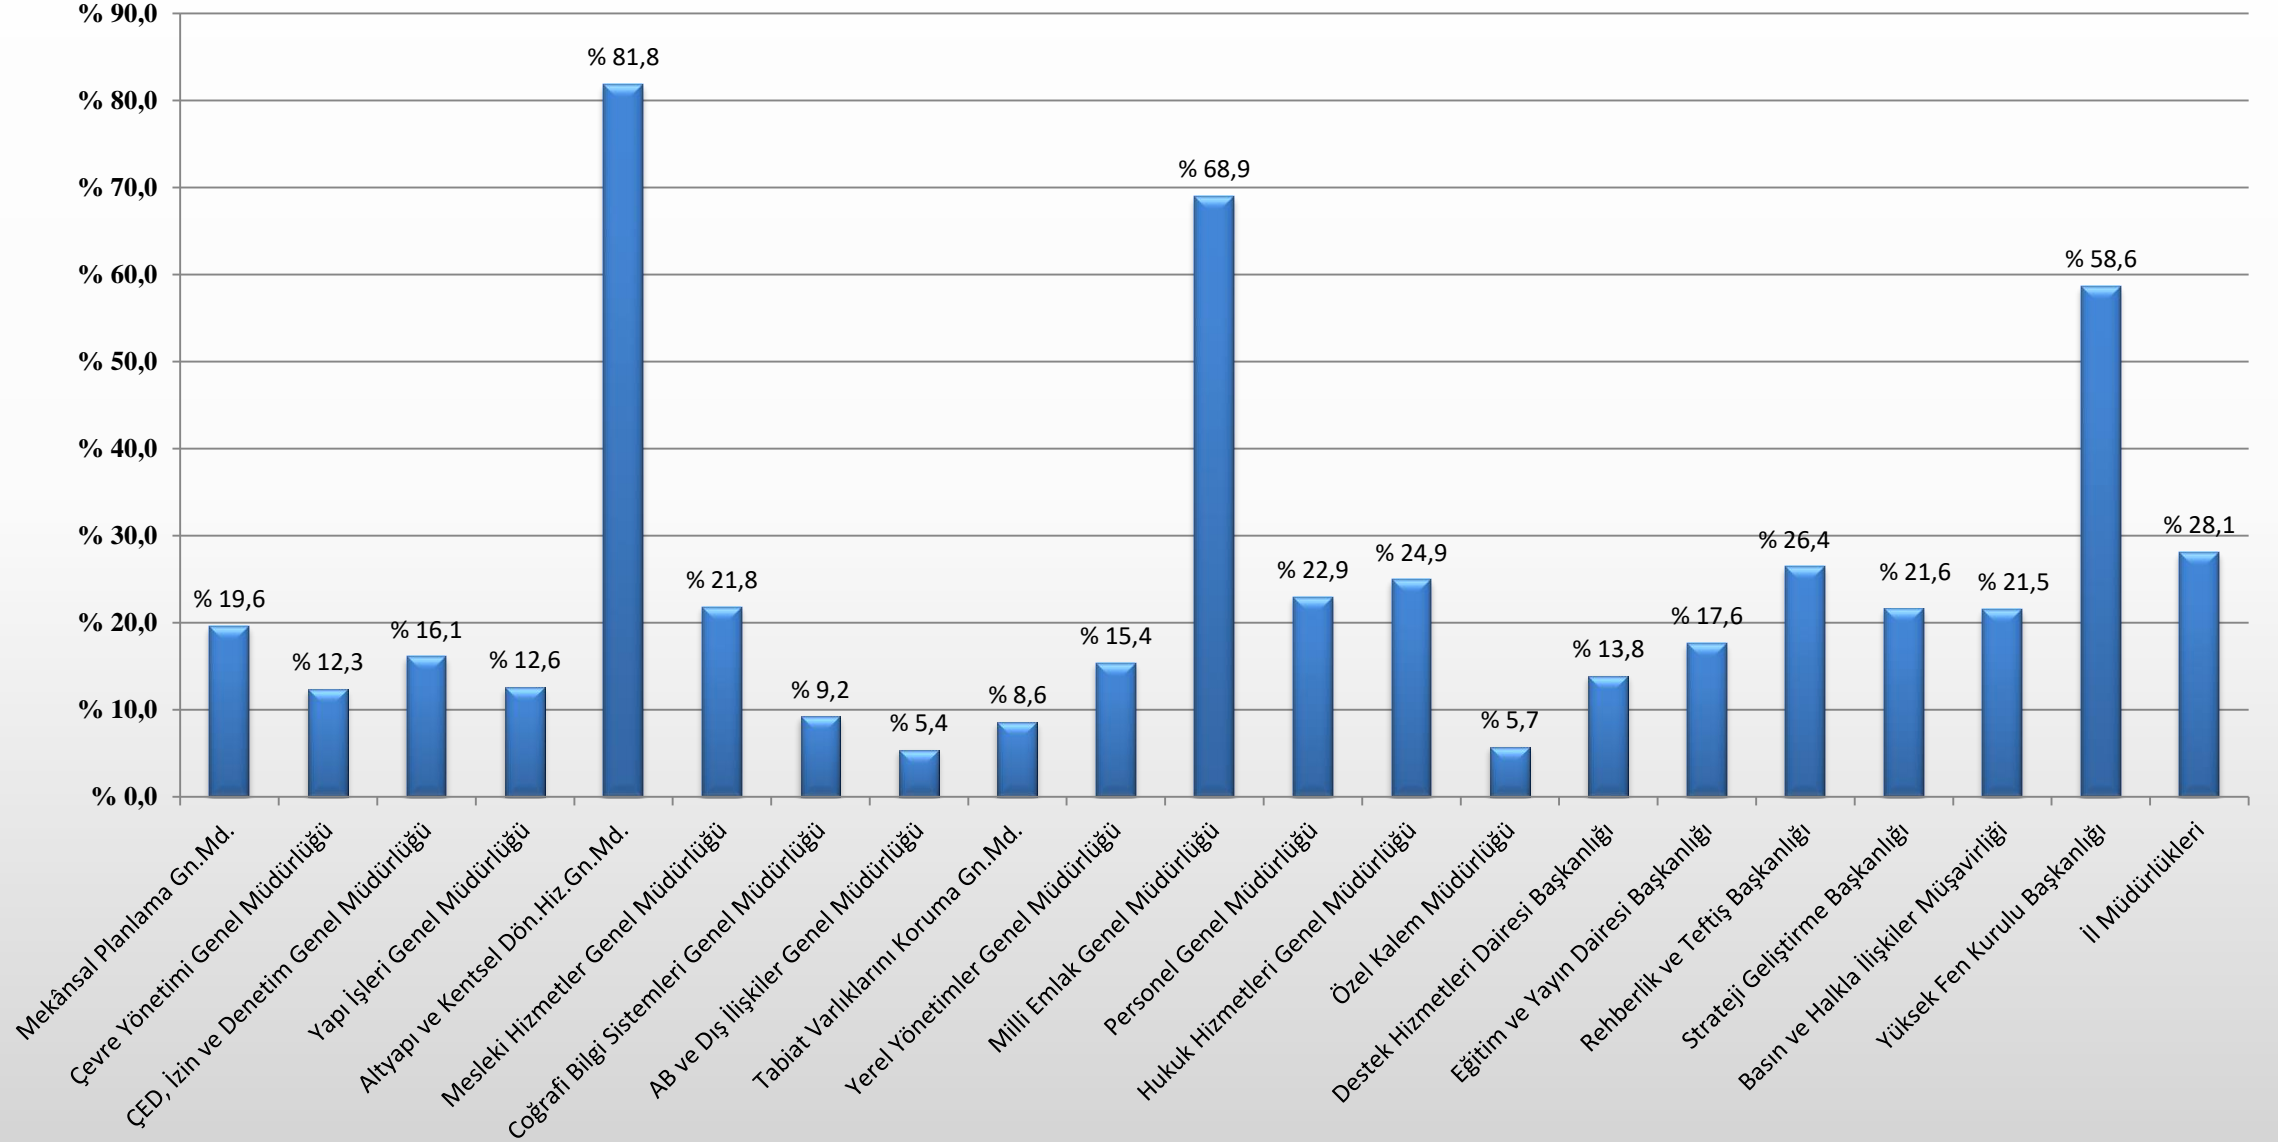

Arz Ederim...



MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2020	7.800	0	2.600	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2020	4.000	0	1.600	0	% 0,0	İhale usulünün belirlenmesi aşamasındadır.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2020	3.800	0	1.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet tespiti yapılmaktadır
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2020	4.000	0	2.650	0	% 0,0	
2018K090220	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	1.500	0	1.000	0	% 0,0	Mayıs Ayı içerisinde beş farklı vilayet için ihaleler yapılacaktır. Aşağıdaki vilayetlere Denizli de eklenmiştir.2-3 Mayıs'ta tamamı ihale edilecektir.
	Samsun İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	
	Yozgat İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	
	Nevşehir İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	
	Mardin İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090600	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (DOKAP) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	1.000	0	500	0	% 0,0	Teknik Şartnamelerin onayı bekleniyor.
	Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	400	0	200	0	% 0,0	
	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	600	0	300	0	% 0,0	
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	14.300	0	6.750	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K060290	Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri (Kanalizasyon Sektörü)	2018-2022	9.986	0	1.576	0	% 0,0	
	Muhtelif Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri	2018-2022	9.536	0	1.126	0	% 0,0	Söz konusu proje, şemsiye proje niteliğinde olup; bu kalem altında bir proje çalışması yürütülmektedir.
	Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması	2019-2019	450	0	450	0	% 0,0	28.07.2016 tarihinde imzalanan protokolle başlayan projenin yurt dışı teknik gezi, deneme yakmaları, nihai raporu ve kapanış toplantısının tamamlanamaması nedeniyle 25.12.2019 tarihinde yapılan ek protokol ile süresi 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Yurt dışı teknik gezi Ocak ayında ve deneme yakmaları Nisan ayın içinde tamamlanmıştır.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2022	1.000	0	4	0	% 0,0	2019’un ilk 3 ayında herhangi bir faaliyet gerçekleşmemiştir.
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	109.904	40.000	50.000	0	% 0,0	17.05.2017 tarihinde yatırım programına alınan ve Bakanlığımız 100 günlük eylem planları kapsamında yürütülen çalışmalar arasında yer alan KAP projesi ödeneği, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanan her proje özelinde belirlenen miktarda ödeneğin kullanılması için 2018 yılı ödeneği İller Bankası A.Ş.’ye aktarılmıştır. KAP kapsamında değerlendirilecek 2019 yılı projelerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılmış Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.
2018K080010	İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2018-2020	1.000	0	500	0	% 0,0	2019’un ilk 3 ayında herhangi bir faaliyet gerçekleşmemiştir.
2018K100290	Tersanelerin Deniz Etkilerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.487	697	790	0	% 0,0	Söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile yürütülmektedir. Projenin saha analiz çalışmaları yürütülmektedir. 2019 yılı proje ödemesi sadece yılın son çeyreğinde yapılacak olup, ilk çeyrekte herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.480	2.520	2.000	0	% 0,0	Ulusal katkının takibinin yapılması amacıyla 2017 Yılı Yatırım Programının DKH-Sosyal-Çevre Sektöründe 2016K100050 numaralı “Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi” eklenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu projenin yürütülmesi işi 06.11.2017 tarihinde imzalanan bir protokol ile Medipol Üniversitesine verilmiştir. Proje faaliyetlerine başlanmış olup 2020 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 2019 yılı ilk çeyreğinde ödeme bulunmamaktadır. Proje takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	2.000	328	0	% 0,0	Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Belirlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Uygulamanın Kolaylaştırılmasının Sağlanması Projesi 3 Şubat 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Dokuz Eylül Üniversitesi yürütücülüğünde başlamıştır. Demir çelik üretimi, demir dışı metal üretimi, tekstil, şeker üretimi, büyük yakma tesisleri, çimento üretimi, cam üretimi tesisleri, tuğla ve kiremit üretimi, beyaz eşya üretimi, seramik üretimi, gıda üretimi, petrokimya üretimi tesisleri yerinde ziyaret edilmiştir. Entegre Demir Çelik Üretim Tesisleri, Demir Dışı Metal Üretim Tesisleri, Şeker Üretim Tesisleri ve Tekstil Üretim Tesisleri ile ilgili kılavuzlar tamamlanmış ve nihai hale getirilmiştir. Proje kapsamında Mayıs ayında I. Sektörel Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 05.11.2018 tarihinde Proje III. Ara raporu sunulmuş olup, onaylanmış ve ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında sektörel kontrol listeleri, uygulama kılavuzları ve mevzuat değişikliği çalışmalarına devam edilmektedir. 2019 yılı ilk çeyreğinde ödeme bulunmamaktadır.
2018K100020	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	8.000	1.200	1.104	0	% 0,0	
	Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespiti	2018-2019	500	200	300	0	% 0,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Hacettepe Üniversitesi ile yürütülmektedir. 22.06.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespiti projesi kapsamında emisyon ve maliyet hesapları iş paketi tamamlanmış olup, Araçların Trafikten Çekilmesi için Yapılacaklara Yönelik Yol Haritası raporu hazırlanmış olup, seçilen senaryolarda yapılacak olan hava kalitesi modelleme çalışması sonucuna göre Hacettepe Üniversitesi tarafından teşvik mekanizması önerilecektir. Ayrıca, sağlık etkilerine yönelik Eva modelinin girdisi de hazır hale gelecektir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi	2018-2021	4.000	1.000	800	0	% 0,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmektedir. 27.06.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi kapsamında , başlangış raporu ve 1 .gelişme raporu kabul işlemlerinin ardından ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ilk çeyreğinde ödeme planlanmamıştır. Projede HEY portalı yazılım bakım ve geliştirme işlemleri devam etmektedir. Hava Emisyon Konulu Çevre İzin sayısallaştırılması işlemleri proje destek elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup, 755 Ek-1 tesisine ait 11.139 bacaya ait veriler veri tabanına kaydedilmiştir. Konya, Samsun ve İzmir bölgesel hava kalitesi yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi modelleme eğitimleri başlamış olup, eğitimlerden Bakanlığımız ilgili personeli, Temiz Hava Merkezi personelleri, çeşitli üniversitelerden görevlendirilen akademisyenler yararlandırılmaktadır.
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi	2018-2021	2.000	0	2	0	% 0,0	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesinin protokol taslağı hazırlanmış olup Bakanlık Makamına onaya sunulmuştur. 2019 yılı tasarruf tedbirleri gereğı projelerin 2020 yılı yatırım programı sürecinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2021	1.500	0	2	0	% 0,0	Koku Oluşturan Emisyonların Yönetimi Projesi protokol taslağı hazırlanmış olup Bakanlık Makamına onaya sunulmuştur. 2019 yılı tasarruf tedbirleri gereğı projelerin 2020 yılı yatırım programı sürecinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
2018K100300	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.687	287	700	0	% 0,0	Proje TÜBİTAK-MAM ile yürütülmektedir. Proje kapsamında teknik çalışma grupları oluşturularak, 26-29 Mart tarihlerinde İyi Çevresel Durum ve İzleme Programı 1. Çalıştayı düzenlenmiş olup, herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2018K100310	Deniz Çöplerinin Önlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	2.360	0	2	0	% 0,0	2019 yılının ilk üç ayında, proje ihale süreci başlamamıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100410	EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000	1.500	1.000	0	% 0,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Karabük Üniversitesi ile yürütülmektedir. 12.07.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Envanter güncelleme çalışmaları devam etmekte olup, ilk çalışmalarda 3809 tesis belirlenmiştir. Her alt sektör için 5 adet MET Kontrol listesi hazırlanmıştır. MET listelerinde verileri toplamak için yazılım oluşturulmuş olup firmalardan veri girişi sağlanmaya başlanmıştır. MET Referans Dokümanları ve MET Sonuçlarının Türkçe çevirisi tamamlanarak web sitesinde yayımlanmıştır. Proje tanıtım videosu, proje tanıtım broşürü hazırlanmış ve 2 Kasım 2018 tarihinde proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık ofisinde 2 adet proje asistanı çalışmaya başlamıştır. 4 adet Proje Yönetim Planı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık personeline yönelik 1. Eğitim Programı ve sektör temsilcilerini katılımı ile 1. Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 1 adet yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içinde; Proje Yönetim Planı Raporu onaylanarak 885.000 TL (KDV Dahil) ilk ödeme ve Saha Ziyareti Planı Raporu onaylanarak 613.600 TL (KDV Dahil) ikinci ödeme gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ilk çeyreğinde ödeme bulunmamaktadır. Proje takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir.
2018K100670	Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000	0	300	0	% 0,0	
	Sulu Sistem Atık Depolama Alanı Bertarafı	2018-2020	2.000	0	200	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi hazırlanmıştır.
	Termik Santral Taban Küllerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi	2018-2020	1.000	0	100	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi hazırlanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100390	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB)	2018-2021	3.451	1.365	550	0	% 0,0	Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CITYAIR) Projesinin Aralık 2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 9 Nisan 2019 tarihinde resmi açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
AB katkısı	(Çevre Sektörü)		19.340	7.735	2.900	0	% 0,0	
2018K100400	KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB)	2018-2022	2.938	0	600	0	% 0,0	Proje henüz başlamamıştır.
AB katkısı	(Çevre Sektörü)		16.577	0	5.525	0	% 0,0	
2018K100610	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB)	2018-2022	10.721	0	1.500	0	% 0,0	IPA 2 Programına sunulan projenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması akabinde projenin uygulayıcı kuruluşu olan UNDP Türkiye tarafından hazırlanan teknik şartname, Bakanlığımızca uygun bulunmuş olup teknik şartnamenin Avrupa Komisyonunca da uygun bulunması halinde proje faaliyetlerinin 2019 yılı içinde başlatılması planlanmaktadır.
AB katkısı	(Çevre Sektörü)		59.395	0	15.190	0	% 0,0	
2019K100030	REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (AB)	2019-2021	1.588		650	0	% 0,0	İhale değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
AB katkısı	(Çevre Sektörü)		8.842		3.900	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100040	Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)	2017-2020	9.078	4.820	3.300	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi AB Türkiye Delegasyonunda uygun bulunarak onaylanmış ve ihaleye çıkılmak üzere prosedürel işlemlerinin tamamlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı IPA birimine iletilmiştir. Mayıs 2019’da ihalesinin yapılmasını müteakiben projeye başlanması beklenmektedir.
AB katkısı	(Çevre Sektörü)		78.194	42.560	25.806	0	% 0,0	
Ülke Katkısı	Düşük Karbonlu Kalkınma Strateji ve Eylem Geliştirilmesi	2018-2019	2.753	1.000	1.250	0	% 0,0	Proje 7 Haziran 2017 itibari ile başlamıştır ve süresi 36 aydır. Proje hedef sektörlerinden biri olan Tarım sektörü için 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde BM FAO’nun modelleme aracı EX-ACT üzerine 2 günlük kapsamlı eğitim gerçekleştirilmiştir. Sektörel sera gazı azaltım potansiyelleri ve maliyetleri değerlendirmesi için TIMES modelleme çerçevesi kurulmuş ve ilk taslak hazırlanmıştır. Ulaştırma sektörü Sektörel Etki Analizi için Mevcut Durum Raporu ve ilgili direktiflerin ekonomik, çevresel ve sosyal fayda ve maliyetlerin hesaplaması tamamlanmıştır. Atık sektörü Sektörel Etki Analizi için Mevcut Durum Raporu ve Yaşam Döngüsü Analizi tamamlanmıştır. Bina sektörü Sektörel Etki Analizi çalışmasının Mevcut Durum Raporu tamamlanmış ve ilgili direktiflerin ekonomik, çevresel ve sosyal fayda ve maliyetlerin hesaplaması devam etmektedir. Proje paydaşları ile danışma toplantıları düzenlenmiş ve hazırlanan olası sektörel sera gazı emisyon azaltım listesi ve veri ihtiyacı üzerinde istişare edilmiştir.
AB katkısı			22.613	8.450	8.450	0	% 0,0	
Ülke Katkısı	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	1.345	390	500	0	% 0,0	Soğutma Sektörü eğitici eğitimleri; 21-22-23-24 Ocak 2019’da İstanbul’da, 7-8 Mart’ta İzmir’de gerçekleştirildi.A.3.1 taslak Raporu sunuldu. A.4 F-Gaz alternatiflerine ilişkin halkın farkındalığının artırılması çalışmaları hazırlığına başlandı ve A.4.1 raporu sunuldu. Web sayfası geliştirilerek web sayfası menüsü ve içerik yenilendi.27-28 Şubat 2019 tarihlerinde A.4. ve A.6. faaliyetlerine ilişkin toplantılar yapılmıştır. A.7. faaliyeti altında atık geri kazanım/bertaraf tesisleri ziyaret edildi
AB katkısı			11.701	3.471	4.115	0	% 0,0	
Ülke Katkısı	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	1.350	850	500	0	% 0,0	16/08/2017 tarihinde başlayan 23 aylık LULUCF Projesi kapsamında, ulusal sera gazı emisyon envanterinin LULUCF bölümünün geliştirilmesine yönelik olarak, OSİB Orman Genel Müdürlüğü ve GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kurumların konu ile ilgili personelinin katılımıyla, 2019 yılının Ocak ayında envanter hazırlama eğitimleri, Şubat ayında envanterin mevcut durumunun değerlendirilmesi çalışması, Mart ayında bilimsel araştırmalarla envanterin değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Mart ayında envanter raporu son haline getirilmiştir. Ayrıca Mart ayı içinde genel sera gazı eğitimi düzenlenmiştir.Çekirdek grup içinde bulunan kurum temsilcileri için proje uzmanları tarafından birebir eğitimler gerçekleştirilmiştir.
AB katkısı			11.700	7.592	4.108	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	1.350	850	500	0	% 0,0	Proje kapsamında Antalya'da yerel iklim eylemi konulu uluslararası bir konferans gerçekleştirilmiştir. Kamu spotu hazırlanmıştır. Hazırlanan eğitim modülleri kapsamında 20 ilde gerçekleştirilecek iklim değişikliği eğitimlerinin 4'ü (Sinop,Samsun,Artvin,Hatay) tamamlanmıştır.
AB katkısı			11.700	7.592	4.108	0	% 0,0	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	2.280	1.730	550	0	% 0,0	Hibe programı kapsamında 37 adet hibe projesi yürütülmektedir. 2018 yılında 18 adet hibe projesi tamamlanmıştır, 2019 yılında 4 adet, 2020 yılı başında ise 15 adet hibe projesi tamamlanmış olacaktır.
AB katkısı			20.480	15.455	5.025	0	% 0,0	
17 Proje		06 ve 07 TOPLAM	177.480	54.389	64.904	0	% 0,0	
			AB KATKISI	182.348	50.295	53.321	0	% 0,0

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2020	122.598	80.347	18.147	121	% 0,7	
	Genel Bütçe Ödeneği		62.598	34.498	11.000	121	% 1,1	*Projenin Lab. Ölç.ve İz. Da. Bşk. tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 2018 yılı Bakım Onarım işine ait son hakediş ödenmiştir. 2019 yılına ait Güney Doğu Anadolu THM' ye bağlı iller için ihale 09 Nisan 2019 tarihinde yapılmış olup, sözleşme imzalanma aşamasına gelinmiştir. ** Projenin GÜNEY İÇ ANADOLU THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; bahse konu proje başlığı altında yer alan Konya THM için ayrılan 500.000 TL'lik miktar ile saha örnekleme cihazları alınacak olup teknik araştırmalar devam etmektedir. *** Projenin MTHM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 2019 yılı ilk üç aylık serbest bırakılan ödenek yetersiz olduğu için Ocak ayı Bakım Bedeli yapılmıştır. Şubat ve Mart Bakım Onarım Bedelleri Nisan Ayı İlk haftasında ödenmiştir. Ayrıca Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları için Sarf ve Yedek Malzeme Temini İşi için 2.500.000,00.-TL Yetki Devri gönderilmiştir. Diğer taraftan; Kuzey İç Anadolu, Güney İç Anadolu, Doğu Anadolu, Orta Karadeniz, Akdeniz ve Ege THM' lerine ihale talimatı gönderilmiş olup, ihale sonuçlarına göre ödenek aktarımı yapılacaktır.
	Döner Sermaye Ödeneği		60.000	45.849	7.147	0	% 0,0	Proje kapsamında Akdeniz THM' ye bağlı illerde istasyon kurulumu gerçekleştirilecektir. İlgili iş için gerekli yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmekte olup, ihale süreci Akdeniz THM tarafından yapılacaktır.
2018K100470	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000	0	300	0	% 0,0	4734 sayılı Kanunun 3/f yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan proje 3/f Projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Bakanlık Makamı Onayına sunulmasına karar verilmiştir. Protokolün Bakanlık Makamı Onaya sunulması aşamasındadır.
2018K100620	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyonu, Entegrasyonu ve Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.400	0	440	0	% 0,0	Projenin 4734 sayılı Kanunun 3/f yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Protokol hazırlama çalışması devam etmektedir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100120	E-PRTR Kapasite Geliştirme (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.742	912	830	0	% 0,0	25 Mayıs 2019 da proje tamamlanacak olup 2019 yılına ait ödeme bu tarihten sonra yapılacaktır.
AB KATKISI			13.969	8.427	5.542	0	% 0,0	
2019K100010	SÇD Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	306		130	112	% 86,0	IPA III. Bileşen Çevre ve İklim Eylem Programı Finansman Anlaşması "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi" kapsamında yer alan "2019K100010 nolu Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi (SÇD) Projesi (TR2018 ESOP ESOP M1 A312)" için talep edilen 17.940,00-Avro karşılığı (Kur 6,2354) 111.863,08-TL,Ulusal Fon III. Bileşen Ulusal Katkı Ana Hesabına Genel Müdürlüğümüzce 03.04.2019 tarihinde aktarılmıştır.
AB KATKISI			1.658		663	570	% 86,0	
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	72.046	35.410	12.700	233	% 1,8	
		DÖNER SERMAYE	60.000	45.849	7.147	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	132.046	81.259	19.847	233	% 1,2	
		AB KATKISI	15.627	8.427	6.205	570	% 9,2	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	16.500	8.500	2.000	0	% 0,0	İlk ihale olan Bakanlık Hizmet Binası işine ilişkin kesin hesap işlemleri tamamlanmıştır. İkinci ihale olan CBS Veri Merkezi ve İlave İşler İnşaatı işinin kesin kabulü yapılmış ve 10.07.2017 tarihinde onaylanmış olup, işe ait kesin hesap çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2018E050290	Ulus Meydanı Düzenlemesi	2018-2023	750.000	100.000	7.800	0	% 0,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğüne söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL, Genel Müdürlüğümüzce Karayolları Genel Müdürlüğüne ilgili hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmalarının kapsamının belirlenmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli ön proje doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlandığı bilinmektedir. İhale süreçleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Çevrimiçi Proje Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması (CADD Uyumlu) ve Yaygınlaştırılması	2019-2019	1.150		1.150	16	% 1,4	"Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları" yayımlanmış olup, konu ile ilgili mevzuat düzenlemesi (genelge vb...) ve yayımlanması için hazırlıklar devam etmektedir.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2019-2019	760		760	13	% 1,7	Yeni Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılım uygulaması değişen mevzuat kapsamında dağıtım modülünü de içerecek şekilde revize edilerek 2019 yılı itibarıyla 81 ilde devreye alınmıştır. Ayrıca, mülga Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile imzalanan protokol kapsamında geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi de 81 ilde uygulamaya alınmıştır.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2019-2019	500		500	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki yazılımların bakım onarım ve iyileştirme işlemlerinde ve donanım ihtiyaçlarının sağlanmasında kullanılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070120	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	5.700	300	1.100	0	% 0,0	
	Muhtelif İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri	2018-2022	5.100	300	500	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüd yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması	2019-2019	600		600	0	% 0,0	2019 yılı Mart Sonu itibarıyla toplamda 54 ilde çalışmalar yapılmış olup 5 İlden oluşan her bölge için toplamda 7 adet yöresel koşullara uygun çözümleri içeren, yöresel doku ve malzemelerin günümüz yöntem ve teknolojisi ile kullanıldığı, yöresel doku ve mimari kimliklerin korunduğu, yöresel malzemenin kullanıldığı, güvenli kırsal konut projeleri ile 44 adet köy konağı projesi elde edilmiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2020	30.850	11.966	6	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2020	9.379	3.513	2	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlanmıştır. Projeye ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanununa 25.05.2018 tarihinde geçici madde eklenmiş olup yıkıp yeniden yapılacak 250 adet konut belirlenmiştir. Kanun gereği 250 aileye başvuru için 6 ay süre verilmiş olup müracaatlar beklenmektedir. Müracaat süresi 03.02.2019 tarihinde sona erecek olup başvuru sayısına göre ihalenin yapılması gerekeceğinden ödenek bu tarihten sonra talep edilecektir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2020	11.970	3.389	2	0	% 0,0	131 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkemeden Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2020	9.501	5.064	2	0	% 0,0	152 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkemeden Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2022	33.600	5.000	4	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmediğinden iş devam edemiyor. 13 milyon ek ödenek gerekmektedir.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	4.277	1.826	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	221.885	57.304	42.845	0	% 0,0	
	Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2020	26.100	3.500	1.000	0	% 0,0	Ödenek yetersizliği nedeniyle iş devam edemeyecektir. 15 milyon 698 bin ek ödenek gerekmektedir.
	Muhtelif İskan İşleri	2011-2022	195.785	53.804	41.845	0	% 0,0	İşlerin yapım çalışmaları devam etmektedir. (Samsun-Vezirköprü-Susuz köyü tamamlanmış olup konut kuraları çekilmiştir. Erzincan İli Uluköy-Kayı-Kalecik köyleri yapım işleri ise devam etmektedir). 11 milyon 493 bin ek ödenek gerekmektedir.
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2022	220.414	167.660	4	0	% 0,0	
	Anamur-Alaköprü Barajı İskanı	2013-2022	211.477	158.725	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmediğinden iş devam edememektedir. 70 milyon 840 bin ek ödenek gerekmektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2019	8.937	8.935	2	0	% 0,0	İş Bitti
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2022	3.620	1.400	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	135.206	40.000	10.000	3.790	% 37,9	Ödeneğini harcadığından iş devam edememektedir. 82 milyon 768 bin ek ödenek gerekmektedir.
2018K070020	Bozkır Barajı İskanı (KOP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	170.164	0	2.000	0	% 0,0	31.12.2018 tarihinde işin ihalesi ve ye teslimi yapılmıştır. Ödenek bulunmamaktadır. 81 milyon ek ödenek gerekmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070030	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (KOP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	37.619	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K070130	İlisu Barajı İskanı (GAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	76.287	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K070140	Yusufeli Barajı İskanı (DOKAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	115.488	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2011K070050 (**)	<i>Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi</i> (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	5.950	2.800	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2016K070020 (**)	<i>Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I</i> (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	268.800	53.849	14.690	0	% 0,0	İşler devam etmektedir. Aksaray,Ankara, Batman,Bilecik,Bingöl, Bolu,Çankırı,Çorum,Denizli,Erzincan,Erzurum,Iğdır,Isparta, İzmir,Kahramanmaraş,Karaman, Kars,Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale,Malatya,Muş,Niğde,Sivas,Şırnak,Uşak illerinden yaklaşık 93 adet köyde 2.140 ailenin konut yapımı işi. 56 milyon 960 bin ek ödenek gerekmektedir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2021	33.681		11.227	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
17 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.807.520	385.456	66.179	3.819	% 5,8	
		08 TOPLAM	274.750	56.649	14.692	0	% 0,0	
		DÖNER SERMAYE	16.500	8.500	2.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	2.098.770	450.605	82.871	3.819	% 4,6	
		Kamu laştırma	33.681	0	11.227	0	% 0,0	

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2020	6.500	3.750	550	0	% 0,0	
2018K090320	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	2.200	0	1.000	0	% 0,0	
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2019-2021	12.000		4.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	8.700	3.750	1.550	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	12.000	0	4.000	0	% 0,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D000070	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2022	3.950	125	683	0	% 0,0	*Binalarda Enerji Verimliliği Uygulaması Bakım Destek İyileştirme İşinin Teknik Şartnamesi hazırlanmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir. *Yeşil Sertifika Türkiye Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi İşinin Teknik Şartnamesi hazırlanmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir.
2019G000370	Konut Araştırması (Konut Sektörü)	2019-2020	1.000		300	0	% 0,0	Üniversitelerle işbirliği yapılarak hazırlanması düşünülen rapor için hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	2.458	1.758	700	0	% 0,0	
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2019-2019						
	YAMBİS ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncelleme	2019-2019	300		300	0	% 0,0	
2019K010820	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2019-2019	500		500	0	% 0,0	
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	8.208	1.883	2.483	0	% 0,0	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2019-2019						
	YAMBİS ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncelleme	2019-2019	300		300	0	% 0,0	
	Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sistemlerine Entegrasyonu	2019-2019	1.120		1.120	0	% 0,0	
	Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme	2019-2019	1.960		1.960	0	% 0,0	
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	3.500	500	0	% 0,0	2019 yılı içerisinde 2019-2022 Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı taslağı hazırlanmış olup, sorumlu ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere görüşe sunulmuştur. Gelen görüşler doğrultusunda güncellenmiştir.
2017K090360	Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000	21.600	8.400	156	% 1,9	Bu kapsamda 1 adet donanım alımı, 1 adet de hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.
	Bilgi Sistemleri Güvenlik Yazılımı Temini	2017-2019	8.600	6.000	2.600	0	% 0,0	Şartname çalışmaları devam etmektedir.
	Bilgi Sistemleri Sistem Yazılımı Temini	2017-2019	19.000	14.000	5.000	0	% 0,0	Şartname çalışmaları devam etmektedir.
	Bilgi Sistemleri Uygulama Yazılımı Temini	2017-2019	2.400	1.600	800	156	% 19,5	Bu kapsamda 1 adet donanım alımı, 1 adet de hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090630	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	24.000	13.000	11.000	0	% 0,0	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2019	7.500	4.000	3.500	0	% 0,0	
	Coğrafi Bilgi Platformunun Kurulumu	2018-2019	6.000	3.000	3.000	0	% 0,0	
	Coğrafi Veri Uyumlaştırma Projesi	2018-2019	6.500	3.500	3.000	0	% 0,0	
	TUCBS Entegrasyonu Projesi	2018-2019	4.000	2.500	1.500	0	% 0,0	
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2020	13.310	2.000	1.000	0	% 0,0	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi kapsamında şartname hazırlık çalışmaları başlamıştır.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	74.690	40.100	24.280	156	% 0,6	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100500	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	20.475	1.441	2.200	643	% 29,2	
AB KATKISI			116.025	8.169	11.106	3.644	% 32,8	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.475	1.441	2.200	643	% 29,2	
		AB KATKISI	116.025	8.169	11.106	3.644	% 32,8	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000630	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2018-2021	1.412	455	319	0	% 0,0	*.İhlara Vadisi Çevre Düzenleme Projesi sözleşmesi imzalanma aşamasındadır. * Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova ve Patara ÖÇK Bölgeleri Bisiklet Yolları Uygulama Projesinin Hazırlanması İşi sözleşmesi 09.04.2019 tarihinde imzalanmıştır.
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP) (Turizm Sektörü)	2017-2019	10.950	8.900	2.050	0	% 0,0	Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yıllara sari olarak yürütülen projede 2017 yılında 2.900.000,00TL, 2018 yılında 5.942.526,06 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup imalat yapım çalışmaları devam etmektedir.
2018F000200	Gökçeada Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	2.500	0	2.500	0	% 0,0	Gökçeada (Çanakkale) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
2018F000240	Tortum Gölü Yarım Ada Çevre Düzenlemesi (DAP) (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.500	4.500	5.000	0	% 0,0	Uzundere (Erzurum) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 1.953.593,25 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup imalat yapım çalışmaları devam etmektedir.
2018F000740	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	8.500	3.000	5.500	0	% 0,0	2018 yılı ödeneği aktarılmıştır. 2019 yılı Makam onayına sunulacak olup çalışmalar devam etmektedir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K050050	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2021	16.514	3.800	3.815	0	% 0,0	
	Saros ÖÇKB Köyleri İçmesuyu Temini	2019-2019	1.500		1.500	0	% 0,0	Gelibolu Kaymakamlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
	Habilli Mahallesi İçmesuyu Temini	2019-2019	1.250		1.250	0	% 0,0	Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
	Çamlıhemşin İçmesuyu Temini	2019-2019	385		385	0	% 0,0	Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı ek protokolü imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2021	13.379	3.800	680	0	% 0,0	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini Projelerinde kullanılacaktır.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	71.237	61.386	9.851	0	% 0,0	2019 yılı yatırım programında yer alan 9.851 TL'nin aktarılmasına ilişkin yazışmalar yapılmıştır. Sonuçlanması beklenmektedir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (KOP) (Çevre Sektörü)	2011-2019	2.532	2.101	431	0	% 0,0	
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	899	829	70	0	% 0,0	Makam onayına sunulmuş olup ihale süreçleri başlatılmıştır.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	546	476	70	0	% 0,0	Makam onayına sunulmuş olup ihale süreçleri başlatılmıştır.
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	547	477	70	0	% 0,0	Makam onayına sunulmuş olup ihale süreçleri başlatılmıştır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme	2016-2019	177	137	40	0	% 0,0	Makam onayına sunulmuş olup ihale süreçleri başlatılmıştır.
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2016-2019	147	107	40	0	% 0,0	Makam onayına sunulmuş olup ihale süreçleri başlatılmıştır.
	Pamukkale ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2017-2019	216	75	141	0	% 0,0	2019 yılı içerisinde devam eden projenin % 25'i gerçekleştirilmiştir

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	825	209	616	0	% 0,0	Proje raporları, teslim alınmış olup; inceleme aşamasındadır. Son hakediş henüz yapılmamıştır.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (KOP) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.335	797	538	0	% 0,0	
	Belek ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	270	135	135	0	% 0,0	13.06.2018 tarihinde işe başlanan projede arazi ve raporlama çalışmaları devam etmekte olup, Ön rapor ve Ara Raporun sunulmasını müteakip 2 adet ödeme gerçekleştirilmiştir. Projenin bitiş tarihi 05.09.2019 olup, sonuç raporunun teslimi ile kalan %50 lik ödeme yapılacaktır.
	Kaş-Kekova ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	285	156	129	0	% 0,0	03.05.2018 tarihinde işe başlanan projede arazi ve raporlama çalışmaları devam etmekte olup, Ön rapor ve Ara Raporun sunulmasını müteakip 2 adet ödeme gerçekleştirilmiştir. Projenin bitiş tarihi 28.07.2019 olup kalan %45 lik harcama kalmıştır.
	Patara ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	450	325	125	0	% 0,0	Proje 08.08.2017 tarihinde başlamıştır. 730 gün proje süresidir. Bu güne kadar %75'i ödenmiş olup % 25 son ödemesi yapılacaktır.Proje 08.08.2019 tarihi itibarıyla tamamlanacaktır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	330	181	149	0	% 0,0	12.02.2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile işe başlanılmış olup, % 25 ile ilk ödeme, % 30 ile Ara Rapor (ikinci) ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kesin Rapor (üçüncü ve son) ödemesi (% 45) şeklinde olup, Kesin Rapor incelenerek kabul aşamasındadır..
2019K100040	Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi (DOKAP) (Çevre Sektörü)	2019-2020	500		100	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlık aşamasındadır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090270	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	12.400		3.594	0	% 0,0	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2021	3.300		994	0	% 0,0	Uzungöl ÖÇKB de ve doğal sit alanı içerisinde kalan yaklaşık 616 hektarlık alanda Halihazır harita alımı işi ihale edilerek çalışmaları başlatılmıştır. Seyfe Gölü Çevresi, Kırşehir İli, Boztepe İlçesi ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla İli, Akyaka İlçe sınırları içerisinde bulunan alanlarda yapılacak halihazır harita alımlarına ilişkin tahdit sınırlarının netleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2021	6.700		2.000	0	% 0,0	Çalışmalar başlangıç aşamasındadır.
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması	2019-2021	2.400		600	0	% 0,0	Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü, Gölyazı ve Karatepe Mahallelerinde yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına Genel Müdürlüğümüzce mali katkı yapılmasına ilişkin Cihanbeyli Belediye Başkanlığı talebi değerlendirilmiş olup Protokol çalışmaları devam etmektedir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2019-2021	3.000		1.000	0	% 0,0	Planlama çalışmaları devam etmektedir.
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	138.205	85.148	34.314	0	% 0,0	
	Kamu laştırma		3.000	0	1.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K080080	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Dipnot: 121) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2021	8.000	5.000	1.000	24	% 2,4	
2017K080030	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Dipnot: 121) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	5.710	500	1.570	27	% 1,7	
2018K090040	İmar Planları İzleme ve Denetim Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	3.000		1.500	0	% 0,0	
2019K070020	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi (Dipnot: 118) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2019	1.496.700		1.496.700	0	% 0,0	Proje Ödenekleri Toplama Dahil Değildir
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.513.410	5.500	4.070	51	% 1,3	

Dipnot: 121 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Dipnot: 118 12.01.32.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010070	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2019-2019	4.000		4.000	0	% 0,0	
	Harita Alımları	2019-2019	250		250	0	% 0,0	
	Plan, Proje Alımları	2019-2019	250		250	0	% 0,0	
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2019-2019	3.500		3.500	0	% 0,0	
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2019-2021	408.850		402.950	323.198	% 80,2	2.950.000,00.-'e toplam ödenekten 1.832.000,00.-'e ödenek serbest bırakılmış, 400.000.000,00.-'e ödenek eklenmiş ve 323.197.839,00.-'e ödeme yapılmış olup, 78.676.685,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	4.000	0	4.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	408.850	0	402.950	323.198	% 80,2	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2020	153.744	41.500	20.658	11.700	% 56,6	
	Genel Bütçe Ödeneği		48.400	15.000	6.050	1.635	% 27,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		105.344	26.500	14.608	10.065	% 68,9	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	14.000	7.000	4.900	1.250	% 25,5	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde KDV dahil 9.770.400,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. KDV dahil 410.586 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 10.180.986 TL dir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %90' dir. 2019 yılı Haziran ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2021	13.000	0	200	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	9.900	8.000	900	385	% 42,8	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde KDV dahil 6.652.840,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. KDV dahil 665.275 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 7.318.115 TL dir. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2021	11.500	0	50	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	21.500	11.000	3.500	4.404	% 125,8	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde KDV dahil 17.039.200 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.01.2018 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %85' dir. 2018 yılında Genel Bütçeden 5.481.473,52 TL ve Döner Sermayeden 7.672.889,69 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	13.000	5.500	3.340	2.481	% 74,3	Hizmet binası yapım işi 15.01.2018 tarihinde KDV dahil 8.782.740 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.02.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 673.522 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 9.456.262 TL dir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %85' dir. 2018 yılında Genel Bütçeden 4.992.315,98 TL ve Döner Sermayeden 1.710.848,36 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	15.000	7.000	3.500	993	% 28,4	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde KDV dahil 10.924.440 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 28.02.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 1.069.374 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 11.993.814 TL dir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %85' dir. 2018 yılında Genel Bütçeden 5.214.443,56 TL ve Döner Sermayeden 2.051.930,62 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2022	35.320	0	210	204	% 97,1	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2022	8.000	0	50	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	11.000	3.000	3.500	1.983	% 56,7	Hizmet binası yapım işi 08.02.2018 tarihinde KDV dahil 6.629.240 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 10.04.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 662.924 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 7.292.164 TL dir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %85' dir. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*.Döner Sermaye)	2019-2021	1.524		508	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılacaktır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K090050	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2019-2019	1.250		1.250	163	% 13,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2019-2019	1.250		1.250	0	% 0,0	
2019G000060	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2019-2019	4.199		4.199	0	% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	55.099	15.000	12.749	1.798	% 14,1	
		DÖNER SERMAYE	105.344	26.500	14.608	10.065	% 68,9	
		GENEL TOPLAM	160.443	41.500	27.357	11.863	% 43,4	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.03.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019G000060	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2019-2019	100		100	0	% 0,0	
2019K090050	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2019-2019	250		250	0	% 0,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2019-2019	250		250	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	600	0	600	0	% 0,0	
