



2019 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

2. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2019 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.264.444.000,00	1.295.857.148,45	664.124.658,04	% 51,2
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	220.900.000,00	228.161.530,69	112.316.758,03	% 49,2
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	93.052.000,00	98.528.449,69	38.677.419,94	% 39,3
05	CARİ TRANSFERLER	572.867.000,00	1.619.010.320,57	1.290.652.073,18	% 79,7
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	393.384.000,00	433.918.000,00	206.887.000,00	% 47,7
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-İmar Barışı	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	150.000.000,00	150.000.000,00	69.500.000,00	% 46,3
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	22.665.000,00	23.907.695,88	10.283.295,85	% 43,0
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği				
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	6.818.000,00	11.184.624,69	3.981.777,33	% 35,6
06	SERMAYE GİDERLERİ	177.331.000,00	1.287.534.889,90	757.766.095,23	% 58,9
	Bakanlık Yatırım Programı	158.154.000,00	313.467.187,35	61.066.969,08	% 19,5
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.177.000,00	455.177.000,00	381.202.372,56	% 83,7
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	518.890.702,55	315.496.753,59	% 60,8
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	230.000.000,00	847.070.788,04	657.303.954,25	% 77,6
	Bakanlık Yatırım Programı	78.625.000,00	91.695.788,04	12.480.954,25	% 13,6
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	151.375.000,00	161.375.000,00	50.823.000,00	% 31,5
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	594.000.000,00	594.000.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	14.692.000,00	14.692.000,00	1.617.350,00	% 11,0
GENEL TOPLAM		2.573.286.000,00	5.390.855.127,34	3.522.458.308,67	% 65,3



BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

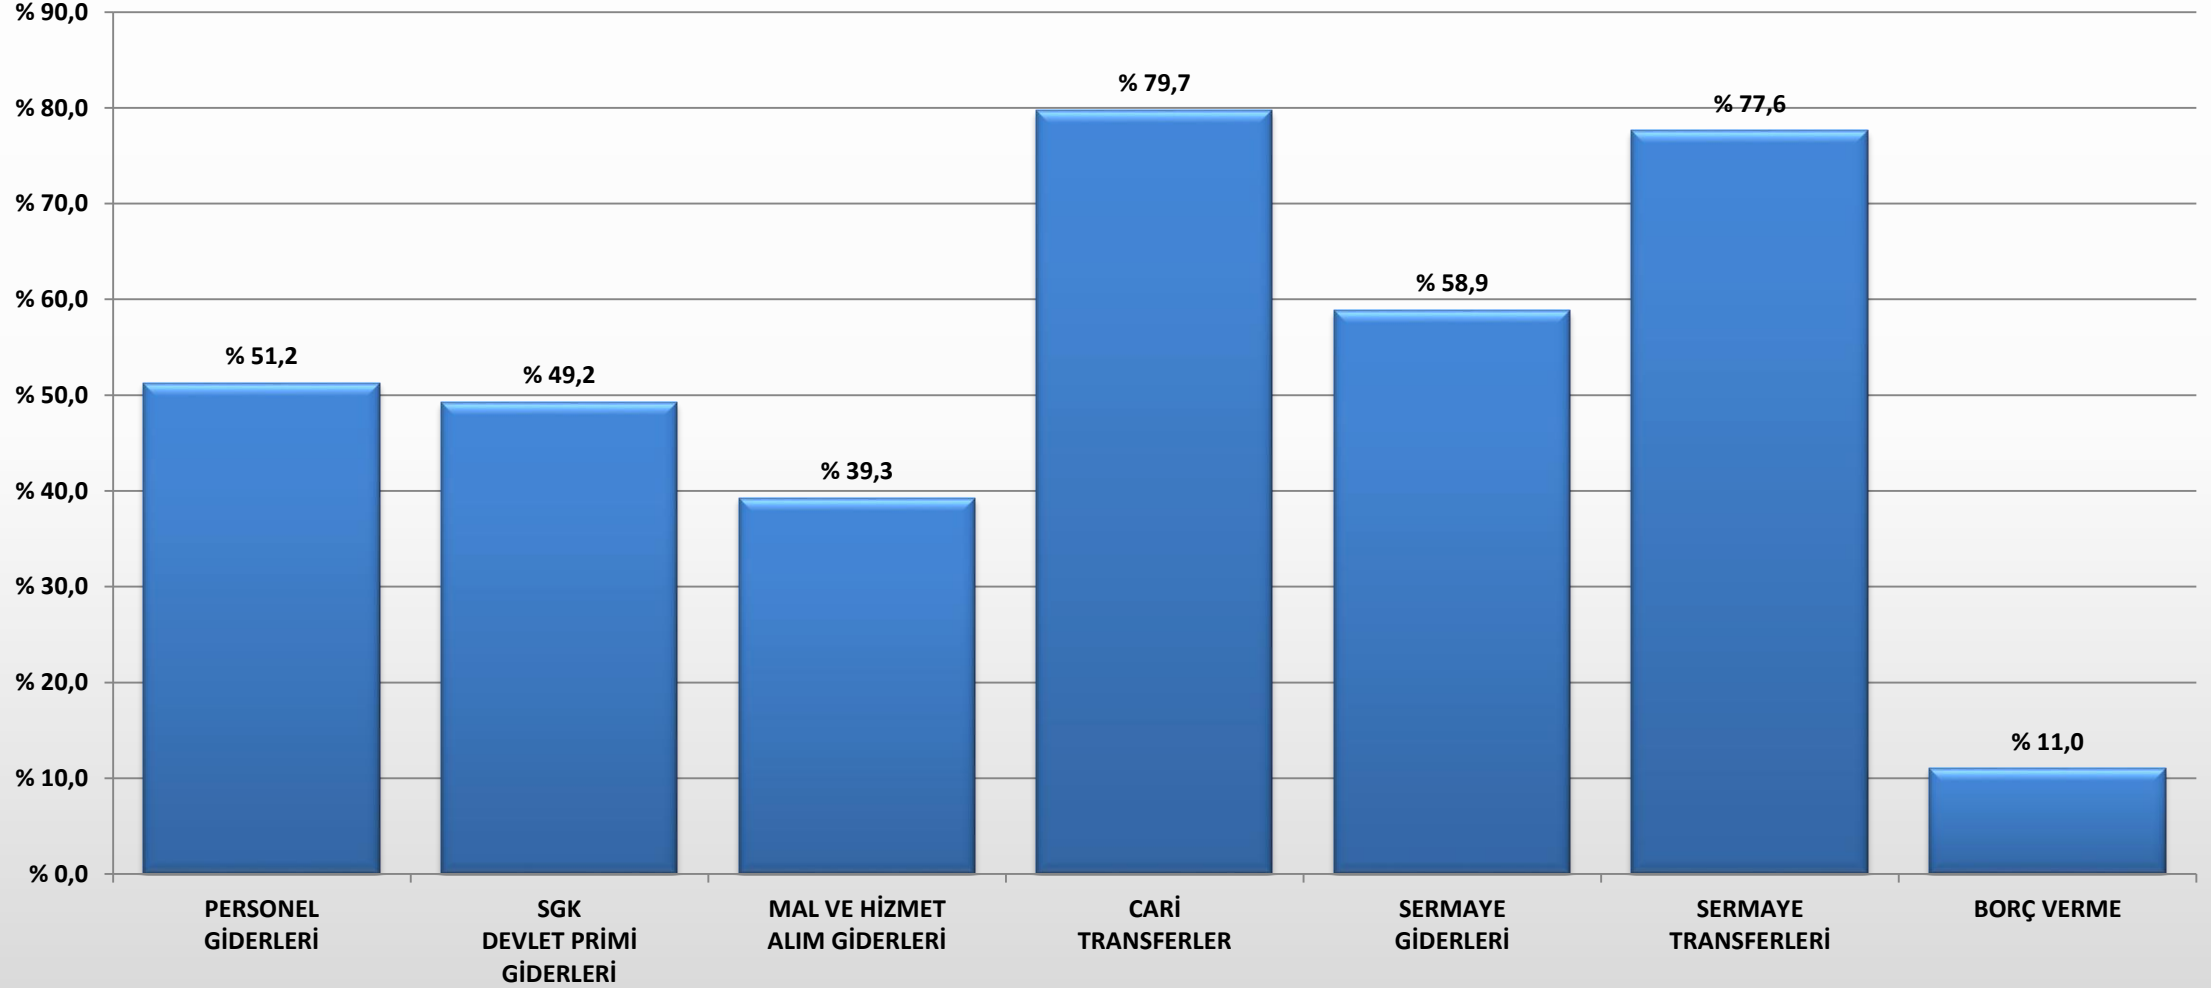




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2019 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2019 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	4	14.300.000,00	6.750.000,00	0,00	% 0,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	17	177.480.000,00	64.904.000,00	6.235.658,11	% 9,6
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	5	132.046.000,00	19.847.000,00	1.563.520,64	% 7,9
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	18	3.218.770.000,00	218.871.000,00	35.679.482,48	% 16,3
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	2	8.700.000,00	1.550.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	5	8.208.000,00	2.483.000,00	62.974,41	% 2,5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	6	77.690.000,00	25.780.000,00	2.481.982,64	% 9,6
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	1	20.475.000,00	2.200.000,00	745.892,64	% 33,9
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	12	145.875.000,00	41.984.000,00	6.399.744,18	% 15,2
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	1.510.410.000,00	2.570.000,00	50.912,12	% 2,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	3	160.443.000,00	42.497.000,00	24.741.925,20	% 58,2
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	600.000,00	600.000,00	102.180,91	% 17,0
GENEL TOPLAM	75	5.478.997.000,00	434.036.000,00	78.064.273,33	% 18,0
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	72	5.297.153.000,00	395.141.000,00	57.665.273,33	% 14,6
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	3	181.844.000,00	38.895.000,00	20.399.000,00	% 52,4
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet	493.531.000,00	455.177.000,00	381.202.372,56	% 83,7



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

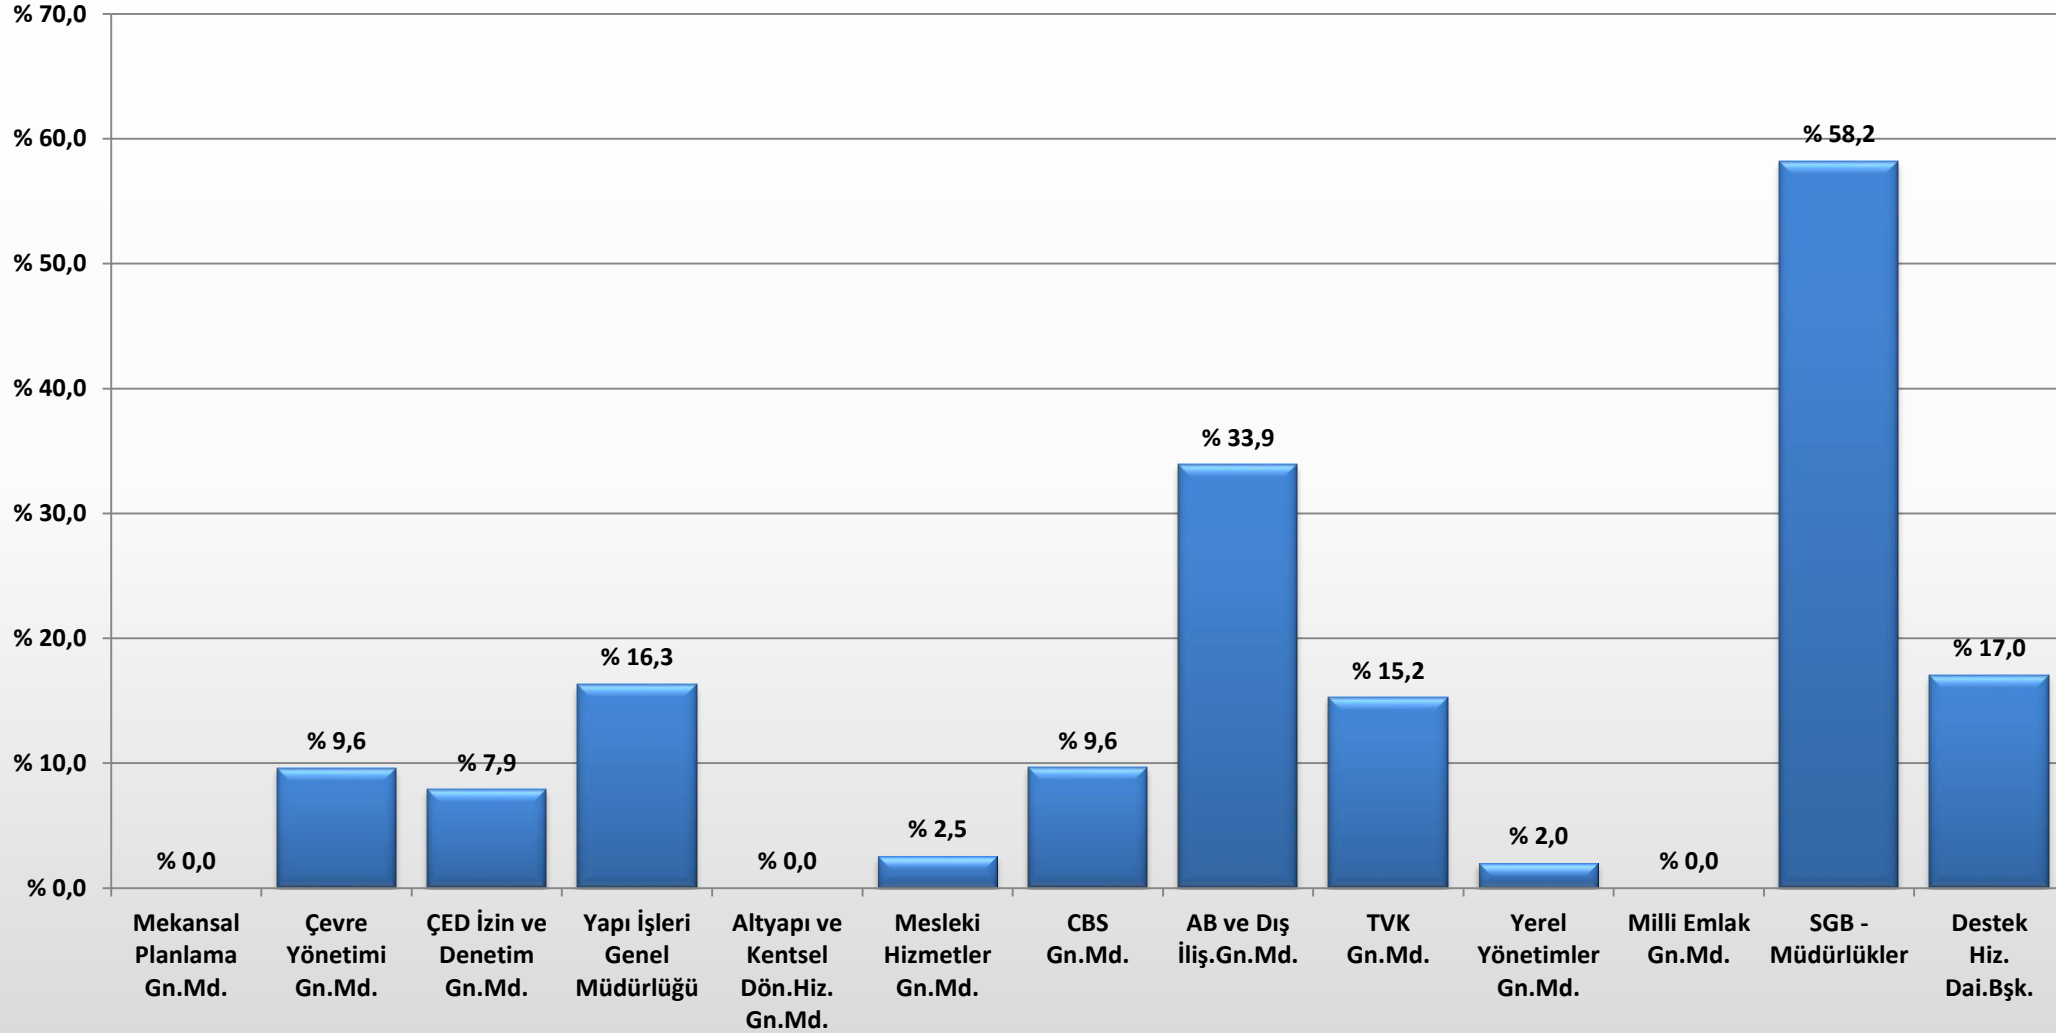




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2019 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	32.656.000,00	32.106.000,00	11.998.396,02	% 37,4
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	247.420.000,00	257.486.624,69	71.683.887,57	% 27,8
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	67.778.000,00	68.796.582,08	23.853.695,31	% 34,7
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	167.602.000,00	302.314.942,10	69.551.499,50	% 23,0
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	420.846.000,00	2.055.380.000,00	1.811.968.525,51	% 88,2
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	24.949.000,00	24.649.000,00	10.293.034,54	% 41,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	44.632.000,00	45.432.000,00	9.242.480,67	% 20,3
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	33.198.000,00	34.450.695,88	14.452.632,81	% 42,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	55.215.000,00	62.842.525,75	13.791.420,27	% 21,9
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	8.987.000,00	8.997.000,00	2.595.975,66	% 28,9
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	81.772.000,00	516.822.000,00	398.756.878,66	% 77,2
Personel Genel Müdürlüğü	7.416.000,00	7.416.000,00	3.183.926,98	% 42,9
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	6.180.000,00	7.150.000,00	3.711.861,88	% 51,9
Özel Kalem Müdürlüğü	33.395.000,00	33.395.000,00	3.690.470,84	% 11,1
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	86.634.000,00	93.243.508,76	26.028.808,47	% 27,9
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	2.878.000,00	2.878.000,00	1.106.823,58	% 38,5
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	10.897.000,00	10.897.000,00	5.676.016,92	% 52,1
Strateji Geliştirme Başkanlığı	157.937.000,00	157.937.000,00	73.341.628,69	% 46,4
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.106.000,00	1.106.000,00	485.933,42	% 43,9
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	3.430.000,00	3.430.000,00	3.066.714,19	% 89,4
İl Müdürlükleri	1.078.358.000,00	1.664.125.248,08	963.977.697,18	% 57,9
TOPLAM	2.573.286.000,00	5.390.855.127,34	3.522.458.308,67	% 65,3



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

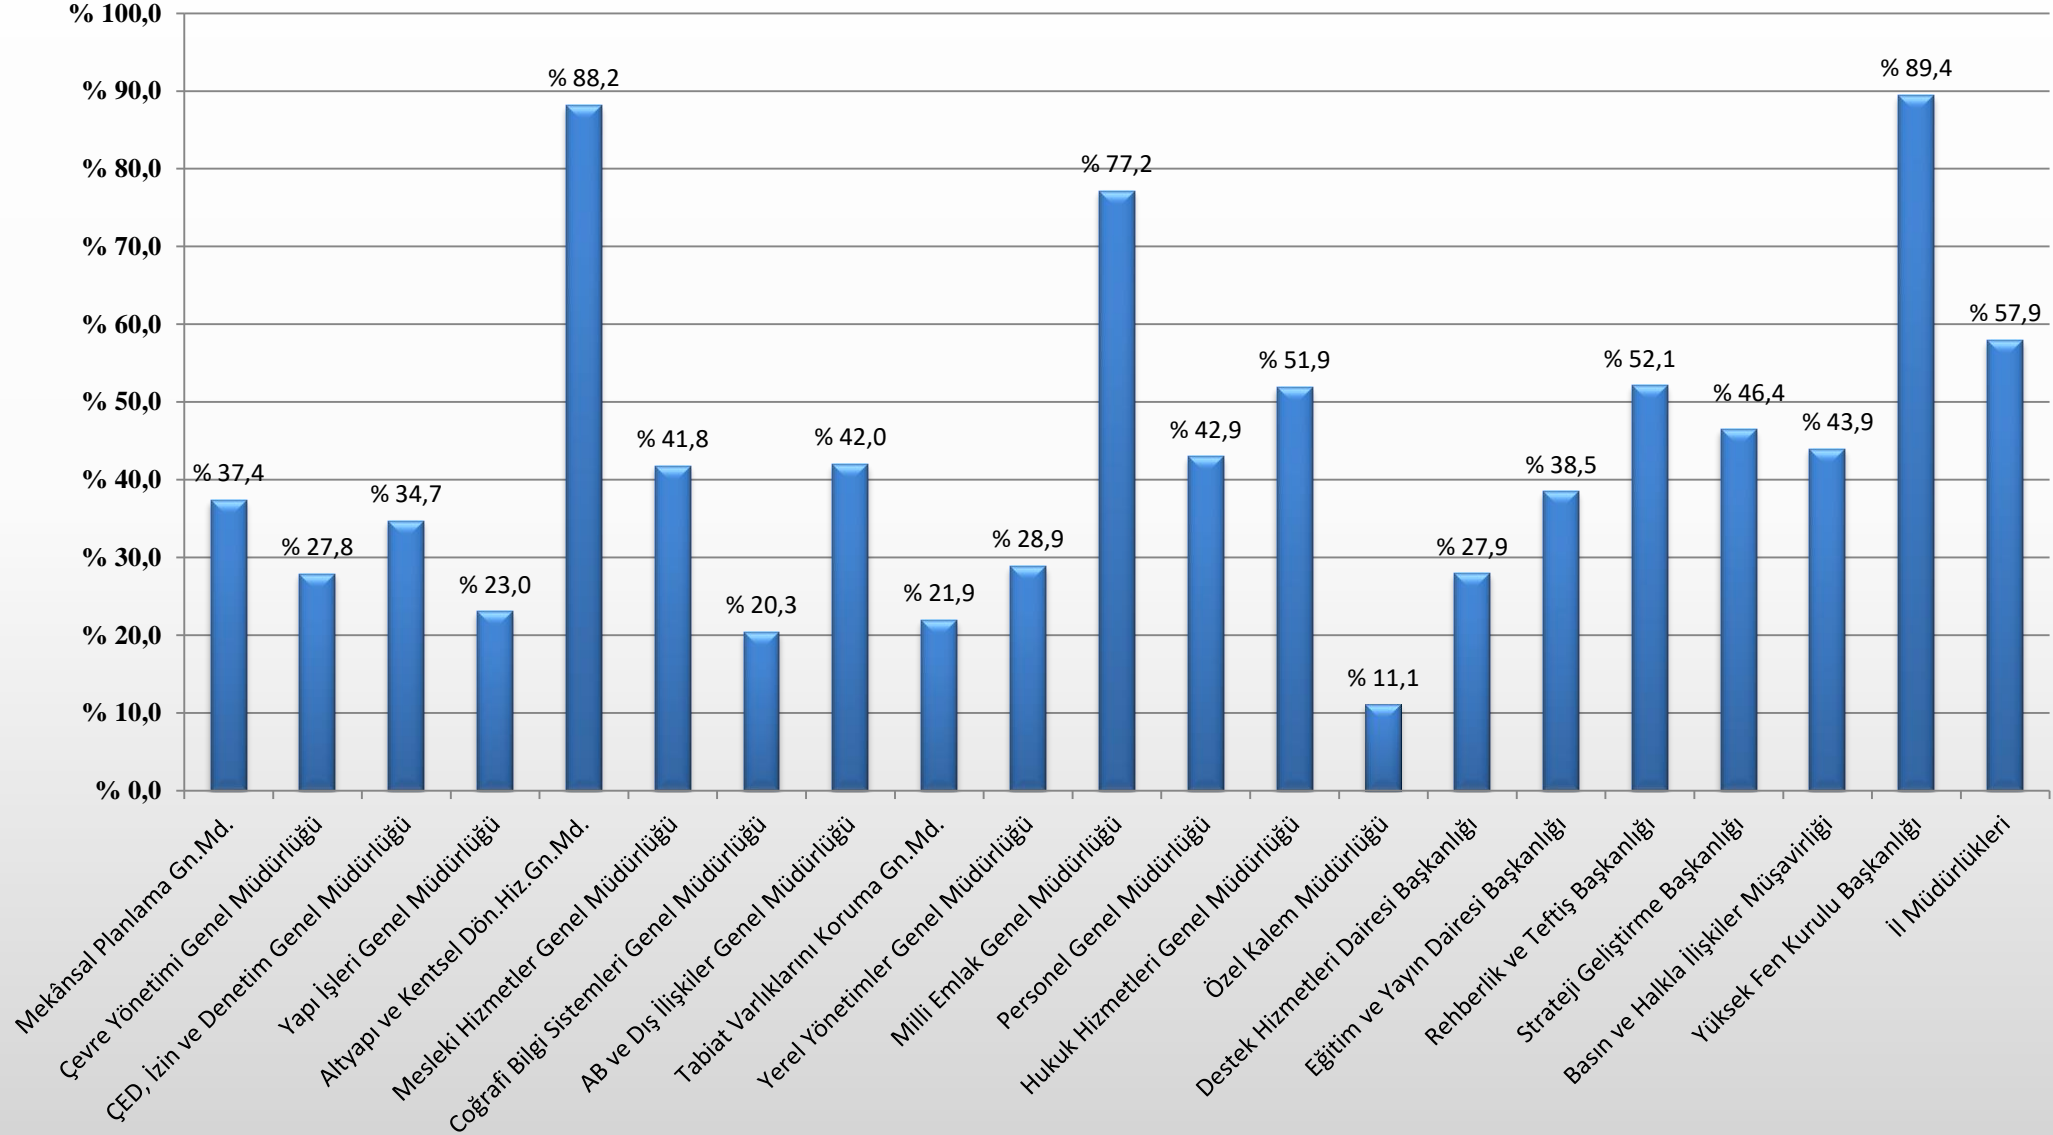

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2020	7.800	0	2.600	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2020	4.000	0	1.600	0	% 0,0	Teknik Şartnamesi Hazırlanıyor.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2020	3.800	0	1.000	0	% 0,0	17.07.2019 tarihinde ihalesi yapıldı
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2020	4.000	0	2.650	0	% 0,0	
2018K090220	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	1.500	0	1.000	0	% 0,0	5 tane ilde işe başlandı.Sözleşme Bedelleri Yozgat İli için 291.250, Denizli İli için 292.600, Samsun İli için 251.000,Düzce ili için 152.500, Mardin İli için 280.000'dir. Harcama Yapılmamıştır
	Samsun İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	İşe başlandı.
	Yozgat İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	İşe başlandı.
	Nevşehir İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	İşe başlandı.
	Mardin İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	İşe başlandı.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090600	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (DOKAP) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	1.000	0	500	0	% 0,0	İşe başlandı.
	Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	400	0	200	0	% 0,0	
	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	600	0	300	0	% 0,0	Teknik Şartnamesi Hazırlanıyor.
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	14.300	0	6.750	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K060290	Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri (Kanalizasyon Sektörü)	2018-2022	9.986	0	1.576	0	% 0,0	
	Muhtelif Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri	2018-2022	9.536	0	1.126	0	% 0,0	Söz konusu proje, şemsiye proje niteliğinde olup; bu kalem altında bir proje çalışması yürütülmektedir.
	Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması	2019-2019	450	0	450	0	% 0,0	Projeye ait Nihai Rapor 24.05.2019 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuştur. Proje kapsamında (Ergene ve Gediz havzaları hariç); -Türkiye’de oluşan arıtma çamuru miktarı ve karakterizasyonu ortaya çıkarıldı. -Türkiye’deki mevcut arıtma çamuru geri kazanım ve bertaraf yöntemleri tespit edildi. -Arıtma çamuru yönetiminde farkındalığı arttırmak, bölgesel sorunların belirlenerek çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla 7 bölgede çalıştay düzenlendi. -Tesis, il ve bölge bazında arıtma çamuru geri kazanım ve bertaraf senaryoları oluşturuldu. -Oluşturulan her bir senaryoya yönelik yatırım ve işletme maliyeti çıkarıldı. -Oluşturulan senaryolara göre ülkemiz için en uygun senaryo seçilerek Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetim Planı ve Eylem Planı oluşturuldu. -Nihai senaryoya göre Türkiye Arıtma Çamuru Finans Modeli oluşturuldu. -18 Mart Çan Termik Santralinde ve Alkim Kimya A.Ş.’ye ait Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisinde deneme yakmaları gerçekleştirildi. -Arıtma çamuru geri kazanım ve bertarafına yönelik el kitapları ve kamu spotu, eğitim videoları ve broşürler hazırlandı. 26 Temmuz 2019 tarihin Proje Kapanış Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2022	1.000	0	4	0	% 0,0	01.04.2019-30.06.2019 tarihleri arasında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	109.904	40.000	50.000	3.625	% 7,3	KAP projesi Bakanlığımız ilk 100 gün, ikinci 100 gün ve üçüncü 100 gün eylem planında yer almıştır. Üçüncü 100 gün eylem planı 30 haziran 2019 tarihinde tamamlanmış olup bu süreçte öngörülen işlerden olan aktarma istasyonu inşaatı yapım işi, entegre atık yönetimi tesisi danışmanlık işi, aktarma istasyonu uygulama projesi danışmanlık işi, düzenli depolama lotu uygulama projesi danışmanlık işi, düzenli depolama lotu yapım işi ve ön işlem tesisi danışmanlık işi ihale çalışmalarına başlanılmıştır.
2018K080010	İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2018-2020	1.000	0	500	0	% 0,0	01.04.2019-30.06.2019 tarihleri arasında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100290	Tersanelerin Deniz Etkilerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.487	697	790	0	% 0,0	Söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile yürütülmektedir. Projenin saha analiz çalışmaları yürütülmektedir. 2019 yılı proje ödemesi sadece yılın son çeyreğinde yapılacak olup, ikinci çeyrekte herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.480	2.520	2.000	0	% 0,0	Söz konusu proje Medipol Üniversitesi ile yürütülmektedir. Projenin ilk ara raporuna istinaden ödeme yapılmış olup, ikinci ve üçüncü ara raporlarda teknik şartnamede istenen kriterler sağlanamadığı için henüz ödemeler gerçekleştirilmemiştir. Proje kapsamında paydaş toplantıları devam etmektedir.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	2.000	328	0	% 0,0	Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Belirlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Uygulamanın Kolaylaştırılmasının Sağlanması Projesi 3 Şubat 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Dokuz Eylül Üniversitesi yürütücülüğünde başlamıştır. Demir çelik üretimi, demir dışı metal üretimi, tekstil, şeker üretimi, büyük yakma tesisleri, çimento üretimi, cam üretimi tesisleri, tuğla ve kiremit üretimi, beyaz eşya üretimi, seramik üretimi, gıda üretimi, petrokimya üretimi tesisleri yerinde ziyaret edilmiştir. Entegre Demir Çelik Üretimi, Demir Dışı Metal Üretimi, Şeker Üretimi, Tekstil Üretimi, Cam Üretimi, Tuğla ve Kiremit Üretimi, Boya Üretimi, Maya Üretimi, Bitkisel Yağ Üretimi ile ilgili kılavuzlar hazırlanmıştır. 2019 yılı Haziran ayında II. Sektörel Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 23.05.2019 tarihinde Proje IV. Ara raporu sunulmuş olup, onaylanmıştır. Proje kapsamında sektörel kontrol listeleri, uygulama kılavuzları ve mevzuat değişikliği çalışmalarına devam edilmektedir. 2019 yılı ikinci çeyreğinde ödeme yapılmamıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100020	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	8.000	1.200	1.104	0	% 0,0	
	Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespiti	2018-2019	500	200	300	0	% 0,0	Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespitine yönelik oluşturulan senaryoların hava kalitesi modelleme sürecinin devam etmesi ve yol haritasının detaylandırılması için teşvik mekanizmasının belirlenmesi sürecinin anılan çalışmaya bağlı olması sebebiyle proje 6 ay süreyle uzatılmıştır. Araçların Trafikten Çekilmesi için Yapılacaklara Yönelik Yol Haritası raporuna esas seçilen senaryolarda yapılacak olan hava kalitesi modelleme çalışması sonucuna göre Hacettepe Üniversitesi tarafından teşvik mekanizması önerilecektir. Ayrıca, sağlık etkilerine yönelik Eva modelinin girdisi de hazır hale gelecektir.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi	2018-2021	4.000	1.000	800	0	% 0,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmektedir. 27.06.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi kapsamında , başlangıç raporu ve 1. ve 2. gelişme raporu kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. Projede HEY-Hava Emisyon Yönetim Portalı yazılım bakım ve geliştirme işlemleri devam etmektedir. Hava Emisyon Konulu Çevre İzin sayılaşdırılması işlemleri proje destek elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup, 755 Ek-1 tesisine ait 11.139 bacaya ait veriler veri tabanına kaydedilmiştir. Konya, Samsun, İzmir, Adana, Erzurum ve İstanbul bölgesel hava kalitesi yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi modelleme eğitimleri başlamış olup, eğitimlerden Bakanlığımız ilgili personeli, Temiz Hava Merkezleri personeli, çeşitli üniversitelerden görevlendirilen akademisyenler yararlandırılmaktadır.
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi	2018-2021	2.000	0	2	0	% 0,0	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesinin protokol taslağı hazırlanmış olup Bakanlık Makamına onaya sunulmuştur. 2019 yılı tasarruf tedbirleri gereği projelerin 2020 yılı yatırım programı sürecinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2021	1.500	0	2	0	% 0,0	Koku Oluşturan Emisyonların Yönetimi Projesi protokol taslağı hazırlanmış olup Bakanlık Makamına onaya sunulmuştur. 2019 yılı tasarruf tedbirleri gereği projelerin 2020 yılı yatırım programı sürecinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100300	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.687	287	700	0	% 0,0	Söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında TÜBİTAK/MAM ile yürütülmektedir. Proje kapsamında 11-14 Haziran 2019 tarihlerinde, Ekosistem Temelli İzleme Programının geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile İzleme Programı Çalıştayı düzenlenmiştir. 2019 yılı proje ödemesi sadece yılın son çeyreğinde yapılacak olup, ikinci çeyrekte herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2018K100310	Deniz Çöplerinin Önlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	2.360	0	2	0	% 0,0	Proje kapsamında 2019 yılında 2.000 TL. iz bedel konusu olup , bu yıl içerisinde herhangi bir ihale çalışması yapılmayacaktır. Söz konusu çalışmalara 2020 yılında başlanması ön görülmektedir.
2018K100410	EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000	1.500	1.000	0	% 0,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Karabük Üniversitesi ile yürütülmektedir. 12.07.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. MET kontrol listelerinde verileri toplamak için oluşturulan yazılım ile firmalardan veri girişi sağlanmıştır. Her alt sektör için 5 adet MET Kontrol listesi hazırlanmıştır. MET Referans Dokümanları ve MET Sonuçlarının Türkçe çevirisi tamamlanarak web sitesinde yayımlanmıştır. Proje tanımı videosu, proje tanıtım broşürü hazırlanmış ve 2 Kasım 2018 tarihinde proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık ofisinde 2 adet proje asistanı çalışmaya başlanmıştır. 5 adet Proje Yönetim Planı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık personeline yönelik 1. Eğitim Programı ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 1. Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 1 adet yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Envanter güncelleme çalışmaları ile belirlenmiş tesislere saha ziyaretleri devam etmektedir. 2018 yılı içinde; Proje Yönetim Planı Raporu onaylanarak 885.000 TL (KDV Dahil) ilk ödeme ve Saha Ziyareti Planı Raporu onaylanarak 613.600 TL (KDV Dahil) ikinci ödeme gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ilk üç çeyreğinde ödeme bulunmamaktadır. Proje takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir.
2018K100670	Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000	0	300	0	% 0,0	
	Sulu Sistem Atık Depolama Alanı Bertarafı	2018-2020	2.000	0	200	0	% 0,0	12.06.2019 tarihli ve 57070256-730.06.02-E.131618 sayılı yazımız ile proje süresinin 2021 yılına uzatılması talep edilmiş olup, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 13.06.2019 tarihli ve 16517702-602.07.02-E.137015 sayılı yazısı ile proje süresinin Bakanlık Makamı Oluru ile 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtilmiştir.
	Termik Santral Taban Küllerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi	2018-2020	1.000	0	100	0	% 0,0	12.06.2019 tarihli ve 57070256-730.06.02-E.131618 sayılı yazımız ile proje süresinin 2021 yılına uzatılması talep edilmiş olup, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 13.06.2019 tarihli ve 16517702-602.07.02-E.137015 sayılı yazısı ile proje süresinin Bakanlık Makamı Oluru ile 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100390	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.451	1.365	550	0	% 0,0	Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CITYAIR) Projesi 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlamıştır. Açılış toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşlarının katılım sağladığı Yönlendirme Komitesi Toplantılarından ikisi gerçekleştirilmiştir. Aktivitelere göre hazırlanması beklenen raporların teslimi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyu farkındalığı çalışmaları çerçevesinde broşür ve görsel malzemeler hazırlanmıştır. Projenin 1. İlerleme Raporu hazırlanmaktadır.
AB katkısı			19.340	7.735	2.900	0	% 0,0	
2018K100400	KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2022	2.938	0	600	0	% 0,0	Proje henüz başlamamıştır.
AB katkısı			16.577	0	5.525	0	% 0,0	
2018K100610	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2022	10.721	0	1.500	1.203	% 80,2	IPA 2 Programına sunulan projenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması akabinde projenin uygulayıcı kuruluşu olan UNDP Türkiye tarafından hazırlanan teknik şartname, delegasyonun görüşleri doğrultusunda güncellenen şartname tekrar değerlendirilmek üzere delegasyona iletilmiştir.
AB katkısı			59.395	0	15.190	12.000	% 79,0	
2019K100030	REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2019-2021	1.588		650	0	% 0,0	Projenin ihale süreci devam etmektedir.
AB katkısı			8.842		3.900	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100040	Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)	2017-2020	9.078	4.820	3.300	1.408	% 42,7	
<i>AB katkısı</i>	(Çevre Sektörü)		78.194	42.560	25.806	11.500	% 44,6	
Ülke Katkısı	Düşük Karbonlu Kalkınma Strateji ve Eylem Geliştirilmesi	2018-2019	2.753	1.000	1.250	558	% 44,6	<p>Başlangıç Raporu ve 1. Ara Raporu onaylanan Projenin birinci bileşeni tamamlanmış olup, 808.055,00 Avro ödeme yapılmıştır. Projenin ikinci, üçüncü ve dördüncü bileşenleri ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Birinci bileşenle ilgili olarak; Durum Raporu, Talep Durum Raporu, Boşluk Analiz Raporu, Engeller ve Fırsatlar Raporu, Temel Rapor olmak üzere beş önemli çıktı Bakanlığımıza teslim edilmiş ve onaylanmıştır. İkinci bileşenle ilgili olarak DEA çalışmalarına temel oluşturacak olan toplantılar ve teknik ziyaretler gerçekleştirilerek ÖnDEA raporları Bakanlığımıza teslim edilmiş ve onaylanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • İklim Değişikliği ile ilgili temel düzeyde bir web tabanlı envanter oluşturulması (Ulusal İklim Bilgi Portalı – UİBP) faaliyetinin uygulanmasına yönelik çalışmalara projenin 1. yılında (Eylül 2017) başlanmıştır. Söz konusu portal ile ilgili olarak gerekli hazırlık çalışmaları yapılarak yayınlanma aşamasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. • AB Yakıt Kalitesi Direktifi (FQD) DEA Çalışması, Faaliyet AB Karbon Yakalama ve Depolama Direktifi (CCSD) DEA Çalışması, AB Emisyon Ticaret Sistemi Direktifi (ETS) DEA Çalışması ve AB Çaba Paylaşım Kararı (Tüzüğü) (ESD-ESR) DEA Çalışması ile ilgili danışma süreçleri ve kalan danışma toplantıları tamamlanma aşamasına gelmiştir. • Atık, bina, ulaştırma ve tarım sektörlerine yönelik olarak yürütülen Sektörel Etki Analizi (SEA) çalışması ile ilgili danışma süreçleri ve kalan danışma toplantıları tamamlanma aşamasına gelmiştir. • Bileşen 3 kapsamında yer alan raporlama faaliyetlerine başlanmıştır. • Bileşen 4 kapsamında atık, bina, ulaştırma ve tarım sektörlerine yönelik olarak ilgili paydaşların katılımıyla eğitimler düzenlenmiştir. • Finlandiya ve İsveç’e çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaret kapsamında; düşük karbonlu kalkınma çalışmalarına yönelik olarak ilgili kamu kurumları, yerel yönetim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir. • Projenin İkinci Ara Raporu incelenmek üzere Bakanlığımıza sunulmuştur. • Yılın ilk altı aylık döneminde Proje kapsamında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
<i>AB katkısı</i>			22.613	8.450	8.450	3.900	% 46,2	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülke Katkısı	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	1.345	390	500	200	% 40,0	Soğutma Sektörü eğitici eğitimleri: 21-22-23-24 Ocak 2019'da İstanbul'da, 7-8 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirildi. A.3.1 taslak Raporu sunuldu. A.4 F-Gaz alternatiflerine ilişkin halkın farkındalığının artırılması çalışmaları hazırlığa başlandı ve A.4.1 raporu sunuldu. Web sayfası geliştirilerek web sayfası menüsü ve içerik yenilendi.27-28 Şubat 2019 tarihlerinde A.4. ve A.6. faaliyetlerine ilişkin toplantılar yapılmıştır. A.7. faaliyeti altında atık geri kazanım/betaraf tesisleri ziyaret edildi. 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul İlinde Soğutma-İklimlendirme-Isı Pompaları Sektörü için Sektörel Bilimlendirme Çalıştayı gerçekleştirildi. 02 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da "Türkiye'de Yalıtım Köpüğü/Solvent ve Yangından Korunma Sektöründe F-gaz Alternatiflerinin Kullanımı Çalıştayı yapıldı. 3 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da "Türkiye'de Elektrikli Şalt Sektöründe F-gaz Alternatiflerinin Kullanımı Çalıştayı yapıldı.18-21 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da Çevre Denetçileri Eğitimi gerçekleştirildi.
AB katkısı			11.701	3.471	4.115	1.700	% 41,3	
Ülke Katkısı	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	1.350	850	500	200	% 40,0	"Sözleşme numarası TR2013/0327.05.01-03/001 olan söz konusu "LULUCF Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme" projesinin bütçesi, IPA katkısı 1,8 Milyon Avro, ulusal katkı 0,2 Milyon Avro olmak üzere toplam 2 Milyon Avro'dur. Proje 16/08/2017 tarihinde gerçekleştirilen kick-off toplantısı ile başlamış olup, 23 aylık uygulama süresinin sonunda 2 Temmuz 2019 tarihinde kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje süresince Bakanlığımızla birlikte çekirdek grup, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 7 Yönlendirme komite toplantısı, yabancı ve ülkemiz uzmanlarının katılımı ile 10 eğitim çalıştayı, 8 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir. 1 eğitim çalıştayı arazi kullanımı ve ormancılık uygulamaları gerçekleştirmek amacı ile şehir dışında arazi çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Yabancı paydaşlarımızla bilgi paylaşımı amacıyla 2 yurtdışı eğitim ziyareti düzenlenmiştir. Ayrıca, AKAKDO konusunda görev yapan personelin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak; uluslararası platformdaki gelişmelerinin takip edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS - UNFCCC) toplantıları ile İtalya'da yer alan Avrupa Komisyonu Birleşik Araştırma Merkezi'nde (Joint Research Centre -JRC) düzenlenen teknik çalıştaylara Bakanlığımız ve paydaş kurumlarımızdan uzmanlar gönderilmiştir. 2017 yılı envanter sonuçlarına göre AKAKDO sektöründe hesaplanan yıllık karbon tutma değeri 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeridir. Projenin global price türünde olan sözleşmesinin değeri 1.998.551,00 Euro'dur. Bu değer %90'ı AB katkısıyla, %10'u ulusal bütçemizden karşılanacaktır. Global Price sözleşme türü kurallarına göre, bu sözleşmenin, ulusal bütçeden ödenen kısım olarak, 79.942,04 Euro'luk kısmı (proje başlangıcında ön ödeme) 2017 yılının Ağustos ayında Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir. "
AB katkısı			11.700	7.592	4.108	1.700	% 41,4	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	1.350	850	500	200	% 40,0	Proje kapsamında Antalya'da yerel iklim eylemi konulu uluslararası bir konferans gerçekleştirilmiştir. Kamu spotu hazırlanmıştır. Hazırlanan eğitim modülleri kapsamında 20 ilde gerçekleştirilecek iklim değişikliği eğitimlerinin 5'ü (Sinop,Samsun,Artvin,Hatay,Sivas) tamamlanmıştır. Ayrıca 3 üniversitede (ODTÜ, EGE ve Marmara Üniversiteleri eğitim seminerleri gerçekleştirildi. 13 adet eğitim modülünün 6 tanesi basıldı. Proje kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandırıldı. Seçilen fotoğraflar ilk olarak İzmir Havalimanında sergilendi. 7 farklı sergi alanında daha sergilecek.
AB katkısı			11.700	7.592	4.108	1.800	% 43,8	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	2.280	1.730	550	250	% 45,5	Hibe programı kapsamında 37 adet hibe projesi yürütülmektedir. 2018 yılında 18 adet hibe projesi tamamlanmıştır, 2019 yılında 4 adet, 2020 yılı başında ise 15 adet hibe projesi tamamlanmış olacaktır.
AB katkısı			20.480	15.455	5.025	2.400	% 47,8	
17 Proje		06 ve 07 TOPLAM	177.480	54.389	64.904	6.236	% 9,6	
AB KATKISI			182.348	50.295	53.321	23.500	% 44,1	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2020	122.598	80.347	18.147		% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği		62.598	34.498	11.000	655	% 6,0	<p>*Projenin Lab. Ölç.ve İz. Da. Bşk. tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; Diyarbakır Temiz Hava Merkezi Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Bakım, Onarım ve Kalibrasyon işi için 1.hakediş ödemesi Haziran ayında; 2. hakediş ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir.</p> <p>*Projenin Akdeniz THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 2019 Yılı HKİİ Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Hizmet Alımı İşi 11.06.2019 tarihinde ihale edilmiş ve 25.06.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak 01.07.2019 tarihi itibarıyla işe başlanmış ve henüz bir hakediş ödemesi yapılmamıştır. İstasyon başına KDV hariç 2.400,00 TL aylık bedelle 11 istasyon ve 8 aylık dönem için ihale edilmiştir. İhalenin toplam bedeli 211.200,00 TL olup KDV hariçtir.</p> <p>*Projenin Güney İç Anadolu THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; (27.01.32.00-05.3.0.04-1-06.1.2.04**500) ayrılan 500.000 TL'lik miktar için saha örnekleme cihazları alınacak olup yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları devam etmektedir.</p> <p>*Projenin Marmara THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 2019 yılı ilk 6 ay (01.01.2019 - 30.06.2019) arası bakım-onarım projesine ödemiş olduğu tutar : 484.272 ,00 TL'dir.</p> <p>*Projenin Doğu Anadolu THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; bakım-onarım projesi 01 Haziran 2019 ayında işe başlanmıştır.</p> <p>*Projenin Ege THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; 11 aylık ihale yapılmış olup, işe 22/5/2019 tarihinde başlanmıştır. Bu kapsamda 1.hakediş ödemesi Haziran ayında; 2. hakediş ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir.</p> <p>*Projenin Kuzey İç Anadolu THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan 2014K100040 nolu "Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Kurulması ve Bakım, Onarım Projesi" kapsamında 2019 yılı için talep etmiş olduğu bakım-onarım projesine aktarılan tutar : 101.000 ,00 TL'dir.</p> <p>*Projenin Orta Karadeniz THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili; Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Bakım ve Arıza Onarım İşine ait Ödenek Tutarı: 1.110,439 TL (KDV Dahil). 2019 yılı sonuna kadar kullanılacak ödenek tutarı: 807,592 TL (KDV Dahil). 2020 yılına kalan ödenek tutarı: 302,847 TL (KDV Dahil). Ayrıca, Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarına cihaz, yedek parça ve sarf malzeme alımı: Ödenek Tutarı: 1.587,35 (KDV Hariç). Ödeneği 01/07/2019 tarihinde Müdürlüğümüze gönderilmiş olup ihale sürecine başlanmıştır.</p> <p>Diğer taraftan, gelen talep yazıları çerçevesinde; Hava Kirliliğinin İzlenmesi amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının taşıma gideri, enerji ihtiyacının temini, elektrik bağlantıları vb. iş ve işlemlere için İl Müdürlükleri tarafından ihtiyaç duyulan ödenekler aktarma yoluyla gerçekleştirilmiştir.</p>
	Döner Sermaye Ödeneği		60.000	45.849	7.147	0	% 0,0	Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yılı bütçe ödeneği 7.147.000 TL. (KDV Dahil) ile ilgili Yetki Devri Akdeniz THM Müdürlüğüne gönderilmiş olup Adana merkeze bağlı illerde kurulacak olan 15 adet yeni ve yenilenecek olan mevcuttaki bazı HKİİ için 08.08.2019 tarihinde ihale yapılacaktır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100470	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000	0	300	0	% 0,0	Proje ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Teknokent Tekn.Trans.Arge Danş.Enerji Sağlık Çevre İletişim San.Tic.A.Ş. 03.07.2019 tarihinde Protokol imzalanmıştır.
2018K100620	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyonu, Entegrasyonu ve Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.400	0	440	0	% 0,0	Proje ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ile 27.06.2019 tarihinde Protokol imzalanmış olup iş başlatılmıştır.
2017K100120	E-PRTR Kapasite Geliştirme (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.742	912	830	797	% 96,0	Projeyle ait tüm faaliyetler tamamlanmıştır. Proje Başlangıç- Bitiş tarihleri:25 Mayıs 2017 – 25 Mayıs 2019 / 2 yıl Toplam proje bütçesi:2.410.000 € (AB Katkısı: 2.149.000 € - Ulusal Katkı: 261.000 €)'dir. Projeyle 2017 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 1.195.000 TL proje tutarı ve 641.000 TL 2017 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede % 100 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 9.822.000 TL, 2017 yılı ödeneği 5.924.000 TL olup proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100,00 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.
AB KATKISI			13.969	8.427	5.542	5.350	% 96,5	Projeyle 2018 yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe yer verilmemiştir. Proje tutarının kalan kısmı 2019 yılı için "AB Katkısı (Euro)":852.678, Genel Bütçe Ödeneğinden 120.600 Euro karşılığı (1€=6.6054 TL.üzerinden) 796.611,24 TL. ulusal katkı ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2019K100010	SÇD Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	306		130	112	% 86,2	IPA II. Dönemi kapsamında yer alan SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" 18 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler: Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Desteklenmesi Projesi Başlangıç Toplantısı 24.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. - SÇD Pilot Sektörlerinin seçilmesi için çalışmalar devam etmektedir. - Proje Başlangıç Raporu 10.06.2019 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup değerlendirme süreci devam etmektedir. - 18.06.2019 tarihinde Projenin Açılış Toplantısı Ankara'da 120 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. - "Genel Bütçe Ödeneğinden 17.940,00 Euro karşılığı (1€=6.2354 TL. üzerinden) 111.863,08 TL ulusal katkı ödemesi gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			1.658		663	580	% 87,5	
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	72.046	35.410	12.700	1.564	% 12,3	
DÖNER SERMAYE			60.000	45.849	7.147	0	% 0,0	
GENEL TOPLAM			132.046	81.259	19.847	1.564	% 7,9	
AB KATKISI			15.627	8.427	6.205	5.930	% 95,6	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	16.500	8.500	2.000	0	% 0,0	İlk ihale olan Bakanlık Hizmet Binası işine ilişkin kesin hesap işlemleri tamamlanmıştır. İkinci ihale olan CBS Veri Merkezi ve İlave İşler İnşaatı işinin kesin kabulü yapılmış ve 10.07.2017 tarihinde onaylanmış olup işe ait kesin hesap çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2018E050290	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2023	750.000	100.000	7.800	0	% 0,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğüne söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL Genel Müdürlüğümüzce Karayolları Genel Müdürlüğüne ilgili hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmalarının kapsamının belirlenmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli ön proje doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlandığı bilinmektedir. İhale süreçleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
2019D000290	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (Enerji Sektörü)	2019-2024	1.120.000	0	27.000	0	% 0,0	
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		1.092.000		22.000	0	% 0,0	Doküman hazırlığı aşamasındadır, 50 adet binanın enerji etüdü Dünya Bankasının finanse ettiği ve görevlendirdiği bir firma tarafından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü kordinesi ile yürütülmektedir.
	Hibe Ödeneği		28.000		5.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)					154		
	Çevrimiçi Proje Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması (CADD Uyumlu) ve Yaygınlaştırılması	2019-2019	1.150		1.150	140	% 12,2	2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 3 adet proje tamamlanarak arşive aktarılmıştır.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2019-2019	760		760	13	% 1,7	Yeni Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılım uygulaması değişen mevzuat kapsamında dağıtım modülünü de içerecek şekilde revize edilerek 2019 yılı itibarıyla 81 ilde devreye alınmıştır. Ayrıca, mülga Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile imzalanan protokol kapsamında geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi de 81 ilde uygulamaya alınmıştır.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2019-2019	500		500	1	% 0,2	Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki yazılımların bakım onarım ve iyileştirme işlemlerinde ve donanım ihtiyaçlarının sağlanmasında proje ödeneği kullanılmaktadır. Bu kapsamda Yatırım Takip Sistemi Yazılımı Bakım, Onarım, İyileştirme ve ek Modül İşine ait ihale işi 18.06.2019 tarihinde yapılmış olup bu işin 04.07.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070120	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	5.700	300	1.100	0	% 0,0	
	Muhtelif İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri	2018-2022	5.100	300	500	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir.Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması	2019-2019	600		600	0	% 0,0	2019 yılı Haziran sonu itibarıyla Hatay İlinde kırsal konut proje temini çalışmaları tamamlanmış ve kırsal konut projesi yapılan il sayısı 54 adet olmuş olup şuan itibarıyla Ülkemiz genelinde üretilen kırsal konut projeleri sayısı 315 adet olarak gerçekleştirilmiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2020	30.850	11.966	6	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2020	9.379	3.513	2	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlanmıştır. Projeye ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanununa 25.05.2018 tarihinde geçici madde eklenmiş olup yıkıp yeniden yapılacak 250 adet konut belirlenmiştir. Kanun gereği 250 aileye başvuru için 6 ay süre verilmiş olup müracaatlar beklenmektedir. Müracaat süresi 03.02.2019 tarihinde sona erecek olup başvuru sayısına göre ihalenin yapılması gerekeceğinden ödenek bu tarihten sonra talep edilecektir.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2020	11.970	3.389	2	0	% 0,0	131 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkemeden Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2020	9.501	5.064	2	0	% 0,0	152 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkemeden Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2022	33.600	5.000	13.004	0	% 0,0	17.05.2019 tarihi itibarıyla 2019 Yılı revize ödeneği 13 milyon 4 bin TL'ye çıkarılmıştır.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	4.277	1.826	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	221.885	57.304	57.845	23.908	% 41,3	
	Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2020	26.100	3.500	16.000	3.001	% 18,8	17.05.2019 tarihi itibariyle 2019 Yılı revize ödeneği 16 milyon TL'ye çıkarılmıştır.
	Muhtelif İskan İşleri	2011-2022	195.785	53.804	41.845	20.907	% 50,0	İşlerin yapım çalışmaları devam etmektedir. (Samsun-Vezirköprü-Susuz köyü tamamlanmış olup konut kuraları çekilmiştir. Erzincan İli Uluköy-Kayı-Kalecik köyleri yapım işleri ise devam etmektedir). 11 milyon 493 bin ek ödenek gerekmektedir.
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2022	220.414	167.660	4	0	% 0,0	
	Anamur-Alaköprü Barajı İskanı	2013-2022	211.477	158.725	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmediğinden iş devam edememektedir. 70 milyon 840 bin ek ödenek gerekmektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2019	8.937	8.935	2	0	% 0,0	İş Bitti.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2022	3.620	1.400	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	135.206	40.000	10.000	10.000	% 100,0	Ödeneğini harcadığından iş devam edememektedir. 82 milyon 768 bin ek ödenek gerekmektedir.
2018K070020	Bozkır Barajı İskanı (KOP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	170.164	0	83.000	0	% 0,0	31.12.2018 tarihinde işin ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır. 17.05.2019 tarihi itibarıyla 2019 Yılı revize ödeneği 83 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Hakediş aşamasındadır.
2018K070030	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (KOP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	37.619	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K070130	İlısu Barajı İskanı (GAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	76.287	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K070140	Yusufeli Barajı İskanı (DOKAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	115.488	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	5.950	2.800	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2016K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	268.800	53.849	14.690	1.617	% 11,0	İşler devam etmektedir. Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak illerinden yaklaşık 93 adet köyde yaklaşık 2.140 ailenin konut yapımı işidir. 6.467.496 TL ödenek illere gönderilmiş olup bu ödenğin 565.950 TL'si harcanmıştır. Öncelik, yarım kalan işlerin tamamlanmasına yöneliktir. Tüm işlerin tamamlanması için 56 milyon 960 bin ek ödenek gerekmektedir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2021	33.681		11.227	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
17 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.927.520	385.456	202.179	34.062	% 16,8	
		08 TOPLAM	274.750	56.649	14.692	1.617	% 11,0	
		DÖNER SERMAYE	16.500	8.500	2.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	3.218.770	450.605	218.871	35.679	% 16,3	
		Kamu laştırma	33.681	0	11.227	0	% 0,0	

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2020	6.500	3.750	550	0	% 0,0	07/03/2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden "Kamu İhale Kanunu'nun 3(f) Maddesi Kapsamında Araştırma Geliştirme Protokolü" imzalanmış olup, söz konusu protokol kapsamında tamamlanmamış bileşenler ve eksiklikler, daha evvel bitirilen iş kalemleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 2019 yılında projeye yapılacak harcamaya ilişkin ayrıca değerlendirme yapılacaktır.
2018K090320	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	2.200	0	1.000	0	% 0,0	Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla, kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup, bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek olan "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik Stratejilerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2019-2021	12.000		4.000	0	% 0,0	6306 sayılı kanun kapsamında Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına ilişkin projede çalışmalar devam etmektedir.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	8.700	3.750	1.550	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	12.000	0	4.000	0	% 0,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D000070	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2022	3.950	125	683	4	% 0,6	*Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-TR) Uygulaması 2. Versiyon Bakım, Destek ve İyileştirme İşi Hizmet Alımına ait 219.000 TL bedelli, 365 gün süreli sözleşme 25/06/2019 tarihinde imzalanmıştır. Yükleniciye ödemeler 6 şar aylık dönemler halinde iki seferde yapılacaktır. *Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı İşinin ihale ilanı yayımlanmış olup, 17/07/2019 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Sözleşme süresi 240 gün olarak belirlenen işte, oluşacak ihale bedelinin tasarım raporu onaylandıktan sonra %15'inin, işin tamamlanmasından sonra kalan %85'inin ödenmesi planlanmaktadır.
2019G000370	Konut Araştırması (Konut Sektörü)	2019-2020	1.000		300	0	% 0,0	Üniversitelerle işbirliği yapılarak hazırlanması düşünülen rapor için hazırlık çalışmalarını devam ettirmektedir.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	2.458	1.758	700	0	% 0,0	Başkanlığımızın diğer faaliyetleri sürdürülmüş olup Ocak-Haziran döneminde proje kapsamında gerçekleştirilen bir faaliyet bulunmamaktadır.
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2019-2019						
	YAMBİS ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncelleme	2019-2019	300		300	31	% 10,3	19.03.2019 tarih ve 63900 sayılı olur ile; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne 300.000,00 ödenek aktarıldı. Kalan ödenekten İlan giderleri olarak 13.915,00 TL harcandı. 17.04.2019 tarih ve 91644 sayılı olura istinaden yapılan İlbanka yapılan eğitime 17.000,00 TL harcandı. Toplam harcama 30.915,00TL
2019K010820	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2019-2019	500		500	28	% 5,6	İhale ilan bedeli ve TSE Deney Hizmeti Ücreti ödemesi yapılmıştır.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	8.208	1.883	2.483	63	% 2,5	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2019-2019						
	YAMBİS ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncelleme	2019-2019	300		300	0	% 0,0	İhale yapılmış ve YAMBİS ve MYS Uygulamaları Bakım Onarım Sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilecektir. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
	Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sistemlerine Entegrasyonu	2019-2019	1.120		1.120	0	% 0,0	3 adet ihale yapılmış olup; "Milli Emlak İlan" ve Kurum Tahsis" İnternet sitelerinin yeniden yazılması hizmeti alımı sözleşmesi ile Oracle Weblogic Uygulama Sunucuları idame bakım hizmeti alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Sybase Veritabanı ve SAP İş Zekası lisans alımında ise kabul işlemleri beklenilmektedir.
	Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme	2019-2019	1.960		1.960	0	% 0,0	İhale yapılmış ve Milli Emlak Otomasyon projesi (MEOP) kapsamında yazılım geliştirme hizmeti alımı sözleşmesi imzalanmıştır.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	3.500	500	0	% 0,0	2019-2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Tüm proje paydaşlarından resmi yazı ile görüş alınmış ve bu doğrultuda çalışmalar devam etmektedir.
2017K090360	Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000	21.600	8.400	2.482	% 29,5	
	Bilgi Sistemleri Güvenlik Yazılımı Temini	2017-2019	8.600	6.000	2.600	258	% 9,9	1) İhale Yapılmış ve Nesus Zafiyet tarama Programı Lisansı alımı ile ilgili olarak sözleşme imzalanmıştır. 2) Java Kodlu Yazılım Lisansı Temini işi gerçekleştirilmiştir.
	Bilgi Sistemleri Sistem Yazılımı Temini	2017-2019	19.000	14.000	5.000	1.513	% 30,3	1) 12 Adet Dizüstü Bilgisayar temini işi, Tablet özellikli laptop temini işi ve Aktif Dizin Yükseltme Destek Hizm. İşi gerçekleştirilmiştir. 2) 2) Veri Tabanı Sunucusu Alımı (4 adet) gerçekleştirilmiştir.
	Bilgi Sistemleri Uygulama Yazılımı Temini	2017-2019	2.400	1.600	800	711	% 88,9	1) 2019 yılı Belgenet bakım ve güncelleme işi ve Web sitesi garanti bakımı işi kapsamında sözleşme imzalanmış olup hakedişler beklenmektedir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090630	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	24.000	13.000	11.000	0	% 0,0	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2019	7.500	4.000	3.500	0	% 0,0	2019 yılı itibarıyla 8 adet veri temasına ait standart geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
	Coğrafi Bilgi Platformunun Kurulumu	2018-2019	6.000	3.000	3.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
	Coğrafi Veri Uyumlaştırma Projesi	2018-2019	6.500	3.500	3.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 12 ilin kent atlası tamamlanmıştır. Yaklaşık 7.000.000 adet binanın 3 boyutlu verisi üretilmiştir.
	TUCBS Entegrasyonu Projesi	2018-2019	4.000	2.500	1.500	0	% 0,0	2019 yılı itibarıyla 32 adet kamu kurum ve kuruluşu ile 30 Büyükşehir Belediyesi ile ilgili entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2020	13.310	2.000	1.000	0	% 0,0	Projeye 2019 Yılı Yatırım programının Şehirleşme Sektöründe 13.310.000 TL toplam proje tutarı olmak üzere 1.000.000 TL 2019 yılı ödeneği ile yer verilmiş olup harcama yapılmamıştır. Kent Bilgi Sistemi Altyapısının yaygınlaştırma faaliyetlerine başlanmıştır. İçişleri Bakanlığı e-Belediye Projesi ile entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir.
2018K090040	İmar Planları İzleme ve Denetim Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	3.000		1.500	0	% 0,0	İmar planları İzleme ve Denetim Modeli Projesi kapsamında satınalma süreçleri başlatılmış olup, ihaleye çıkılacaktır.
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	77.690	40.100	25.780	2.482	% 9,6	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100500	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	20.475	1.441	2.200	745	% 33,9	
AB KATKISI			116.025	8.169	11.106	6.632	% 59,7	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.475	1.441	2.200	745	% 33,9	
		AB KATKISI	116.025	8.169	11.106	6.632	% 59,7	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000630	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2018-2021	1.412	455	319	0	% 0,0	*İhlara Vadisi Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzenleme Projesi sözleşmesi imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 103.604,00 TL(KDV dahil) olup, işin süresi henüz tamamlanmamıştır. *Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova ve Patara ÖÇKB Bisiklet Yolları Uygulama Projesi işi tamamlanmış, işin kontrol süreci devam etmektedir. Sözleşme bedeli 100.300,00 TL (KDV dahil) olup henüz ödeme yapılmamıştır.
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP) (Turizm Sektörü)	2017-2019	18.620	8.900	9.720	1.254	% 12,9	
	Genel Bütçe Ödeneği		10.950	8.900	2.050	1.254		Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yıllara sari olarak yürütülen projede 2017 yılında 2.900.000,00TL, 2018 yılında 5.942.526,06 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiş olup imalat yapım çalışmaları devam etmektedir.2019 yılı ödeneğinden ise 1.254.236,02 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği		7.670	0	7.670	0		İmalat çalışmaları devam etmektedir.
2018F000200	Gökçeada Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	2.500	0	2.500	0	% 0,0	Gökçeada (Çanakkale) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
2018F000240	Tortum Gölü Yarım Ada Çevre Düzenlemesi (DAP) (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.500	4.500	5.000	0	% 0,0	Uzundere (Erzurum) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 1.953.593,25 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Revize proje çalışmaları devam etmektedir.
2018F000740	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	8.500	3.000	5.500	0	% 0,0	2018 yılı içerisinde, Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçesinden Mülga Kalkınma Bakanlığı onayı ile 3.000.000 TL ödenek FRİGKÜM (Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği)'ne aktarılmıştır. 2019 yılı için 5.500.000 TL ödenek yatırım programında resmi olarak yayınlanmıştır. 2018 yılı bütçesi ile ihalesi yapılan iş 15.07.2019 tarihinde teslim edilecektir. Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi için Genel Müdürlüğümüz ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği arasında 2019 yılı için mali katkı protokolü imzalama çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K050050	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2021	16.514	3.800	3.815	383	% 10,0	
	Saros ÖÇKB Köyleri İçmesuyu Temini	2019-2019	1.500		1.500	0	% 0,0	Gelibolu Kaymakamlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup Gelibolu Kaymakamlığı ile yüklenici arasında proje için sözleşme imzalanma aşamasındadır.
	Habilli Mahallesi İçmesuyu Temini	2019-2019	1.250		1.250	0	% 0,0	Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup SASKİ tarafından yürütülen projenin ihale süreci devam etmektedir.
	Çamlıhemşin İçmesuyu Temini	2019-2019	385		385	383	% 99,5	Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı ek protokolü imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2021	13.379	3.800	680	0	% 0,0	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini Projelerinde kullanılacaktır.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	71.237	61.386	9.851	4.708	% 47,8	2019 yılı ödeneği olan 9.851.000 TL nin 4.707.314,19 TL'lik kısmının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme gereğince yüklenici firmaya ödenmesi için aktarılmıştır. Kalan kısmı gölde rihtımda atıl halde bekleyen vasıtaların geri mobilizasyonunda kullanılacaktır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (KOP) (Çevre Sektörü)	2011-2019	2.532	2.101	431	54	% 12,5	
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	899	829	70	0	% 0,0	Yüklenici firmaya ilgili şube tarafından sözleşmeye davet yazısı yazıldı. İşe başlanması bekleniyor.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	546	476	70	0	% 0,0	Yüklenici firmaya ilgili şube tarafından sözleşmeye davet yazısı yazıldı. İşe başlanması bekleniyor.
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	547	477	70	0	% 0,0	Yüklenici firmaya ilgili şube tarafından sözleşmeye davet yazısı yazıldı. İşe başlanması bekleniyor.
	Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme	2016-2019	177	137	40	0	% 0,0	proje kapsamında ön rapor sunuldu, 1. hakediş için hazırlıklar yapılıyor.
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2016-2019	147	107	40	0	% 0,0	Yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. İş yeri teslimi yapıldı.
	Pamukkale ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2017-2019	216	75	141	54	% 38,3	

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	825	209	616	0	% 0,0	Değerlendirme dosyaları ilgili şirket tarafından teslim edilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından teslim edilen dosyalar inceleme aşamasındadır. Yatırım Programının Çevre Sektöründe 694.000,00 TL+KDV bedel ile ihale edilmiştir 2018 yılı içerisinde % 30u ödenmiş olup, % 70 lik kısım 2019 yılı içerisinde ödenecektir.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (KOP) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.335	797	538	0	% 0,0	
	Belek ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	270	135	135	0	% 0,0	Projeler devam etmektedir.
	Kaş-Kekova ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	285	156	129	0	% 0,0	Projeler devam etmektedir.
	Patara ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	450	325	125	0	% 0,0	Projeler devam etmektedir.
	Tuz Gölü ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	330	181	149	0	% 0,0	Proje tamamlanmıştır.
2019K100040	Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi (DOKAP) (Çevre Sektörü)	2019-2020	500		100	0	% 0,0	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090270	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	12.400		3.594	0	% 0,0	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2021	3.300		994	0	% 0,0	1-Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi onay sürecinde olup işlemleri devam etmektedir. 2-Muğla İli Ula İlçesi, Akyaka 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi sözleşme yapılmak üzere yönetim hizmetleri daire başkanlığına gönderilmiştir. 3-Kırşehir ili, Seyfe gölü 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi sözleşme yapılmak üzere yönetim hizmetleri daire başkanlığına gönderilmiştir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2021	6.700		2.000	0	% 0,0	1-Fethiye Göcek ÖÇKB Fethiye Kentsel Rehberinin Hazırlanması projesi hazırlık aşamasında. 2-Köyceğiz Dalyan ÖÇKB Dalyan Tasarım Rehberinin Hazırlanması çalışmalarına başlanacak. 3-İzmir Balçova İnciraltı Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı kurum görüşlerine çıktı. 4-Aksaray 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Yaklaşık Maliyet Aşamasında. 5-Aksaray 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına esas jeolojik etüt Yaklaşık Maliyet Aşamasında. 6-İhlara ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Halihazır Haritalar temin ediliyor. 7-Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl Mahallesi İmar Planına Esas Jeolojik etüt 2006 yılında yapılmış mevcut Etüt için Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda kullanılacağı için etüt iptal oldu. 8-Kaş-Kekova ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kurum görüşlerine çıkılacak. 9-Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Tasarım Rehberinin Hazırlanması Kurum Görüşlerine çıktı. 10-Köyceğiz Dalyan ÖÇKB Köyceğiz İlçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu protokol imzalandı 11-Belek ÖÇKB Antalya İli Manavgat İlçesi Yavrudoğan, Büklüce, Denizyaka, Denizkent, Parekende, Kısalar Mahalleleri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Belediyeden Tarım görüşü bilgisi bekleniyor. 12- Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı protokolü 28.05.2019 tarih ve 125451 sayılı Dağıtım yazısı ile başladı. 13-Rize Çamlıhemşin İmar Planına Esas Jeolojik etüt 14 No'lu projeden 10.000,00 TL ödenek aktarılacak 14-Fethiye Göcek ÖÇKB İnlince Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmaları başlatılmadı.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması	2019-2021	2.400		600	0	% 0,0	Konya İli, Cihanbeyli İlçesi Karatepe, Gölyazı, Günyüzü Mahallelerinde İmar uygulaması işine ilişkin Belediyesi ile protokol imzalanmış olup, Belediyesince ihaleleri yapılarak sözleşmeleri gönderilmiştir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2019-2021	3.000		1.000	0	% 0,0	
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	138.205	85.148	34.314	6.399	% 18,6	
	DÖNER SERMAYE		7.670	0	7.670	0	% 0,0	
	GENEL TOPLAM		145.875	85.148	41.984	6.399	% 15,2	
	Kamu laştırma		3.000	0	1.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K080080	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Dipnot: 121) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2021	8.000	5.000	1.000	24	% 2,4	
2017K080030	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Dipnot: 121) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	5.710	500	1.570	27	% 1,7	
2019K070020	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi (Dipnot: 118) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2019	1.496.700		1.496.700		% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.510.410	5.500	2.570	51	% 2,0	

Dipnot: 121 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Dipnot: 118 12.01.32.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010070	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2019-2019	4.000		4.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2019-2019	250		250	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2019-2019	250		250	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2019-2019	3.500		3.500	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2019-2021	444.850		438.950	381.202	% 86,8	2.950.000,00.-₺ toplam ödenekten 2.705.000,00.-₺ ödenek serbest bırakılmış, 436.000.000,00.-₺ ödenek eklenmiş ve 381.389.383,00.-₺ ödeme yapılmış olup, 57.315.617,00.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	4.000	0	4.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	444.850	0	438.950	381.202	% 86,8	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2020	153.744	41.500	35.798	23.508	% 65,7	
	Genel Bütçe Ödeneği		48.400	15.000	6.050	3.109	% 51,4	
	Döner Sermaye Ödeneği		105.344	26.500	29.748	20.399	% 68,6	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	14.000	7.000	4.900	2.558	% 52,2	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde KDV dahil 9.770.400,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. KDV dahil 410.586 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 10.180.986 TL dir. 17.05.2019 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2021	13.000	0	200	178	% 89,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	9.900	8.000	900	373	% 41,4	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde KDV dahil 6.652.840,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. KDV dahil 665.275 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 7.318.115 TL dir. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2021	11.500	0	50	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	21.500	11.000	9.000	7.082	% 78,7	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde KDV dahil 17.039.200 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.01.2018 tarihinde imzalandı. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %98' dir. 2018 yılında Genel Bütçeden 5.481.473,52 TL ve Döner Sermayeden 7.672.889,69 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	13.000	5.500	6.000	5.273	% 87,9	Hizmet binası yapım işi 15.01.2018 tarihinde KDV dahil 8.782.740 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.02.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 673.522 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 9.456.262 TL dir. 14.05.2019 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır. 2018 yılında Genel Bütçeden 4.992.315,98 TL ve Döner Sermayeden 1.710.848,36 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	15.000	7.000	7.980	3.210	% 40,2	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde KDV dahil 10.924.440 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 28.02.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 1.069.374 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 11.993.814 TL dir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %95' dir. 2018 yılında Genel Bütçeden 5.214.443,56 TL ve Döner Sermayeden 2.051.930,62 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2022	35.320	0	210	204	% 97,1	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2022	8.000	0	50	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	11.000	3.000	6.000	4.630	% 77,2	Hizmet binası yapım işi 08.02.2018 tarihinde KDV dahil 6.629.240 TL' ye ihale edilmiştir. Sözleşme 10.04.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 662.924 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 7.292.164 TL dir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %95' dir. 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde hizmete açılacaktır.
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*.Döner Sermaye)	2019-2021	1.524		508	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılacaktır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K090050	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2019-2019	1.250		1.250	758	% 60,6	
	Hizmet Binası Onarımı	2019-2019	1.250		1.250	476	% 38,1	
2019G000060	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2019-2019	4.199		4.199	0	% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	55.099	15.000	12.749	4.343	% 34,1	
		DÖNER SERMAYE	105.344	26.500	29.748	20.399	% 68,6	
		GENEL TOPLAM	160.443	41.500	42.497	24.742	% 58,2	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.06.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019G000060	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2019-2019	100		100	0	% 0,0	
2019K090050	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2019-2019	250		250	36	% 14,4	Merkez Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Masa vb. malzeme Alımı
	Hizmet Binası Onarımı	2019-2019	250		250	66	% 26,4	Merkez Hizmet Binası Sosyal Tesis Girişinde bulunan turnikelerin bakımı ve Barkod Okuyucu alınarak entegre edilmesi işleri yapılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	600	0	600	102	% 17,0	
