



# 2021 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 1. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 Dönemi)



# BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2021 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.612.347.000,00	1.614.259.165,77	445.896.380,44	% 27,6
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	274.484.000,00	274.711.192,10	74.488.353,15	% 27,1
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	114.221.000,00	130.684.332,34	17.533.897,61	% 13,4
05	CARİ TRANSFERLER	674.912.000,00	953.980.656,82	146.487.371,17	% 15,4
	Kentsel Dönüşüm Ödeneği - Özel Ödenek	458.000.000,00	458.000.000,00	113.000.000,00	% 24,7
	Kentsel Dönüşüm Ödeneği - Ek Ödenek	0,00	0,00	0,00	
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	170.000.000,00	170.000.000,00	31.000.000,00	% 18,2
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	39.000.000,00	39.000.005,79	1.067.801,06	% 2,7
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	0,00	0,00	0,00	
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	0,00	278.579.000,00	0,00	% 0,0
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	7.912.000,00	8.401.651,03	1.419.570,11	% 16,9
06	SERMAYE GİDERLERİ	407.939.000,00	1.022.489.338,21	255.088.925,85	% 24,9
	Bakanlık Yatırım Programı	391.835.000,00	392.517.999,33	44.100.531,16	% 11,2
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.104.000,00	16.104.000,00	563.073,61	% 3,5
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	613.867.338,88	210.425.321,08	% 34,3
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	276.711.000,00	350.816.611,74	129.763.132,21	% 37,0
	Bakanlık Yatırım Programı	96.711.000,00	96.711.000,00	379.190,72	% 0,4
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	180.000.000,00	149.491.000,00	49.960.139,84	% 33,4
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	104.614.611,74	79.423.801,65	% 75,9
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
08	BORÇ VERME	17.550.000,00	17.550.000,00	1.257.600,00	% 7,2
GENEL TOPLAM		3.378.164.000,00	4.364.491.296,98	1.070.515.660,43	% 24,5



# BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

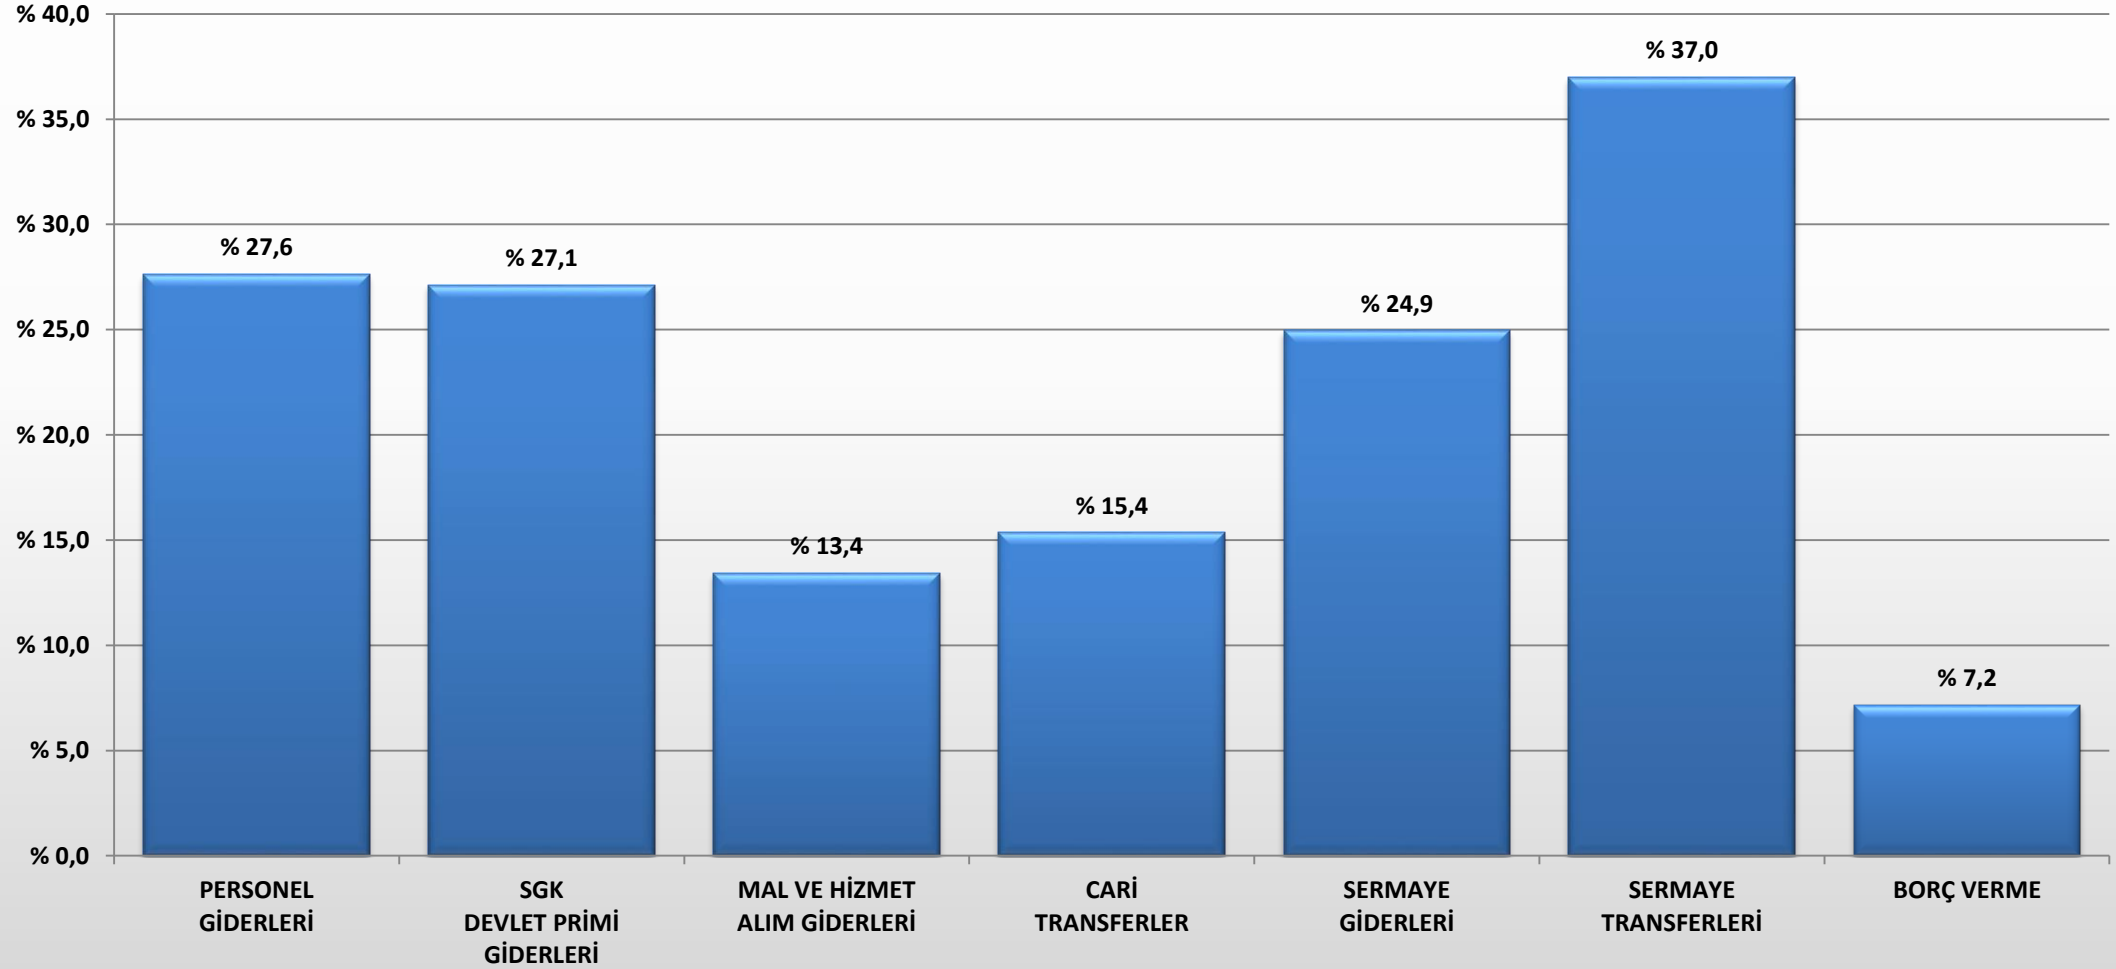




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ

## 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2021 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2021 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	45.120.000,00	18.700.000,00	609.599,80	% 3,3
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	10	616.211.000,00	72.536.000,00	379.190,72	% 0,5
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	5	211.227.000,00	32.190.000,00	524.052,16	% 1,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	17	3.085.941.111,00	277.992.000,00	45.189.275,76	% 16,3
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	2	7.500.000,00	501.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	3	3.748.000,00	1.723.000,00	1.500,00	% 0,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	6	119.150.000,00	48.212.000,00	1.331.100,00	% 2,8
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	3.355.191.000,00	7.767.000,00	509.521,00	% 6,6
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	19	252.690.000,00	90.280.000,00	197.532,00	% 0,2
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	1.619.177.000,00	1.500.000,00	0,00	% 0,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	77.638.000,00	21.335.000,00	620.340,19	% 2,9
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	390.000,00	390.000,00	0,00	% 0,0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>76</b>	<b>9.396.983.111,00</b>	<b>576.126.000,00</b>	<b>49.362.111,63</b>	<b>% 8,6</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>65</b>	<b>9.158.564.111,00</b>	<b>506.096.000,00</b>	<b>46.246.842,63</b>	<b>% 9,1</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>11</b>	<b>238.419.000,00</b>	<b>70.030.000,00</b>	<b>3.115.269,00</b>	<b>% 4,4</b>
<b>"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği</b>	<b>3 adet</b>		<b>16.104.000,00</b>	<b>563.073,61</b>	<b>% 3,5</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

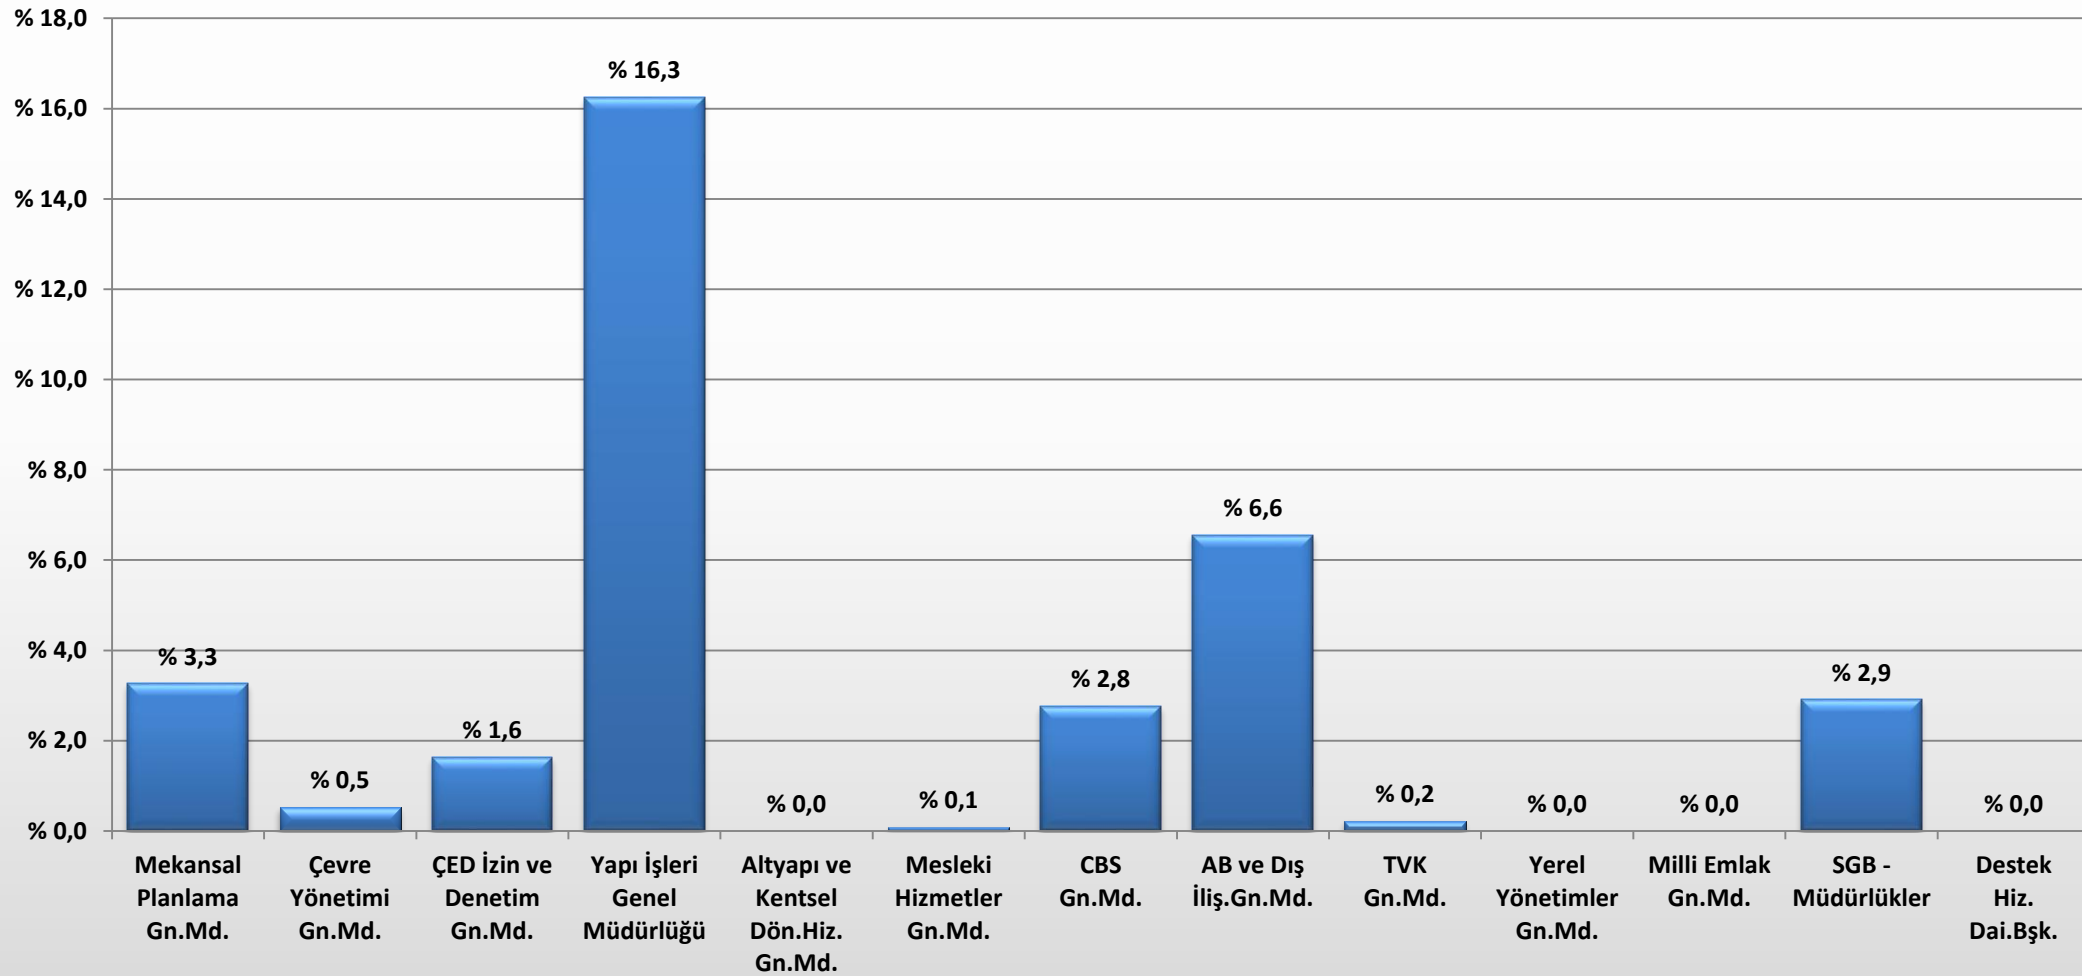




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2021 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	47.329.000,00	47.329.000,00	8.070.397,37	% 17,1
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	285.203.000,00	637.887.611,74	137.463.215,16	% 21,5
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	83.515.000,00	83.515.000,00	14.915.885,37	% 17,9
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	356.239.000,00	356.604.199,26	62.950.288,44	% 17,7
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	483.952.000,00	483.952.000,00	120.163.564,28	% 24,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	25.151.000,00	25.151.000,00	6.248.507,53	% 24,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	41.845.000,00	41.845.000,00	4.786.215,22	% 11,4
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	52.243.000,00	52.243.005,79	4.146.349,44	% 7,9
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	103.830.000,00	103.830.000,00	6.554.932,44	% 6,3
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	9.717.000,00	9.717.000,00	2.358.001,66	% 24,3
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	95.475.000,00	95.475.000,00	10.631.599,42	% 11,1
Personel Genel Müdürlüğü	8.314.000,00	8.314.000,00	2.946.698,07	% 35,4
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	8.604.000,00	8.604.000,00	3.703.683,70	% 43,0
Özel Kalem Müdürlüğü	39.504.000,00	39.504.000,00	2.944.618,48	% 7,5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	68.048.000,00	68.551.529,68	15.733.007,84	% 23,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	3.375.000,00	3.375.000,00	541.306,49	% 16,0
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	13.463.000,00	13.463.000,00	5.375.156,29	% 39,9
Strateji Geliştirme Başkanlığı	184.591.000,00	184.591.000,00	33.482.464,43	% 18,1
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.473.000,00	1.473.000,00	367.739,73	% 25,0
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	4.182.000,00	4.182.000,00	2.536.448,44	% 60,7
İl Müdürlükleri	1.462.111.000,00	2.094.884.950,51	624.595.580,63	% 29,8
<b>TOPLAM</b>	<b>3.378.164.000,00</b>	<b>4.364.491.296,98</b>	<b>1.070.515.660,43</b>	<b>% 24,5</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

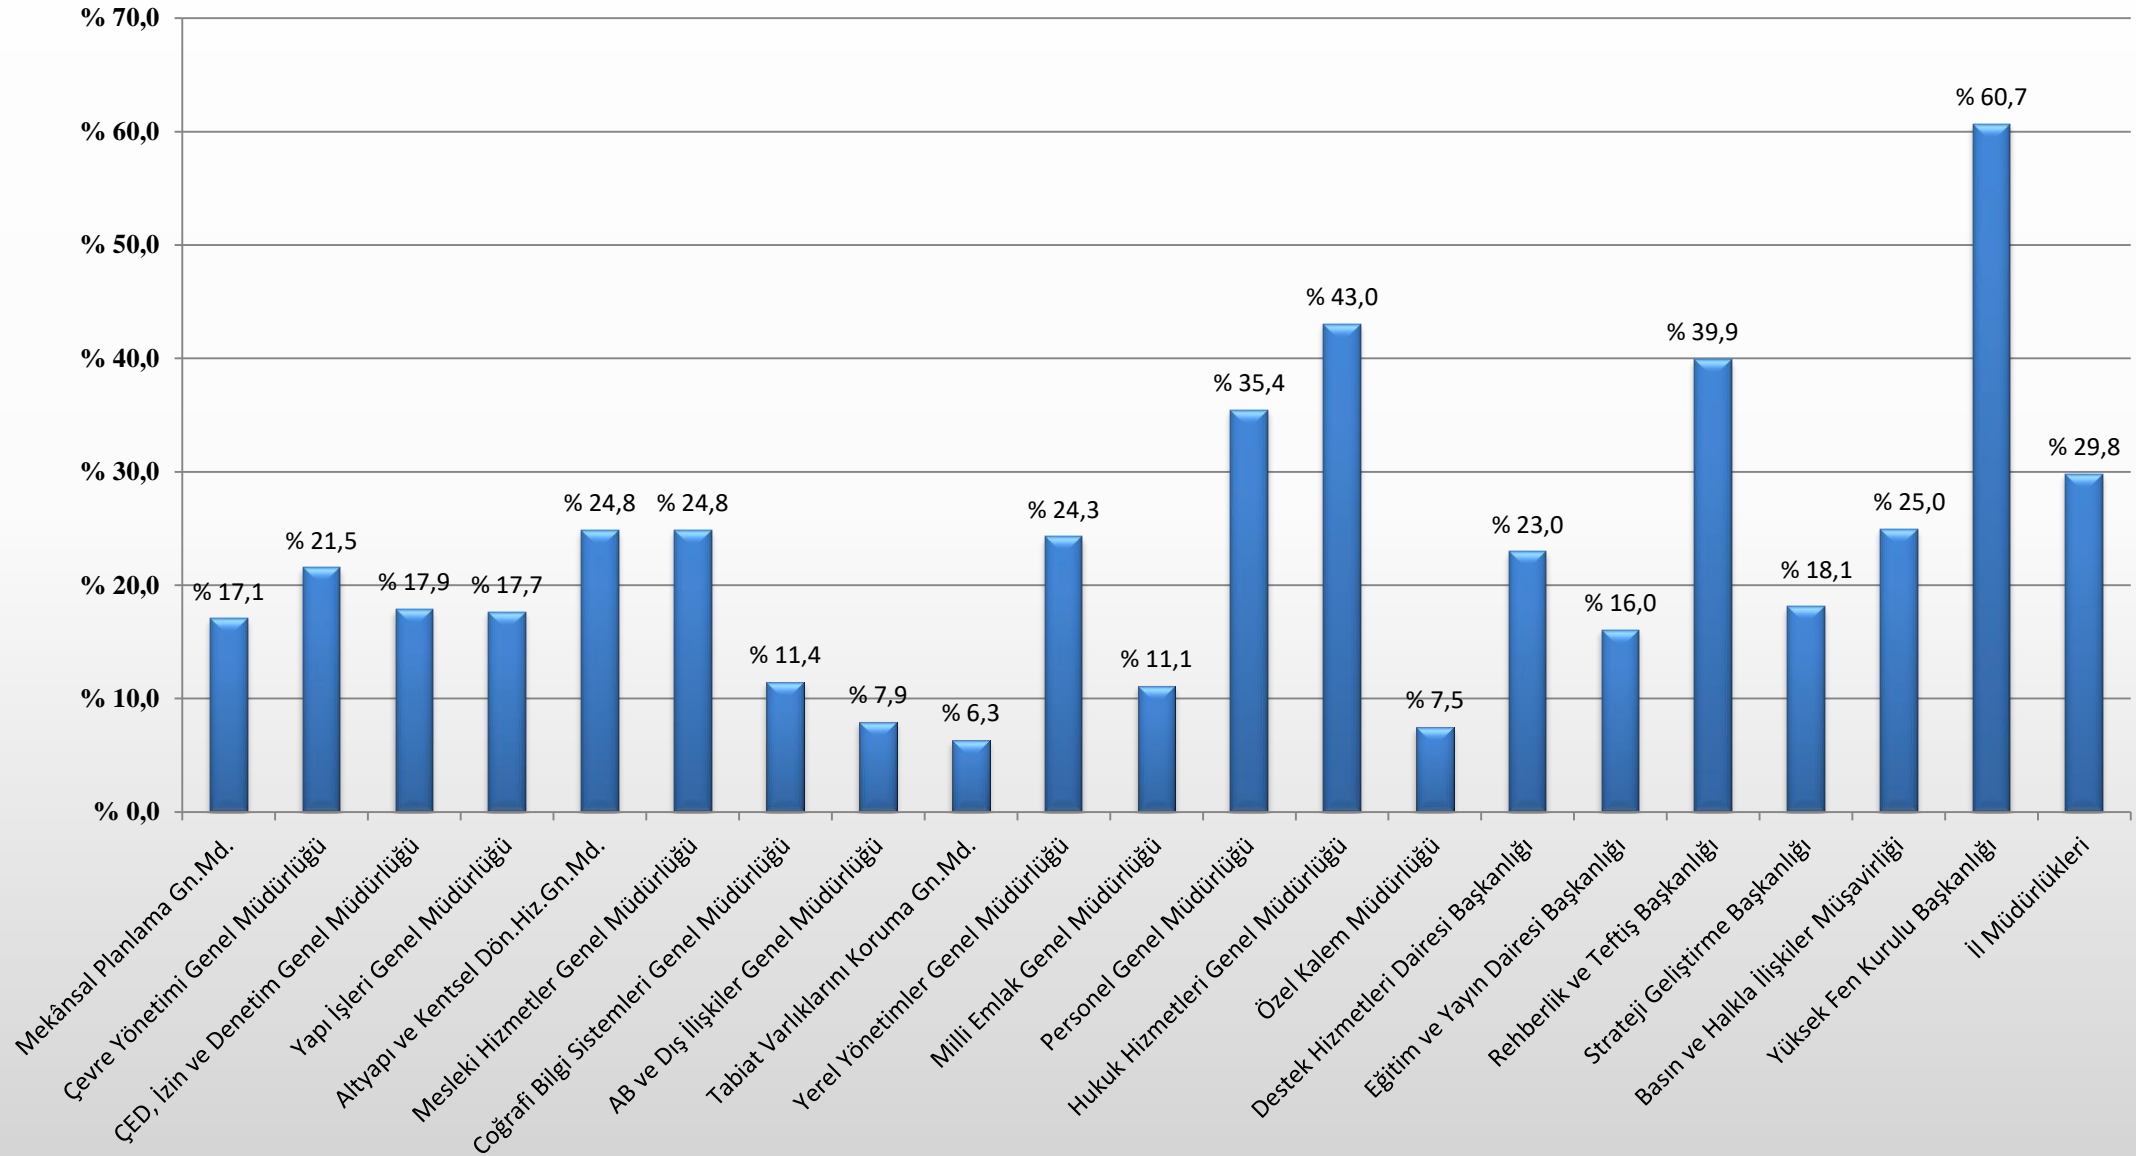

**Harcama Birimi Bazında  
2021 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri**



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3798	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	6.020.000	2.720.000	3.300.000	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2021	4.000.000	2.400.000	1.600.000	0	% 0,0	
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama	2017-2021	2.020.000	320.000	1.700.000	0	% 0,0	
2020K09-150347	Yaşanabilir Şehirler Kriterleri Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2020-2021	850.000	0	850.000	0	% 0,0	
	Türkiye Yaşanabilir Kentler Endeksi ve Beratı	2020-2021	500.000	0	500.000	0	% 0,0	
	Yeni Planlama Modeline İlişkin Yatay Mimari Taramaları	2020-2021	350.000	0	350.000	0	% 0,0	
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2023	4.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	
2018K09-18078	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	13.250.000	6.000.000	3.750.000	609.600	% 16,3	
	2. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2019-2021	6.750.000	6.000.000	750.000	609.600	% 81,3	Karabük-Safranbolu Örnek İmar Uygulamaları için 50.622,00 TL, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulamaları için 352.772,80 TL, Yozgat Sorgun İmar Uygulamaları Projesi Kapsamında 206.205,00 TL ödeme yapılmıştır.
	3. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2021-2022	6.500.000	0	3.000.000	0	% 0,0	

**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-3803	Bütünleşik Kıyı Alanlarının Planlaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	2.600.000	300.000	1.300.000	0	% 0,0	
	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2021	1.000.000	300.000	700.000	0	% 0,0	
	İzmit-Sakarya-Düzce Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	700.000	0	200.000	0	% 0,0	
	Zonguldak-Bartın-Kastamonu Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	900.000	0	400.000	0	% 0,0	
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2023	14.400.000	1.000.000	4.500.000	0	% 0,0	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2022	5.000.000	1.000.000	2.500.000	0	% 0,0	
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2023	9.400.000		2.000.000	0	% 0,0	
2021K09-162464	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2022	4.000.000		3.000.000	0	% 0,0	
<b>7 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>45.120.000</b>	<b>10.020.000</b>	<b>18.700.000</b>	<b>609.600</b>	<b>% 3,3</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-3796	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	2.250.000	750.000	1.500.000	0	% 0,0	Proje bütçesi 2.250.000 TL olup projenin yapılmasına ilişkin protokol İstanbul Teknik Üniversitesi ile 07/02/2020 tarihinde imzalanmıştır. İş programı çerçevesinde 11 adet kılavuz ve yönetici özet kitapçığı hazırlanmış, atık karakterizasyonu kılavuzu taslağı hazırlanmış ilk iki ödemeye ilişkin işlemler tamamlanmıştır. Veri toplanmasına yönelik 30 büyükşehir belediyesi ve 5 il belediyesinde yerinde inceleme çalışmaları yürütülmekte olup iş programına göre henüz harcama yapılmamıştır.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2024	400.000.000	140.000.000	54.950.000	0	% 0,0	KAP projesi kapsamında 2021 yılı projelerinin değerlendirilmesi amacıyla Proje Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirilerek 2021 yılı projelerine karar verilecektir. Henüz harcama yapılmamıştır.
2018K10-18297	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2021	1.687.000	987.000	700.000	0	% 0,0	Ulusal Deniz Çevresi Yönetimi Stratejisi Belgesi taslağına ilişkin ilgili kurumların görüşleri alınmıştır. Diğer taraftan, bahse konu Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında; Strateji Belgesine duyulan ihtiyaç ve strateji hazırlama yükümlülüğü , hukuki dayanak, yetkili ve görevli otorite, Deniz Çevresinin Korunması Stratejisinin amaç ve temel ilkeleri, Deniz Çevresinin Korunması Ulusal Stratejisinin aşamaları, önlemler programının önceliklendirilmesi planı ve ulusal ve uluslararası düzeyde yürütme ve raporlama hususlarına ilişkin değerlendirmeler Proje ekibi ve Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2022	6.750.000	3.350.000	3.100.000	0	% 0,0	
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi	2018-2021	4.000.000	2.600.000	1.400.000	0	% 0,0	<p>*.4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile 27.06.2018 tarihinde imzalanan protokol ile projeye başlanmıştır.</p> <p>*.Proje kapsamında Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalının bakım ve geliştirme hizmetleri sağlanmakta olup, söz konusu çalışmalara devam edilmiştir.</p> <p>*.HEY Portalı Noktasal Modülü altında sanayi tesislerinin emisyon ölçüm raporlarının dijitalleştirme çalışmalarına devam edilmiştir.</p> <p>*.Statejik hava kalitesi hazırlanması çalışmaları kapsamında Ege Bölgesine ilişkin emisyon envanteri çalışmaları başlatılmıştır.</p> <p>*.2020/25 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Uygunluk İzin Belgesi, Satış İzin Belgesi, Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin yerli katı yakıtlar için 18 Kasım 2020 tarihinden itibaren, ithal katı yakıtlar için 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı Katı Yakıt Modülü üzerinden dijital ortamda düzenleneceği belirtilmiş olup, hız zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmıştır.</p> <p>*.Katı Yakıt Modülünde 1 Ocak itibarıyla ithal katı yakıtların belgelendirme süreçleri başlamış olup İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması ile entegrasyon sağlanmıştır.</p> <p>*.Günümüz itibarıyla Katı Yakıt Modülü üzerinden 2893 Satış İzin Belgesi düzenlenmiş olup, 722 firmanın veri tabanına kayıt işlemi yapılmıştır.</p>
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi	2018-2022	1.750.000	750.000	900.000	0	% 0,0	Proje; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında, Ege Üniversitesi ile yapılan Protokol çerçevesinde, 1 Aralık 2020 yılında başlamış olup, 1 Aralık 2021 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. Ancak Covid-19 nedeniyle proje süresinin 2022 Ekim sonuna kadar uzatılması planlanmaktadır.
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2022	1.000.000	0	800.000	0	% 0,0	Proje henüz başlamamış olup, 2021 yılının ilk yarısında başlaması planlanmaktadır.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2023	7.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi hazırlanmış olup, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Yönetimi-TVK Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme	2016-2021	5.480.000	3.480.000	2.000.000	0	% 0,0	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi Projesi kapsamında iletilen 4. Revize Ara Raporla ilişkin revize çalışmaları devam etmektedir. İlgili kurumlardan alınan görüşler raporlara yansıtılmaktadır. Hazırlanacak olan uyum taslak bildirimi çalışmaları ve çevrimiçi veri toplama sistemi çalışmaları devam etmektedir. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi güncellemeleri sürdürülmektedir. Konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görüşleri alınıp proje kapsamında değerlendirilmektedir.
Alt proje-2	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB-1)	2018-2022	13.340.000	8.691.000	3.400.000	181.126	% 5,3	IPA II programı kapsamında 2018K100610 proje numaralı "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Avrupa Birliği ve Bakanlığımız eş finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmektedir. Proje 09.10.2019 tarihinde başlamış olup açılış konferansı 26.02.2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Proje yöneticisi ve hibe uzmanı istihdam edilmiştir. Projenin ilk ilerleme raporu 17.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. Proje kapsamında Muğla, Samsun, Sakarya ve Konya Büyükşehir Belediyeleri pilot belediyeler olarak seçilmiştir. Hibe başvuruları toplanmış ön başvuruların incelenmesi ve proje bileşenleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ulusal Uyum Platformunun teknik arka plan ve kullanıcı arayüzünü içeren tasarım süreci başlatılmıştır.
AB katkısı			75.591.000	49.502.000	19.265.000	1.000.000	% 5,2	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	EKÖK Kapsamında Atık İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi	2020-2022	2.250.000	400.000	750.000	0	% 0,0	Protokol Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında 16.11.2020 tarihinde imzalanmış, proje başlatılmıştır. Nihai Zaman Planının yer aldığı Başlangıç Raporu idareye sunulmuş ve proje kapsamında ihtiyaç duyulan ekipman temini sağlanmıştır. Proje kapsamında çalıştay ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Henüz harcama yapılmamıştır.
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	5.458.000	2.182.000	1.092.000	0	% 0,0	IPA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmıştır. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu projede 27.08.2020 tarihinde müşavir firmaya 1.503.264 Avro Avans ödemesi yapılmıştır. Proje aktiviteleri kapsamında Başlangıç Raporu, Metodoloji Raporu, Yazılım Analiz ve Eğitim İhtiyaçları Değerlendirme Raporlarının ön onayı Genel Müdürlüğümüzce yapılarak, onay için AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
AB katkısı			30.924.000	12.372.000	6.184.000	0	% 0,0	
2018K10-18333	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması (CITYAIR) (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2021	4.244.000	2.971.000	1.273.000	198.065	% 15,6	*Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CITYAIR) Projesi; 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlamıştır. *2021 yılı başından itibaren aylık koordinasyon toplantıları ve 8. yönlendirme komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. *Emisyon yönetim stratejilerine yönelik olan teknik çalışmalar 31 ilin Temiz Hava Eylem Planlarının güncellenmesi amacıyla sürdürülmektedir. *Üniversitelerde farkındalık seminerleri ile öğrencilere yönelik aktiviteler planlanmıştır. *2021 yılı ilk çeyreğinde, projenin ilerleyişine yönelik çevrim içi toplantılar düzenlenmiştir.
AB katkısı			24.048.000	16.836.000	7.212.000	1.100.000	% 15,3	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2022	3.639.000	1.977.000	607.000	0	% 0,0	Proje kapsamında, Bakanlığımız, özel sektör ve İl Müdürlükleri temsilcileri katılımı ile 8-10-12 Şubat 2021 tarihlerinde "Toprak Kirlilik Yükünün Tespiti ve Değerlendirilmesi" eğitimi, 8-9-10 Mart 2021 tarihlerinde "Saha Temizleme Hedeflerinin Belirlenmesi" eğitimi ve 31 Mart 2021 tarihinde "Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi" eğitimi çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.
AB katkısı			20.615.000	11.201.000	3.436.000	0	% 0,0	
2019K10-92594	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2019-2021	1.940.000	776.000	1.164.000	0	% 0,0	Proje kapsamında, Bakanlığımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör birliklerinin/derneklerinin temsilcilerine yönelik olarak 1-4 Şubat 2021 tarihlerinde Çevresel Risk Değerlendirmesi Eğitimi, 22-25 Şubat 2021 tarihlerinde İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi Eğitimi, 29 Mart-1 Nisan 2021 tarihlerinde Maruz Kalma Senaryoları Eğitimi online olarak düzenlenmiştir. Kimyasal Kayıt Sistemine entegre edilecek Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve Raporlama Aracının geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından sanayicilere yönelik olarak hazırlanan 11 rehber doküman Türkçe'ye çevrilmiştir.
AB katkısı			10.995.000	4.398.000	6.597.000	0	% 0,0	
<b>10 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>454.038.000</b>	<b>165.564.000</b>	<b>72.536.000</b>	<b>379.191</b>	<b>% 0,5</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>162.173.000</b>	<b>94.309.000</b>	<b>42.694.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>% 4,9</b>	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)	2014-2023						
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2023	192.127.000	119.753.000	22.675.000	524.052	% 2,3	
	Genel Bütçe Ödeneği		125.052.000	60.603.000	19.425.000	524.052	% 2,7	Merkez Laboratuvar Ölç.İzlm.Dai.Bşk.ile 7 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri tarafından 2020 yılında ihalesi yapıp 2021 yılına sarkan hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Temiz Hava Merkezi' ne bağlı illerde bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarının bakım onarımı için hakediş işlemleri devam etmekte olup, tamamlanmasına müteakip ilk 3 aylık ödemeler yapılacaktır.
	Döner Sermaye Ödeneği		67.075.000	59.150.000	3.250.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanınca yaklaşık maliyet hesaplama çalışmalarına başlanacaktır.
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2021-2023	3.500.000		1.000.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanınca yaklaşık maliyet hesaplama çalışmalarına başlanacaktır.
Alt proje-3	Güneydoğu THMM Hava Kalitesi Ön Değerlendirme	2021-2022	2.750.000		1.250.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanınca yaklaşık maliyet hesaplama çalışmalarına başlanacaktır.
2020K10-140875	Çevre Referans Laboratuvarı Altyapı Revizyonu (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2020-2022	7.700.000	0	4.140.000	0	% 0,0	Proje bileşenlerinin tamamını içerecek şekilde şartname hazırlanmış olup, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacaktır.



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18384	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000.000	750.000	2.250.000	0	% 0,0	2021 yılı içerisinde; 11.03.2021 tarihinde Eskişehir İlinde, Toz Şeker ve Seramik üretimi konusunda faaliyet gösteren sektörler saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme toplantıları yapılarak, yazılımda kullanılacak sektör bazlı emisyon faktörlerinin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yazılım ekranlarının (Emisyon Verilerin girilmesi, Meteorolojik ve topoğrafik verilerin alınması, çıktı formatları vb..) oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.550.000		575.000	0	% 0,0	26.03.2021 tarihinde, Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi kapsamında 4 ürün grubunda (Boya ve Vernikler, Deterjanlar (Çamaşır Makinası Deterjanı ve Bulaşık Makinası Deterjanı), Cam Ürünleri ve Sert Yüzey Temizleyiciler) çevre eteki kriterlerinin belirlenmesini içeren çalışmalara yönelik Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile hizmet alımı protokolü imzalanmıştır. Protokol süresi 30 ay olup, tutarı 849.600 TL (KDV dahil) dir.
2021K10-169535	Hava Kirliliği Kaynakları ve Önlemlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2021-2022	600.000		300.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanınca yaklaşık maliyet hesaplama çalışmalarına başlanacaktır.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>136.452.000</b>	<b>61.353.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>524.052</b>	<b>% 2,1</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>74.775.000</b>	<b>59.150.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>211.227.000</b>	<b>120.503.000</b>	<b>32.190.000</b>	<b>524.052</b>	<b>% 1,6</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018E06-87362	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2024	750.000.000	115.600.000	3.572.000	0	% 0,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünce söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL, Genel Müdürlüğümüze Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmalarının kapsamının belirlenmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli ön proje doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlandığı bilinmektedir. İhale süreçleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu aşamada, Başkanlığımıza iletilen başkaca bir husus bulunmamaktadır.
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (Enerji Sektörü)	2019-2025	1.534.000.000	11.213.000	91.593.000	169.801	% 0,2	
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		1.504.854.000	7.094.000	82.997.000	0	% 0,0	İstanbul'da Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarımı İşi 16 bina, Bursa Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Enerji Verimliliği Onarımı İşi 6 bina, , Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enerji Verimliliği Onarımı İşi 2 bina, Ankara ve Karabük illerinde Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Tadilatı İşi İnşaat Sözleşmesi 9 bina olmak üzere toplamda 33 binanın ihalesi yapılmıştır.
	Hibe Ödeneği		29.146.000	4.119.000	8.596.000	169.801	% 2,0	
2020K14-152212	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2020-2021	9.826.000	4.863.000	4.963.000	1.784.169	% 35,9	Türkiye çapında 78 ilimizde Kamu yapılarının envanterinin çıkarılması ve afetlere karşı önceliklendirme çalışmaları web tabanlı bir yazılım üzerinden (KAYES) başlatılmış olup, illerimizde saha çalışmaları devam etmektedir. 6 Nisan 2021 tarihine kadar 188.757 adet binanın envanter bilgisi kayıt edilmiştir.
2021K14-164341	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2021-2021	11.480.000		11.480.000	0	% 0,0	İhale Aşamasında. 3594 Sayılı C.B. Kararı ile ihalesi yapılacaktır. 35adet 4x4 Arazi Aracı alımı.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K01-161831	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-CBS-Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Proje Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi, CBS ile Uyumlaştırılması ve Yaygınlaştırılması	2021-2021	900.000		900.000	115.239	% 12,8	Proje Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi projesi sözleşmesi yapılarak çalışmalara başlandı.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2021-2021	800.000		800.000	141.600	% 17,7	Yeni Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılım uygulaması değişen mevzuat kapsamında dağıtım modülünü de içerecek şekilde revize edilerek 2019 yılı itibarıyla 81 ilde devreye alınmış, 2021 yılı itibarı ile de uygulanmakta olup, yazılıma ilişkin iyileştirme ve geliştirme süreçleri devam etmektedir.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2021-2021	300.000		300.000	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki yazılımların bakım onarım ve iyileştirme işlemlerinde ve donanım ihtiyaçlarının sağlanmasında proje ödeneği kullanılmaktadır.
2011K07-140439	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2021	5.500.000	4.000.000	1.500.000	0	% 0,0	63 adet ile dair çalışmalar tamamlanmış olup, yıl sonuna kadar 72 adet ile ait projenin tamamlanması planlanmaktadır.
2018K07-149555	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	18.000.000	13.000.000	5.000.000	0	% 0,0	
	İlisu Barajından Etkilenen Siirt İli Köyleri İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2021	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	% 0,0	Ödenek başka işe aktarılacaktır.
	İlisu Barajından Etkilenen Batman İli Köyleri İskan Konutları Altyapı İşleri	2019-2021	13.000.000	9.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Ödenek başka işe aktarılacaktır.
2018K07-18498	Bozkır Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	210.817.408	113.395.408	97.422.000	41.000.000	% 42,1	İş devam ediyor.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	40.744.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-24212	İhsu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	32.490.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	116.964.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2022	6.823.000		2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2021K07-160010	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2021K07-169789	Tamamlama ve Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	50.500.000		50.500.000	890.668	% 1,8	
	Kesin Hesap	2021-2021	13.500.000		13.500.000	890.668	% 6,6	İhtiyaç duyulduka harcama yapılacaktır.
	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli Tamamlama	2021-2021	37.000.000		37.000.000	0	% 0,0	2021 yılında iş tamamlanacaktır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	<i>Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (*:08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2016-2024	295.746.703	50.383.703	17.500.000	1.257.600	% 7,2	Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak illerinden 95 adet köyde yaklaşık 2.100 ailenin konut yapımı işidir. Batman ve Erzurum illerine toplam da Mart ayı sonu itibarıyla 1.257.600 TL ödenek gönderilmiş olup, gönderilen ödenegin tamamı harcanmıştır. 31.03.2021 tarihi itibarıyla Erzurum ilinde toplamda 12 konut tamamlanarak haksahiplerine teslim edilmiştir.
	<i>Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	17.362.700	803.700	1.000.000	0	% 0,0	
	<i>Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	8.047.041	520.041	1.000	0	% 0,0	
	<i>Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2023	24.740.866	13.540.866	5.000.000	1.021.350	% 20,4	
	<i>Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	1.750.614	450.614	307.100	0	% 0,0	
	<i>Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	3.577.000	802.000	1.020	0	% 0,0	
	<i>Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	23.021.643	1.521.643	500.000	0	% 0,0	
	<i>Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	13.099.000	549.000	1.500.002	0	% 0,0	
	<i>Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	6.296.000	1.396.000	1.082.000	0	% 0,0	
	<i>Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	7.775.000	495.000	1.000.000	0	% 0,0	
	<i>Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	4.137.000	1.328.000	329.001	0	% 0,0	
	<i>Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	81.706.000	16.820.000	3.227.720	236.250	% 7,3	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	İğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	10.000.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	5.555.000	610.000	250.002	0	% 0,0	
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.608.000	733.000	600.002	0	% 0,0	
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	7.700.000	373.000	1.000	0	% 0,0	
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	5.000.000	360.000	1.000	0	% 0,0	
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	22.083.590	6.451.590	1.826.093	0	% 0,0	
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	3.070.000	770.000	8.302	0	% 0,0	
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	1.500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	12.060.000	315.000	212.150	0	% 0,0	
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	14.004.749	704.749	57.754	0	% 0,0	
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	6.500.000	473.000	1.002	0	% 0,0	
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.500.000	72.000	500.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	<i>Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	2.061.000	681.000	1.000	0	% 0,0	
	<i>Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	2.055.500	613.500	80.852	0	% 0,0	
	<i>Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	7.000.000		1.000	0	% 0,0	
2021K07-160012	<i>Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2021-2021	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2023			9.862.000	220.473	% 2,2	Kamulaştırma ve satın alımlar için kullanılmaktadır. Adıyaman ve Bingöl illerine 4 adet konut satın alımı için 616.000 TL ödenek gönderilmiştir.
<b>15 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>2.739.692.408</b>	<b>253.089.408</b>	<b>243.999.000</b>	<b>42.147.507</b>	<b>% 17,3</b>	
		<b>08 TOPLAM</b>	<b>295.796.703</b>	<b>50.383.703</b>	<b>17.550.000</b>	<b>1.257.600</b>	<b>% 7,2</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>21.306.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>16.443.000</b>	<b>1.784.169</b>	<b>% 10,9</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.085.941.111</b>	<b>312.455.111</b>	<b>277.992.000</b>	<b>45.189.276</b>	<b>% 16,3</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.862.000</b>	<b>220.473</b>	<b>% 2,2</b>	

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K01-2755	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2022	6.500.000	3.750.000	1.000	0	% 0,0	"İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi" projesi gelinen tarih itibariyle %58 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmış olup, anılan proje kapsamında yürütülen çalışmaların durdurulmasına dair 17.08.2018 tarihli ve E.140882 sayılı yazımıza istinaden projeye devam edilememiştir.
2021K09-162458	Doğu Karadeniz Dere Yatakları Islah ve İyileştirme (Şehirleşme Sektörü)	2021-2022	1.000.000		500.000	0	% 0,0	Bahse Konu Proje İle Alakalı, ODTÜ İle Protokol Görüşmeleri Yapılmış olup, Söz Konusu İş İmza Aşamasındadır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>7.500.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	



**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D00-17215	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2023	3.025.000	600.000	1.000.000	0	% 0,0	<p>•27/07/2020 tarihinde ihalesi yapılan Binalarda Enerji Verimliliği Uygulaması (BEP-TR) 2. Versiyon Bakım Destek ve İyileştirilmesi Hizmet Alımı işinin sözleşmesi 05/10/2020 tarihinde imzalanmıştır. 204.400 TL bedelli işin süresi 365 gün olup, yükleniciye yapılacak ödemeler işin altıncı ayında (Nisan 2021) ve sonunda (Ekim 2021) olmak üzere iki sefer halinde gerçekleştirilecektir.</p> <p>*2021 yılı içerisinde Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-TR) Uygulaması 2. Versiyon Bakım, Destek ve İyileştirme İşİ Hizmet Alımı işi için ihaleye çıkılacaktır.</p> <p>• 263.040 TL bedelli Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YES-TR) Yazılımı İşinin sözleşmesi 05/11/2019 tarihinde imzalanmıştır. 2020 yılı temmuz ayı içinde işin tasarım raporunun onaylanması ve ihale bedelinin %15'inin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. İşin kabulü ve geri kalan %85'lik bedelin ödenmesi işlemleri 2020 yılı aralık ayı içinde tamamlanmıştır.</p> <p>*Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı için 18/12/2022 tarihine kadar yüklenici tarafından ücretsiz garanti ve bakım hizmeti verilecektir.</p>
2021K01-161844	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2021-2021	500.000		500.000	1.500	% 0,3	
2021K01-161831	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncellemesi	2021-2021	223.000		223.000	0	% 0,0	
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.748.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.500</b>	<b>% 0,1</b>	

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021E06-164350	Trafik Sorununun Çözümü için Akıllı Şehirler (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2021-2022	9.500.000		5.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
2021K01-164342	Milli Emlak Otomasyon Projesi İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2021-2022	4.900.000		2.300.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Ocak/2021 tarihinde 2 yıllık 2.344.800-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede belirtilen ödemeler proje takvimine göre hakediş ödemeleri şeklinde yapılacaktır.
2020K01-146671	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (*Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2020-2022	8.500.000	3.500.000	3.847.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Temmuz/2020 tarihinde 3.884.400TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede belirtilen ödeme proje takvimine göre hakediş ödemeleri şeklinde yapılacaktır.
2020K09-150397	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2020-2021	5.500.000	3.000.000	2.500.000	0	% 0,0	
	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı	2020-2020	1.000.000	500.000	500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik	2020-2021	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Eylül/2020 tarihinde 1.919.000TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme	2020-2021	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Ekim/2020 tarihinde 610.000+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Diğer hizmetlere ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-35701	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	34.000.000	16.500.000	10.000.000	0	% 0,0	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2021	11.500.000	9.000.000	2.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet tespiti tamamlanmış olup ihale aşamasındadır.
	TUCBS Entegrasyonu	2018-2022	11.000.000	7.000.000	1.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Eylül/2020 tarihinde 3.132.000+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye bağlanan iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	TUCBS Stratejisi ve Eylem Planı İzleme-Raporlama	2020-2021	1.000.000	500.000	500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet tespiti tamamlanmış olup ihale aşamasındadır.
	Coğrafi Veri ve Metaverilerinin Güvenli Paylaşımı	2021-2022	2.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Mart/2021 tarihinde 112.500+TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Diğer hizmetlere ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.
	Coğrafi Bilgi Platformu Modernizasyonu	2021-2021	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet tespiti tamamlanmış olup ihale aşamasındadır.
	Coğrafi Veri Güncelleme Çalışmaları	2021-2021	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
	TUCBS Coğrafi Veri Uyumlaştırma Çalışmaları	2021-2022	6.500.000		2.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-141024	Bilişim ve Donanım Altyapısı Modernizasyonu (*Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2020-2023	56.750.000	23.930.000	24.565.000	1.331.100	% 5,4	
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2020-2021	7.000.000	4.000.000	3.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım,Onarım ve Lisans Temini	2020-2021	12.000.000	8.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
	Hazır Yazılım Temini, Uygulama Yazılımı Lisans Alımı ve Bakımı	2020-2023	18.800.000	5.800.000	8.245.000	0	% 0,0	Proje kapsamında "Bakanlık Web Sayfaları Altyapısı Bakım Hizmet" sözleşmesi ve "Belgenet Bakım Güncelleme" sözleşmeleri imzalanmıştır. Diğer hizmetlere ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.
	Bakanlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümü	2020-2021	10.450.000	6.130.000	4.320.000	1.331.100	% 30,8	Proje kapsamında Ocak/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Oracle'dan PostgreSQL'e Göç	2021-2021	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet tespiti tamamlanmış olup ihale aşamasındadır.
	Çevre ve Şehircilik Veri Sözlüğü Geliştirilmesi	2021-2022	3.500.000		2.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, ihale aşamasındadır.
	E-Belediye Uygulamaları Bakım-Onarım	2021-2022	4.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>53.900.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>65.250.000</b>	<b>27.430.000</b>	<b>28.412.000</b>	<b>1.331.100</b>	<b>% 4,7</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>119.150.000</b>	<b>46.930.000</b>	<b>48.212.000</b>	<b>1.331.100</b>	<b>% 2,8</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2025	25.466.000	5.730.000	7.767.000	509.521	% 6,6	
<i>AB katkısı</i>			144.312.000	32.470.000	44.015.000	2.887.288	% 6,6	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	3.185.413.000	480.850.000	1.205.860.000	72.456.181	% 6,0	
	AB Hibesi		2.611.144.000	408.775.000	988.712.000	61.587.754	% 6,2	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		236.494.000	30.448.000	90.869.000	4.569.138	% 5,0	
	Mahalli İdare Katkısı		337.775.000	41.627.000	126.279.000	6.299.289	% 5,0	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>25.466.000</b>	<b>5.730.000</b>	<b>7.767.000</b>	<b>509.521</b>	<b>% 6,6</b>	
	<i>AB KATKISI</i>		<b>144.312.000</b>	<b>32.470.000</b>	<b>44.015.000</b>	<b>2.887.288</b>	<b>% 6,6</b>	
	<i>İçmesuyu Projesi</i>		<b>3.185.413.000</b>	<b>480.850.000</b>	<b>1.205.860.000</b>	<b>72.456.181</b>	<b>% 6,0</b>	

**2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	<b>Çarşamba Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>85.060.000</b>	<b>27.136.000</b>	<b>36.360.000</b>	<b>7.063.960</b>	<b>% 19,4</b>	
	AB Hibesi		72.296.000	23.064.000	30.905.000	6.004.366		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.106.000	1.629.000	2.182.000	423.838		
	Mahalli İdare Katkısı		7.658.000	2.443.000	3.273.000	635.756		
Alt proje-2	<b>Bandırma Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>186.349.000</b>	<b>20.737.000</b>	<b>72.492.000</b>	<b>8.110.134</b>	<b>% 11,2</b>	
	AB Hibesi		158.391.000	17.625.000	61.617.000	6.893.614		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		11.184.000	1.245.000	4.350.000	486.608		
	Mahalli İdare Katkısı		16.774.000	1.867.000	6.525.000	729.912		
Alt proje-3	<b>Bismil Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>83.136.000</b>	<b>42.045.000</b>	<b>26.088.000</b>	<b>2.626.523</b>	<b>% 10,1</b>	
	AB Hibesi		70.663.000	35.738.000	22.174.000	2.232.545		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.613.000	2.838.000	1.761.000	177.290		
	Mahalli İdare Katkısı		6.860.000	3.469.000	2.153.000	216.688		
Alt proje-4	<b>Bozüyük Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>252.569.000</b>	<b>0</b>	<b>103.465.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		165.506.000	0	67.800.000	0		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		34.830.000	0	14.268.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		52.233.000	0	21.397.000	0		
Alt proje-5	<b>Çankırı Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>264.973.000</b>	<b>0</b>	<b>93.866.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		225.223.000	0	79.786.000	0		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		15.900.000	0	5.632.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		23.850.000	0	8.448.000	0		
Alt proje-6	<b>Elbistan Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>151.706.000</b>	<b>74.589.000</b>	<b>36.702.000</b>	<b>5.241.942</b>	<b>% 14,3</b>	
	AB Hibesi		128.962.000	63.415.000	31.196.000	4.455.650		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		10.235.000	5.028.000	2.478.000	353.831		
	Mahalli İdare Katkısı		12.509.000	6.146.000	3.028.000	432.460		
Alt proje-7	<b>Giresun Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>237.352.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>83.309.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		201.746.000	3.144.000	70.812.000	0		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		14.243.000	222.000	4.999.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		21.363.000	333.000	7.498.000	0		
Alt proje-8	<b>İğdır Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>174.189.000</b>	<b>43.980.000</b>	<b>78.107.000</b>	<b>15.020.674</b>	<b>% 19,2</b>	
	AB Hibesi		148.056.000	37.382.000	66.390.000	12.767.573		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		11.760.000	2.969.000	5.273.000	1.013.895		
	Mahalli İdare Katkısı		14.373.000	3.629.000	6.444.000	1.239.206		
Alt proje-9	<b>Kastamonu Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>122.507.000</b>	<b>40.369.000</b>	<b>53.182.000</b>	<b>2.339.200</b>	<b>% 4,4</b>	
	AB Hibesi		104.127.000	34.312.000	45.204.000	1.988.320		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		7.352.000	2.423.000	3.191.000	140.352		
	Mahalli İdare Katkısı		11.028.000	3.634.000	4.787.000	210.528		

Alt proje-10	<b>Niksar Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>164.767.000</b>	<b>45.939.000</b>	<b>57.573.000</b>	<b>11.375.486</b>	<b>% 19,8</b>
	AB Hibesi		140.047.000	39.047.000	48.936.000	9.669.163	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		9.889.000	2.757.000	3.455.000	682.529	
	Mahalli İdare Katkısı		14.831.000	4.135.000	5.182.000	1.023.794	
Alt proje-11	<b>Rize Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>264.204.000</b>	<b>36.222.000</b>	<b>75.514.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		224.570.000	30.788.000	64.186.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		15.854.000	2.174.000	4.531.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		23.780.000	3.260.000	6.797.000	0	
Alt proje-12	<b>Sivas Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>223.094.000</b>	<b>44.969.000</b>	<b>100.771.000</b>	<b>4.021.204</b>	<b>% 4,0</b>
	AB Hibesi		189.625.000	38.222.000	85.654.000	3.418.024	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		13.388.000	2.699.000	6.047.000	241.272	
	Mahalli İdare Katkısı		20.081.000	4.048.000	9.070.000	361.908	
Alt proje-13	<b>Sorgun Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>83.490.000</b>	<b>11.794.000</b>	<b>58.341.000</b>	<b>5.607.446</b>	<b>% 9,6</b>
	AB Hibesi		70.963.000	10.024.000	49.589.000	4.766.329	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.011.000	708.000	3.501.000	336.447	
	Mahalli İdare Katkısı		7.516.000	1.062.000	5.251.000	504.670	
Alt proje-14	<b>Şırnak Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>77.471.000</b>	<b>38.756.000</b>	<b>20.931.000</b>	<b>6.002.000</b>	<b>% 28,7</b>
	AB Hibesi		65.898.000	32.992.000	17.791.000	5.101.700	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.208.000	2.594.000	1.413.000	405.135	
	Mahalli İdare Katkısı		6.365.000	3.170.000	1.727.000	495.165	
Alt proje-15	<b>Trabzon Su Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>151.283.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>44.120.000</b>	<b>4.369.763</b>	<b>% 9,9</b>
	AB Hibesi		128.587.000	28.900.000	37.501.000	3.714.298	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		9.079.000	2.040.000	2.648.000	262.186	
	Mahalli İdare Katkısı		13.617.000	3.060.000	3.971.000	393.279	
Alt proje-16	<b>Yüksekova Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>85.459.000</b>	<b>16.615.000</b>	<b>32.174.000</b>	<b>677.847</b>	<b>% 2,1</b>
	AB Hibesi		72.636.000	14.122.000	27.347.000	576.170	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.771.000	1.122.000	2.172.000	45.755	
	Mahalli İdare Katkısı		7.052.000	1.371.000	2.655.000	55.922	
Alt proje-17	<b>Suluova Entegre Su Tesisi</b>	<b>2020-2025</b>	<b>118.132.000</b>	<b>0</b>	<b>44.560.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		92.457.000	0	37.875.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		7.344.000	0	3.008.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		18.331.000	0	3.677.000	0	
Alt proje-18	<b>Doğubayazıt Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>197.522.000</b>	<b>0</b>	<b>80.915.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		167.890.000	0	68.777.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		13.335.000	0	5.462.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		16.297.000	0	6.676.000	0	
Alt proje-19	<b>Aksaray Entegre Su Projesi</b>	<b>2021-2025</b>	<b>262.150.000</b>	<b>0</b>	<b>107.390.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		183.501.000	0	75.172.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		35.392.000	0	14.498.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		43.257.000	0	17.720.000	0	

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021F00-164396	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2021-2021	351.000		351.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2021-2021	1.000		1.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Uzungöl ÖÇKB Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi Temini	2021-2021	180.000		180.000	0	% 0,0	Proje hizmet alımı için gerekli çalışmalara başlanılmıştır.
	Salsala Koyu Çevre Düzenleme Projesi Temini	2021-2021	170.000		170.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2018F00-67925	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulamaları (Turizm Sektörü)	2018-2021	9.900.000	5.800.000	4.100.000	0	% 0,0	Protokol çalışmaları devam etmektedir.
2020F00-147602	Korunan Alanlarda Bisiklet Yolu Yapımı Pilot Çalışması (Turizm Sektörü)	2020-2021	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	% 0,0	Protokol çalışmaları devam etmektedir.
2020F00-155262	Tarihi Obruk Han Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2021	7.000.000	3.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Ek protokol çalışmaları devam etmektedir.
2021F00-161769	Akyaka ve Gökova Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2021	400.000		400.000	0	% 0,0	Protokol çalışmaları devam etmektedir.
2021F00-161772	Hafik Gölü Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2022	5.000.000		1.252.000	0	% 0,0	Sivas İl Özel İdaresi ile Genel Müdürlüğümüz arasında Hafik Gölü Çevre Düzenleme Projesine ait mali katkı protokolü imzalanmıştır. Projeye ait ihale süreci Sivas İl Özel İdaresince gerçekleştirilecektir.



**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2022	9.000.000		6.000.000	0	% 0,0	Ortaca Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme Projesine ait mali katkı protokolü imzalanmıştır. Projeye ait ihale süreci Ortaca Belediye Başkanlığı gerçekleştirilecektir.
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2023	28.000.000	12.582.000	6.206.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2023	14.838.000	5.800.000	3.206.000	0	% 0,0	Protokol çalışmaları devam etmektedir.
	ÖÇK Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2023	10.027.000	3.647.000	3.000.000	0	% 0,0	Protokol çalışmaları devam etmektedir.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2022	15.000.000		12.000.000	0	% 0,0	
	Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri	2021-2022	14.999.000		11.999.000	0	% 0,0	Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (KOSKİ) ile Genel Müdürlüğümüz arasında Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri projesine ait mali katkı protokolü imzalanmıştır.
	Marmaris Kanalizasyon Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	2021-2021	1.000		1.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	11.300.000	6.800.000	4.500.000	69.030	% 1,5	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2021	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	% 0,0	*.Muğla ili, Marmaris İlçesi Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Hisarönü, Bayır ve Taşlıca Mahalleleri ile Datça İlçesi Kızlan Mahallesi, toplam 1943 ha alanda Halihazır harita Alımı ihalesi yapılmıştır.İhale bedeli 350.000 TL + KDV *.Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı/Kulmaç, İnsuyu/Uzuncayayla, Taşpınar/Aydınlık2 ve Taşpınar/Çandır Mahallelerinde toplam 240 ha alanda Halihazır harita Alımı ihalesi yapılmıştır. İhale bedeli 60.000 TL +KDV
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2021	5.965.000	3.965.000	2.000.000	69.030	% 3,5	Proje kapsamında 20 adet iş devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*: 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2021	735.000	235.000	500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 5 adet iş devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*: 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2021	2.100.000	1.100.000	1.000.000	0	% 0,0	Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka mahallesinde toplam 155 ha alanda imar uygulaması yapımına ilişkin toplama 385.000 (KDV Dahil) prtokol imzalanmıştır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	2021-2023	3.000.000		2.500.000	0	% 0,0	
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2021	800.000		800.000	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2021	800.000		800.000	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Sürüngenlerin Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması, İzlenmesi	2021-2023	1.400.000		900.000	0	% 0,0	İhalesi yapılacaktır.
2011K10-1460	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2021	4.196.000	3.121.000	1.075.000	0	% 0,0	
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	1.111.000	994.000	117.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanma aşamasında
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	758.000	641.000	117.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanma aşamasında
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	814.000	697.000	117.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanma aşamasında

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2016-2021	827.000	427.000	400.000	0	% 0,0	İhale çalışmaları devam etmektedir.
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2016-2021	262.000	172.000	90.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanma aşamasında
	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2020-2021	212.000	95.000	117.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanma aşamasında
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2020-2021	212.000	95.000	117.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanma aşamasında
2014K10-2121	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi (Çevre Sektörü)	2014-2022	141.238.000	91.238.000	40.000.000	0	% 0,0	Dip Çamuru tarama test çalışması başlamış olup tarama işlemi nisan ayı sonu itibarıyla başlayacaktır.
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Yönetimi-TVK Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	İklim Değişikliğinin Ekosistem Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması	2021-2023	3.500.000		1.225.000	0	% 0,0	Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde İklim Değişikliğinin Denizel ve Karasal Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması ve Uyum Kapasitesinin Artırılması Projesi için Teknik Şartname hazırlık aşaması tamamlanmakta olup ihale süreci başlatılacaktır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2022	2.524.000	825.000	950.000	128.502	% 13,5	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2022	2.075.000	825.000	650.000	0	% 0,0	İhale Hazırlık Süreci Devam Etmektedir.
	Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2020-2022	449.000	0	300.000	128.502	% 42,8	Yapılan Sözleşme Gereği %30 olan I. Hakediş Ödemesi Gerçekleşmiştir. Çalışmalar Devam Etmektedir.
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2023	924.000	162.000	338.000	0	% 0,0	Projenin % 50'lik kısmı gerçekleşmiş olup, 2021 yılı içerisinde diğer % 50 lik kısmının tamamlanarak bitirilmesi beklenilmektedir.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2023	5.007.000	92.000	1.628.000	0	% 0,0	01.01.2021-31.03.2021 tarihleri arasında 2020K10-152855 proje numarası altındaki projeler için hiçbir ödeme yapılmamıştır.
	Karaburun-İldır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2023	4.007.000	92.000	1.348.000	0	% 0,0	Projenin Karasal Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kısmı için 2020 yılı içerisinde % 15'lik kısmı tamamlanmış olup, 2021 yılı içerisinde % 30'luk kısmının tamamlanması beklenmektedir. Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi için ihale süreci devam etmektedir.
	Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2022	400.000	0	160.000	0	% 0,0	21.12.2020 tarihinde Sözleşmesi imzalanmış olup henüz hiçbir ödeme yapılmamıştır. 2021 yılı içerisinde projenin % 40'ının tamamlanması beklenmektedir.
	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2021-2023	600.000		120.000	0	% 0,0	Proje İhale sürecinde olup 19.04.2021 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161740	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (*Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2021-2021	350.000		350.000	0	% 0,0	Hizmet alım işi için ihale yapılmıştır. Sözleşme imzalanması süreci yürütülmektedir.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2022	1.000.000		405.000	0	% 0,0	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2022	650.000		300.000	0	% 0,0	İhale Hazırlık Çalışmaları Devam Etmektedir.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2022	350.000		105.000	0	% 0,0	İhale Hazırlık Çalışmaları Devam Etmektedir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2021-2023			3.000.000	0	% 0,0	
<b>17 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>237.340.000</b>	<b>125.620.000</b>	<b>77.930.000</b>	<b>197.532</b>	<b>% 0,3</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>15.350.000</b>	<b>0</b>	<b>12.350.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>252.690.000</b>	<b>125.620.000</b>	<b>90.280.000</b>	<b>197.532</b>	<b>% 0,2</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2021	5.530.000	5.100.000	430.000	0	% 0,0	
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	9.339.000	2.000.000	1.070.000	0	% 0,0	
2021K07-160009	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 199) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	1.604.308.000		1.604.308.000	0	% 0,0	2021 yılı için Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesine ayrılan 1.604.308.000 TL ödenegın kullanılmasına dair usul ve esaslar hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı henüz çıkmadığından harcama yapılmamıştır.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.619.177.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

Dipnot: 199

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

## MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K01-140379	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2021-2021	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2021-2021	100.000		100.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2021-2021	100.000		100.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2021-2021	2.800.000		2.800.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2021-2023			3.242.000	342.600	% 10,6	Milli Emlak merkez ve taşra birimleri tarafından izale-i şuyuu ihalelerinde kullanılmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)				0			
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.242.000</b>	<b>342.600</b>	<b>% 10,6</b>	



## STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	58.308.000	203.000	2.005.000	0	% 0,0	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2017-2024	41.770.000	0	5.000	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*Döner Sermaye)	2020-2021	1.203.000	203.000	1.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2021-2023	15.335.000	0	1.000.000	0	% 0,0	İhaleye ilişkin işlemler il müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
2021K09-161848	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2021-2021	3.400.000		3.400.000	504.298	% 14,8	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2021-2021	3.400.000		3.400.000	116.043	% 3,4	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2021-2021	850.000		850.000	0	% 0,0	3 adet "T05-Minibüs" tipi taşıtın edinilmesine ilişkin 09.03.2021 tarihli ve 3594 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı alınmıştır. DMO üzerinden alım işlemleri devam etmektedir. Taşıtlar; Eskişehir, İstanbul ve Van İl Müdürlüklerine tahsis edilecektir.

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K09-165747	Şehircilik Hizmetleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2021	9.380.000		9.380.000	0	% 0,0	Bakanlık tarafından yürütülen diğer projelerde ödeneye ihtiyaç duyulması durumunda bu projeden karşılanacaktır.
	Genel Bütçe Ödeneği	2021-2021	6.800.000		6.800.000	0	% 0,0	
	Döner Sermaye Ödeneği	2021-2021	2.580.000		2.580.000	0	% 0,0	
2021G00-161814	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2021-2021	2.300.000		2.300.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>15.900.000</b>	<b>0</b>	<b>15.900.000</b>	<b>620.341</b>	<b>% 3,9</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>61.738.000</b>	<b>203.000</b>	<b>5.435.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>77.638.000</b>	<b>203.000</b>	<b>21.335.000</b>	<b>620.341</b>	<b>% 2,9</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 31.03.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021G00-161814	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2021-2021	190.000		190.000	0	% 0,0	
2021K09-161848	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2021-2021	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2021-2021	100.000		100.000	0	% 0,0	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
