



# 2021 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 4. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 Dönemi)



# BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2021 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.612.347.000,00</b>	<b>1.771.669.165,77</b>	<b>1.748.509.613,27</b>	<b>% 98,7</b>
02	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>274.484.000,00</b>	<b>306.361.192,10</b>	<b>297.047.795,71</b>	<b>% 97,0</b>
03	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>114.221.000,00</b>	<b>385.692.732,34</b>	<b>331.894.291,39</b>	<b>% 86,1</b>
05	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>674.912.000,00</b>	<b>2.388.938.456,82</b>	<b>2.384.907.379,50</b>	<b>% 99,8</b>
	Kentsel Dönüşüm Ödeneği - Özel Ödenek	458.000.000,00	783.600.000,00	783.600.000,00	<b>% 100,0</b>
	Kentsel Dönüşüm Ödeneği - Ek Ödenek	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	<b>% 100,0</b>
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	170.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	<b>% 100,0</b>
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	39.000.000,00	40.780.805,79	40.068.529,21	<b>% 98,3</b>
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	0,00	187.000.000,00	186.813.568,80	<b>% 99,9</b>
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	0,00	801.386.000,00	801.386.000,00	<b>% 100,0</b>
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	7.912.000,00	16.171.651,03	13.039.281,49	<b>% 80,6</b>
06	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>407.939.000,00</b>	<b>3.851.432.685,05</b>	<b>3.604.563.700,79</b>	<b>% 93,6</b>
	Bakanlık Yatırım Programı	391.835.000,00	387.902.279,33	337.555.460,31	<b>% 87,0</b>
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.104.000,00	129.890.000,00	120.649.268,16	<b>% 92,9</b>
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	61.159.000,00	61.038.141,68	<b>% 99,8</b>
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	3.272.481.405,72	3.085.320.830,64	<b>% 94,3</b>
07	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>276.711.000,00</b>	<b>1.536.825.611,74</b>	<b>1.472.504.506,93</b>	<b>% 95,8</b>
	Bakanlık Yatırım Programı	96.711.000,00	96.711.000,00	33.498.821,60	<b>% 34,6</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	180.000.000,00	455.000.000,00	454.991.852,16	<b>% 100,0</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	154.614.611,74	153.528.501,21	<b>% 99,3</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye-IPA	0,00	24.500.000,00	24.485.331,96	<b>% 99,9</b>
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	206.000.000,00	206.000.000,00	<b>% 100,0</b>
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	<b>% 100,0</b>
08	<b>BORÇ VERME</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>9.107.181,38</b>	<b>% 51,9</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>3.378.164.000,00</b>	<b>10.258.469.843,82</b>	<b>9.848.534.468,97</b>	<b>% 96,0</b>



# BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

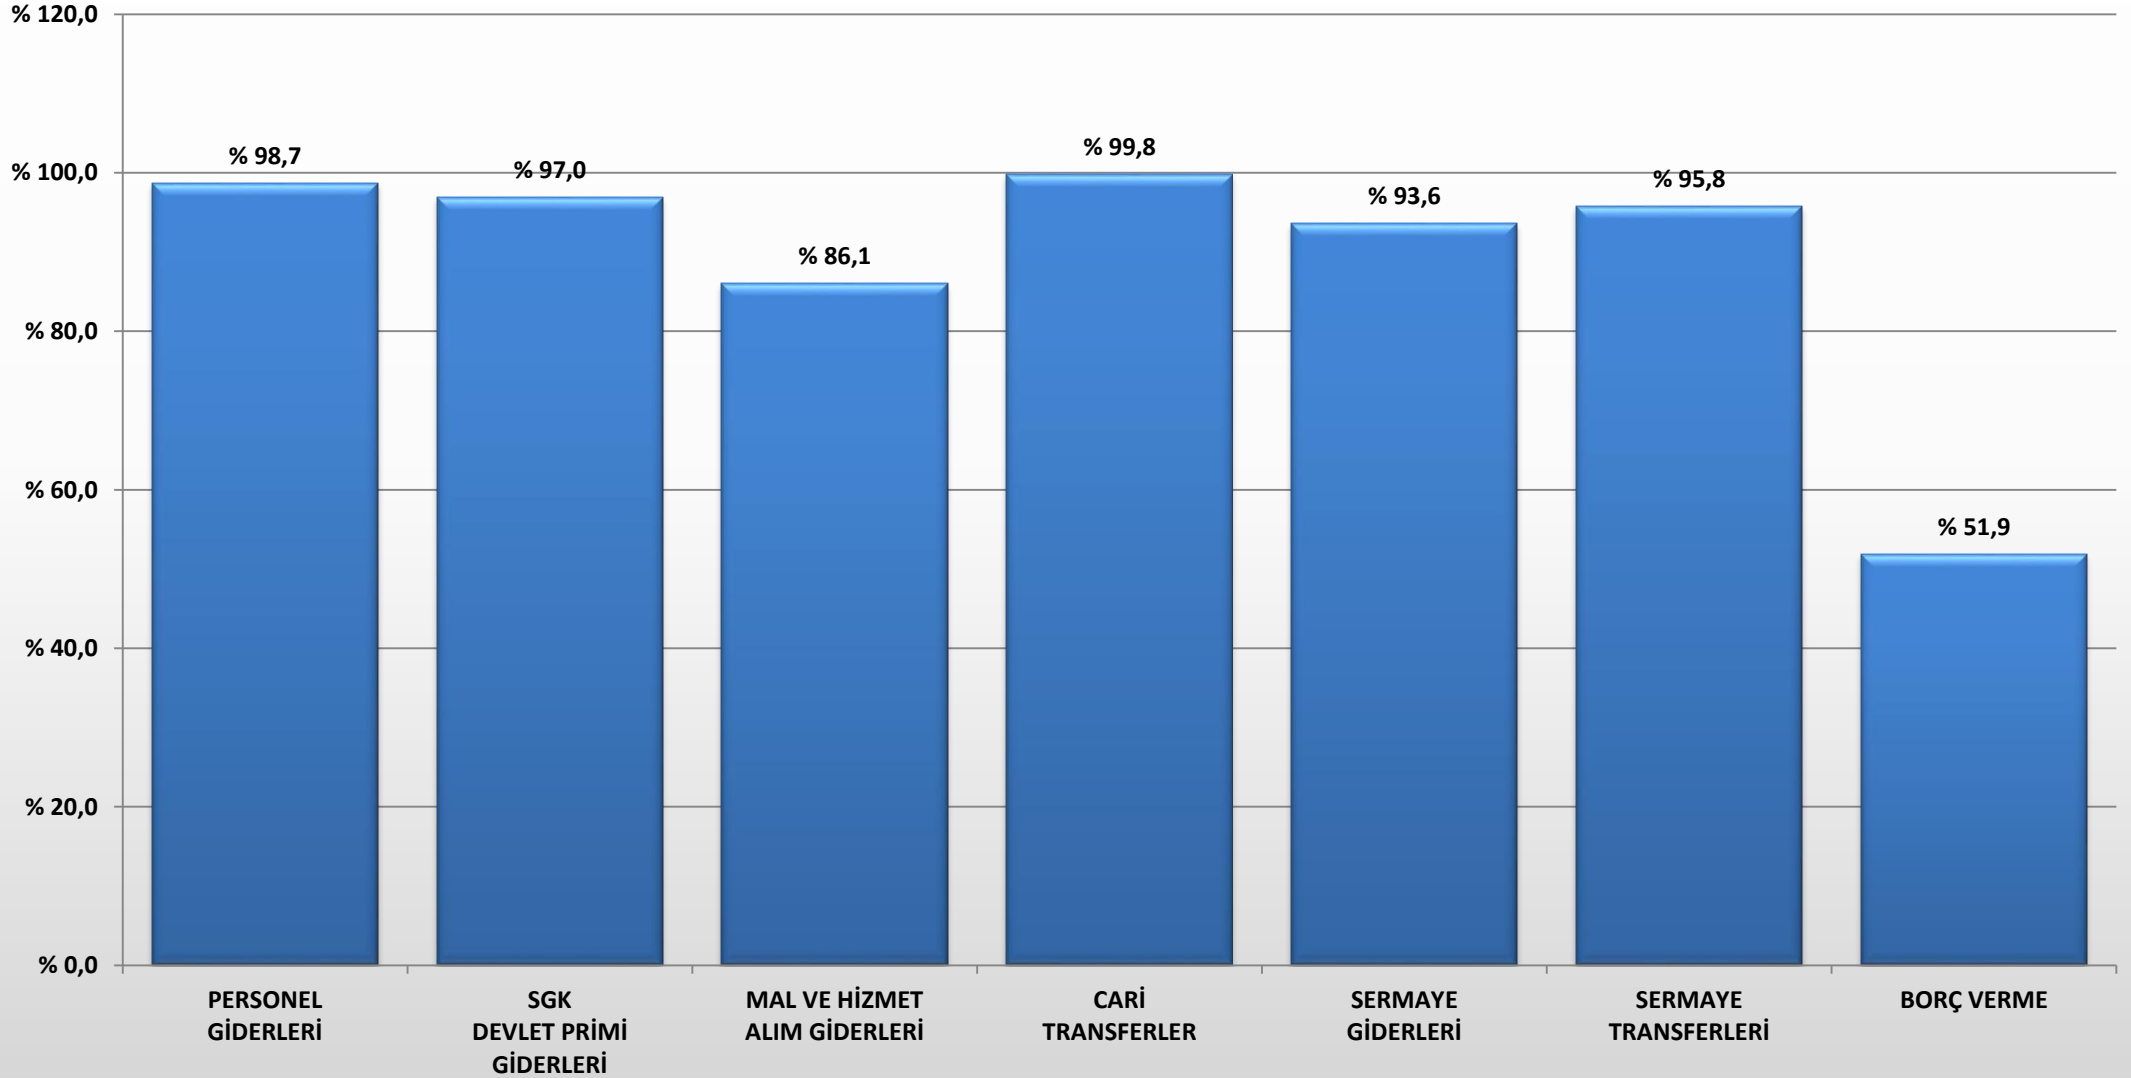




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ

## 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2021 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2021 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	45.720.000,00	19.300.000,00	11.492.912,00	% 59,5
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	10	616.367.000,00	72.536.000,00	12.974.577,00	% 17,9
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	5	211.997.000,00	32.190.000,00	23.509.850,00	% 73,0
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	21	5.131.894.111,00	323.943.000,00	295.015.045,25	% 91,1
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	2	7.500.000,00	501.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	3	3.485.000,00	1.460.000,00	444.714,54	% 30,5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	8	119.413.000,00	48.475.000,00	35.402.091,52	% 73,0
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	3.355.191.000,00	7.767.000,00	3.830.529,00	% 49,3
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	20	261.690.000,00	59.280.000,00	48.196.051,07	% 81,3
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	1.619.177.000,00	1.500.000,00	457.840,00	% 30,5
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	3.000.000,00	3.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	36.157.000,00	17.000.000,00	16.854.856,00	% 99,1
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	172.244.000,00	20.735.000,00	14.150.017,65	% 68,2
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	390.000,00	390.000,00	197.521,00	% 50,6
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>83</b>	<b>11.584.225.111,00</b>	<b>605.080.000,00</b>	<b>462.526.005,03</b>	<b>% 76,4</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>69</b>	<b>11.233.180.111,00</b>	<b>518.400.000,00</b>	<b>397.102.719,26</b>	<b>% 76,6</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>14</b>	<b>351.045.000,00</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>65.423.285,77</b>	<b>% 75,5</b>
<b>"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği</b>	<b>4 adet</b>		<b>129.890.000,00</b>	<b>120.649.268,16</b>	<b>% 92,9</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

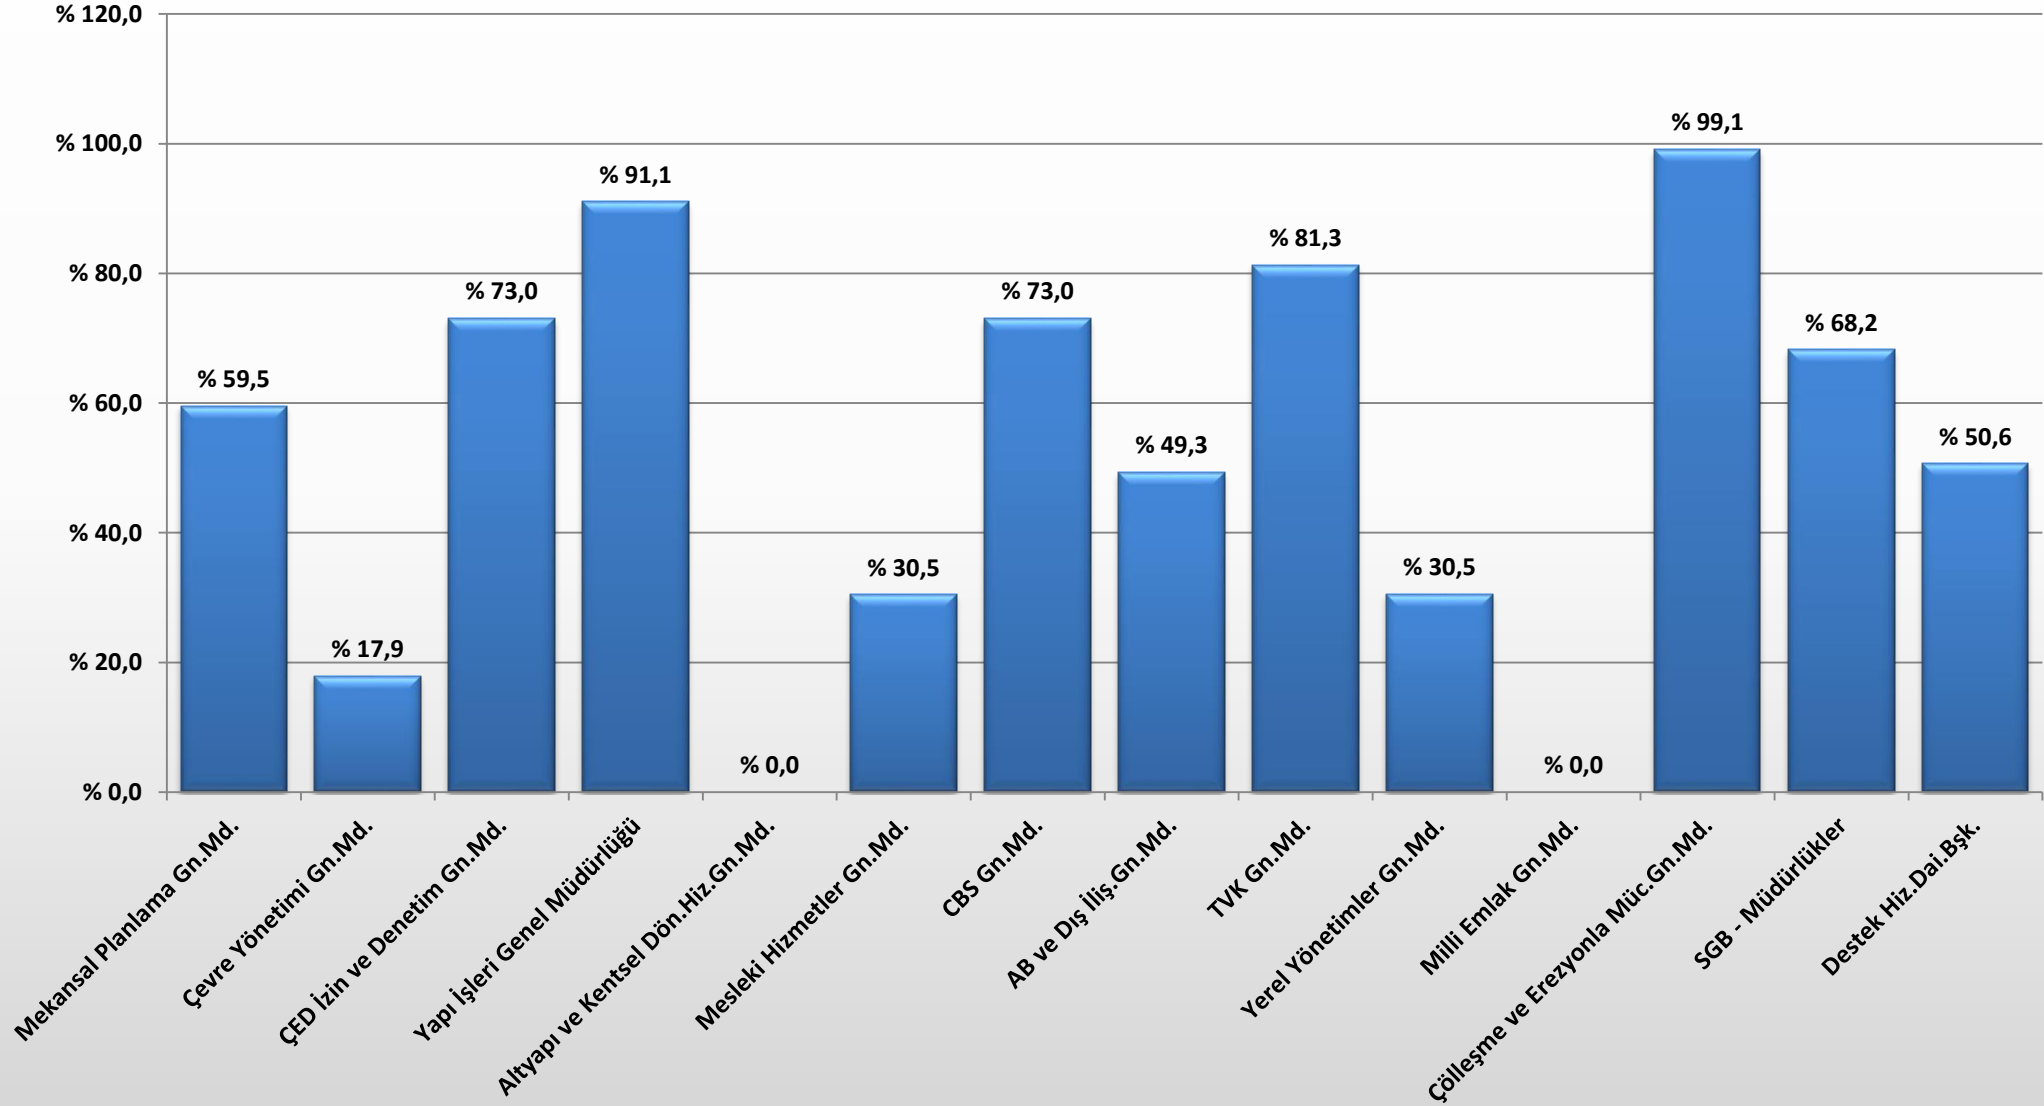




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2021 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	47.329.000,00	47.320.200,00	38.705.725,46	% 81,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	285.203.000,00	1.731.185.211,74	1.668.312.706,14	% 96,4
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	83.515.000,00	91.693.100,00	84.901.898,66	% 92,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	356.239.000,00	1.107.113.199,26	1.078.179.762,98	% 97,4
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	483.952.000,00	1.417.823.400,00	1.416.626.673,92	% 99,9
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	25.151.000,00	24.260.000,00	22.858.574,77	% 94,2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	41.845.000,00	46.747.400,00	38.036.121,80	% 81,4
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	52.243.000,00	60.456.805,79	55.248.509,09	% 91,4
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	103.830.000,00	64.824.950,00	54.002.474,52	% 83,3
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	9.717.000,00	10.960.800,00	9.432.778,65	% 86,1
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	95.475.000,00	162.304.500,00	154.894.897,57	% 95,4
Personel Genel Müdürlüğü	8.314.000,00	10.737.000,00	10.511.795,79	% 97,9
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	8.604.000,00	315.235.000,00	272.469.919,92	% 86,4
Özel Kalem Müdürlüğü	39.504.000,00	11.596.900,00	10.619.236,74	% 91,6
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	68.048.000,00	96.808.829,68	94.392.969,68	% 97,5
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	3.375.000,00	3.623.200,00	3.300.291,02	% 91,1
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	13.463.000,00	19.932.700,00	19.558.424,67	% 98,1
Strateji Geliştirme Başkanlığı	184.591.000,00	169.764.500,00	168.450.246,41	% 99,2
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.473.000,00	1.614.000,00	1.431.394,97	% 88,7
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	4.182.000,00	9.238.000,00	8.915.138,02	% 96,5
İl Müdürlükleri	1.462.111.000,00	4.855.230.147,35	4.637.684.928,19	% 95,5
<b>TOPLAM</b>	<b>3.378.164.000,00</b>	<b>10.258.469.843,82</b>	<b>9.848.534.468,97</b>	<b>% 96,0</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

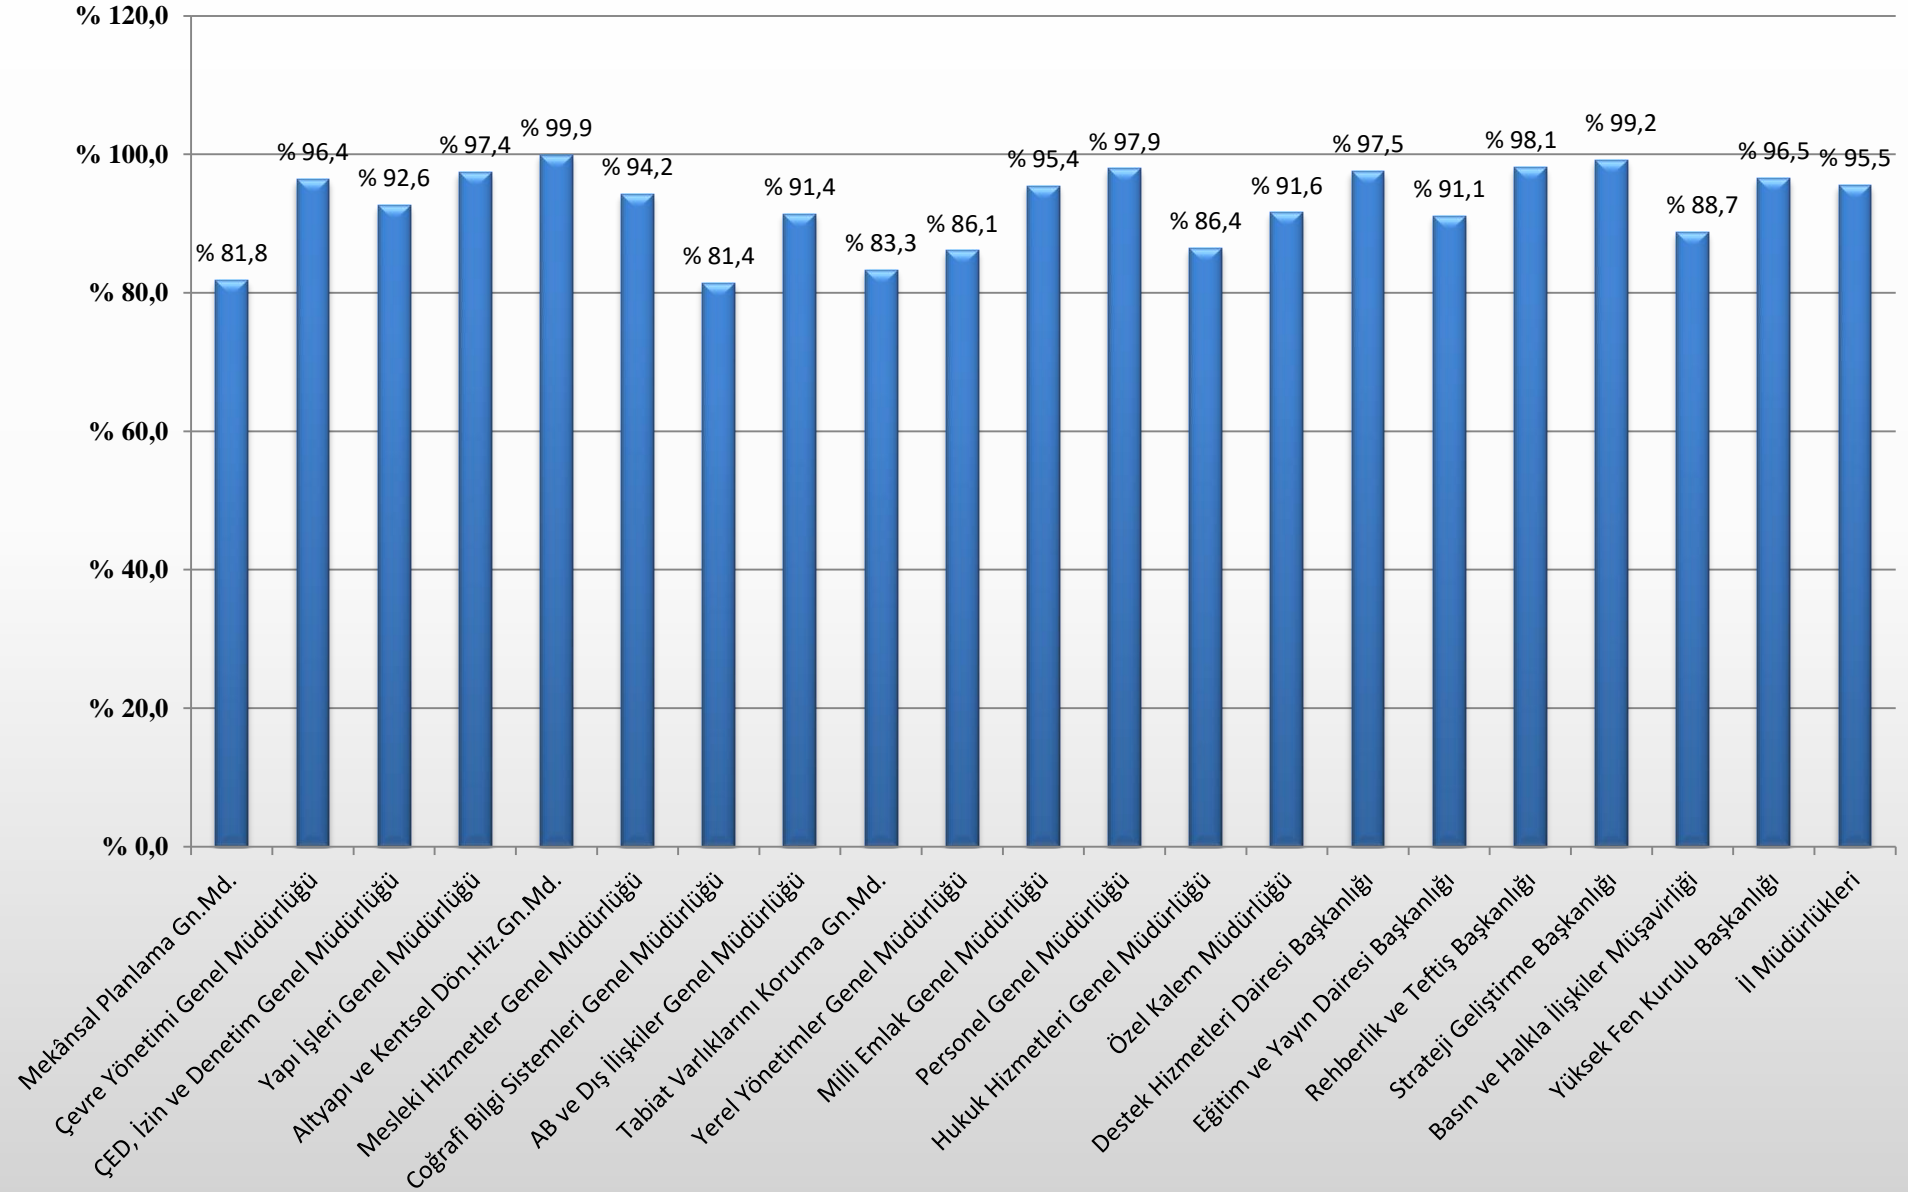

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı**

**Harcama Birimi Bazında**

**2021 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri**

**01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021**



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3798	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	6.620.000	2.720.000	3.900.000	3.444.024	% 88,3	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2021	4.600.000	2.400.000	2.200.000	2.063.139	% 93,8	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi işi 3.aşama ödemesi 1.001.138,73 TL ve 4. aşama 1.062.000,00 TL yapılmıştır.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama	2017-2021	2.020.000	320.000	1.700.000	1.380.886	% 81,2	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Danışma Hizmet Alımı işi kapsamında 436.886,16 TL ve 3.aşama ödemesi 283.200,00 TL, 4.aşama ödemesi 660.800,00TL yapılmıştır.
2020K09-150347	Yaşanabilir Şehirler Kriterleri Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2020-2021	850.000	0	850.000	0	% 0,0	
	Türkiye Yaşanabilir Kentler Endeksi ve Beratı	2020-2021	500.000	0	500.000	0	% 0,0	
	Yeni Planlama Modeline İlişkin Yatay Mimari Taramaları	2020-2021	350.000	0	350.000	0	% 0,0	
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2023	4.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	

## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-18078	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	13.250.000	6.000.000	3.750.000	3.554.263	% 94,8	Karabük-Safranbolu Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1. aşama 50.622,00 TL, 2. aşama 75.933,00 TL ve 3. aşama 126.555,00 TL yapılmıştır. Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulamaları Projesi 2.aşama 352.772,80 TL ve 3.aşama ödemesi 939.399,72 TL yapılmıştır. Denizli İli Acıpaayam İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında 207.160,80 TL ödeme yapılmıştır. Tekirdağ Süleymanpaşa Örnek İmar Uygulamaları kapsamında 2.aşama ödemesi 108.076,20TL yapılmıştır. Ordu- Ünye Örnek İmar Uygulamaları kapsamında ödemeler 2.aşama ödemesi 290.280,00 TL yapılmıştır. Burdur İli Karamanlı İlçesi Örnek İmar Uygulamaları kapsamında 1. Aşama ödemesi 289.100,00TL yapılmıştır. Amasya İli Merkez Suluova İlçesi Örnek İmar Uygulamaları kapsamında 3. Aşama ödemesi 140.656,00 TL yapılmıştır. Sivas İli Merkez İlçesi Örnek İmar Uygulamaları kapsamında 2.aşama ödemesi 276.592,00 TL yapılmıştır. Muğla Mentеше Örnek İmar Uygulamaları Projesi 2. aşama 111.421,50 TL yapılmıştır.
	2. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2019-2021	6.750.000	6.000.000	750.000	700.000	% 93,3	Samsun İli Tekkeköy İlçesi Örnek İmar Uygulama işi 2.aşama ödemesi 88.854,00 TL yapılmıştır. Düzce İli Merkez İlçesi Örnek İmar Uygulama işi 3.aşama ödemesi 107.970,00 TL yapılmıştır. Yozgat Sorgun İmar Uygulamaları Projesi Kapsamında 206.205,00 TL ödeme yapılmıştır.
	3. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2021-2022	6.500.000	0	3.000.000	2.854.263	% 95,1	Amasya İli Merkez Suluova ve Gümüşhacıköy İlçeleri İmar Uygulama işi kapsamında 105.492,00 TL ödeme yapılmıştır. Eskişehir İli Han İlçesi Örnek İmar Uygulamaları kapsamında 1. Aşama ödemesi 77.172,00 TL yapılmıştır.
2018K09-3803	Bütünleşik Kıyı Alanlarının Planlaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	2.600.000	300.000	1.300.000	732.249	% 56,3	
	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2021	1.000.000	300.000	700.000	434.889	% 62,1	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları işinin 2. aşama ödemesi 167.265,00TL, 3.aşama ödemesi 133.812,00 TL ve 4.aşama ödemesi 133.812,00TL olarak yapılmıştır.
	İzmit-Sakarya-Düzce Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	700.000	0	200.000	101.185	% 50,6	İzmit-Sakarya-Düzce Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı işi ödemesi 101.185,00TL yapılmıştır.

**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Zonguldak-Bartın-Kastamonu Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	900.000	0	400.000	196.175	% 49,0	Zonguldak-Bartın-Kastamonu Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı işİ ödemesi 196.175,00 TL yapılmıştır.

## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2023	14.400.000	1.000.000	4.500.000	3.172.376	% 70,5	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2022	5.000.000	1.000.000	2.500.000	2.490.000	% 99,6	Yazılım Geliştirme ve Güncelleme Hizmeti İşi kapsamında 2.Aşama 647.400,00 TL , 3.Aşama 348.600,00 TL ve 4.aşama ödemesi 1.494.000,00 TL yapılmıştır.
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2023	9.400.000		2.000.000	682.376	% 34,1	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması projesinden tarama ve baskı makinası alımı yapılarak 140.125,00 TL ödeme yapılmıştır. İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi 1.aşama ödemesi 249.452,00 TL ve 2.aşama ödemesi 292.799,06 TL yapılmıştır.
2021K09-162464	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2022	4.000.000		3.000.000	590.000	% 19,7	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterler 1. aşama ödemesi 590.000 TL yapılmıştır.
<b>7 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>45.720.000</b>	<b>10.020.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>11.492.912</b>	<b>% 59,5</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-3796	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	2.250.000	750.000	1.500.000	1.492.080	% 99,5	Protokol ve teknik şartname çerçevesinde projeye ilişkin hazırlanan iş programı 17/02/2020 tarihli ve 73615618-145.05-E.40800 sayılı yazımız ile uygun görülmüş ve iş başlatılmıştır. Proje süresi 700 takvim günüdür. 09/12/2020 tarihinde iş programı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün revize talebi sebebiyle ek protokol imzalanmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 22.07.2020 ve 30343279-045.99-E.384026 sayılı yazısı uyarınca söz konusu projede 120 günlük süre uzatımı talebi bildirilmiş olup 01/06/2021 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Ek protokole göre işin süresi 820 (sekiz yüz yirmi) takvim günüdür. Protokol ve iş programı çerçevesinde 11 adet kılavuz ve yönetici özet kitapçığı hazırlanmış, atık karakterizasyonu kılavuzu taslağı hazırlanmış, mevcut durum raporu ve nihai rapor hazırlanmıştır.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2024	400.000.000	140.000.000	54.950.000	0	% 0,0	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneginden harcama yapılmamıştır.
2018K10-18297	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2021	1.687.000	987.000	700.000	460.000	% 65,7	Proje çalışmaları (COVID19 salgını ve döviz maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak yapılamayan teknik ziyaretler Yüklenci ile alınan ortak karar kapsamında Projenin çıkarılmıştır.) Aralık-2021'de tamamlanmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2022	6.750.000	3.350.000	3.100.000	2.022.913	% 65,3	
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi	2018-2021	4.000.000	2.600.000	1.400.000	1.391.810	% 99,4	Proje; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmüştür. 27.06.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi kapsamında 5. gelişme raporu sonrasında covid-19 tedbirleri dolayısıyla ek protokol ile süre uzatımı süreci gerçekleştirilmiştir. Hava Emisyon Konulu Çevre izin sayısallaştırılması işlemleri gerçekleştirilmiştir, süreç veri yönetimine ilişkin olarak sürdürülmektedir. HEY portalı veri tabanında, 2021 yılı sonu itibarıyla itibarıyla yaklaşık 7000 sanayi tesisine ait kirletici bilgileri kayıt altındadır. Konya, Samsun, İzmir, Adana, Erzurum ve İstanbul bölgesel hava kalitesi yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi modelleme eğitimleri Bakanlığımız ilgili personeli, Temiz Hava Merkezleri personeli, çeşitli üniversitelerden görevlendirilen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Temiz Hava Merkezlerince yazılım üzerinden aktivite kodu güncelleme işlemleri yapılmıştır. 2020/25 sayılı Bakanlığımız Genelgesi kapsamında Katı Yakıt Modülü devreye alınmış olup e-imza ile belgelendirme süreci başlatılmıştır. Kullanıma açılmasından bu yana 13255 adet elektronik belge düzenlenmiş olup sistemde aktif 2784 kullanıcı kayıtlıdır. Projenin modüllerine esas teknik çalışma toplantıları ile birlikte idari toplantılar gerçekleştirilmiştir. Projenin muayene kabul işlemleri tamamlanmış olup ödeme işlemleri için işin bütünü bozmayan eksikliklerin giderilmesi beklenmektedir.
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi	2018-2022	1.750.000	750.000	900.000	631.103	% 70,1	Proje; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında, Ege Üniversitesi ile yapılan Protokol çerçevesinde, 1 Aralık 2020 yılında başlamış olup, 21.04.2021 tarihinde ek protokol düzenlenerek proje bitiş tarihi 11 Kasım 2022 tarihine uzatılmıştır. Projede; kamu, özel sektör ve yerel yönetimlere yönelik anket çalışmaları , mevcut durum analizi, proje açılış toplantısı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 3 adet değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Saha ziyaretlerinin %35'i gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretleri kapsamında teknik raporlar sunulmuştur. Polonyaya 1 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretinin teknik raporu hazırlanmıştır. 29 Eylül 2021 tarihinde ara rapor sunulmuştur. 2021 yılının ilk ödemesi ve proje kapsamındaki ikinci hakediş için muayene kabul işlemleri tamamlanmıştır. 534.833,34 TL (KDV hariç) emanete alınmış olup, ödeme işlemleri için işin bütünü bozmayan eksikliklerin giderilmesi beklenmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2022	1.000.000	0	800.000	0	% 0,0	Proje için; Cumhurbaşkanlığınca ihale edilebilecek mitar verilmediğinden (1000 TL ödenek verildi.) ihale çıkılamamıştır. Sonraki yıldada ilk yıl verilen proje bedelinden daha düşük ödenek verilmesi nedeniyle projeye teklif veren olmamıştır. Bu nedenle ödenek artırılması talebinde bulunulmuş olup, ödeneğin artırılması durumunda, 2022 yılında projenin başlaması planlanmaktadır.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2023	7.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi hazırlanmış olup, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Yönetimi-TVK Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme	2016-2021	5.480.000	3.480.000	2.000.000	1.910.499	% 95,5	Proje tamamlandı.
Alt proje-2	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB-1)	2018-2022	13.340.000	8.691.000	3.130.000	2.546.836	% 81,4	IPA II programı kapsamında 2018K100610 proje numaralı "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Avrupa Birliği ve Bakanlığımız eş finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmektedir. Proje 09.10.2019 tarihinde başlamıştır. Projenin ilk ilerleme raporu 17.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.Proje kapsamında Muğla, Samsun, Sakarya ve Konya Büyükşehir Belediyeleri pilot belediyeler olarak seçilmiş olup belediyelerin eylem planlarının ve etki etkilenebilirlik analizlerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Hibe başvuruları toplanmış ön başvuruların incelenmesi tamamlanarak proje bileşenleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ulusal Uyum Platformunun teknik arka plan ve kullanıcı arayüzünü içeren tasarım süreci sona ermiş olup, platformu yayınlama çalışmaları ayrıca sürdürülmektedir.
AB katkısı			75.591.000	49.502.000	19.265.000	19.265.000	% 100,0	



**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	EKÖK Kapsamında Atık İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi	2020-2022	2.250.000	400.000	750.000	400.000	% 53,3	Protokol Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında 16.11.2020 tarihinde imzalanmış, proje başlatılmıştır.Sektörel Envanterin Güncellenmesi Nihai Raporu idareye sunulmuştur. Bu kalemlere esas ödeme Haziran 2021'de yapılmıştır. Proje kapsamında eğitim ve saha ziyaretleri devam etmektedir. MET Kontrol Listeleri hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	5.458.000	2.182.000	1.092.000	1.092.000	% 100,0	PA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmıştır. Proje kapsamında 2021 yılı 4. döneminde, 2. Eğitimcilerin Eğitimi Programı Antalya'da yüz yüze gerçekleştirilmiş, mineral ve kimya sektörü özelinde Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Samsun, Yalova, Kocaeli, Antalya ve Eskişehir illerinde 34 adet tesise saha ziyareti yapılmıştır. Bakanlık personeline saha ziyaretleri öncesinde 13 adet çevrimiçi proses eğitimi gerçekleştirilmiştir. 3 adet Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı ile 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 1. Farkındalık Semineri 24-25.11.2021 tarihlerinde Bolu ilinde farklı sektörlerden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Türkçe MET Kontrol Listeleri, EKÖK Güncel Envanteri, Revize 1. UEP Raporu, EKÖK Sertifikasyon Şablonları ile 2. İlerleme Raporu Sözleşme Makamına sunulmuş ve onaylanmıştır.
AB katkısı			30.924.000	12.372.000	6.184.000	6.184.000	% 100,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18333	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Arttırılması (CITYAIR) (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2021	4.244.000	2.971.000	1.273.000	1.251.565	% 98,3	Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CITYAIR) Projesi; 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlamıştır. Açılış toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşlarının katılım sağladığı Yönlendirme Komitesi Toplantıları ile onbir kez biraraya gelinmiştir. Aktivitelere göre hazırlanması beklenen raporların teslimi gerçekleştirilmiştir. Covid-19 tedbirlerine bağlı olarak ve proje bileşenleri temsilcilerinin uzaktan çalışmasına bağlı şekilde, bazı aktivite raporlarının teslim süreleri uzatılmıştır. Emisyon envanteri çalıştaylar serisi tamamlanmıştır. Projenin 5. İlerleme raporu teslim edilmiş durumdadır ve onaylanmıştır. 2021 yılı başından itibaren aylık koordinasyon toplantıları ve 11. yönlendirme komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Emisyon yönetim stratejilerine yönelik olan teknik çalışmalar 31 ilin Temiz Hava Eylem Planlarının güncellenmesi amacıyla sürdürülmektedir. Projenin, covid-19 pandemisi nedeniyle uluslararası tedbirlere bağlı olarak aktivitelerinin şartnamede belirtilen şekilde gerçekleştirilmesini teminen, 4 ay uzatma (Addendum süreci ile) yapılmıştır. Üniversitelerde farkındalık seminerlerinin sonuncusu sınav dönemi ve pandemi tedbirleri nedeniyle 2022 yılına ertelenmiştir. Teknik çalıştaylar serisinin; hava kirliliğinin önlenmesi başlığında tümü çevrimiçi şekilde 4 ayrı planlama ile gerçekleştirilmiştir. Teknik aktiviteler ve kamuoyu farkındalığı için planlanan aktiviteler için çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 yılı Dünya Temiz Hava Günü anısına Ankara'da bir okul seçilerek, öğrenciler için hava kalitesi farkındalık faaliyetleri, kamu spotu tanıtımı ve boyama etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Gaziantep'te 2021 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası için düzenlenen ve Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyete proje nezdinde katılım sağlanmıştır. Kamu spotu ve görsel iletişim amaçlı hazırlanacak materyal ve içerik çalışmaları tamamlanmış ve dağıtımı, paylaşılması ve işbirliği için kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Online kurs platformu içerisinde hava kalitesine esas ders içerikleri hazırlanmış, video-seslendirme çekimleri düzenlenmektedir. Modelleme çalışmaları 31 ili kapsayacak şekilde olmak üzere ve hava kalitesi tahminleme çalışmaları 2021 Eylül ayını takiben yürütülmektedir.
AB katkısı			24.048.000	16.836.000	7.212.000	7.212.000	% 100,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2022	3.639.000	1.977.000	451.000	450.998	% 100,0	Dördüncü Yönlendirme Kurulu Toplantısı 07.10.2021 tarihinde tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Faaliyet 2.5., 2.6. ve 2.7. kapsamında iyileştirme çalışmaları yürütülecek kalıcı organik kirleticiler ile kirlenmiş iki pilot saha için ihale dosyası hazırlığı tamamlandı. IPA Birimi, her iki saha için hazırlanan Teknik Şartname, Operasyonel Plan, Süpervizyon, İzleme ve İyileştirme Sonrası Plan'ı 03.12.2021 tarihinde onayladı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun görüşlerine sundu. KOK'larla kirlenmiş sahalar ve KOK stokları arasındaki ilişkiyi anlatan proje videosu taslak olarak hazırlandı. KOK'lar/Kalıcı Toksik Kimyasallar ile Kirlenmiş Sahaların Önceliklendirilmesi Raporu taslak olarak hazırlandı. Dördüncü Faaliyet Raporu ve İkinci İlerleme Raporu taraflara sunuldu.
AB katkısı			20.615.000	11.201.000	3.436.000	3.436.000	% 100,0	KSBS Yardım Masası uygulaması Ekim 2021 tarihi itibarıyla canlı kullanıma açıldı. Bildirim No:8 kararıyla proje dokümanına eklenen dört hibrit eğitim Ekim-Aralık 2021 tarihlerinde COVID önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Buna göre Sağlık ve Ekolojik Risk Değerlendirilmesi Eğitimleri 11-13 Ekim 2021 ve 1-3 Kasım 2021 tarihlerinde ve Teknoloji Alternatifleri, İslah ve İzleme Eğitimleri 22-24 Kasım 2021 ve 13-15 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlendi. Bu eğitimlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve il müdürlüklerinden temsilciler katıldı. Kilit Uzman-2 tarafından geliştirilen Sağlık Risk Analiz Yazılımı ve kullanıcı kılavuzu taslak olarak hazırlandı. Yazılım altyapısı için güncelleme çalışmaları 2022 yılında devam edecek.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K10-92594	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2019-2021	2.366.000	776.000	1.590.000	1.347.686	% 84,8	1 Kasım 2019 yılında başlamış olan ve iki yıl süren proje 31 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Projede, 2021 yılının 4. çeyreğinde gerçekleştirilen faaliyetler şöyledir: Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi Raporlama Sistemi (KGDRS) nihai hale getirilmiş ve KKS'ye entegre edilerek firmaların kullanımına sunulmuştur. KGDRS'ye ilişkin olarak Bakanlık Kimyasallar Yönetimi Dairesi personeline yönelik bir çalıştay 4 Ekim 2021'de gerçekleştirilmiştir. 2021 Ekim ayında sanayiciler ve yerel otoriteler için iki farklı bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir. İlk seminer 14 Ekim 2021'de İzmir'de düzenlenmiştir. İkinci seminer 15 Ekim 2021'de İstanbul'da düzenlenmiş ve ayrıca Youtube üzerinden canlı yayınlanmıştır. Seminerlere fiziki olarak 82 kişi katılım sağlamış ve 488 kişi canlı izlemiştir. Projenin kapanış semineri, Bakanlığımıza, paydaşlar ve hedef gruplardan temsilcilerin katılımı ile 26 Ekim 2021'de Ankara'da düzenlenmiştir. Sınıflandırma ve etiketleme envanterinin halka açılmasına yönelik sistem hazırlanmıştır. Projenin Final Raporu sunulmuş ve revize hali onaylanmıştır.
AB katkısı			10.995.000	4.398.000	6.597.000	6.597.000	% 100,0	
<b>10 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>454.464.000</b>	<b>165.564.000</b>	<b>72.536.000</b>	<b>12.974.577</b>	<b>% 17,9</b>	
<b>AB KATKISI</b>			<b>162.173.000</b>	<b>94.309.000</b>	<b>42.694.000</b>	<b>42.694.000</b>	<b>% 100,0</b>	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)	2014-2023						
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2023	192.127.000	119.753.000	22.675.000	16.974.321	% 74,9	
	Genel Bütçe Ödeneği		125.052.000	60.603.000	19.425.000	16.974.321	% 87,4	Hava kalitesi izleme istasyonları için sarf yedek malzeme ihtiyacına yönelik ihale gerçekleştirilerek, Muayene ve Kabul Süreci tamamlanmıştır. 3 adet Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarına ait bakım onarım ve kalibrasyon sözleşmesi imzalanmış olup, bakım, onarım ve kalibrasyon iş ve işlemleri aylık olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda sözkonusu bakım onarımlar 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri tarafından bölgesel olarak yapılmakta olup ilgili birimlerce hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ulusal hava kalitesi izleme ağına ilave edilmek üzere 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurulumu için ihale gerçekleştirilerek, Muayene ve Kabul Süreci tamamlanmıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		67.075.000	59.150.000	3.250.000	0	% 0,0	
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2021-2023	3.500.000		1.000.000	0	% 0,0	İhale fiyatı yaklaşık maliyetin üstünde olduğundan, ihale iptal edildi.
Alt proje-3	Güneydoğu THMM Hava Kalitesi Ön Değerlendirme	2021-2022	2.750.000		1.250.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet, işe ait ödenekten yüksek olduğu için iptal edildi.
2020K10-140875	Çevre Referans Laboratuvarı Altyapı Revizyonu (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2020-2022	8.470.000	0	4.140.000	4.035.836	% 97,5	Proje kapsamında Numune Kabul ve Ön İşlem Birimi, Yakıt Analizleri Ön İşlem Laboratuvarı ve Yakıt Analiz Laboratuvarı'nın revizyonu tamamlanmış olup, cihaz/ekipman tedarigi ve Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı revizyonu devam etmektedir.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18384	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000.000	750.000	2.250.000	1.864.853	% 82,9	Şartname'de belirtilen hususlar yerine getirilmiş olup, 21.12.2021 tarihinde Projenin kapanış toplantısı yapılarak Protokol-Ek Protokol'de belirlenen ödeme işlemleri %100 oranında gerçekleştirilmiştir.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.550.000		575.000	339.840	% 59,1	Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Kriter Belirleme Çalışmalarına Yönelik HizmetAlımı İşi kapsamında Protokol bedelinin %20'lik kısmına tekabül eden 1. hakediş ödememiz (3. ödeme döneminde) KDV dahil 169.920TL ve Protokol bedelinin %20'lik kısmına tekabül eden 2. hakediş ödememiz KDV dahil 169.920TL ödeme gerçekleşmiştir.
2021K10-169535	Hava Kirliliği Kaynakları ve Önlemlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2021-2022	600.000		300.000	295.000	% 98,3	Proje 1. yılını tamamlamış olup, 3 hakediş ödemesi yapılmıştır. Proje kapsamında; İş termin planı hazırlanarak, İhtiyaç Tespit Raporu sunulmuştur. Ayrıca saha örnekleme personelinin eğitimi gerçekleştirilmiş, Düzce ilinde 2020 kış ve yaz dönemi, Karabük ilinde Yaz dönemi örnekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Düzce ili için Sağlık etkileri ve hava kirliliği kontrol tedbirlerini içeren raporun hazırlanarak Karabük ili kış dönemi örnekleme çalışmaları tamamlanmıştır.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>136.452.000</b>	<b>61.353.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>19.474.014</b>	<b>% 78,5</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>75.545.000</b>	<b>59.150.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>4.035.836</b>	<b>% 54,6</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>211.997.000</b>	<b>120.503.000</b>	<b>32.190.000</b>	<b>23.509.850</b>	<b>% 73,0</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018E06-87362	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2024	750.000.000	115.600.000	3.572.000	3.572.000	% 100,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğüne söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL, Genel Müdürlüğümüze Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilgili hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmalarının kapsamının belirlenmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli ön proje doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlandı bilinmektedir. İhale süreçleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu aşamada, Başkanlığımıza iletilen başkaca bir husus bulunmamaktadır.
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	1.534.000.000	11.213.000	131.593.000	123.206.657	% 93,6	LOT 1 Ankara-Karabük illerinde, LOT 2 Bursa ilinde bulunan Kamu Binalarında yapım işine ait Enerji Verimliliği Uygulamaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. LOT 3 İstanbul ilinde bulunan Kamu Binalarında yapım işine ait Enerji Verimliliği Uygulamaları Haziran 2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. LOT 4 Karabük- Zonguldak- Sakarya- Ankara- Kocaeli, LOT 5 Antalya-Karaman, LOT 6 Denizli- İzmir illerinde uygulanacak Enerji Verimliliği Uygulamaları Danışmanlık Hizmeti ihaleleri tamamlanmıştır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		1.504.854.000	7.094.000	122.997.000	118.790.328	% 96,6	
	Hibe Ödeneği		29.146.000	4.119.000	8.596.000	4.416.329	% 51,4	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K14-152212	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2020-2021	9.826.000	4.863.000	4.963.000	4.963.000	% 100,0	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi kapsamında geliştirilen yöntem ve yazılım yardımı ile 2020-2023 yılları arasında 81 ilden kamu binalarının envanter bilgilerinin toplanmasına başlanacak ve deprem riskine ilişkin olarak, kamu binalarının deprem performansının belirlenmesi için bir önceliklendirme yapılacaktır. Toplam Kamu Binası adedinin 480.000 civarında olduğu öngörülmektedir (KAYSIS bilgilerine göre). Bina envanter bilgileri bir yazılım kapsamında puanlanacak olup, puanlama sonrasında renk kodları kırmızı (1. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi ivedi yapılması gereken bina), turuncu (2. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi 2.öncelikli olarak yapılması gereken bina), sarı (3. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi 3.öncelikli olarak yapılması gereken bina) olmak üzere incelenmesi gereken binalar sınıflandırılacaktır. Yazılımdan alınacak raporlar çok gizli evrak niteliğinde olup, sadece Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıkların üst düzey sorumluları ve Valiler ile paylaşılacaktır. Proje 2020 yılında başlamış olup, o tarihten Aralık 2021 sonuna kadar 347.205 adet kamu binasının envanter bilgileri sisteme kayıt edilmiştir. 62 ilimizde envanter çalışmaları bitirilmiştir. Projenin 2022 yılı sonunda tamamen bitirilmesi hedeflenmektedir.



## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-164341	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2021-2021	11.480.000		11.480.000	6.909.553	% 60,2	Toplam 40 adet araçlık talep için, 20 adet araç alımı gerçekleşti. 6.909.553,25 TL harcandı.
2021K14-170327	Afet Müdahale Teknik Analiz Yöntemi Geliştirme (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2021-2021	6.000.000		6.000.000	6.000.000	% 100,0	Bina İzleme İstasyonu alımı için, ödeneğin tamamı harcandı.
2021K14-170333	Afet Müdahale Ekipleri Yaşam ve Çalışma Mekanı (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2021-2021	1.650.000		1.650.000	1.650.000	% 100,0	İHA alımı için, ödeneğin tamamı harcandı.
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	2.038.303.000	0	500.000	0	% 0,0	
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)		293.378.000		500.000	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği		5.752.000		0			2021 Yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)		1.739.173.000		0			

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024						
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2021-2023	15.335.000	0	1.000.000	0	% 0,0	Projesi tamamlanarak kabulü yapılmıştır. Yapım ihalesine çıkılmamıştır. Sözleşme bedeli: 285.000 tl)
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	33.630.000		12.000.000	0	% 0,0	Projesi tamamlanarak kabulü yapılmıştır. Yapım ihalesine çıkılmamıştır. (sözleşme bedeli: 259.500 tl)
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	21.712.000		8.000.000	0	% 0,0	İhale yetkisi il müdürlüğüne verilmiştir.
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	16.396.000		6.000.000	0	% 0,0	İhale yetkisi il müdürlüğüne verilmiştir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	23.468.000		9.000.000	0	% 0,0	Büyük tip çevre ve şehircilik hizmet binası proje temini kapsamında proje hizmet alımı devam etmektedir. (s.b: 400.000 tl, ödenen: 384.960 tl)

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K01-161831	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-CBS-Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Proje Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi, CBS ile Uyumlaştırılması ve Yaygınlaştırılması	2021-2021	900.000		900.000	860.020	% 95,6	Proje hizmet alımı tamamlanmıştır. Ancak işin geneli anlamında çalışmalar devam etmektedir.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2021-2021	800.000		800.000	627.888	% 78,5	Yeni Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılım uygulaması değişen mevzuat kapsamında dağıtım modülünü de içerecek şekilde revize edilerek 2019 yılı itibarıyla 81 ilde devreye alınmış, 2021 yılı itibarı ile de uygulanmakta olup, yazılıma ilişkin iyileştirme ve geliştirme süreçleri devam etmektedir.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2021-2021	300.000		300.000	207.031	% 69,0	Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki yazılımların bakım onarım ve iyileştirme işlemlerinde ve donanım ihtiyaçlarının sağlanmasında proje ödeneği kullanılmaktadır.
2011K07-140439	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2021	5.500.000	4.000.000	1.500.000	626.051	% 41,7	1) Antalya, Burdur, Isparta, Afyon, Eskişehir yöresel mimari projesi gerçekleştirme oranı: %31 (s.b: 260.000 tl, ödenen. 81.432 tl) 2) Bitlis, Muş, Van, Ağrı yöresel mimari projesi gerçekleştirme oranı: %100 (s.b: 192.500 tl) 3) Kastamonu, Bartın, Çorum, Yozgat yöresel mimari projesi gerçekleştirme oranı: %31 (s.b: 139.000 tl, ödenen. 43.062 tl) 4) Samsun, Ordu, Giresun, Sinop yöresel mimari projesi gerçekleştirme oranı: %30 (s.b: 235.000 tl, ödenen. 69.737,60 tl)
2018K07-149555	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	13.101.000	13.000.000	101.000	46.610	% 46,1	
	İhsu Barajından Etkilenen Siirt İli Köyleri İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2021	4.100.000	4.000.000	100.000	46.610	% 46,6	İhsu Barajından etkilenen; Bloris, Sağlarce ve Demirkapı köylerindeki altyapı işleri çalışmalarını kapsamaktadır. Proje 2021 yıl sonu itibarıyla sonlandırılmış olup iş bitmiştir.
	İhsu Barajından Etkilenen Batman İli Köyleri İskan Konutları Altyapı İşleri	2019-2021	9.001.000	9.000.000	1.000	0	% 0,0	İhsu Barajından etkilenen Güçlükonak-Koçtepe köyündeki altyapı işleri çalışmalarını kapsamaktadır. Proje 2021 yıl sonu itibarıyla sonlandırılmış olup iş bitmiştir.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-18498	Bozkır Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	213.817.408	113.395.408	100.422.000	91.400.544	% 91,0	Konut yapım işi bitti. Geçici kabulü yapıldı, Konut kuraları çekildi. Hak sahibi borçlandırmaları yapıldı. Peyzaj yapım işi devam etmektedir.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	40.744.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K07-24212	İhsu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	32.490.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	116.964.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2022	6.823.000		2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2021K07-160010	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	1.000.000		1.000.000	476.832	% 47,7	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2021K07-169789	Tamamlama ve Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	50.200.000		50.200.000	49.778.007	% 99,2	
	Kesin Hesap	2021-2021	7.000.000		7.000.000	6.965.306	% 99,5	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli Tamamlama	2021-2021	43.200.000		43.200.000	42.812.701	% 99,1	2021 Yıl sonu itibariyle konutlar tamamlanmış olup haksahipliği borçlandırmaları yapılacaktır.İşin geçici kabulü yapılmıştır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	<i>Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2016-2024	295.746.703	50.383.703	17.500.000	9.107.181	% 52,0	Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak illerinde 96 köydeki uygulamalarda yaklaşık 2.100 ailenin konut yapımı işidir. Aralık ayı sonu itibarıyla toplam da 9.107.181 TL ödenek harcanmıştır. 31.12.2021 tarihi itibarıyla Aksaray, Batman, Bilecik, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Kars, Malatya ve Uşak illerinde toplamda 129 konut tamamlanarak haksahiplerine teslim edilmiştir.
	<i>Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	17.362.700	803.700	237.500	5.250	% 2,2	
	<i>Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	8.047.041	520.041	1.000	0	% 0,0	
	<i>Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2023	24.740.866	13.540.866	5.000.000	3.335.750	% 66,7	
	<i>Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	1.750.614	450.614	307.100	225.750	% 73,5	
	<i>Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	3.577.000	802.000	1.020	0	% 0,0	
	<i>Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	23.021.643	1.521.643	500.000	23.100	% 4,6	
	<i>Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	13.099.000	549.000	1.500.002	63.631	% 4,2	
	<i>Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	6.296.000	1.396.000	525.500	351.750	% 66,9	
	<i>Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	7.775.000	495.000	1.829.500	1.816.500	% 99,3	
	<i>Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	4.137.000	1.328.000	40.001	0	% 0,0	
	<i>Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	81.706.000	16.820.000	3.930.720	2.231.250	% 56,8	
	<i>Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Iğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	10.000.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	5.555.000	610.000	740.252	105.000	% 14,2	
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.608.000	733.000	600.002	109.200	% 18,2	
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	7.700.000	373.000	1.000	0	% 0,0	
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	5.000.000	360.000	1.000	0	% 0,0	
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	22.083.590	6.451.590	1.411.343	761.250	% 53,9	
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	3.070.000	770.000	8.302	0	% 0,0	
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	1.500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	12.060.000	315.000	212.150	0	% 0,0	
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	14.004.749	704.749	57.754	0	% 0,0	
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	6.500.000	473.000	1.002	0	% 0,0	
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.500.000	72.000	500.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.061.000	681.000	1.000	0	% 0,0	
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.055.500	613.500	80.852	78.750	% 97,4	
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	7.000.000		1.000	0	% 0,0	
2021K07-160012	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2023			9.862.000	9.264.507	% 93,9	Kamulaştırma ve konut satın alımları için kullanılmaktadır. Adıyaman, Batman, Bingöl, Çorum, İstanbul, Malatya ve Sakarya illerine toplam da 60 adet konut satın alımı için yaklaşık 8.667.137 TL ödenek gönderilmiştir.
<b>12 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>4.770.044.408</b>	<b>253.089.408</b>	<b>282.300.000</b>	<b>266.385.311</b>	<b>% 94,4</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>08 TOPLAM</b>	<b>295.796.703</b>	<b>50.383.703</b>	<b>17.550.000</b>	<b>9.107.181</b>	<b>% 51,9</b>	
<b>4 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>28.956.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>24.093.000</b>	<b>19.522.553</b>	<b>% 81,0</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>HİBE</b>	<b>34.898.000</b>	<b>4.119.000</b>	<b>8.596.000</b>	<b>4.416.329</b>	<b>% 51,4</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.129.695.111</b>	<b>312.455.111</b>	<b>323.943.000</b>	<b>295.015.045</b>	<b>% 91,1</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>ARSA KARŞILIGI</b>	<b>95.206.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.862.000</b>	<b>9.264.507</b>	<b>% 93,9</b>	

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K01-2755	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2022	6.500.000	3.750.000	1.000		% 0,0	"İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi" projesi gelinen tarih itibariyle %58 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmış olup, anılan proje kapsamında yürütülen çalışmaların durdurulmasına dair 17.08.2018 tarihli ve E.140882 sayılı yazımıza istinaden projeye devam edilememiştir.
2021K09-162458	Doğu Karadeniz Dere Yatakları Islah ve İyileştirme (Şehirleşme Sektörü)	2021-2022	1.000.000		500.000	0	% 0,0	25.10.2021 tarihinde Bakanlığımız ile ODTÜ Üniversitesi arasında imzalanan Protokol kapsamında bu proje 7 İş Paketinden oluşmaktadır. Buna göre, İş paketi-1 kapsamında yapılacak işlerin 2021 yılında bitirilemeyeceği anlaşılmış olup, bu iş paketi ve diğer iş paketleri kapsamında yapılacak işlerin 2022 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılı ödeneği 2022 yılına aktarılmıştır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>7.500.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	



**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D00-17215	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2023	3.025.000	600.000	1.000.000	241.192	% 24,1	<p>*263.040 TL bedelli Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YES-TR) Yazılımı İşinin sözleşmesi 05/11/2019 tarihinde imzalanmıştır. 2020 yılı temmuz ayı içinde işin tasarım raporunun onaylanması ve ihale bedelinin %15'inin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. İşin kabulü ve geri kalan %85'lik bedelin ödenmesi işlemleri 2020 yılı aralık ayı içinde tamamlanmıştır. Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı için 18/12/2022 tarihine kadar yüklenici tarafından ücretsiz garanti ve bakım hizmeti verilecektir. 2022 yılı içinde 2023 yılında yürütülecek Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı Bakım, Destek ve İyileştirme Hizmet Alımı işi için ihaleye çıkılması planlanmaktadır.</p> <p>*27/07/2020 tarihinde ihaleyi yapılan Binalarda Enerji Verimliliği Uygulaması (BEP-TR) 2. Versiyon Bakım Destek ve İyileştirme Hizmet Alımı işinin sözleşmesi 05/10/2020 tarihinde imzalanmıştır. 204.400 TL bedelli işin süresi 365 gün olup, yükleniciye yapılacak ödemelerin ilk bölümü işin altıncı ayında (Nisan 2021), kalan ödeme işin sonunda (Ekim 2021) gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki bakım onarım faaliyetlerinin Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir..</p> <p>*Genel Müdürlüğümüzce IPA III kapsamında hazırlanan Eylem Fişi'nde; "Çevreyle Bütünlük Binalarda Enerji Tüketiminin Azaltılması Projesi" tarafımızdan teklif edilmiştir. Bu nedenle söz konusu faaliyetin danışmanlık giderleri için 2021 proje bütçesinde revize yapılmıştır. Ancak proje kabul edilmediği için bu konuda ödeme yapılmamıştır.</p>
2021K01-161844	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Mesleki+CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2021-2021	360.000		360.000	159.285	% 44,2	<p>Lab cihaz bakım onarım/TSE'ye Muayene ve Deney Ödemesi /ve Avans ödemesi yapılmıştır.</p>

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K01-161831	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-Mesleki+CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Mütcaahhitliğı Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncellemesi	2021-2021	100.000		100.000	44.237	% 44,2	Revize 100.000 TL den,Ruhsat eki projelere aykırı imalat yapan mütcaahhitler hakkında tesis edilen geçici yetki belge durdurma işlemleri için yapılan ilan,tebliğ ve bilgilendirmelerde 44.227,20 TL Harcama yapılmıştır. Proje kapsamında;mevcut yazılımların bakım onarım ve idame işlemleri yıl sonuna kadar herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin sağlanmıştır. Not: 06.04.2021 tarih ve 719483 sayılı yazımızla proje ödeniğinden 123.000 TL nin Coğrafi Bilgi Sstemleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi Strateji Başkanlığından talep edildi.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.485.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>444.715</b>	<b>% 30,5</b>	

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021E06-164350	Trafik Sorununun Çözümü için Akıllı Şehirler (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2021-2022	9.500.000		5.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında proje uygulamalarının yapılmasına yönelik projeye davet ve yarışma başlatılmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilmeye yönelik Revizyon proje fişi hazırlanmıştır.
2021K01-164342	Milli Emlak Otomasyon Projesi İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2021-2022	4.900.000		2.300.000	1.383.432	% 60,1	İhale Bedeli (KDV hariç): 2.344.800,00 TL. olarak 2021-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 2 yıllık olarak ihale yapılmıştır.8/01/2021 tarihinde imzalanmıştır. Proje şartnameye uygun olarak devam etmektedir.
2020K01-146671	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2020-2022	8.500.000	3.500.000	3.847.000	1.527.864	% 39,7	İhale Bedeli (KDV hariç): 3.884,400 TL olarak 2020-2021-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 39 aylık olarak ihale edilmiştir. Sözleşme 06.07.2020 tarihinde imzalanmıştır. Proje şartnameye ve belirlenen iş takvimine uygun olarak devam etmektedir.
2021K01-161831	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-Mesleki+CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)					0		
	Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncellemesi	2021-2021	123.000		123.000	0	% 0,0	
2021K01-161844	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Mesleki+CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2021-2021	140.000		140.000	0	% 0,0	

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150397	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2020-2021	5.667.000	3.000.000	2.667.000	2.516.350	% 94,4	
	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı	2020-2020	1.000.000	500.000	500.000	399.400	% 79,9	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi kapsamında "İş Paketi 1: Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Rehberliği" ve Akıllı Şehir Proje Yönetimi Standartlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında "İş Paketi 1: Akıllı Şehir Projeleri ve Fizibilite Etüdü Hazırlama Standardı ve Akıllı Şehir Proje Yönetimi Klavuzunun Hazırlanması" için kullanılmıştır.
	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik	2020-2021	2.500.000	1.500.000	1.000.000	993.041	% 99,3	Bu kapsamda Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi (İP 2-İP 3-İP 8) ile Akıllı Şehir Proje Yönetimi Standartlarının Belirlenmesi Hizmet Alımı (İP 2-İP 3) işleri yapılmıştır. Projeler tamamlanmıştır.
	Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme	2020-2021	2.167.000	1.000.000	1.167.000	1.024.240	% 87,8	Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme kapsamında Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Projesi ve ayrıca bu kapsamda Vatandaş Algı ve Farkındalık Araştırma Çalışması yapılmıştır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-35701	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	35.032.000	16.500.000	9.833.000	8.172.264	% 83,1	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2021	12.332.000	9.000.000	3.332.000	3.260.490	% 97,9	"Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (4. Faz)" için hizmet temini gerçekleştirilmiş olup 2.415.000,00 TL+KDV tutarında ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilmiştir.
	TUCBS Entegrasyonu	2018-2022	11.000.000	7.000.000	2.745.000	2.740.668	% 99,8	
	TUCBS Stratejisi ve Eylem Planı İzleme-Raporlama	2020-2021	1.200.000	500.000	700.000	700.000	% 100,0	"Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama Faaliyetleri Kapsamında Olgunluk Modelinin Uygulanması Projesi için hizmet temini gerçekleştirilmiş olup ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilmiştir.
	Coğrafi Veri ve Metaverilerinin Güvenli Paylaşımı	2021-2022	2.000.000		833.000	274.586	% 33,0	"TUCBS Altyapısında Bulunan Coğrafi Veri Servislerinin Standartlara Uyumluluğunun İzlenmesi ve Raporlanması Bakım Hizmeti Alımı Ve Ek Fonksiyon Geliştirilmesi İşi " hizmet temini gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Mart/2021 tarihinde 112.500+TL+KDV tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir.
	Coğrafi Bilgi Platformu Modernizasyonu	2021-2021	1.000.000		1.000.000	778.800	% 77,9	"Bakanlık Atlas Ve Geoportal Uygulamalarının Bakım Hizmeti Alımı Ve Ek Fonksiyon Geliştirilmesi İşi " hizmet temini gerçekleştirilmiş olup 660.000,00 TL+KDV ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilmiştir.
	Coğrafi Veri Güncelleme Çalışmaları	2021-2021	1.000.000		1.000.000	417.720	% 41,8	İnsansız Hava Aracı ile Amasya Merkezde Elde Edilecek Oblik Görüntülerden 3 Boyutlu Bina Modelleri Üretimi, Mobil Haritalama Verileri ve Sokak Görüntülerinin Elde Edilmesi ile Verilerin Güncellenerek Harita Tabanlı 3 Boyutlu Görüntüleme Web Yazılımına Aktarılması işinde teknik şartname uyarınca, İHA ile uçuş ve panoramik çekim çalışmaları yürütülmektedir. Proje kapsamında 354.000,00TL+KDV tutarında ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilmiştir.
	TUCBS Coğrafi Veri Uyumlaştırma Çalışmaları	2021-2022	6.500.000		223.000	0	% 0,0	

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-141024	Bilişim ve Donanım Altyapısı Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2020-2023	56.750.000	23.930.000	24.565.000	21.802.182	% 88,8	
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2020-2021	7.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	% 100,0	Sözleşmeli Bilişim Personeli Donanım Talebi Monitör İş İstasyonu alımı için 77.400 TL + KDV ödeme gerçekleştirilmiştir. 1 Dizüstü Bilgisayar alımı için 15.230 TL + KDV ödeme gerçekleştirilmiştir. Yüksek Çözünürlüklü Kamera alımı için 21.500 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Veri Depolama Ünite alımı için 1.637.000+KDV tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilmiştir.
	Altyapı Bileşenleri Bakım,Onarım ve Lisans Temini	2020-2021	12.000.000	8.000.000	4.000.000	8.167.475	% 204,2	Sunucu Sistemleri Yedekleme Yazılım temini gerçekleştirilmiştir. (664.000 TL KDV Hariç) 32 Ceph Object Storage Depolama Yazılımının Entegrasyonu ve Bakımı gerçekleştirilmiştir. (120.000 TL KDV Hariç) Nac (Ağ Erişim Kontrol Yazılımı) Bakım Ve Destek Hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir. (435.000 TL KDV Hariç) Bulut Şehir Uygulaması Bakım hizmeti temin edilmiştir. (700.000 TL KDV Hariç) Veri Depolama Ünitesi Alımı - SVC SAN Volume Controller gerçekleştirilmiştir. (1.965.000 TL KDV Hariç)
	Hazır Yazılım Temini, Uygulama Yazılımı Lisans Alımı ve Bakımı	2020-2023	18.800.000	5.800.000	8.245.000	5.301.382	% 64,3	Mcafee Güvenlik Ürünleri lisans yenileme temini gerçekleştirilmiştir. (1.398.000 TL KDV Hariç) SCOP Vision (SIEM ) Merkezi Log Yönetim Sistemi Lisans Yenileme temini gerçekleştirilmiştir. (445.000 TL KDV Hariç) Picus Sımr Güvenliği Etkinlik Analiz Ürünü lisans yenileme temini gerçekleştirilmiştir. (650.000 TL KDV Hariç) Atak Önleme Sistemi (IPS) donanım temini gerçekleştirilmiştir. (1.250.000 TL KDV Hariç) NETCAD Yazılım Lisansları temini gerçekleştirilmiştir. (2.420.000 TL KDV' den muaf) OSKA ve AMP Yazılım Lisansları temini gerçekleştirilmiştir. (240.000 TL KD' deb muaf)
	Bakanlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümü	2020-2021	10.450.000	6.130.000	4.320.000	4.320.000	% 100,0	Karar Destek Sistemi projesi kapsamında veri ambarı ve hazırlanan raporların idamesi gerçekleştirilmiş ve Bakanlık Birimlerinin talepleri doğrultusunda yeni raporlar geliştirilmiştir. Bakanlığa ait 69 adet uygulamanın geliştirme, güncelleme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2021 yılı içerisinde planlanan alımlar tamamlanmıştır. Proje kapsamında 4.320.000 ödeme yapılmıştır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Oracle'dan PostgreSQL'e Göç	2021-2021	1.000.000		1.000.000	553.420	% 55,3	20.12.2021 tarihinde Oracle'dan PostgreSQL'e Göç işinin geçici kabulü yapılmıştır. Bu tarihte eksik işler için tutanak hazırlanmış ve firmaya bildirilmiştir. Proje kapsamında 16 uygulama yer almakta olup yılsonu itibariyle 11 uygulama PostgreSQL veri tabanına taşınmıştır. Kalan uygulamaların taşınma işlemleri devam etmekte olup ödemeler proje takvimine göre gerçekleşmiştir.
	Çevre ve Şehircilik Veri Sözlüğü Geliştirilmesi	2021-2022	3.500.000		2.000.000	0	% 0,0	
	E-Belediye Uygulamaları Bakım-Onarım	2021-2022	4.000.000		2.000.000	459.905	% 23,0	Uygulamanın yaygınlaştırılması sürecinde kullanıcı desteği sağlanarak ve kullanıma ilişkin eğitimler verilerek 2021 yılsonu itibariyle 16000'in üzerinde tekil kullanıcı sayısına ulaşılmıştır. Ülke genelinde hazırlanacak olan ve halen yürürlükte bulunan mekânsal planların Bakanlığımızca belirlenen mekânsal plan üretim veri yapısı olan PlanGML formatında üretilebilmesine, sisteme yüklenebilmesine ve servis edilebilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Bu kapsamda E-Plan Otomasyon sistemine toplamda 30402 GML verisi 45093 vektörel veri yüklenmiştir.
<b>6 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>55.362.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.063.000</b>	<b>12.072.046</b>	<b>% 60,2</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>65.250.000</b>	<b>27.430.000</b>	<b>28.412.000</b>	<b>23.330.046</b>	<b>% 82,1</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>120.612.000</b>	<b>46.930.000</b>	<b>48.475.000</b>	<b>35.402.092</b>	<b>% 73,0</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2025	25.466.000	5.730.000	7.767.000	3.830.529	% 49,3	
<i>AB katkısı</i>			144.312.000	32.470.000	44.015.000	11.963.757	% 27,2	
2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	3.185.413.000	480.850.000	1.205.860.000	552.064.709	% 45,8	
	AB Hibesi		2.611.144.000	408.775.000	988.712.000	469.255.003	% 47,5	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		236.494.000	30.448.000	90.869.000	34.818.614	% 38,3	
	Mahalli İdare Katkısı		337.775.000	41.627.000	126.279.000	47.991.092	% 38,0	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>25.466.000</b>	<b>5.730.000</b>	<b>7.767.000</b>	<b>3.830.529</b>	<b>% 49,3</b>	
	<i>AB KATKISI</i>		<b>144.312.000</b>	<b>32.470.000</b>	<b>44.015.000</b>	<b>11.963.757</b>	<b>% 27,2</b>	
	<i>İçmesuyu Projesi</i>		<b>3.185.413.000</b>	<b>480.850.000</b>	<b>1.205.860.000</b>	<b>552.064.709</b>	<b>% 45,8</b>	



**2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	<b>Çarşamba Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>85.060.000</b>	<b>27.136.000</b>	<b>36.360.000</b>	<b>27.107.353</b>	<b>% 74,6</b>	
	AB Hibesi		72.296.000	23.064.000	30.905.000	23.041.250		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.106.000	1.629.000	2.182.000	1.626.441		
	Mahalli İdare Katkısı		7.658.000	2.443.000	3.273.000	2.439.662		
Alt proje-2	<b>Bandırma Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>186.349.000</b>	<b>20.737.000</b>	<b>72.492.000</b>	<b>45.578.435</b>	<b>% 62,9</b>	
	AB Hibesi		158.391.000	17.625.000	61.617.000	38.741.670		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		11.184.000	1.245.000	4.350.000	2.734.706		
	Mahalli İdare Katkısı		16.774.000	1.867.000	6.525.000	4.102.059		
Alt proje-3	<b>Bismil Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>83.136.000</b>	<b>42.045.000</b>	<b>26.088.000</b>	<b>37.433.638</b>	<b>% 143,5</b>	
	AB Hibesi		70.663.000	35.738.000	22.174.000	31.818.593		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.613.000	2.838.000	1.761.000	2.526.771		
	Mahalli İdare Katkısı		6.860.000	3.469.000	2.153.000	3.088.275		
Alt proje-4	<b>Bozüyük Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>252.569.000</b>	<b>0</b>	<b>103.465.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		165.506.000	0	67.800.000			
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		34.830.000	0	14.268.000			
	Mahalli İdare Katkısı		52.233.000	0	21.397.000			
Alt proje-5	<b>Çankırı Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>264.973.000</b>	<b>0</b>	<b>93.866.000</b>	<b>8.696.502</b>	<b>% 9,3</b>	
	AB Hibesi		225.223.000	0	79.786.000	7.392.027		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		15.900.000	0	5.632.000	521.790		
	Mahalli İdare Katkısı		23.850.000	0	8.448.000	782.685		
Alt proje-6	<b>Elbistan Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>151.706.000</b>	<b>74.589.000</b>	<b>36.702.000</b>	<b>50.339.415</b>	<b>% 137,2</b>	
	AB Hibesi		128.962.000	63.415.000	31.196.000	42.788.503		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		10.235.000	5.028.000	2.478.000	3.397.911		
	Mahalli İdare Katkısı		12.509.000	6.146.000	3.028.000	4.153.002		
Alt proje-7	<b>Giresun Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>237.352.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>83.309.000</b>	<b>26.110.649</b>	<b>% 31,3</b>	
	AB Hibesi		201.746.000	3.144.000	70.812.000	22.194.051		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		14.243.000	222.000	4.999.000	1.566.639		
	Mahalli İdare Katkısı		21.363.000	333.000	7.498.000	2.349.958		
Alt proje-8	<b>İğdır Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>174.189.000</b>	<b>43.980.000</b>	<b>78.107.000</b>	<b>73.935.804</b>	<b>% 94,7</b>	
	AB Hibesi		148.056.000	37.382.000	66.390.000	62.845.433		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		11.760.000	2.969.000	5.273.000	4.990.667		
	Mahalli İdare Katkısı		14.373.000	3.629.000	6.444.000	6.099.704		
Alt proje-9	<b>Kastamonu Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>122.507.000</b>	<b>40.369.000</b>	<b>53.182.000</b>	<b>45.149.870</b>	<b>% 84,9</b>	
	AB Hibesi		104.127.000	34.312.000	45.204.000	38.377.389		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		7.352.000	2.423.000	3.191.000	2.708.992		
	Mahalli İdare Katkısı		11.028.000	3.634.000	4.787.000	4.063.488		

Alt proje-10	<b>Niksar Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>164.767.000</b>	<b>45.939.000</b>	<b>57.573.000</b>	<b>64.655.210</b>	<b>% 112,3</b>
	AB Hibesi		140.047.000	39.047.000	48.936.000	54.956.928	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		9.889.000	2.757.000	3.455.000	3.879.313	
	Mahalli İdare Katkısı		14.831.000	4.135.000	5.182.000	5.818.969	
Alt proje-11	<b>Rize Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>264.204.000</b>	<b>36.222.000</b>	<b>75.514.000</b>	<b>26.119.113</b>	<b>% 34,6</b>
	AB Hibesi		224.570.000	30.788.000	64.186.000	22.201.246	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		15.854.000	2.174.000	4.531.000	1.567.147	
	Mahalli İdare Katkısı		23.780.000	3.260.000	6.797.000	2.350.720	
Alt proje-12	<b>Sivas Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>223.094.000</b>	<b>44.969.000</b>	<b>100.771.000</b>	<b>32.629.296</b>	<b>% 32,4</b>
	AB Hibesi		189.625.000	38.222.000	85.654.000	27.734.902	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		13.388.000	2.699.000	6.047.000	1.957.758	
	Mahalli İdare Katkısı		20.081.000	4.048.000	9.070.000	2.936.637	
Alt proje-13	<b>Sorgun Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>83.490.000</b>	<b>11.794.000</b>	<b>58.341.000</b>	<b>21.777.637</b>	<b>% 37,3</b>
	AB Hibesi		70.963.000	10.024.000	49.589.000	18.510.992	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.011.000	708.000	3.501.000	1.306.658	
	Mahalli İdare Katkısı		7.516.000	1.062.000	5.251.000	1.959.987	
Alt proje-14	<b>Şırnak Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>77.471.000</b>	<b>38.756.000</b>	<b>20.931.000</b>	<b>30.616.727</b>	<b>% 146,3</b>
	AB Hibesi		65.898.000	32.992.000	17.791.000	26.024.218	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.208.000	2.594.000	1.413.000	2.066.629	
	Mahalli İdare Katkısı		6.365.000	3.170.000	1.727.000	2.525.880	
Alt proje-15	<b>Trabzon Su Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>151.283.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>44.120.000</b>	<b>28.276.468</b>	<b>% 64,1</b>
	AB Hibesi		128.587.000	28.900.000	37.501.000	24.034.998	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		9.079.000	2.040.000	2.648.000	1.696.588	
	Mahalli İdare Katkısı		13.617.000	3.060.000	3.971.000	2.544.882	
Alt proje-16	<b>Yüksekova Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>85.459.000</b>	<b>16.615.000</b>	<b>32.174.000</b>	<b>20.180.390</b>	<b>% 62,7</b>
	AB Hibesi		72.636.000	14.122.000	27.347.000	17.153.331	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.771.000	1.122.000	2.172.000	1.362.176	
	Mahalli İdare Katkısı		7.052.000	1.371.000	2.655.000	1.664.882	
Alt proje-17	<b>Suluova Entegre Su Tesisi</b>	<b>2020-2025</b>	<b>118.132.000</b>	<b>0</b>	<b>44.560.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		92.457.000	0	37.875.000		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		7.344.000	0	3.008.000		
	Mahalli İdare Katkısı		18.331.000	0	3.677.000		
Alt proje-18	<b>Doğubayazıt Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>197.522.000</b>	<b>0</b>	<b>80.915.000</b>	<b>13.458.202</b>	<b>% 16,6</b>
	AB Hibesi		167.890.000	0	68.777.000	11.439.472	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		13.335.000	0	5.462.000	908.429	
	Mahalli İdare Katkısı		16.297.000	0	6.676.000	1.110.302	
Alt proje-19	<b>Aksaray Entegre Su Projesi</b>	<b>2021-2025</b>	<b>262.150.000</b>	<b>0</b>	<b>107.390.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		183.501.000	0	75.172.000		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		35.392.000	0	14.498.000		
	Mahalli İdare Katkısı		43.257.000	0	17.720.000		

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021F00-164396	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2021-2021	351.000		351.000	129.800	% 37,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2021-2021	1.000		1.000		% 0,0	
	Uzungöl ÖÇKB Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi Temini	2021-2021	180.000		180.000	129.800	% 72,1	İş tamamlanmıştır.
	Salsala Koyu Çevre Düzenleme Projesi Temini	2021-2021	170.000		170.000		% 0,0	
2018F00-67925	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulamaları (Turizm Sektörü)	2018-2021	9.900.000	5.800.000	4.100.000	2.000.000	% 48,8	*Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (Ayazini Etabı-Afyonkarahisar) Yapım İşi (Karşılama Merkezi) işine ait 2021 yılı ödeneği olan 1.000.000,00 TL ödenek Afyonkarahisar İl Özel İdaresine aktarılmıştır. * Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi Ayazini Mevki (Afyonkarahisar/İhsaniye) Karşılama Merkezi Çevre Düzenleme Projesi için Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ile 1.000.000,00 TL ödenek Afyonkarahisar İl Özel İdaresine aktarılmıştır.
2020F00-147602	Korunan Alanlarda Bisiklet Yolu Yapımı Pilot Çalışması (Turizm Sektörü)	2020-2021	5.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	% 100,0	Kaş (Ova-Kınık Mahalleleri Arası) Bisiklet Yolu 2.Etap Yapım İşi ayrılan 3.000.000,00 TL ödenek için Kaş Belediye Başkanlığı aktarılmıştır.
2020F00-155262	Tarihi Obruk Han Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2021	7.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	% 100,0	Karatay Belediye Başkanlığı ile imzalanan mali katkı protokolü çerçevesinde 2020 yılında Tarihi Obruk Han Çevre Düzenleme projesi için Döner Sermaye İşletmesi ödeneğinden 3.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 2021 yılı ödeneği olan 4.000.000,00 TL ödenek Karatay Belediye Başkanlığına aktarılmıştır.
2021F00-172684	İhlara Vadisi Karşılama Merkezi Yapımı (**.Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2021-2021	9.000.000		9.000.000	5.000.000	% 55,6	İhlara Vadisi Karşılama Merkezi Yapımı işi için 5.000.000,00 TL ödenek Bakanlık Makamı Onayı ile Aksaray İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021F00-161769	Akyaka ve Gökova Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2021	400.000		400.000	399.076	% 99,8	Akyaka ve Gökova Çevre Düzenlemesi Yapım İşi için 399.076,00 TL ödenek Ula Belediye Başkanlığına aktarılmıştır.
2021F00-161772	Hafik Gölü Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2022	5.000.000		1.252.000	1.252.000	% 100,0	Hafik Gölü Çevre Düzenleme Projesine ait 2021 yılı için ayrılan 1.252.000,00TL ödenek Sivas İl Özel İdaresine aktarılmıştır.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2022	18.600.000		6.000.000	6.000.000	% 100,0	Dalyan Kanalları (Muğla) Kıyı Düzenleme Projesine ait 2021 yılı için ayrılan 6.000.000,00TL ödenek Ortaca (Muğla) Belediye Başkanlığına aktarılmıştır.
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2023	28.000.000	12.582.000	6.206.000	5.758.357	% 92,8	
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2023	14.838.000	5.800.000	3.206.000	2.758.357	% 86,0	*Çamlıhemşin (Rize) Belediyesi Kavak ve Sırt Mahalleleri İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşi için ayrılan 1.500.000,00 TL ödenek Çamlıhemşin Belediye Başkanlığına aktarılmıştır. *Burdur İl Özel İdaresi ile Salda ÖÇKB Köyleri (Burdur) Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşi için 1.000.000,00 TLsi bu kalemden (toplamda 4.000.000,00 TL) mali katkı protokolü imzalanarak ödenek aktarılmıştır. * Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşi için 258.356,52 TL ödenek Yeşilova (Burdur) Belediye Başkanlığına akatırılmıştır.
	ÖÇK Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2023	10.027.000	3.647.000	3.000.000	3.000.000	% 100,0	*Burdur İl Özel İdaresi ile Salda ÖÇKB Köyleri (Burdur) Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşi için 3.000.000,00 TLsi bu kalemden (toplamda 4.000.000,00 TL) mali katkı protokolü imzalanarak ödenek aktarılmıştır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (*.*.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2022	15.000.000		12.000.000	11.999.000	% 100,0	
	Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri	2021-2022	14.999.000		11.999.000	11.999.000	% 100,0	Konya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Konya İli Cihanbeyli İlçesi Merkez ve Gölyazı Mahalleleri İle Kulu İlçesi Ömeranlı ve Tuzyaka Mahallelerinde 4 Adet Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi için 2021 yılı mali katkı protokolü imzalanmıştır. 2021 yılı toplam ödeneği olan 11.999.000 ,00 TL Konya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
	Marmaris Kanalizasyon Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	2021-2021	1.000		1.000	0	% 0,0	

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	11.300.000	6.800.000	4.500.000	2.788.297	% 62,0	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2021	2.500.000	1.500.000	1.000.000	932.200	% 93,2	Muğla ili, Marmaris İlçesi Selimiye, Orhaniye, Sögüt, Turgut, Hisarönü, Bayır ve Taşlıca Mahalleleri ile Datça İlçesi Kızılan Mahallesi, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı Hakedişi yapılmıştır. 356.300,00 TL (KDV Dahil) Konya ili, Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı/Kulmaç, İnsuyu/Uzuncayayla, Taşpınar/Aydınlık2 ve Taşpınar/Çandır Mahallelerinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı ihalesi hakedişi yapılmıştır. 61.080,00 TL (KDV Dahil) Aksaray ili, Sultanhanı İlçesinde Bakanlığımızca yapılacak planlama çalışmalarına altlık teşkil edecek 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı işi Hakediş yapılmıştır. 83.985,00 TL (KDV Dahil)
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2021	5.965.000	3.965.000	2.000.000	1.286.318	% 64,3	Proje kapsamında 20 adet iş tamamlanmıştır.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*: 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2021	735.000	235.000	500.000	82.368	% 16,5	Proje kapsamında 20 adet iş tamamlanmıştır.
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*: 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2021	2.100.000	1.100.000	1.000.000	487.411	% 48,7	Proje kapsamında 4 adet iş tamamlanmıştır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	2021-2023	3.000.000		2.500.000	1.497.282	% 59,9	Konuya ilişkin açıklama alt projelerde yapılmıştır.
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2021	800.000		800.000	800.000	% 100,0	Proje ODTÜ ile protokol kapsamında Proje tamamlanmıştır.
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2021	800.000		800.000	0	% 0,0	2021 yılı Türkiye'de çıkan yangın olaylarından dolayı personelin alanda olması ve proje alanında ekolojik çalışmanın yetersiz kalacağı tespit edildiğinden ihaleye çıkılmamış 2022 yılında yapılması planlanmaktadır.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Sürüngenlerin Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması, İzlenmesi	2021-2023	1.400.000		900.000	697.282	% 77,5	Proje yapımı için 09.09.2021 tarihinde 919.000 TL'lik sözleşme imzalanmış olup, yıllara sarıh olarak yürütülecek ve 26.02.2024 tarihinde sona erecektir.
2011K10-1460	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2021	4.196.000	3.121.000	1.075.000	1.036.040	% 96,4	Alt projeler şeklinde ihaleler yapılarak projeler gerçekleştirilmiştir.
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	1.111.000	994.000	117.000	114.460	% 97,8	Proje için hizmet alım işi planlanmış ve ihalesi yapılarak, sözleşme 25/03/2021 tarihinde imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	758.000	641.000	117.000	113.280	% 96,8	Proje için hizmet alım işi planlanmış ve ihalesi yapılarak, sözleşme 29/04/2021 tarihinde imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	814.000	697.000	117.000	112.100	% 95,8	Proje için hizmet alım işi planlanmış ve ihalesi yapılarak, sözleşme 29/04/2021 tarihinde imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2016-2021	827.000	427.000	400.000	383.500	% 95,9	Proje için hizmet alım işi planlanmış ve ihalesi yapılarak, sözleşme 29/04/2021 tarihinde imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2016-2021	262.000	172.000	90.000	84.960	% 94,4	Proje 29.04.2021 tarihli sözleşme kapsamında Doğrudan temin yoluyla 72.000 TL karşılığı yapılmış ve 15.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2020-2021	212.000	95.000	117.000	114.460	% 97,8	Proje için hizmet alım işi planlanmış ve ihalesi yapılarak, sözleşme 29/04/2021 tarihinde imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2020-2021	212.000	95.000	117.000	113.280	% 96,8	Proje için hizmet alım işi planlanmış ve ihalesi yapılarak, sözleşme 29/04/2021 tarihinde imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.
2014K10-2121	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi (Çevre Sektörü)	2014-2022	141.238.000	91.238.000	40.000.000	40.000.000	% 100,0	2021 Yılı Ödeneğinin Tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Aktarılmıştır.
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Yönetimi-TVK Ortak Proje) (Çevre Sektörü)					0		
Alt proje-1	İklim Değişikliğinin Ekosistem Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması	2021-2023	3.500.000		1.165.000	0	% 0,0	26.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış olup sözleşme bedeli 2.440.000,00TL'dir. 02.12.2021 tarihinde işe başlanmıştır. Ön Rapor yüklenici tarafından 30.12.2021 tarihinde sunulmuştur. Ön Rapor için ödeme yapılmayacaktır. Ödemelerin ara rapor ve sonuç raporu sonrasında 2022-2024 yılları arasında yapılması planlanmaktadır.



**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2022	2.524.000	825.000	1.010.000	1.004.180	% 99,4	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2022	2.075.000	825.000	581.000	575.840	% 99,1	2021 Yılı Projeleri Tamamlanmıştır.
	Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2020-2022	449.000	0	429.000	428.340	% 99,8	Proje Sözleşme Bedeli oranında gerçekleşmiş olup %100 Tamamlanmıştır.
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2023	924.000	162.000	338.000	254.738	% 75,4	Toplatlaştırılmış Proje Kapsamında 1.Kısım olan 'Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi' % 100 olarak tamamlanmıştır. 2.Kısım olan 'Otlatma Yönetimi Projesinin' % 20 lik kısmı tamamlanmış olup proje devam etmektedir.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2023	5.007.000	92.000	1.628.000	1.505.376	% 92,5	
	Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2023	4.007.000	92.000	1.348.000	1.260.358	% 93,5	Projenin KARASAL Biyolojik Çeşitlilik Araştırma kısmı için 2.Ara Rapor teslim edilmiş olup % 35 lik kısmı tamamlanmıştır. 3.550.000. TL Bütçeli DENİZEL Kısmı için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile 4734 sayılı K.I.K. 3-f maddesi gereği 2.800.000 TL+KDV PROTOKOL imzalanmış olup; 29.10.2021 tarihi itibarıyla proje çalışmalarına başlanılmıştır. Projenin 1. ARA RAPORU teslim edilmiş olup % 34 lük kısmı tamamlanmıştır.
	Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2022	400.000	0	160.000	155.288	% 97,1	Projenin 2.Ara Raporu sunulmuş olup; % 40 ı gerçekleşmiştir.
	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2021-2023	600.000		120.000	89.730	% 74,8	Projenin 1.Ara Raporu sunulmuş olup; % 20 lik kısmı gerçekleşmiştir.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161740	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (** Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2021-2021	350.000		350.000	304.440	% 87,0	KDV Dahil Edime, Kırklareli, Tekirdağ İllerinde Yer Alan Anıt Ağaç ve Tescilli Ağaç Topluluklarının Bakımı ve Rehabilitasyonu Tamamlandı.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2022	1.000.000		405.000	267.466	% 66,0	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2022	650.000		300.000	267.466	% 89,2	Projenin 2 Hakedişi ödenmiş olup % 46,15 i gerçekleşmiştir.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2022	350.000		105.000		% 0,0	İş yoğunluğundan dolayı 2021 yılında proje ihalesi yapılamamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2021-2023			3.000.000		% 0,0	
<b>17 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>246.940.000</b>	<b>125.620.000</b>	<b>37.930.000</b>	<b>30.892.611</b>	<b>% 81,4</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>24.350.000</b>	<b>0</b>	<b>21.350.000</b>	<b>17.303.440</b>	<b>% 81,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>271.290.000</b>	<b>125.620.000</b>	<b>59.280.000</b>	<b>48.196.051</b>	<b>% 81,3</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2021	5.530.000	5.100.000	430.000	0	% 0,0	
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	9.339.000	2.000.000	1.070.000	457.840	% 42,8	ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İLE İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA BELEDİYELER İÇİN HİZMET ÖNCELİKLENDİRME REHBERİ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMINI YAPILMIŞTIR.
2021K07-160009	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 199) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	1.604.308.000		1.604.308.000	1.604.308.000	% 100,0	2021 YILI KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İMALATLARIN TAKİBİ YAPILMAKTA OLUP, 2022 YILI KÖYDES PROJESİ CUMHURBAŞKANI KARARI VE İL,İLÇE BAZINDA ÖDENEK DAĞILIMLARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLANMIŞTIR.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.619.177.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>457.840</b>	<b>% 30,5</b>	

Dipnot: 199

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

## MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K01-140379	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2021-2021	3.000		3.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2021-2021	1.000		1.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2021-2021	1.000		1.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2021-2021	1.000		1.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2021-2021			90.028.000	90.028.000	% 100,0	3.242.000,00.-₺ toplam ödenğin tamamı serbest bırakılmış, 92.486.000,00.-₺ ödenek eklenmiş toplam 95.728.000,00.-₺ ödenekten 95.209.696.-₺'si gönderilmiş olup, 518.304,00.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2021-2021			21.300.000	21.300.000	% 100,0	21.300.000,00.-₺ ödenek eklenmiş ödenğin tamamı harcanmıştır.
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.328.000</b>	<b>111.328.000</b>	<b>% 100,0</b>	

**ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2013A05-1732	Murat Nehri Havzası Rehabilitasyonu (*Kredili Proje) (Ormancılık Sektörü)	2013-2022	3.793.000	2.877.000	420.000	405.742	% 96,6	Projenin son yılı olup, izleme ve değerlendirme faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulama Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Genel Müdürlük olarak tamamlama ve etki araştırması anketi ile bitki örtüsü değişimi raporlanması tamamlanacaktır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		2.858.000	2.276.000	300.000	294.802	% 98,3	
	Genel Bütçe Ödeneği		935.000	601.000	120.000	110.940	% 92,5	
2018A05-14322	Ulusal Arazi Örtüsü (Ormancılık Sektörü)	2018-2022	21.902.000	5.492.000	12.410.000	12.394.407	% 99,9	Proje kapsamında Görüntüleme ve Etiketleme Yazılımı , Kitle Kaynak Yazılımı , Veri Aktarma/Ortaklaştırma, Sınıflandırma ve değişim izleme ara yüzleri ve CORINE Dönüştürücü Yazılımları geliştirme (beta) versiyonları tamamlanmıştır. Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Sınıflandırma Algoritmaları geliştirme çalışmaları yürütülerek, pilot sahalarda arazi örtüsü/kullanımı verisi üretilmiştir.
2020A05-168456	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2020-2024	10.462.000	4.472.000	4.170.000	4.054.707	% 97,2	
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2020-2024	4.090.000	4.123.000	4.090.000	3.992.321	% 97,6	Projeler hazırlanarak uygulanmak üzere ilgili kuruluşlara gönderildi.
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2020-2024	80.000	349.000	80.000	62.386	% 78,0	Paydaş kurumlar ile toplantılar yapılarak; doğrudan ekim, damla sulama, mera rehabilitasyonu, rüzgâr perdesi kurulumu ve daha pek çok konuda demonstrasyon sahaları oluşturulmasına karar verilmiştir. Teknik şartname ve teknik dokümanlar hazırlanmış olup onay sürecindedir. ATD Sosyoekonomik Analizleri ve cinsiyet eylem planı hazırlanması için teknik onay süreci tamamlanmış, ihalesine çıkmıştır. Ayrıca Proje kapsamında hazırlanması öngörülen Mikro Havza Planı için yer seçim ve teknik çalışmalar tamamlanarak ihale sürecine geçilmiştir.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>36.157.000</b>	<b>12.841.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.854.856</b>	<b>% 99,1</b>	

## STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	153.514.000	203.000	2.005.000	253.857	% 12,7	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2017-2024	41.770.000	0	5.000	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*Döner Sermaye)	2020-2021	1.203.000	203.000	1.000.000	253.857	% 25,4	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2021-2023	15.335.000	0	1.000.000	0	% 0,0	İhaleye ilişkin işlemler Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü arasında koordinasyon halinde yürütülmektedir.
2021K09-161848	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2021-2021	6.150.000		6.150.000	5.772.866	% 93,9	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2021-2021	5.850.000		5.850.000	5.623.098	% 96,1	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2021-2021	1.200.000		1.200.000	977.554	% 81,5	3 adet "T05-Minibüs" tipi taşıtın edinilmesine ilişkin 09.03.2021 tarihli ve 3594 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda DMO dan alım işlemleri gerçekleştirilen taşıtlar Eskişehir, İstanbul ve Van İl Müdürlüklerine tahsis edilmiştir.

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K09-165747	Şehircilik Hizmetleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2021	3.230.000	0	3.230.000	0	% 0,0	Bakanlık tarafından yürütülen diğer projelerde ödeneye ihtiyaç duyulması durumunda bu projeden karşılanacaktır.
	Genel Bütçe Ödeneği	2021-2021	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	
	Döner Sermaye Ödeneği	2021-2021	2.230.000		2.230.000	0	% 0,0	
2021G00-161814	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2021-2021	2.300.000		2.300.000	1.268.786	% 55,2	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>15.300.000</b>	<b>0</b>	<b>15.300.000</b>	<b>12.918.607</b>	<b>% 84,4</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>156.944.000</b>	<b>203.000</b>	<b>5.435.000</b>	<b>1.231.411</b>	<b>% 22,7</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>172.244.000</b>	<b>203.000</b>	<b>20.735.000</b>	<b>14.150.018</b>	<b>% 68,2</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.12.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021G00-161814	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2021-2021	190.000		190.000		% 0,0	Lojmanlarda tadilat gerekmediğinden kullanılmıřtır.
2021K09-161848	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2021-2021	100.000		100.000	97.575	% 97,6	Birimlerimizde Kullanılmak Üzere Bilgisayar ve Sunucu Alımı.
	Hizmet Binası Onarımı	2021-2021	100.000		100.000	99.946	% 99,9	Hizmet Binası Yan cephe yazı deęişikliği
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>197.521</b>	<b>% 50,6</b>	
