



# 2022 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 1. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemi)



# BAKANLIĞIMIZ 2022 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2022 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.086.088.000,00	2.157.487.413,74	634.810.248,07	% 29,4
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	346.986.000,00	364.374.741,95	104.129.396,37	% 28,6
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	137.994.000,00	297.756.543,94	38.610.754,97	% 13,0
05	CARİ TRANSFERLER	1.524.500.000,00	1.533.100.526,39	183.059.486,27	% 11,9
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	516.996.000,00	516.996.000,00	137.700.000,00	% 26,6
	Kentsel Dönüşüm Genel Bütçe Ödeneği ve Ek Ödenek	100.779.000,00	100.779.000,00	34.031.000,00	% 33,8
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	0,00	0,00	0,00	
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	675.000.000,00	675.000.000,00	6.534.000,00	% 1,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	% 0,0
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	52.794.000,00	52.794.005,79	0,00	% 0,0
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	8.931.000,00	17.531.520,60	4.794.486,27	% 27,3
06	SERMAYE GİDERLERİ	446.924.000,00	861.163.138,14	194.873.361,77	% 22,6
	Bakanlık Yatırım Programı	382.105.000,00	382.105.000,00	31.226.494,86	% 8,2
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	64.819.000,00	64.819.000,00	1.109.934,29	% 1,7
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	51.939.000,00	0,00	% 0,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	362.300.138,14	162.536.932,62	% 44,9
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	296.529.000,00	372.629.778,57	87.664.019,76	% 23,5
	Bakanlık Yatırım Programı	93.342.000,00	93.342.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	203.187.000,00	203.187.000,00	19.970.858,14	% 9,8
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	76.086.110,53	67.693.161,62	% 89,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye-IPA	0,00	14.668,04	0,00	% 0,0
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
08	BORÇ VERME	48.811.000,00	48.811.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM		4.887.832.000,00	5.635.323.142,73	1.243.147.267,21	% 22,1



# BAKANLIĞIMIZ 2022 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

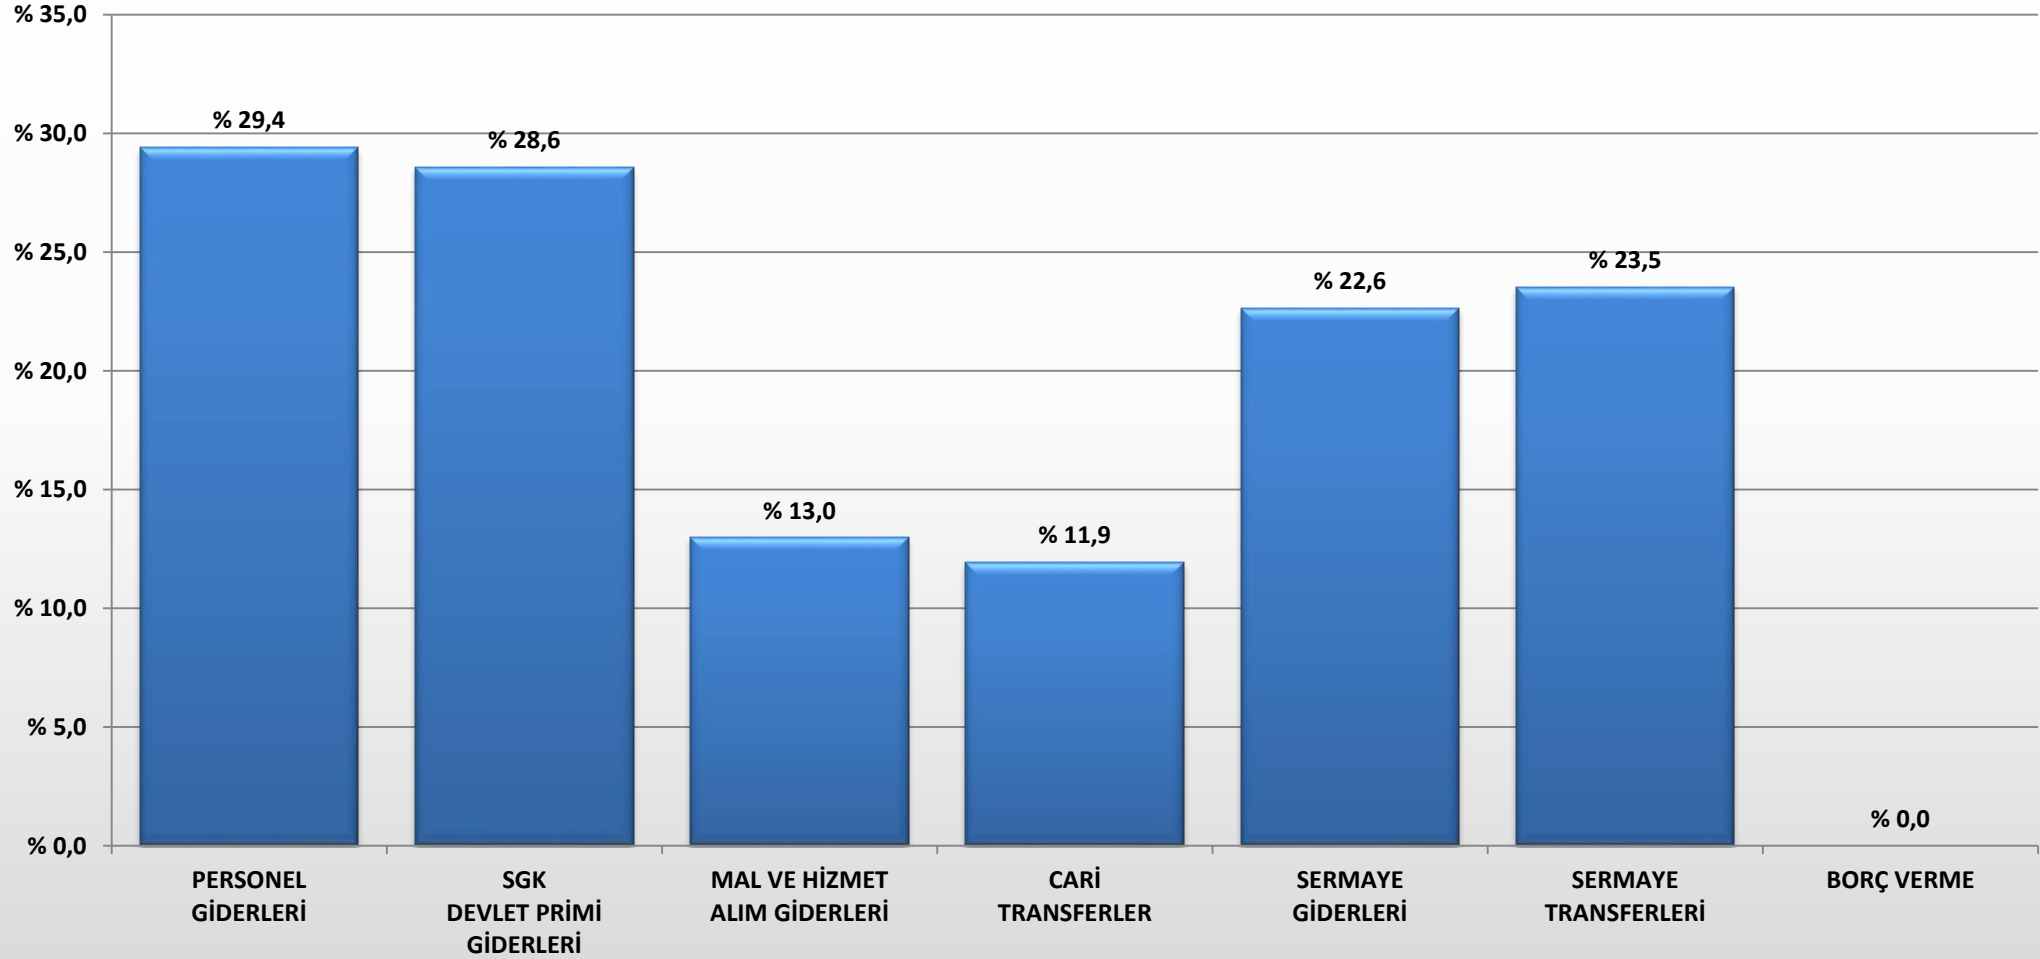




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ

## 01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2022 Yatırım		Gerçekleşme ORANI	
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2022 İtibariyle HARCAMA		
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	6	37.820.000,00	15.878.000,00	0,00	% 0,0	→
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	10	639.613.000,00	89.347.000,00	0,00	% 0,0	→
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	8	214.127.000,00	37.065.000,00	735.483,00	% 2,0	→
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	21	5.643.071.000,00	308.432.000,00	31.628.418,00	% 10,3	→
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	1	1.000.000,00	500.000,00	0,00	% 0,0	→
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	3.666.000,00	1.150.000,00	5.793,00	% 0,5	→
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	13	127.282.000,00	77.664.000,00	3.424.666,80	% 4,4	→
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	3.845.953.000,00	2.414.000,00	461.878,62	% 19,1	→
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	20	287.445.000,00	61.048.000,00	0,00	% 0,0	→
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	1.826.652.000,00	2.000.000,00	0,00	% 0,0	→
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	500.000,00	500.000,00	0,00	% 0,0	→
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	44.071.018,00	8.000.000,00	0,00	% 0,0	→
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	3	10.341.000,00	9.941.000,00	760.405,00	% 7,6	→
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	% 0,0	→
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>91</b>	<b>12.682.872.018,00</b>	<b>615.270.000,00</b>	<b>37.016.644,42</b>	<b>% 6,0</b>	
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>77</b>	<b>12.468.261.018,00</b>	<b>524.258.000,00</b>	<b>31.688.374,62</b>	<b>% 6,0</b>	
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>14</b>	<b>214.611.000,00</b>	<b>91.012.000,00</b>	<b>5.328.269,80</b>	<b>% 5,9</b>	
<b>"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği</b>	<b>4 adet</b>		<b>64.819.000,00</b>	<b>1.109.934,29</b>	<b>% 1,7</b>	



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2022 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

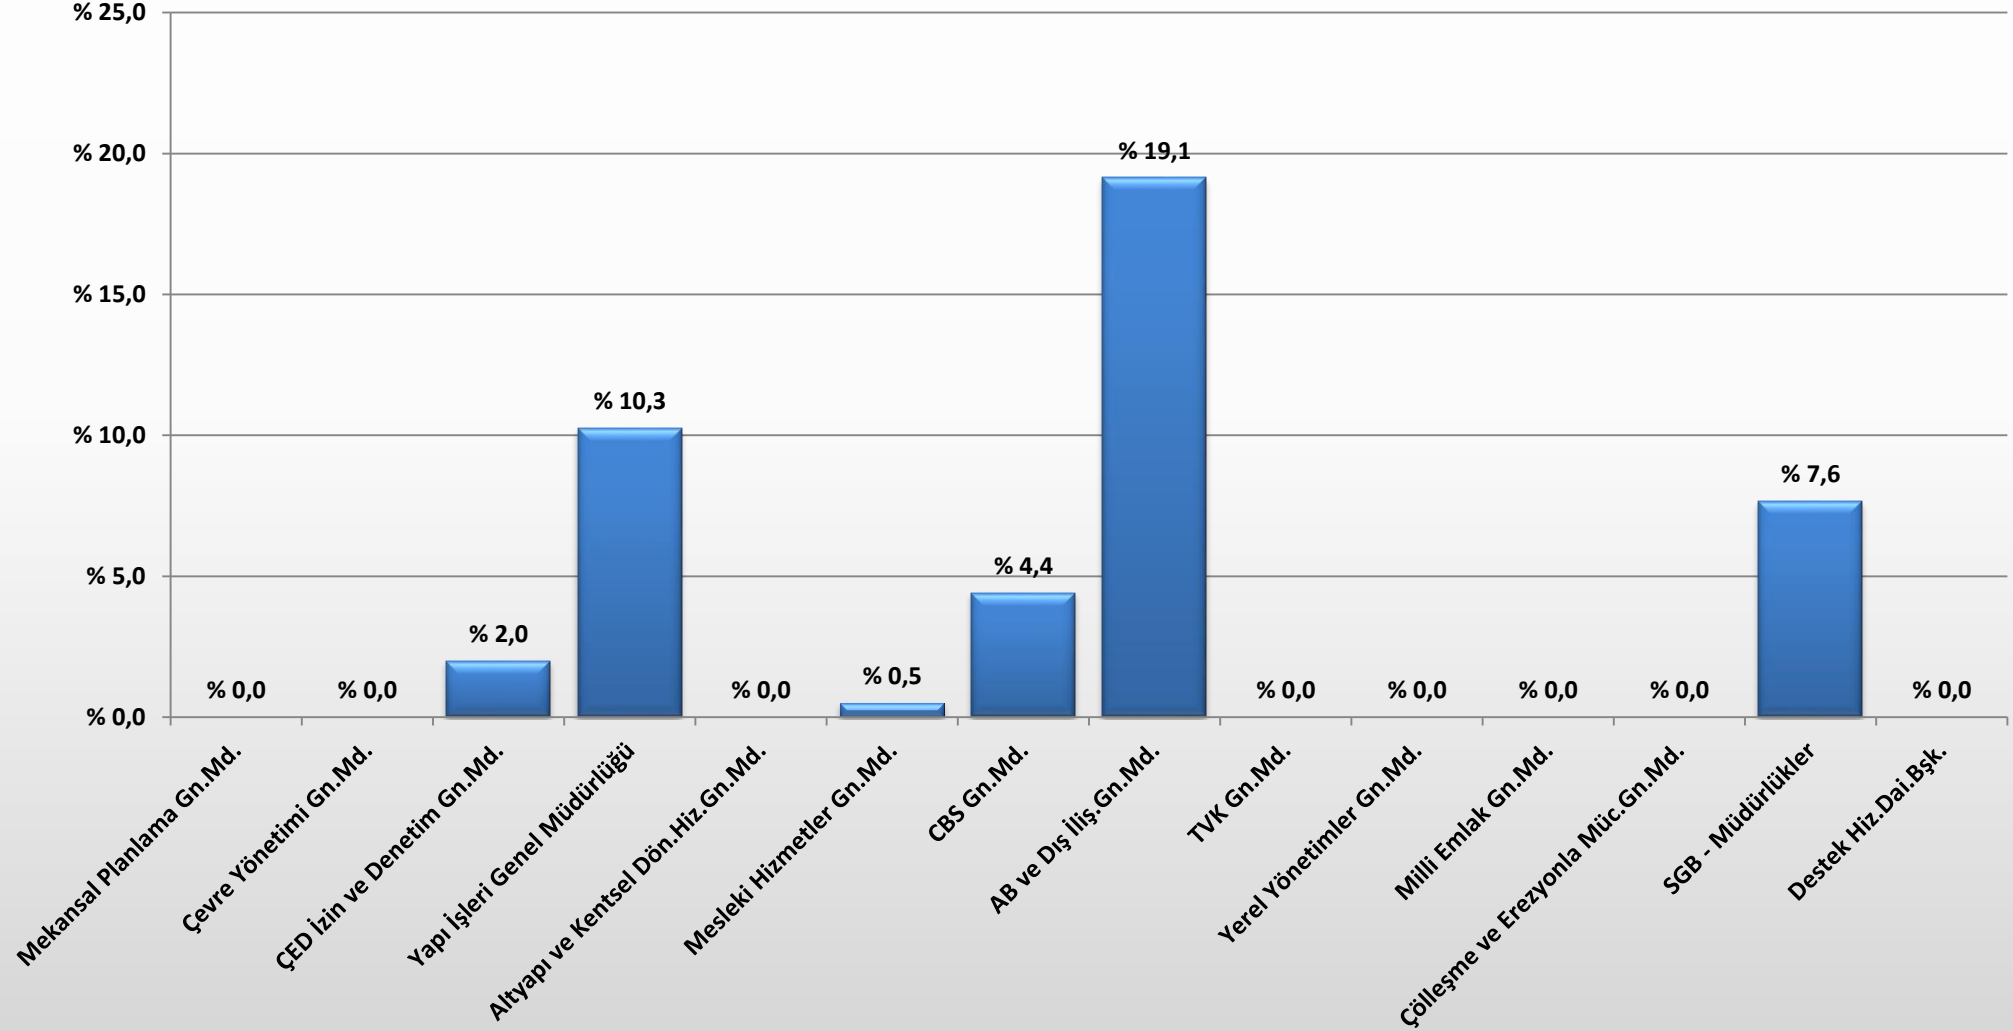




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2022 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2022 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	50.825.000,00	50.825.000,00	10.615.304,35	% 20,9
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	1.003.985.000,00	1.087.160.561,87	109.132.326,08	% 10,0
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	108.129.000,00	107.229.000,00	22.384.657,20	% 20,9
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	443.219.000,00	474.278.834,53	81.914.880,53	% 17,3
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	650.304.000,00	650.304.000,00	182.247.219,52	% 28,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	30.836.000,00	30.836.000,00	9.246.136,01	% 30,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	63.194.000,00	64.094.000,00	9.890.260,07	% 15,4
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	58.608.000,00	58.608.005,79	4.547.261,08	% 7,8
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	77.896.000,00	77.896.000,00	9.099.728,36	% 11,7
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	12.253.000,00	12.253.000,00	3.588.227,34	% 29,3
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	125.295.000,00	125.295.000,00	13.747.150,76	% 11,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	30.697.000,00	30.697.000,00	6.087.731,23	% 19,8
Personel Genel Müdürlüğü	10.582.000,00	10.582.000,00	4.237.603,44	% 40,0
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	10.602.000,00	177.541.000,00	5.523.596,28	% 3,1
Özel Kalem Müdürlüğü	50.514.000,00	50.514.000,00	3.723.340,66	% 7,4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	87.047.000,00	113.701.071,38	27.848.680,63	% 24,5
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	3.793.000,00	3.793.000,00	1.061.046,41	% 28,0
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	17.017.000,00	17.047.700,00	7.960.750,46	% 46,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı	180.852.000,00	180.852.000,00	3.413.348,34	% 1,9
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.889.000,00	1.889.000,00	523.275,44	% 27,7
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	5.265.000,00	5.265.000,00	3.513.406,96	% 66,7
İl Müdürlükleri	1.865.030.000,00	2.304.661.969,16	722.841.336,06	% 31,4
<b>TOPLAM</b>	<b>4.887.832.000,00</b>	<b>5.635.323.142,73</b>	<b>1.243.147.267,21</b>	<b>% 22,1</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2022 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

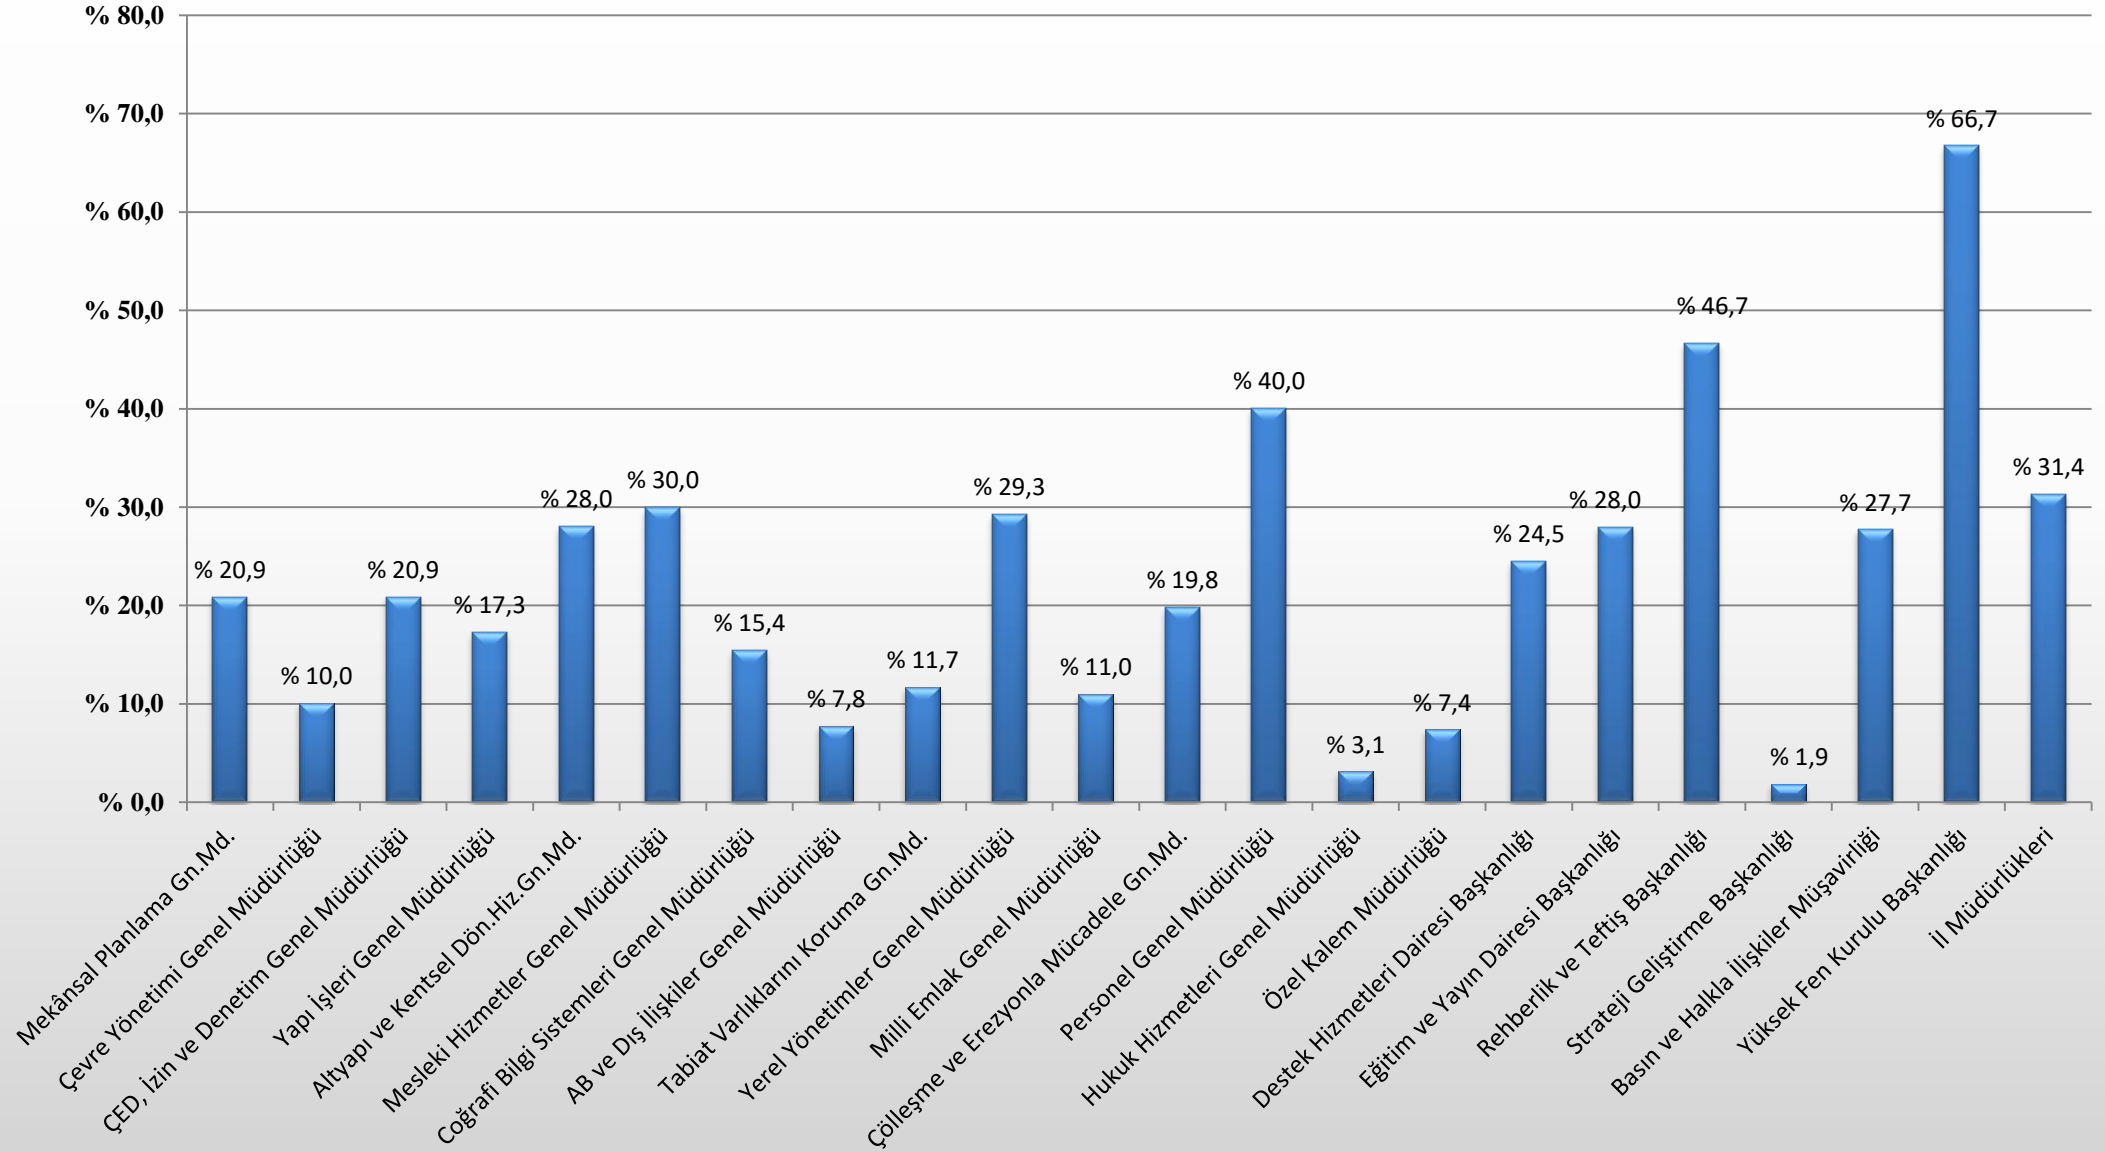

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı**

**Harcama Birimi Bazında**

**2022 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri**

**01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022**



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-18078	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	6.500.000	2.500.000	4.000.000	0	% 0,0	Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1.Hakediş ödemesi 76.228,00 TL ve Kütahya İli Simav İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1.Hakediş ödemesi 75.520,00 TL olmak üzere 151.748,00 TL ödeme Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
	3. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2021-2022	6.500.000	2.500.000	4.000.000	0	% 0,0	
2018K09-3803	Bütünleşik Kıyı Alanlarının Planlaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	1.420.000	320.000	1.100.000	0	% 0,0	
	İzmit-Sakarya-Düzce Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	600.000	100.000	500.000	0	% 0,0	
	Zonguldak-Bartın-Kastamonu Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	820.000	220.000	600.000	0	% 0,0	
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2023	4.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	

**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2023	14.400.000	3.722.000	5.278.000	0	% 0,0	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2023	5.000.000	2.000.000	1.500.000	0	% 0,0	
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2023	9.400.000	1.722.000	3.778.000	0	% 0,0	
2021K09-162464	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2023	4.000.000	500.000	2.000.000	0	% 0,0	
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	7.500.000		1.500.000	0	% 0,0	
<b>6 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>37.820.000</b>	<b>7.042.000</b>	<b>15.878.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	400.000.000	140.000.000	60.000.000	0	% 0,0	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneginden harcama yapılmamıştır. 2018-2022 yılı proje detay listesi belirlenmesine yönelik komisyon toplantısı yapılmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanan detay liste İLBANK A.Ş.'ye iletilmiştir. Proje hazırlama ve yapımına dair ihale hazırlık çalışmaları başlatılacaktır. Bu nedenle henüz 2022 yılı ödeneginden harcama yapılmamıştır.
2017K08-3796	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	4.250.000	2.250.000	1.000.000	0	% 0,0	Protokol ve teknik şartname çerçevesinde projeye ilişkin hazırlanan iş programı 17/02/2020 tarihli ve 73615618-145.05-E.40800 sayılı yazımız ile uygun görülmüş ve iş başlatılmıştır. Proje süresi 700 takvim günüdür. 09/12/2020 tarihinde iş programı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün revize talebi sebebiyle ek protokol imzalanmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 22.07.2020 ve 30343279-045.99-E.384026 sayılı yazısı uyarınca söz konusu projede 120 günlük süre uzatımı talebi bildirilmiş olup 01/06/2021 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Ek protokole göre işin süresi 820 (sekiz yüz yirmi) takvim günüdür. Protokol ve iş programı çerçevesinde 11 adet kılavuz ve yönetici özet kitapçığı hazırlanmış, atık karakterizasyonu kılavuzu taslağı hazırlanmış, mevcut durum raporu ve nihai rapor hazırlanmıştır.
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2024	12.600.000	1.460.000	3.400.000	0	% 0,0	
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi	2018-2022	1.750.000	1.460.000	290.000	0	% 0,0	Proje; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında, Ege Üniversitesi ile yapılan Protokol çerçevesinde, 1 Aralık 2020 yılında başlamış olup, 21.04.2021 tarihinde ek protokol düzenlenerek proje bitiş tarihi 11 Kasım 2022 tarihine uzatılmıştır. Projede; kamu, özel sektör ve yerel yönetimlere yönelik anket çalışmaları, mevcut durum analizi, proje açılış toplantısı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 4 adet değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Saha ziyaretlerinin %75'i gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretleri kapsamında teknik raporlar sunulmuştur. Polonya'ya 1 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretinin teknik raporu hazırlanmıştır. 29 Eylül 2021 tarihinde ara rapor sunulmuştur. 534.833,34 TL (KDV hariç) ödeme işlemi yapılmıştır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2023	2.000.000	0	800.000	0	% 0,0	Proje için; Cumhurbaşkanlığınca ihale edilebilecek miktar verilmediğinden (1000 TL ödenek verildi.) ihaleye çıkılamamıştır. Sonraki yıldada ilk yıl verilen proje bedelinden daha düşük ödenek verilmesi nedeniyle projeye teklif veren olmamıştır. Bu nedenle ödenek artırılması talebinde bulunulmuş olup, ödeneğin artırılması durumunda, 2022 yılında projenin başlaması planlanmaktadır.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.850.000		2.310.000	0	% 0,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren HEY Portalı veritabanının, veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. Bu Portal aracılığıyla NEFES yazılımına esas şehirlerde hava kalitesi seviyelerinin belirlenmesi, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatının kullanımına yönelik hava kalitesi haritalarının üretimi ile birlikte katı yakıt uygunluk, satış ve dağıtım hizmetinin elektronik süreç takibi gerçekleştirilmektedir. 2018 yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenen Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi projesi ile portalın veri tabanı tüm ülke geneline yaygınlaştırılmış ve proje ile hedeflenen tüm geliştirmeler sağlanmıştır. Proje ile geliştirilen Katı Yakıt Modülü; Bakanlığımız 2020/25 sayılı Genelgesi ile uygulamaya alınmıştır. 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla ısınma amaçlı yerli ve ithal tüm katı yakıtların ilköyle girişten son kullanıcıya ulaşana kadar süreçte mevzuatın gereği olarak verilen tüm belgeler elektronik ortamda e-imza ile düzenlenmeye başlanmıştır. İlave olarak, katı yakıtların üretici/ithalatçı/dağıtıcılardan satıcıya kadar olan dağıtım süreci stok takibi ile kontrol altına alınmıştır. Satıcıların ise uygulamaya veri girişlerini mobil versiyonu ile üzerinden gerçekleştirilebilecekleri planlanmaktadır. Ülkemizdeki katı yakıt satıcılarının söz konusu uygulamanın mobil versiyonu ile satış yaptıkları müşterileri sisteme tanımlamaları ile adrese dayalı katı yakıt tüketim miktarı bilgisine ulaşılmış olacaktır. Elde edilen bu veri sistemdeki evsel ısınma kaynaklı hava kirliliği emisyon hesaplamasında kullanılacaktır. Ayrıca katı yakıt modülünün halen ıslak ortamda yapılan başvuru sürecinin de elektronik ortama taşınması ve e-devlet entegrasyonu ile kullanıcılarının doğrudan bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. HEYGEL projesi ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında hava kalitesi tahminleme sisteminin ilk adımları atılmış olup, yazılımın ülke genelinde sürekli hizmet verecek şekilde geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda uluslararası çalışmalar yakından takip edilmekte olup yapay zeka kullanımı, büyük veri yönetimi, uzaktan algılama teknolojileri gibi farklı teknolojilerin sisteme entegrasyonu ile hesaplamalardaki belirsizlik oranının asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Önerilen proje ile yapılacak Ar-Ge faaliyetleri kapsamında mevcut sistemin iyileştirilmesi/geliştirilmesine yönelik adımlar güncel son teknoloji kullanılarak hayata geçirilmiş olacaktır. Hava kalitesi yönetiminde karar destek aracı olarak kullanılan Hava Emisyon Yönetim Portalının teknolojik açıdan iyileştirilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, web yazılım ile hayata geçirilen çevre yatırımının sürdürülmesi ve daha ileriye taşınması amaçlanmaktadır. Projenin şartname süreci devam etmektedir.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2024	7.000.000	0	3.000.000	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi hazırlanmış olup ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	9.990.000		3.080.000	0	% 0,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren NEFES yazılımına ait veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. NEFES yazılımı kapsamında şehirlerin hava kalitesine ilişkin değerlendirme ve sonuç odaklı eylemlerinin belirlenmesine esas dijital ikizlerinin üretilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Hava kalitesi yönetiminde şehirlere özgü yüksek çözünürlüklü veri üreterek kirliliğin kaynağının tespitinin sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlık indeksi hesabı ile şehrin hava kalitesini etkileyen tüm etmenlere ilişkin karar destek süreçlerine değerlendirme aracı sağlanması amacıyla planlama yapılması öngörülmektedir. Çalışmaların ilerimizde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Projenin şartname süreci devam etmektedir.
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2023	12.000.000		6.000.000	0	% 0,0	Projenin teknik şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)-(Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	EKÖK Kapsamında Atık İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi	2020-2022	2.250.000	1.150.000	1.100.000	0	% 0,0	Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından teknik şartname kapsamında sunulması gereken 2. ilerleme raporu 18.02.2022 tarihli ve 162 sayılı yazı ile Bakanlığımıza sunulmuş ve uygun bulunmuştur. Proje kapsamında yapılması gereken 50 saha ziyaretinden 45'i gerçekleştirilmiştir.
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	7.439.000	3.972.000	1.978.000	0	% 0,0	IPA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmıştır. Proje kapsamında 2022 yılı 1. döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. 3 Şubat.2022 tarihinde 3. İlerleme Raporu teslim edilmiştir. 24 Şubat 2022 tarihinde 11. Operasyonel Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 8 Mart.2022 tarihinde 6. Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 8-9 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul ilinde Kimya Sektörü için Uyum Raporlarının Hazırlanmasına yönelik 1. Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2022 tarihinde Bakanlık personeline EKÖK Envanteri Güncellenmesine yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir. 22-24 Mart 2022 tarihlerinde İzmir ilinde Mineral Sektörü için Uyum Raporlarının Hazırlanmasına yönelik 1. Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretleri özelinde 10 adet çevrimiçi proses eğitimi alınmıştır. Bilecik, Bursa, İzmir, Adana ve Mersin illerinde toplam 41 tesise saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 18 adet Saha Ziyareti Raporu Yararlanıcı'ya teslim edilmiştir.
AB katkısı			42.150.000	25.290.000	8.430.000	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-3	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2024	9.500.000		2.500.000	0	% 0,0	Projenin teknik şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2018K10-18333	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Arttırılması (CITYAIR) (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2022	5.785.000	5.234.000	551.000	0	% 0,0	CITYAIR Projesi 2018 Aralık itibarıyla başlamış, covid-19 pandemisi nedeniyle 4 aylık süre uzatımı yapılmıştır. 6. Ara rapor dönemi içerisinde bulunulan projede hazırlanan raporların kontrolü ve içerik değerlendirmesi devam etmektedir. Online akademi için hazırlanan videoların sonuçlandırılması işlemleri devam etmektedir. Hava kalitesi farkındalık seminerleri serisinin 4. etkinliği bu dönem içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sosyal medya ve kamuoyu farkındalığı kampanyaları sürdürülmüştür. Bu çerçevede Eko İklim Zirvesinde proje faaliyetlerinin tanıtımı gerçekleştirilmiş ve geniş kitleye ulaşılması sağlanmıştır.
AB katkısı			32.779.000	31.765.000	1.014.000	0	% 0,0	
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2022	4.959.000	1.857.000	3.102.000	0	% 0,0	"Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik" kapsamında ilk çalıştay 25-26 Ocak 2022 ve ikinci çalıştay 29-30 Mart 2022 tarihinde düzenlendi. 16-17 Mart 2022 tarihinde Su ve Toprak Yönetimi Dairesi temsilcilerinin ve Toprak Kirliliği Uzmanının katılımı ile bir teknik toplantı düzenlendi. Bu toplantıda ikinci çalıştay öncesi alınacak kararlar görüşüldü. Kirlenmiş Sahalarda Önceliklendirme Parametrelerinin Tanımlanması Çalıştayı 04.03.2022 tarihinde toplam 110 kişinin katılımı ile çevrim içi olarak düzenlendi. Kirleticiler ve Sektörlerin Tanımlanması Çalıştayı 15.03.2022 tarihinde toplam 74 kişinin katılımı ile çevrim içi olarak düzenlendi. Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahalara İlişkin Teknik Kılavuz taslağı 12.02.2022 tarihinde teknik dairelerin görüşlerine sunuldu. Temizleme/İyileştirme Teknolojileri Kılavuzu, Kirlenmiş Sahalar Uzmanı tarafından güncellendi ve 15.03.2022 tarihinde teknik dairelerin görüşlerine sunuldu. KOK'larla ve Kalıcı Toksik Maddelerle Kirlenmiş Sahalara İlişkin Rapor 10.02.2022 tarihinde onaylandı. Beşinci Faaliyet Raporu 25.03.2022 tarihinde taslak olarak tüm tarafların görüşüne sunuldu. İkinci İlerleme Raporu 17.03.2022 tarihinde basılı kopya olarak teslim edildi. KOK'larla kirlenmiş iki pilot sahada yürütülecek iyileştirme çalışmaları için hazırlanan ihale dosyasına, 17.02.2022 tarihinde Delegasyon'un yorumları geldi. Teknik dairelerin ve sözleşme makamının katılımı ile 23.03.2022 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Pilot sahalardan biri olan Hopa Termik Santrali sahasında ek analiz yapılması kararlaştırıldı. 22. Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 22.03.2022 tarihinde ve 23. Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı 04.04.2022 tarihinde gerçekleştirildi.
AB katkısı			28.101.000	10.526.000	17.575.000	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181853	Atık Yönetimi Alanında Kapasite Geliştirme [AB-1] (Çevre Sektörü)	2019-2021	9.122.000		3.636.000	0	% 0,0	Söz konusu başlık altında yer alan 3 projeden biri olan ve AB IPA 2 Dönemi fonları ile desteklenen "Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi" projesi 07.02.2022 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Açılış (Kick Off) Toplantısı 17.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu proje kapsamında Başlangıç Raporu hazırlanmış olup henüz nihai hale gelmemiştir. Diğer taraftan Ön Değerlendirme Raporu taslağı da Genel Müdürlüğümüze sunulmuş olup rapor üzerinde incelemelerimiz devam etmektedir. Şubat ayında başlayan projeye yönelik herhangi bir ödeme yapılmamıştır
AB katkısı			51.688.000		20.604.000	0	% 0,0	
<b>10 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>484.895.000</b>	<b>155.923.000</b>	<b>89.347.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>AB KATRISI</b>	<b>154.718.000</b>	<b>67.581.000</b>	<b>47.623.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K08-183815	Atık Yönetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2022-2023	1.958.000		0			Proje ödenekleri Bakanlık Makamının 02.03.2022 tarihli ve E.3071898 sayılı Oluru ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Projeye ilişkin gerçekleştirmeler Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden talep edilmektedir.
2022K10-181851	ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED) Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)	2022-2023	2.000.000		0			Proje ödenekleri Bakanlık Makamının 02.03.2022 tarihli ve E.3071898 sayılı Oluru ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Projeye ilişkin gerçekleştirmeler Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden talep edilmektedir.
2022K10-183741	Çevre Denetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)	2022-2023	486.000		0			Proje ödenekleri Bakanlık Makamının 02.03.2022 tarihli ve E.3071898 sayılı Oluru ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Projeye ilişkin gerçekleştirmeler Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden talep edilmektedir.
2021K10-169535	Hava Kirliliği Kaynakları ve Önlemlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2021-2022	600.000	300.000	300.000	0	% 0,0	Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından, Proje 1. yılını tamamlamış olup, 3 hakediş ödemesi yapılmıştır. Proje kapsamında; 4. hakediş Mayıs ayı itibari ile gerçekleştirilecektir. Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2022 döneminde Zonguldak ili kış dönemi örnekleme çalışmaları devam etmektedir.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.550.000	435.000	570.000	0	% 0,0	Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kriter Belirleme Çalışmalarına Yönelik Hizmet Alımı İşi kapsamında hazırlanan çamaşır deterjanı ve bulaşık makinesi deterjanı ürün grubu çevre etiketi kriterleri yayımlanmıştır. (Bu dönem hakediş ödemesi yapılmamıştır.)
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2023	189.813.000	140.114.000	26.115.000	0	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği	2014-2023	122.738.000	77.714.000	21.440.000	735.483	% 3,4	3 adet Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarına ait bakım onarım ve kalibrasyon sözleşmesi imzalanmış olup bakım onarım kalibrasyon çalışmaları devam etmektedir. 8 Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne ödenek aktarılmakta olup ilgili Müdürlükler tarafından çalışmalar yapılmaktadır.
	Döner Sermaye Ödeneği	2014-2022	67.075.000	62.400.000	4.675.000	0	% 0,0	Ulusal hava kalitesi izleme ağına ilave edilmek üzere hava kalitesi izleme istasyonu kurulumu teknik şartname hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2021-2023	3.500.000	1.000.000	1.250.000	0	% 0,0	Ulusal hava kalitesi ağı'nda yenilenmesi gereken istasyonlara ait tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu tespitler ışığında teknik şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
Alt proje-3	Güneydoğu THMM Hava Kalitesi Ön Değerlendirme	2021-2022	2.750.000	1.250.000	1.500.000	0	% 0,0	Teknik Şartname Hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
2020K10-140875	Çevre Referans Laboratuvarı Altyapı Revizyonu (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2020-2022	8.470.000	4.140.000	4.330.000	0	% 0,0	31 Mart 2022 tarihi itibarıyla tamamlanmış olan proje kapsamında Numune Kabul ve Raporlama Birimi, Yakıt Ön İşlem Laboratuvarı, Yakıt Analiz Laboratuvarı ve Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı revize edilmiş, cihaz ve ekipman alımı yapılmış olup; ödeme aşamasına gelinmiştir.
2022K10-181796	Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı Aracı Alımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2022-2022	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı aracı alımı için şartname hazırlanarak, ilgili birime iletilmiştir. Araç alım aşamasındadır.
<b>6 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>135.582.000</b>	<b>80.699.000</b>	<b>25.060.000</b>	<b>735.483</b>	<b>% 2,9</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>78.545.000</b>	<b>66.540.000</b>	<b>12.005.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>214.127.000</b>	<b>147.239.000</b>	<b>37.065.000</b>	<b>735.483</b>	<b>% 2,0</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018E06-87362	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2025	750.000.000	119.172.000	1.000	0	% 0,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğüne söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL, Genel Müdürlüğümüzce Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmalarının kapsamının belirlenmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli ön proje doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlandığı bilinmektedir. İhale süreçleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu aşamada, Başkanlığımıza iletilen başkaca bir husus bulunmamaktadır.
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	1.854.000.000	232.992.000	107.518.000	29.334.508	% 27,3	EPC-REN-WORKS-P01 kapsamında Bursa Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Enerji Verimliliği Onarımı İşi geçici kabul işlemi tamamlanmıştır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	1.818.774.000	217.079.000	93.750.000	29.070.278	% 31,0	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	35.226.000	15.913.000	13.768.000	264.230	% 1,9	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-180876	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (Yapı İşleri ve CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması (**.Döner Sermaye)	2022-2022	700.000		700.000	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki yazılımların bakım onarım ve iyileştirme işlemlerinde ve donanım ihtiyaçlarının sağlanmasında proje ödeneği kullanılmaktadır.
2020K14-152212	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2020-2022	12.026.000	9.826.000	2.200.000	303.652	% 13,8	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi kapsamında geliştirilen yöntem ve yazılım yardımı ile 2020-2023 yılları arasında 81 ilden kamu binalarının envanter bilgilerinin toplanmasına başlanacak ve deprem riskine ilişkin olarak, kamu binalarının deprem performansının belirlenmesi için bir önceliklendirme yapılacaktır. Toplam Kamu Binası adedinin 400.000 civarında olduğu öngörülmektedir (KAYSİS bilgilerine göre). Bina envanter bilgileri bir yazılım kapsamında puanlanacak olup, puanlama sonrasında renk kodları kırmızı (1. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi ivedi yapılması gereken bina), turuncu (2. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi 2.öncelikli olarak yapılması gereken bina), sarı (3. Öncelikli, Deprem Performansı İncelemesi 3.öncelikli olarak yapılması gereken bina) olmak üzere incelenmesi gereken binalar sınıflandırılacaktır. Yazılımdan alınacak raporlar çok gizli evrak niteliğinde olup, sadece Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıkların üst düzey sorumluları ve gerekli hallerde Valiler ile paylaşılacaktır. Proje 2020 yılında başlamış olup, o tarihten Mart 2022 sonuna kadar 372.220 adet kamu binasının envanter bilgileri sisteme kayıt edilmiştir. 68 ilimizde envanter çalışmaları bitirilmiştir. Projenin 2022 yılı sonunda tamamen bitirilmesi hedeflenmektedir.
2022K14-180871	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2022-2022	5.700.000		5.700.000	0	% 0,0	İhale süreci devam etmektedir.
2022K14-181274	Afet Sonrası Bina Güvenliği Teyidi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2022-2022	8.500.000		8.500.000	0	% 0,0	Fiyat analizi çalışmaları devam etmektedir.
2022K14-181283	Afet Sonrası Zemin Güvenliği Teyidi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2022-2022	8.500.000		8.500.000	0	% 0,0	İhale süreci devam etmektedir.
2022K14-181290	Afet Sonrası Haritalama ve Bölge Tarama (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2022-2022	1.000.000		1.000.000	1.599.951	% 160,0	2021 yılının aralık ayında alımı tamamlanmıştır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	2.462.901.000	0	41.166.000	0	% 0,0	
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	353.975.000	0	39.234.000	260.366	% 0,7	Proje kapsamında Ocak 2022- Mart 2022 döneminde bireysel uzman ödemeleri yapılmıştır.Ayrıca danışmanlık hizmetleri kapsamında Yapısal Güçlendirme ve Enerji Verimliliği Tasarımı ve İnşaat Müşavirliği Danışmanlık Hizmeti (WB/DESSUP-01) ihalesine çıkmıştır.
	Hibe Ödeneği	2021-2027	6.953.000	0	1.932.000	0	% 0,0	
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	2.101.973.000	0	0			
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2021-2023	15.335.000	0	2.000	0	% 0,0	PROJE İŞİ: 2021 DE TAMAMLANDI. SÖZLEŞME BEDELİ : 285.000,00 GERÇEKLEŞME : %100 (YAKLAŞIK MALİYET GÜNCELLENİYOR)
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	33.630.000	0	12.000.000	0	% 0,0	PROJE İŞİ: 2021 DE TAMAMLANDI. SÖZLEŞME BEDELİ : 259.500,00 GERÇEKLEŞME : %100 (YAKLAŞIK MALİYET GÜNCELLENİYOR)
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	21.712.000	0	8.000.000	0	% 0,0	UYGULAMA PROJELERİ İÇİN İLİNE YETKİ VERİLMİŞTİR.
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	16.396.000	0	6.000.000	0	% 0,0	UYGULAMA PROJELERİ İÇİN İLİNE YETKİ VERİLMİŞTİR.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	23.468.000	0	9.000.000	0	% 0,0	UYGULAMA PROJELERİ İÇİN İLİNE YETKİ VERİLMİŞTİR.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BASLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K07-140439	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	5.502.000	4.750.000	752.000	0	% 0,0	PROJE İŞLERİMİZ: 1. ANTALYA, BURDUR, İSPARTA YÖRESEL TİP KONUT PROJESİ İŞİ: SÖZLEŞME BEDELİ: 260.000,00 TL ÖDENEN: 81.422,00 TL GERÇEKLEŞME: %31 2. KASTAMONU, BARTIN, ÇORUM YÖRESEL TİP KONUT PROJESİ İŞİ: SÖZLEŞME 139.000,00 ÖDENEN: 43.062,00 GERÇEKLEŞME: %31 3. SAMSUN, ORDU, GİRESUN YÖRESEL: SÖZLEŞME: 235.600,00 ÖDENEN: 69.737,60 GERÇEKLEŞME: %30 4. BİTLİS, MUŞ, VAN YÖRESEL: SÖZLEŞME: 192.500,00 ÖDENEN: 192.500,00 GERÇEKLEŞME : %100 (2021-2022 BİTEN VE DEVAM EDEN YÖRESEL PROJE İŞLERİMİZ - GENEL BÜTÇE - MERKEZ SAYMANLIK ÇŞB)
2018K07-18500	Sarkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	60.000.000	0	20.000.000	0	% 0,0	Konutların yapılacağı alan için yapılan imar planına itirazlar olduğundan süreç mahkemelik olmuştur. Danıştay aşamasındaki sürecin sonlanması beklenmektedir.
2018K07-24212	İhsu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	8.719.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	10.000.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçbeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2023	55.899.000		30.000.000	0	% 0,0	Fiyat artışı nedeniyle proje tutarının artırılması gerekmekte olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığından onay beklenmektedir.
2022K07-180883	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukları harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2022K07-183787	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	5.000.000		5.000.000	394.171	% 7,9	İhtiyaç duyuldukları harcama yapılacaktır.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	23.164.000		23.164.000	0	% 0,0	Fiyat artışı nedeniyle proje tutarının artırılması gerekmekte olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığından onay beklenmektedir.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2023	44.436.000		20.116.000	0	% 0,0	Fiyat artışı nedeniyle proje tutarının artırılması gerekmekte olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığından onay beklenmektedir.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2025	310.639.000	65.329.000	48.761.000	0	% 0,0	Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak illerinde 94 köydeki uygulamalarda yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2022 yılı itibarıyla bu iş için ayrılan ödenek miktarı 48.761.000 TL olarak belirlenmiştir.
	Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	15.412.000	1.070.000	1.634.000	0	% 0,0	
	Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	20.000.000	521.000	5.444.100	0	% 0,0	
	Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	26.756.520	18.541.000	6.015.520	0	% 0,0	
	Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	1.751.000	451.000	1.000	0	% 0,0	
	Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	3.577.000	802.000	1.000	0	% 0,0	
	Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	13.022.000	1.522.000	2.279.200	0	% 0,0	
	Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	13.099.000	2.049.000	200.000	0	% 0,0	
	Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	6.296.000	2.478.000	718.212	0	% 0,0	
	Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	7.775.000	1.495.000	1.498.000	0	% 0,0	
	Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	4.137.000	1.328.000	61.200	0	% 0,0	
	Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	81.706.000	20.048.000	10.022.568	0	% 0,0	
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Iğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	12.000.000	0	1.919.700	0	% 0,0	
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	6.058.000	800.000	3.003.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BASLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	9.000.000	733.000	5.396.600	0	% 0,0	
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	7.700.000	373.000	1.000	0	% 0,0	
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	5.000.000	360.000	1.260.000	0	% 0,0	
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	21.084.000	8.278.000	4.641.000	0	% 0,0	
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	3.070.000	770.000	3.000	0	% 0,0	
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	1.500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	6.060.000	527.000	141.000	0	% 0,0	
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	14.005.000	762.000	481.900	0	% 0,0	
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	8.500.000	473.000	3.000	0	% 0,0	
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	4.044.000	572.000	3.044.000	0	% 0,0	
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	2.061.000	681.000	1.000	0	% 0,0	
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	7.419.480		1.000	0	% 0,0	
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.074.000	695.000	979.000	0	% 0,0	
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2025	7.000.000		1.000	0	% 0,0	
2022K07-180884	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyulduka harcama yapılacaktır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024			50.000.000	200.000	% 0,4	Kamulaştırma ve konut satın alımları için kullanılmaktadır. 31.03.2022 tarihi itibarıyla Adıyaman ilinde toplam da 4 konut satın alımı için 200.000 TL ödenek Adıyaman iline gönderilmiştir.
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	5.238.442.000	341.001.000	233.019.000	29.724.815	% 12,8	
2 Proje		08 TOPLAM	310.689.000	65.329.000	48.811.000	0	% 0,0	
7 Proje		DÖNER SERMAYE	51.761.000	9.826.000	26.602.000	1.903.603	% 7,2	
2 Proje		HİBE	42.179.000	15.913.000	15.700.000	264.230	% 1,7	
		GENEL TOPLAM	5.643.071.000	432.069.000	308.432.000	31.628.418	% 10,3	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	95.206.000	0	35.000.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	50.000.000	200.000	% 0,4	



**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K09-162458	Doğu Karadeniz Dere Yatakları Islah ve İyileştirme (Şehirleşme Sektörü)	2021-2023	1.000.000	200.000	500.000	0	% 0,0	25.10.2021 tarihinde Bakanlığımız ile ODTÜ Üniversitesi arasında imzalanan Protokol kapsamında 7 İş Paketinden oluşan söz konusu projenin 2023 yılında bitirilmesi planlanmakta olup, Üniversitece çalışmalar devam ettirilmektedir.
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

## MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D00-17215	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2024	3.266.000	820.000	750.000	5.793	% 0,8	<p>*263.040 TL bedelli Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YES-TR) Yazılımı İşinin sözleşmesi 05/11/2019 tarihinde imzalanmıştır. 2020 yılı temmuz ayı içinde işin tasarım raporunun onaylanması ve ihale bedelinin %15'inin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. İşin kabulü ve geri kalan %85'lik bedelin ödenmesi işlemleri 2020 yılı aralık ayı içinde tamamlanmıştır. Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı için 18/12/2022 tarihine kadar yüklenici tarafından ücretsiz garanti ve bakım hizmeti verilecektir. 2022 yılı içinde 2023 yılında yürütülecek Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı Bakım, Destek ve İyileştirme Hizmet Alımı işi için ihaleye çıkılması planlanmaktadır.</p> <p>*27/07/2020 tarihinde ihalesi yapılan 365 gün süreli Binalarda Enerji Verimliliği Uygulaması (BEP-TR) 2. Versiyon Bakım Destek ve İyileştirme Hizmet Alımı işinin sözleşmesi 05/10/2020 tarihinde imzalanmış ve 2021 yılı Ekim ayı içinde iş tamamlanmıştır. Bir sonraki bakım, destek, ve iyileştirme faaliyetleri için ihaleye çıkmamış olup, yazılımın tüm bakım, destek, ve iyileştirme faaliyetleri Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.</p> <p>*21/02/2022-25/02/2025 tarihleri arasında Konya ili Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen İklim Şurasına katılım sağlanmıştır.</p> <p>*11/03/2022 tarihinde İstanbul'da İMSAD tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma amaçları Diyalog Gününe katılım sağlanmıştır.</p> <p>*22/03/2022-24/03/2022 tarihleri arasında İstanbul'da Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesine katılım sağlanmıştır.</p> <p>*25/03/2022-26/03/2022 tarihleri arasında BETEK Boya ve Kimya A.Ş.'nin Balıkesir ve Gebze'de bulunan Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezlerinde ısı yalıtım malzemeleri teknolojilerine yönelik teknik incelemeye katılım sağlanmıştır.</p> <p>*31/03/2022-02/04/2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yangın Güvenlik Sempozyumu ve Sergisine katılım sağlanmıştır.</p>
2022K01-180881	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2022-2022	400.000		400.000	0	% 0,0	TSE'ye Test ve Muayene Ücreti Ödemesi yapılmıştır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.666.000</b>	<b>820.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>5.793</b>	<b>% 0,5</b>	

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021E06-164350	Trafik Sorununun Çözümü için Akıllı Şehirler (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2021-2023	10.780.000	0	8.676.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Bluetooth Dedektör Cihazı, Değişken Mesaj İşareti ve Ortalama Hız Tespit Sistemi, Yeni Nesil Bisikletli Toplu Taşıma, Trafik Güvenliği Analiz Platformu işlerine ilişkin ihale süreçleri başlatılmıştır.
2022E06-182027	Kent İçi Hareketlilik Analizleri (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2022-2023	2.800.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Kent İçi Hareketlilik Analiz Yazılımı işine ilişkin ihale süreci başlatılmıştır.
2021K01-164342	Milli Emlak Otomasyon Projesi İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2021-2022	2.768.000	1.384.000	1.384.000	0	% 0,0	İhale Bedeli (KDV hariç): 2.344.800,00 TL tutarında 2021-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 2 yıllık olarak ihale edilmiştir. Sözleşme 8.01.2021 tarihinde imzalanmıştır. Proje şartnameye ve belirlenen iş takvimine uygun olarak devam etmektedir. 2022 yılı 1. hakediş ödemesi yapılmıştır. Ödemeler proje takvimine göre yapılacaktır.
2022K01-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Genel İdare Sektörü)	2022-2023	5.768.000		2.000.000	0	% 0,0	Teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (Genel İdare Sektörü)	2022-2023	6.120.000		3.000.000	0	% 0,0	Analiz çalışmaları devam etmektedir.
2020K01-146671	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2020-2022	7.420.000	5.350.000	2.070.000	0	% 0,0	İhale Bedeli (KDV hariç): 3.884.400,00 TL tutarında 2020-2021-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 39 aylık olarak ihale edilmiştir. Sözleşme 06.07.2020 tarihinde imzalanmıştır. Proje şartnameye ve belirlenen iş takvimine uygun olarak devam etmektedir. Ödemeler proje takvimine göre yapılacaktır.

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-180876	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (Yapı İşleri ve CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Dijital Dönüşüm V2 (**.Döner Sermaye)	2022-2022	8.000.000		8.000.000	2.312.328	% 28,9	Proje Kapsamındaki 80 uygulamanın bakım ve güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Proje şartnameye ve belirlenen iş takvimine uygun olarak devam etmektedir. 2022 yılı 1. hakediş ödemesi yapılmıştır. Ödemeler proje takvimine göre yapılacaktır.
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini (**.Döner Sermaye)	2022-2022	14.254.000		14.254.000	1.112.339	% 7,8	Çok fonksiyonlu yazıcı temini kapsamında Ricoh Turkey Baskı Çözümleri Limited Şirketine 215.000 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. Bilgisayar temini kapsamında Kozhan Bilişim Teknolojilerine 727.660 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. Ödemeler proje takvimine göre yapılacaktır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım,Onarım ve Lisans Temini (**.Döner Sermaye)	2022-2022	6.000.000		6.000.000	0	% 0,0	Teknik şartname, yaklaşık maliyet ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.
	Hazır Yazılım Temini, Uygulama Yazılımı Lisans Alımı ve Bakımı (**.Döner Sermaye)	2022-2022	3.300.000		3.300.000	0	% 0,0	491 adet elektronik sertifika ile 87 adet kart okuyucu temini ve Belgenet Bakım ve güncelleme hizmetleri tamamlanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre yapılacaktır.
2018K09-35701	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	35.973.000	23.473.000	12.500.000	0	% 0,0	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2022	14.260.000	12.260.000	2.000.000	0	% 0,0	Teknik şartname, yaklaşık maliyet ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.
	TUCBS Entegrasyonu	2018-2022	12.241.000	9.741.000	2.500.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmış yaklaşık maliyet belirlenmiş olup ihale hazırlıkları devam etmektedir.
	Coğrafi Veri ve Metaverilerinin Güvenli Paylaşımı	2021-2022	1.275.000	275.000	1.000.000	0	% 0,0	Teknik şartname, yaklaşık maliyet ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.
	Coğrafi Bilgi Platformu Modernizasyonu	2021-2022	2.279.000	779.000	1.500.000	0	% 0,0	Teknik şartname, yaklaşık maliyet ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.
	Coğrafi Veri Güncelleme Çalışmaları	2021-2022	1.918.000	418.000	1.500.000	0	% 0,0	Teknik şartname, yaklaşık maliyet ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.
	TUCBS Coğrafi Veri Uyumlaştırma Çalışmaları	2021-2022	4.000.000	0	4.000.000	0	% 0,0	Teknik şartname, yaklaşık maliyet ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-141024	Bilişim ve Donanım Altyapısı Modernizasyonu (Şehirleşme Sektörü)	2020-2022	6.299.000	2.919.000	3.380.000	0	% 0,0	
	Çevre ve Şehircilik Veri Sözlüğü Geliştirilmesi (**.Döner Sermaye)	2021-2022	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	% 0,0	14.01.2022 tarihinde yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle mevcut sözleşme feshedilmiştir. Yeniden ihale edilmek üzere teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
	E-Belediye Uygulamaları Bakım-Onarım (**.Döner Sermaye)	2021-2022	2.299.000	919.000	1.380.000	0	% 0,0	E-Belediye E-Plan Otomasyon Sistemi Bakım işine ilişkin hizmet alımı ihale süreci tamamlanmış olup sözleşme aşamasına gelinmiştir.
2022K09-181318	Parselasyon Planları İzleme ve Denetleme Sistemi (Şehirleşme Sektörü)	2022-2022	1.100.000		1.100.000	0	% 0,0	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı İdame, Ek Geliştirme ve Yaygınlaştırma İşine yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır ihale süreci devam etmektedir.
2022K09-181334	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yaygınlaştırma (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı İdame, Ek Geliştirme ve Yaygınlaştırma İşine yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır ihale süreci devam etmektedir.
2022K09-181337	E-Plan Otomasyon Sistemi İdame ve Yenileme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	3.700.000		2.000.000	0	% 0,0	E-Plan Otomasyon Sistemi Modernizasyonu İşine yönelik teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır ihale süreci devam etmektedir.
2022K09-187448	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.500.000		2.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları işine ilişkin teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır ihale süreci başlatılmıştır.
	Akıllı Şehir Coğrafi Veri Sözlüğü	2022-2023	2.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları işine ilişkin teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır ihale süreci başlatılmıştır.
	Akıllı Şehir Rehberliği İkinci Faz Uygulamaları	2022-2023	2.500.000		1.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları işine ilişkin teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır ihale süreci başlatılmıştır.

**COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K08-183815	Atık Yönetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2022-2023	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
2022K10-181851	ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED) Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)	2022-2023	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
2022K10-183741	Çevre Denetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ve CBS Ortak Proje) (Çevre Sektörü)	2022-2023	1.500.000		1.500.000	0	% 0,0	Analiz çalışmaları devam etmektedir.
<b>13 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>82.009.000</b>	<b>24.857.000</b>	<b>40.660.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>45.273.000</b>	<b>8.269.000</b>	<b>37.004.000</b>	<b>3.424.667</b>	<b>% 9,3</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>127.282.000</b>	<b>33.126.000</b>	<b>77.664.000</b>	<b>3.424.667</b>	<b>% 4,4</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2025	34.717.000	9.671.000	2.414.000	461.879	% 19,1	
<i>AB katkısı</i>			196.710.000	54.798.000	13.677.000	2.617.317	% 19,1	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	3.614.526.000	1.271.661.000	1.374.673.000	81.297.310	% 5,9	
	AB Hibesi		2.964.170.000	1.080.900.000	1.105.581.000	69.101.253	% 6,3	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		273.265.000	80.416.000	112.932.000	5.111.062	% 4,5	
	Mahalli İdare Katkısı		377.091.000	110.345.000	156.160.000	7.084.995	% 4,5	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>34.717.000</b>	<b>9.671.000</b>	<b>2.414.000</b>	<b>461.879</b>	<b>% 19,1</b>	
	<i>AB KATKISI</i>		<b>196.710.000</b>	<b>54.798.000</b>	<b>13.677.000</b>	<b>2.617.317</b>	<b>% 19,1</b>	
	<i>İçmesuyu Projesi</i>		<b>3.614.526.000</b>	<b>1.271.661.000</b>	<b>1.374.673.000</b>	<b>81.297.310</b>	<b>% 5,9</b>	

**2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	<b>Çarşamba Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>108.615.000</b>	<b>79.494.000</b>	<b>28.583.000</b>	<b>9.160.149</b>	<b>% 32,0</b>	
	AB Hibesi		92.320.000	67.569.000	24.295.000	7.785.951		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		6.518.000	4.770.000	1.715.000	549.615		
	Mahalli İdare Katkısı		9.777.000	7.155.000	2.573.000	824.583		
Alt proje-2	<b>Bandırma Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>209.777.000</b>	<b>91.503.000</b>	<b>66.483.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		178.306.000	77.776.000	56.510.000			
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.589.000	5.491.000	3.989.000			
	Mahalli İdare Katkısı		18.882.000	8.236.000	5.984.000			
Alt proje-3	<b>Bismil Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>108.851.000</b>	<b>79.360.000</b>	<b>26.464.000</b>	<b>4.414.067</b>	<b>% 16,7</b>	
	AB Hibesi		92.520.000	67.455.000	22.493.000	3.751.724		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		7.349.000	5.357.000	1.787.000	298.063		
	Mahalli İdare Katkısı		8.982.000	6.548.000	2.184.000	364.280		
Alt proje-4	<b>Bozüyük Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>308.576.000</b>	<b>0</b>	<b>179.461.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		202.209.000	0	117.600.000			
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		42.553.000	0	24.748.000			
	Mahalli İdare Katkısı		63.814.000	0	37.113.000			
Alt proje-5	<b>Çankırı Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>290.511.000</b>	<b>44.284.000</b>	<b>112.866.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		246.931.000	37.641.000	95.936.000			
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.432.000	2.657.000	6.772.000			
	Mahalli İdare Katkısı		26.148.000	3.986.000	10.158.000			
Alt proje-6	<b>Elbistan Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>198.690.000</b>	<b>141.469.000</b>	<b>54.449.000</b>	<b>15.399.999</b>	<b>% 28,3</b>	
	AB Hibesi		168.882.000	120.247.000	46.281.000	13.089.816		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.414.000	9.550.000	3.676.000	1.039.695		
	Mahalli İdare Katkısı		16.394.000	11.672.000	4.492.000	1.270.488		
Alt proje-7	<b>Giresun Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>294.915.000</b>	<b>45.334.000</b>	<b>93.874.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		250.679.000	38.534.000	79.797.000			
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.697.000	2.720.000	5.633.000			
	Mahalli İdare Katkısı		26.539.000	4.080.000	8.444.000			
Alt proje-8	<b>İğdır Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>209.752.000</b>	<b>156.766.000</b>	<b>45.364.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>% 12,9</b>	
	AB Hibesi		178.285.000	133.250.000	38.559.000	4.955.449		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		14.160.000	10.582.000	3.062.000	393.516		
	Mahalli İdare Katkısı		17.307.000	12.934.000	3.743.000	481.035		
Alt proje-9	<b>Kastamonu Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>156.659.000</b>	<b>118.095.000</b>	<b>35.894.000</b>	<b>9.628.979</b>	<b>% 26,8</b>	
	AB Hibesi		133.157.000	100.380.000	30.509.000	8.184.391		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		9.401.000	7.086.000	2.154.000	577.835		
	Mahalli İdare Katkısı		14.101.000	10.629.000	3.231.000	866.753		



Alt proje-10	<b>Niksar Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>214.446.000</b>	<b>127.889.000</b>	<b>67.477.000</b>	<b>10.885.340</b>	<b>% 16,1</b>
	AB Hibesi		182.276.000	108.705.000	57.355.000	9.252.466	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.869.000	7.674.000	4.049.000	653.182	
	Mahalli İdare Katkısı		19.301.000	11.510.000	6.073.000	979.692	
Alt proje-11	<b>Rize Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>219.404.000</b>	<b>51.782.000</b>	<b>107.598.000</b>	<b>3.381.146</b>	<b>% 3,1</b>
	AB Hibesi		186.491.000	44.014.000	91.458.000	2.873.964	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.165.000	3.107.000	6.456.000	202.873	
	Mahalli İdare Katkısı		19.748.000	4.661.000	9.684.000	304.309	
Alt proje-12	<b>Sivas Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>112.540.000</b>	<b>55.972.000</b>	<b>53.486.000</b>	<b>5.740.128</b>	<b>% 10,7</b>
	AB Hibesi		95.656.000	47.575.000	45.462.000	4.878.990	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		6.754.000	3.359.000	3.210.000	344.498	
	Mahalli İdare Katkısı		10.130.000	5.038.000	4.814.000	516.640	
Alt proje-13	<b>Sorgun Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>81.016.000</b>	<b>31.231.000</b>	<b>45.926.000</b>	<b>4.732.171</b>	<b>% 10,3</b>
	AB Hibesi		68.861.000	26.546.000	39.036.000	4.022.232	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		4.862.000	1.874.000	2.756.000	283.976	
	Mahalli İdare Katkısı		7.293.000	2.811.000	4.134.000	425.963	
Alt proje-14	<b>Şırnak Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>103.172.000</b>	<b>90.157.000</b>	<b>10.967.000</b>	<b>2.255.746</b>	<b>% 20,6</b>
	AB Hibesi		87.694.000	76.633.000	9.321.000	1.917.189	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		6.966.000	6.086.000	741.000	152.412	
	Mahalli İdare Katkısı		8.512.000	7.438.000	905.000	186.145	
Alt proje-15	<b>Trabzon Su Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>190.713.000</b>	<b>78.044.000</b>	<b>64.183.000</b>	<b>6.773.845</b>	<b>% 10,6</b>
	AB Hibesi		162.103.000	66.337.000	54.555.000	5.757.710	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		11.445.000	4.683.000	3.851.000	406.433	
	Mahalli İdare Katkısı		17.165.000	7.024.000	5.777.000	609.702	
Alt proje-16	<b>Yüksekova Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>107.281.000</b>	<b>47.650.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		91.186.000	40.502.000	46.749.000	0	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		7.243.000	3.217.000	3.713.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		8.852.000	3.931.000	4.538.000	0	
Alt proje-17	<b>Suluova Entegre Su Tesisi</b>	<b>2020-2025</b>	<b>166.944.000</b>	<b>0</b>	<b>53.337.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		141.898.000	0	45.335.000	0	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		11.271.000	0	3.601.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		13.775.000	0	4.401.000	0	
Alt proje-18	<b>Doğubayazıt Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>212.381.000</b>	<b>32.631.000</b>	<b>86.992.000</b>	<b>3.095.738</b>	<b>% 3,6</b>
	AB Hibesi		180.521.000	27.736.000	73.943.000	2.631.370	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		14.337.000	2.203.000	5.872.000	208.964	
	Mahalli İdare Katkısı		17.523.000	2.692.000	7.177.000	255.404	
Alt proje-19	<b>Aksaray Entegre Su Projesi</b>	<b>2021-2025</b>	<b>320.283.000</b>	<b>0</b>	<b>186.269.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		224.195.000	0	130.387.000	0	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		43.240.000	0	25.147.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		52.848.000	0	30.735.000	0	

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022F00-180864	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2022-2022	500.000		500.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2022-2022	500.000		500.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2021F00-161772	Hafik Gölü Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2022	5.000.000	1.252.000	3.748.000	0	% 0,0	İmalat çalışmaları devam etmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2023	18.600.000	6.000.000	7.500.000	0	% 0,0	İmalat çalışmaları devam etmektedir.
2022F00-181114	Sülüngür Gölü Ahşap İskele Yapımı (Turizm Sektörü)	2022-2022	250.000		250.000	0	% 0,0	Mali katkı protokol çalışmaları devam etmektedir.
2022F00-181116	Fakıllı Mağarası Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2022-2022	465.000		465.000	0	% 0,0	Mali katkı protokol çalışmaları devam etmektedir.
2022F00-184858	Mağara ve Anıt Ağaçlar Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2022-2022	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2024	38.471.000	15.653.000	7.005.000	0	% 0,0	
	ÖÇK Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2024	22.747.000	6.647.000	5.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokol çalışmaları devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2024	15.724.000	9.006.000	2.005.000	0	% 0,0	Mali katkı protokol çalışmaları devam etmektedir.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2024	35.999.000	11.999.000	12.768.000	0	% 0,0	
	Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri	2021-2022	14.999.000	11.999.000	3.000.000	0	% 0,0	İmalat çalışmaları devam etmektedir.
	Ihlara Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Eksikliklerinin Giderilmesi	2022-2022	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokol çalışmaları devam etmektedir.
	Muğla ÖÇK Bölgelerinde Altyapı Yatırımlar	2022-2024	9.000.000		3.768.000	0	% 0,0	Mali katkı protokol çalışmaları devam etmektedir.
	Samsun Doğal Sit Alanlarda Altyapı Yatırımları	2022-2024	9.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokol çalışmaları devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2022	16.493.000	11.300.000	5.193.000	0	% 0,0	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2022	3.600.000	2.500.000	1.100.000	0	% 0,0	Talep gelmesi halinde çalışmalar yapılacaktır.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2022	8.365.000	5.965.000	2.400.000	0	% 0,0	Yatırım Programı yapılacak işler ile ilgili Makam Olur'u alınacaktır
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2022	1.485.000	735.000	750.000	0	% 0,0	Yatırım Programı yapılacak işler ile ilgili Makam Olur'u alınacaktır
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2022	3.043.000	2.100.000	943.000	0	% 0,0	Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi C.100 düzenleme sahasında Bakanlığımız ile Cihanbeyli Belediyesi arasında 200.000 TL maddi katkı protokolü imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	2021-2023	11.100.000	1.700.000	4.200.000	0	% 0,0	
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	2.800.000	800.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmektedir.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Sürtingenlerin Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması, İzlenmesi	2021-2023	1.289.000	900.000	156.000	0	% 0,0	Proje yapımı için 09.09.2021 tarihinde 919.000 TL'lik sözleşme imzalanmış olup, yıllara sarif olarak yürütülecektir.
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2023	7.011.000		3.044.000	0	% 0,0	2021 yılında yapılan fizibilite çalışması sonucunda alanın rehabilitasyonu için bazı uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılı yatırım projesinde karakteristiği "Danışmanlık, Etüd-Proje" olan projenin karakteristiğinin "Uygulama ve Danışmanlık" şeklinde değiştirilmesi için 03.03.2022 tarih ve 3040110 sayılı Strateji Geliştirme Başkanlığına talep yazısı yazılmıştır. Cumhurbaşkanlığı'ndan onaylanmıştır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-2121	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi (Çevre Sektörü)	2014-2022	141.238.000	131.238.000	10.000.000	0	% 0,0	
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	İklim Değişikliğinin Ekosistem Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması	2021-2023	3.500.000	1.225.000	1.050.000	0	% 0,0	2021 yılı bütçesi 2024 yılına aktarılmış olup 2022 yılı itibariyle henüz harcama yapılmamıştır. 1. hakediş düzenlenmiş olup onaylanması beklenmektedir.
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2023	3.324.000	1.775.000	1.149.000	0	% 0,0	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2023	2.124.000	1.326.000	748.000	0	% 0,0	Çalışmalar Devam Etmektedir.
	Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2020-2022	450.000	449.000	1.000	0	% 0,0	Yapılan Sözleşme Gereği İş Tamamlanmıştır.
	Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2022-2023	750.000		400.000	0	% 0,0	Henüz çalışmalar tamamlanmamıştır, ihale süreci devam etmektedir.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2023	924.000	384.000	270.000	0	% 0,0	2021 Yılı sonu itibariye kümülatif harcama 416.398,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Projede toplamda % 52'lik fiili gerçekleştirme sağlanmıştır.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	5.596.000	1.686.000	2.145.000	0	% 0,0	
	Karaburun-İldır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2023	3.850.000	1.440.000	1.352.000	0	% 0,0	KARASAL kısmı için; 3. Ara Rapor sunulmuş olup; projede % 50'lik gerçekleştirme sağlanmıştır. DENİZEL kısmı için; 1.Ara Rapor sunulmuş olup % 34'lük gerçekleştirme sağlanmıştır. Toplamda % 36'lık gerçekleştirme sağlanmıştır.
	Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2022	389.000	156.000	233.000	0	% 0,0	3. Ara Rapor sunulmuş olup; % 40'lik gerçekleştirme sağlanmıştır.
	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2021-2023	450.000	90.000	225.000	0	% 0,0	2. Ara Rapor sunulmuş olup; % 20'lik gerçekleştirme sağlanmıştır.
	İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2022-2024	907.000		335.000	0	% 0,0	İhale hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.500.000	200.000	795.000	0	% 0,0	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	580.000	200.000	313.000	0	% 0,0	Proje 2021-2022 yıllarını kapsamaktadır.2021 yılında işin %46.15 i gerçekleştirilmiştir.Devam etmektedir.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	50.000	0	40.000	0	% 0,0	Bütçe takviyesi talep edildikten sonra 2022 yılında başlanması planlanmaktadır.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2022-2023	870.000		442.000	0	% 0,0	İhale hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.
2022K10-181787	Göksu Deltası ÖÇKB Koruma Amaçlı Araç Temini (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2022	700.000		700.000	0	% 0,0	25.03.2022 tarih ve E-69208088-840-3258102 sayılı yazı ile Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Yetki Devri yapıldı.
2022K10-181879	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (Çevre Sektörü)	2022-2022	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	İhale süreci devam etmektedir.
2022K10-183740	Yangında Zarar Gören Korunan Alanlar Restorasyonu (Çevre Sektörü)	2022-2022	250.000		250.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183742	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2022-2023	1.535.000		1.060.000	0	% 0,0	
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2022-2022	172.000		172.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasında
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2022-2022	127.000		127.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasında
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2022-2022	127.000		127.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasında
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2022	25.000		25.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasında
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2022-2022	157.000		157.000	0	% 0,0	Proje ye Haziran ayı itibarı ile başlanacaktır
	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2022-2022	127.000		127.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasında
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2022-2023	800.000		325.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasında



**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2022-2024			2.819.000	0	% 0,0	
<b>18 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>250.746.000</b>	<b>172.413.000</b>	<b>47.580.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>36.699.000</b>	<b>11.999.000</b>	<b>13.468.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>287.445.000</b>	<b>184.412.000</b>	<b>61.048.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.819.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2024	7.788.000	5.100.000	500.000	0	% 0,0	
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2024	7.900.000	2.500.000	1.500.000	0	% 0,0	
2022K07-180882	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 217) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2022	1.810.964.000		1.810.964.000	0	% 0,0	2022 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullanılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.826.652.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

Dipnot: 217

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

## MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-180872	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2022-2022	500.000		500.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2022-2022	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2022-2022	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2022-2022	200.000		200.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2022-2024			5.000.000	592.263	% 11,8	
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2022-2024			7.000.000	317.671	% 4,5	
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>909.934</b>	<b>% 7,6</b>	

**ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018A05-14322	Ulusal Arazi Örtüsü (Ormancılık Sektörü)	2018-2022	21.400.000	20.200.000	1.200.000	0	% 0,0	
2013A05-1732	Murat Nehri Havzası Rehabilitasyonu (*Kredili Proje) (Ormancılık Sektörü)	2013-2022	3.832.218	3.332.218	500.000	0	% 0,0	Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 'nin İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmekte idi. Ancak; Genel Müdürlüğümüzün 29 Ekim 2021 Tarihinde 85 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanması sonrası proje kapsamında imzalanan İkras Anlaşması'nda tadilat yapılması gerekmiştir. Proje kapanışına kalan sürenin az olması nedeni ile Projede tadilat yapılamayacağı İFAD Yetkilileri tarafından bildirilmiştir ve 2022 yılında Genel Müdürlüğümüze yapılması planlanan tüm faaliyetlerin Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasında mutabık kalmış olup, kredi karşılığı tahsis edilen miktarı olan 400.000 TL. kullanılamayacaktır. Ayrıca; bu nedenle 2022 yılı için Genel Bütçeden proje için ayrılan 100.000TL'nin Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Projesi'nin 24.160.573.19695.20.41.01.06.01 tertibine aktarılması hususu Strateji Başkanlığı'na Resmi yazı bildirilmiştir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		2.889.004	2.489.004	400.000	0	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği		943.214	843.214	100.000	0	% 0,0	
2020A05-168456	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2020-2024	18.838.800	3.950.800	6.300.000	0	% 0,0	
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2020-2023	17.930.496	3.860.496	6.070.000	0	% 0,0	Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2020-2024	370.304	90.304	80.000	0	% 0,0	Proje'ye ilişkin bütçe harcaması ve ilgili faaliyetlerin, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
	Çölleşme ve Kuraklığa Dirençli Şehirler	2020-2024	538.000		150.000	0	% 0,0	
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>44.071.018</b>	<b>27.483.018</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

## STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2022	1.402.000	400.000	1.002.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2022K09-180888	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2022-2022	3.400.000		3.400.000	727.365	% 21,4	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2022-2022	3.400.000		3.400.000	33.040	% 1,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2022G00-180868	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2022-2022	2.139.000		2.139.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>8.939.000</b>	<b>0</b>	<b>8.939.000</b>	<b>760.405</b>	<b>% 8,5</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>1.402.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>10.341.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.941.000</b>	<b>760.405</b>	<b>% 7,6</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2022 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2021 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2022 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2022 31.03.2022 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022G00-180868	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2022-2022	200.000		200.000	0	% 0,0	
2022K09-180888	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2022-2022	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2022-2022	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2022-2022	931.000		931.000	0	% 0,0	Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 18.03.2022 tarihli ve E-96822168-170.01-73103 sayılı yazısı ile taşıt alım izni verilmiştir. Alım işlemleri devam etmektedir.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>931.000</b>	<b>0</b>	<b>931.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.331.000</b>	<b>0</b>	<b>1.331.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
