



# 2023 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 2. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 Dönemi)



# BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2023 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>4.257.365.000,00</b>	<b>4.299.425.894,97</b>	<b>2.527.057.255,59</b>	<b>% 58,8</b>
02	<b>SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>756.980.000,00</b>	<b>775.168.425,23</b>	<b>423.645.126,05</b>	<b>% 54,7</b>
03	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>453.954.000,00</b>	<b>777.616.529,37</b>	<b>338.412.737,45</b>	<b>% 43,5</b>
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	339.854.000,00	663.516.529,37	323.226.693,77	<b>% 48,7</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	68.100.000,00	68.100.000,00	15.186.043,68	<b>% 22,3</b>
	Kentsel Dirençlilik Projesi-DB Kredisi Karşılığı	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	<b>% 0,0</b>
05	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>5.263.627.000,00</b>	<b>10.769.668.277,74</b>	<b>6.727.896.823,10</b>	<b>% 62,5</b>
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	1.069.395.000,00	1.069.395.000,00	581.940.000,00	<b>% 54,4</b>
	Kentsel Dönüşüm Genel Bütçe Ödeneği ve Ek Ödenek	208.459.000,00	208.459.000,00	145.486.000,00	<b>% 69,8</b>
	Kentsel Dirençlilik Projesi-DB Kredisi Karşılığı	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	<b>% 0,0</b>
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	<b>% 100,0</b>
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	<b>% 0,0</b>
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	1.232.000.000,00	1.232.000.000,00	336.732.000,00	<b>% 27,3</b>
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	315.000.000,00	311.000.000,00	76.068.500,00	<b>% 24,5</b>
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	110.000.000,00	110.000.005,85	69.100.139,09	<b>% 62,8</b>
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	27.573.000,00	37.614.271,89	18.370.184,01	<b>% 48,8</b>
	İskan Uygulamaları Ödeneği	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	<b>% 0,0</b>
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	200.000,00	200.000,00	200.000,00	<b>% 100,0</b>
06	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>2.019.188.000,00</b>	<b>5.830.819.306,82</b>	<b>2.365.881.650,27</b>	<b>% 40,6</b>
	Bakanlık Yatırım Programı	1.793.188.000,00	2.482.140.000,00	219.439.230,09	<b>% 8,8</b>
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	226.000.000,00	226.000.000,00	195.485.523,23	<b>% 86,5</b>
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	2.000.000.000,00	1.099.998.352,80	<b>% 55,0</b>
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk		0,00	0,00	
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	1.122.679.306,82	850.958.544,15	<b>% 75,8</b>
07	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>11.379.934.000,00</b>	<b>14.379.947.304,50</b>	<b>13.307.104.735,08</b>	<b>% 92,5</b>
	Bakanlık Yatırım Programı	359.934.000,00	359.934.000,00	7.320.191,28	<b>% 2,0</b>
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	<b>% 100,0</b>
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	<b>% 100,0</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	299.784.543,80	<b>% 29,4</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	13.304,50	0,00	<b>% 0,0</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	0,00	0,00	
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
08	<b>BORÇ VERME</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>6.765.600,00</b>	<b>% 3,6</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>24.321.048.000,00</b>	<b>37.022.645.738,63</b>	<b>25.696.763.927,54</b>	<b>% 69,4</b>



# BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

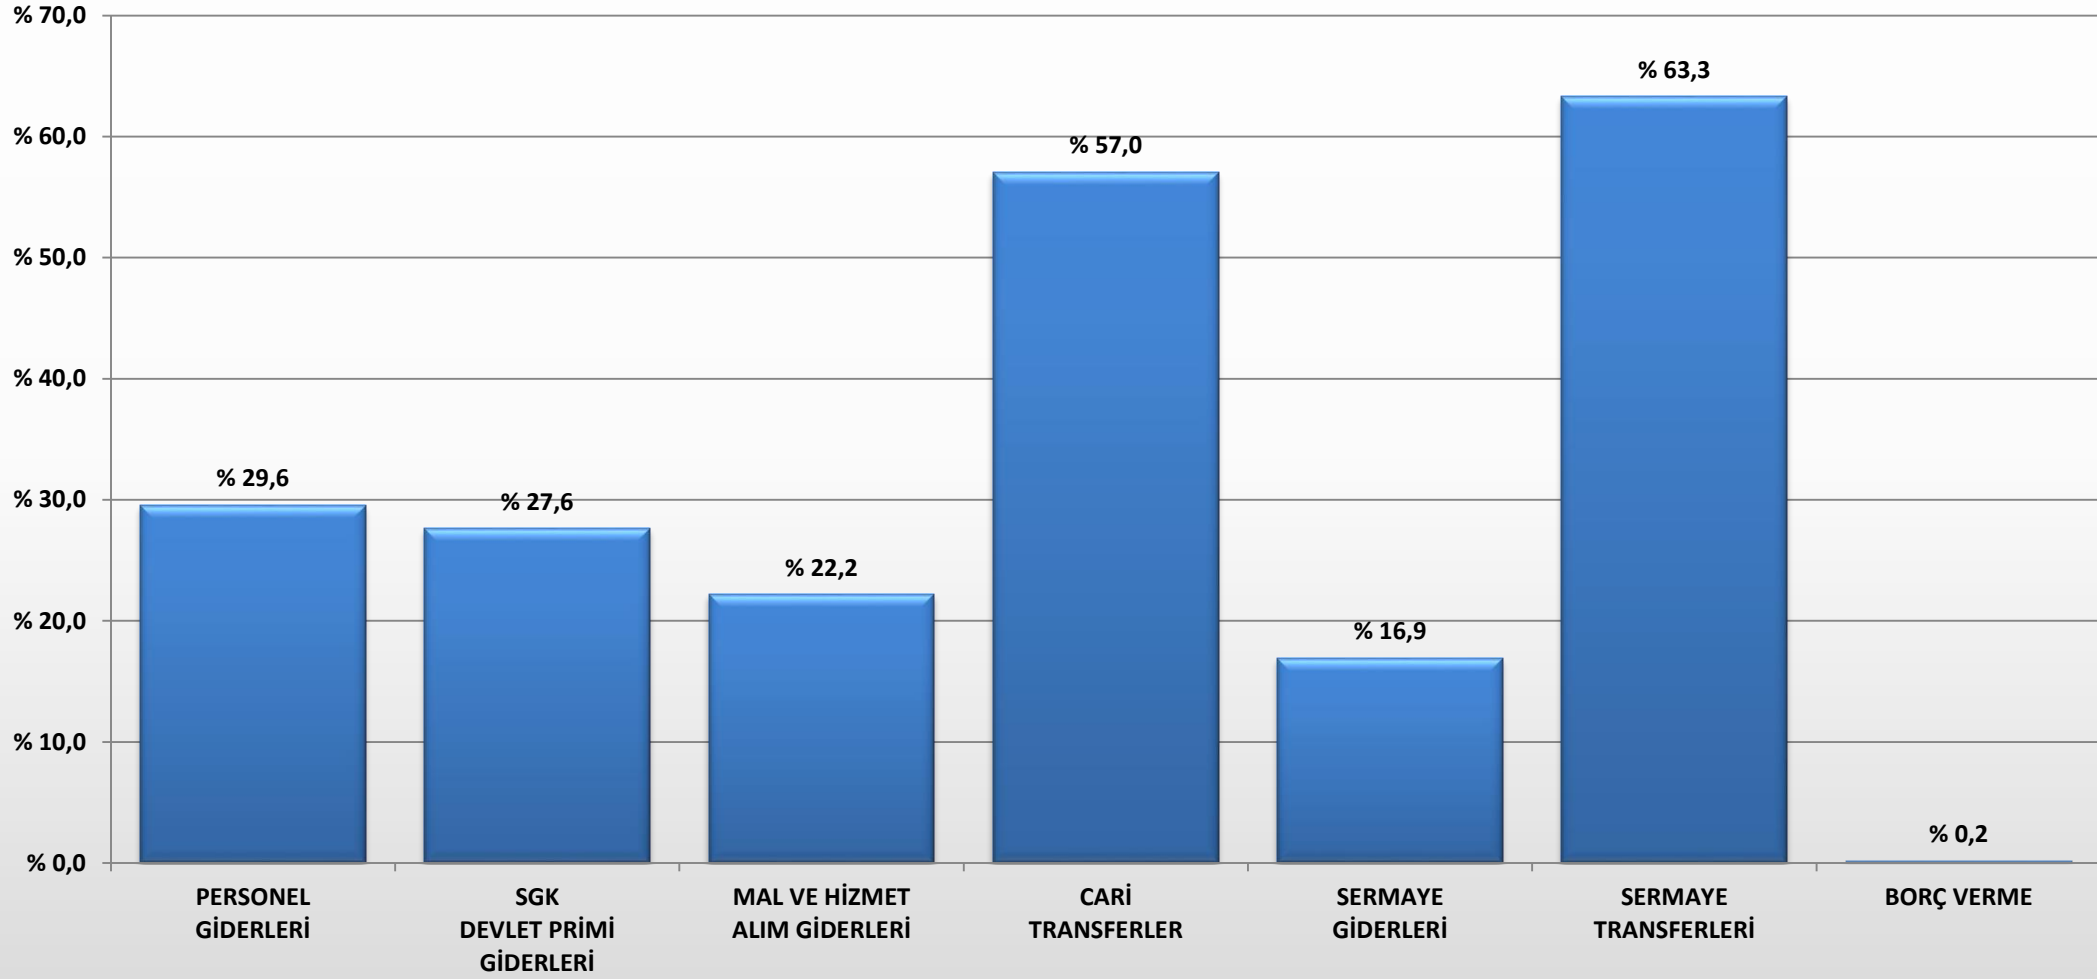




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ

## 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2023 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2023 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	55.855.000,00	24.516.000,00	1.410.921,00	% 5,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	11	839.829.000,00	206.628.000,00	2.000.000,00	% 1,0
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	6	374.421.000,00	90.782.000,00	5.881.509,00	% 6,5
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	19	22.935.222.000,00	2.465.336.000,00	210.388.241,28	% 8,5
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	0	0,00	0,00	0,00	
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	3.321.000,00	1.280.000,00	310.249,81	% 24,2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	18	244.008.000,00	186.274.000,00	27.563.971,50	% 14,8
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	6.211.961.300,00	6.426.000,00	3.532.364,72	% 55,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	21	1.961.953.000,00	526.528.000,00	12.061.355,00	% 2,3
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	3.819.600.000,00	3.000.000,00	0,00	% 0,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	63.330.000,00	21.000.000,00	183.591,00	% 0,9
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	18.300.000,00	17.800.000,00	8.003.126,52	% 45,0
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	2.005.000,00	2.005.000,00	1.705.000,00	% 85,0
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>95</b>	<b>36.531.605.300,00</b>	<b>3.553.375.000,00</b>	<b>273.040.329,83</b>	<b>% 7,7</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>68</b>	<b>35.348.570.300,00</b>	<b>2.996.874.000,00</b>	<b>229.315.777,35</b>	<b>% 7,7</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>27</b>	<b>1.183.035.000,00</b>	<b>556.501.000,00</b>	<b>43.724.552,48</b>	<b>% 7,9</b>
<b>"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği</b>	<b>4 adet</b>		<b>226.000.000,00</b>	<b>195.485.523,23</b>	<b>% 86,5</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

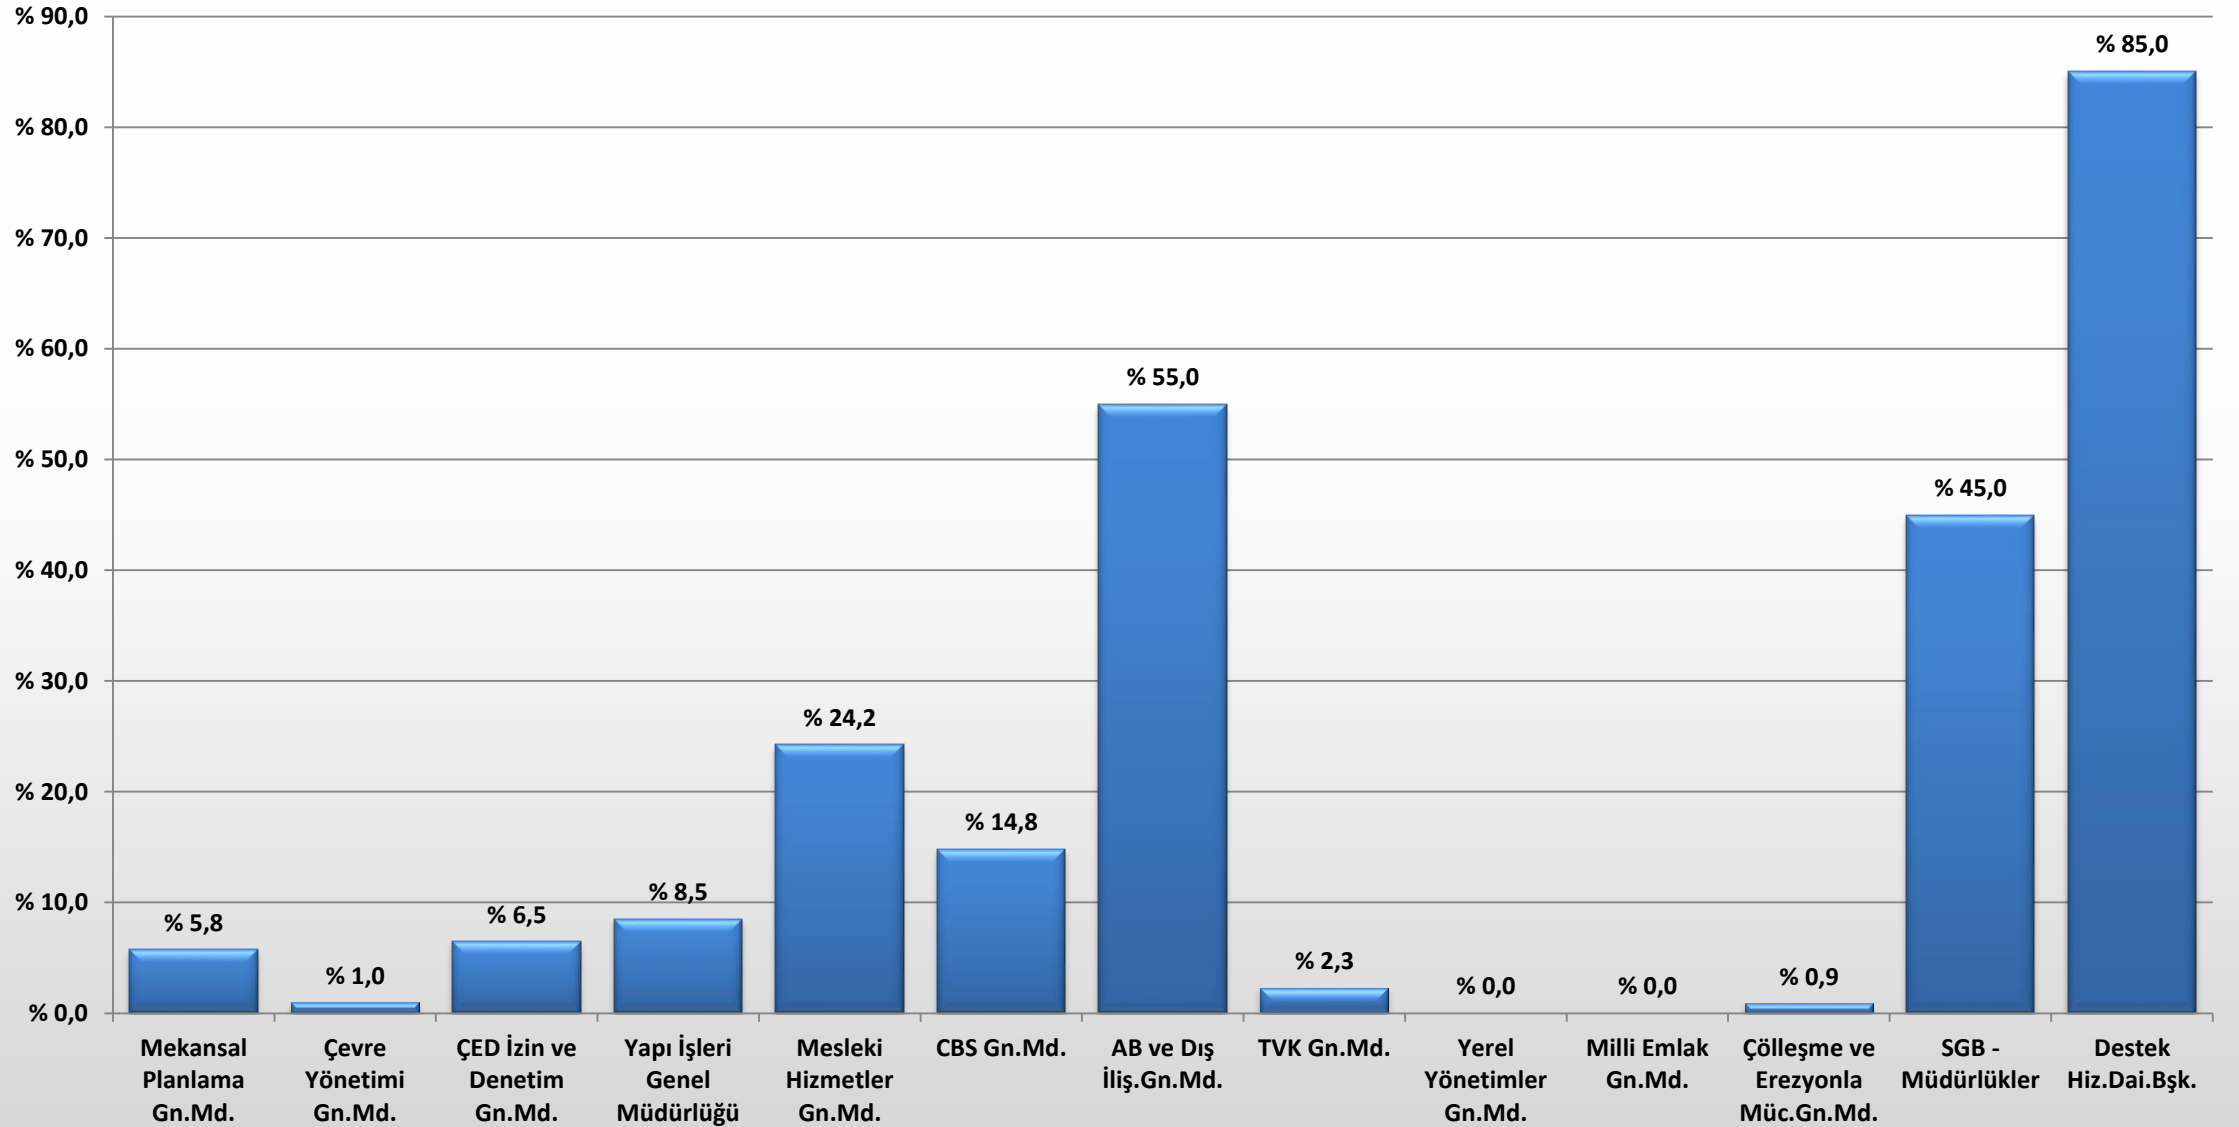



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2023 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	88.659.000,00	93.808.000,00	37.575.567,75	% 40,1
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	3.274.158.000,00	3.277.843.304,56	678.849.724,64	% 20,7
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	220.190.000,00	220.510.000,00	93.209.321,44	% 42,3
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	2.017.015.000,00	4.992.810.403,19	1.661.653.870,62	% 33,3
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	12.939.639.000,00	21.440.810.869,23	19.272.392.485,53	% 89,9
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	61.065.000,00	61.197.000,00	32.742.069,57	% 53,5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	114.397.000,00	130.597.000,00	46.485.182,37	% 35,6
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	130.583.000,00	130.618.005,79	87.333.896,31	% 66,9
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	261.872.000,00	299.327.350,00	41.964.194,63	% 14,0
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	23.748.000,00	23.748.000,00	13.430.528,25	% 56,6
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	429.151.000,00	429.151.000,00	226.064.779,04	% 52,7
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	59.320.000,00	59.322.000,00	22.154.027,32	% 37,3
Personel Genel Müdürlüğü	21.212.000,00	21.694.000,00	14.991.950,51	% 69,1
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	21.798.000,00	21.798.000,00	19.944.337,41	% 91,5
Özel Kalem Müdürlüğü	101.280.000,00	101.280.000,00	13.678.961,77	% 13,5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	237.286.000,00	412.664.634,73	256.371.138,17	% 62,1
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	7.689.000,00	7.689.000,00	4.296.870,58	% 55,9
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	34.689.000,00	34.689.000,00	27.504.707,81	% 79,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı	336.857.000,00	332.859.000,00	88.422.721,65	% 26,6
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	3.782.000,00	3.782.000,00	2.132.253,35	% 56,4
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	10.687.000,00	10.687.000,00	10.687.000,00	% 100,0
İl Müdürlükleri	3.914.664.000,00	4.904.485.171,13	3.037.184.887,93	% 61,9
Yurtdışı Teşkilatı	11.307.000,00	11.275.000,00	7.693.450,89	% 68,2
<b>TOPLAM</b>	<b>24.321.048.000,00</b>	<b>37.022.645.738,63</b>	<b>25.696.763.927,54</b>	<b>% 69,4</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

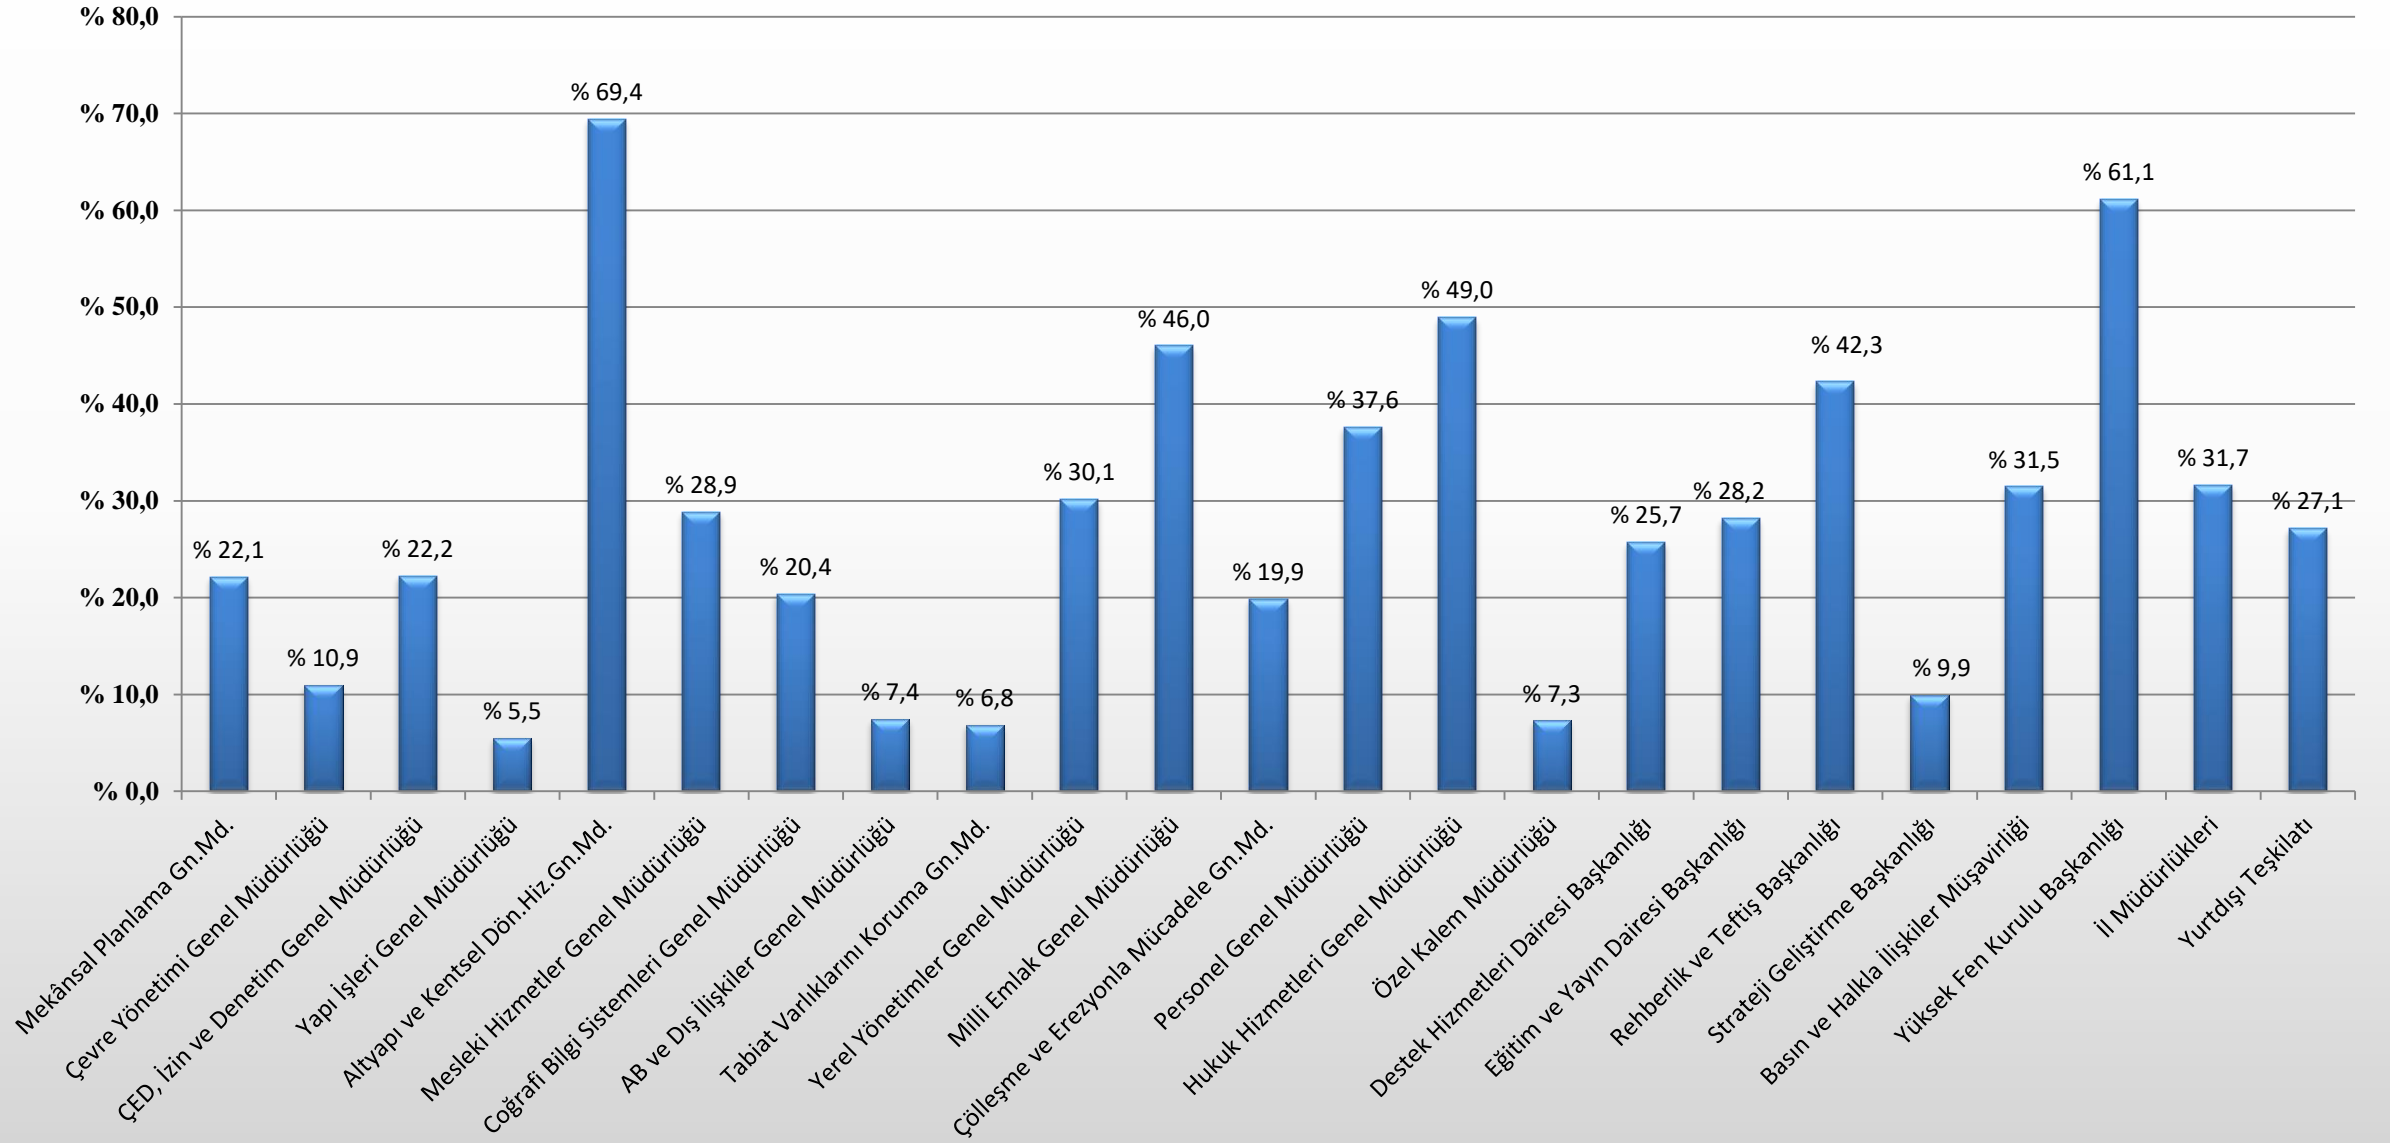

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı**

**Harcama Birimi Bazında**

**2023 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri**

**01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023**



**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K09-162464	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2023	4.000.000	2.500.000	1.500.000	0	% 0,0	
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	4.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2024	28.816.000	7.799.000	7.587.000	0	% 0,0	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2024	19.416.000	3.486.000	2.500.000	0	% 0,0	
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2023	9.400.000	4.313.000	5.087.000	0	% 0,0	
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2024	7.500.000	0	6.000.000	0	% 0,0	

## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K09-200027	Mücadir Alan Bilgi Sisteminin Oluşturulması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2023-2023	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2024	6.390.000		2.280.000	170.921	% 7,5	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi (Fiyat Farkı) 170.921,06TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2024	6.390.000		2.280.000	170.921	% 7,5	
2023K09-198533	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi (2 Nolu Hakediş) 358.720,00TL, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulama İşİ (6 Nolu Hakediş) 503.723,21TL, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulama İşİ (7 Nolu Hakediş) 377.563,53TL olmak üzere toplam 1.240.006,74 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
	Örnek İmar Uygulamaları Kesin Hesabı	2023-2023	4.149.000		4.149.000	1.240.000	% 29,9	
<b>6 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>54.855.000</b>	<b>10.299.000</b>	<b>23.516.000</b>	<b>1.410.921</b>	<b>% 6,0</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>55.855.000</b>	<b>10.299.000</b>	<b>24.516.000</b>	<b>1.410.921</b>	<b>% 5,8</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	500.000.000	200.000.000	165.000.000	0	% 0,0	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneğinden hakediş kapsamında 49.953.569 TL harcama yapılmıştır. 6 şubat 2023 ve sonrasında meydana gelen depremler nedeni ile ödeneğin 65 milyon TL olarak belirtilmesi sebebiyle yıl sonu harcama tahmini 65 milyon TL öngörülmüştür.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme Kılavuzu Hazırlama (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2024	4.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Proje bütçesi dikkate alındığında 2022 yılı içerisinde artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2023 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize yapılarak başvurulmuştur. Bütçe 4milyon TL olarak süresi 2022-2024 olarak revize edilmiştir. Proje revizesi çalışmaları yürütülmekte olup henüz 2023 yılı için ayrılan ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. Projenin süresinde revize talebi bulunmamaktadır. O nedenle yıl sonuna kadar harcama yapılması öngörülmemektedir.
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2024	12.350.000	2.310.000	5.390.000	0	% 0,0	
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2024	3.500.000	0	2.700.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname oluşturularak teklif alınmış olup, teknik şartname kapsamında gelen teklif proje bütçesinden fazla olduğu için proje bütçesinin arttırılması talep edilecektir.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.850.000	2.310.000	2.690.000	0	% 0,0	Şartname kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen projede; yazılıma esas geliştirme, araştırma-geliştirme süreçlerine esas faaliyetler sürdürülmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2025	15.000.000	3.000.000	7.000.000	0	% 0,0	Proje, 2021 Yılı Yatırım Programında yer almakta iken yaşanan Covid19 süreci ile başlatılmamış olup süre uzatımına gidilmiştir. 08/11/2022 tarihinde yapılan sözleşme ile başlayan ve 08/12/2022 tarihinde açılışı yapılan projenin ilk hakedişi 2022 yılı 4. Çeyreğinde yapılmıştır. Projenin 2023 yılı 2. döneminde, Teknik Şartname kapsamında hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan Kıyı Tesisleri ve Plan Analizleri Raporu değerlendirme aşamasında olup hakedişi yapılmamıştır. Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması planlanmış ve bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ek bütçe talebinde bulunulmuş ve 2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar ile projenin toplam bütçesi 15.000.000 ₺'ye yükseltilmiştir. Bahse konu CBS tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması için teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	9.990.000	3.080.000	3.580.000	0	% 0,0	TURKSAT ile yürütülen proje şartnamesi kapsamında belirlenen iller için veri üretimi çalışmaları planlanan şekilde gerçekleştirilmiş olup, iş planı çerçevesinde faaliyetler sürdürülmektedir.
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2024	12.000.000	0	6.000.000	0	% 0,0	2022 Yatırım Programında yer alan Projenin 01.02.2023 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile 3f kapsamında protokolü imzalanmış olup, proje 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu teslim edilmiş olup, İdare tarafından raporların inceleme ve değerlendirme süreci devam etmektedir.
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (Çevre Sektörü)	2023-2025	10.000.000	0	3.500.000	2.000.000	% 57,1	04/01/2023 tarihli ve 5447350 sayılı Olur kapsamında söz konusu Projenin Türksat A.Ş. ile yapılması kararlaştırılmıştır. Gerekli satınalma süreçleri tamamlanarak 07/04/2023 tarihinde Türksat A.Ş. ile Sözleşme imzalanmıştır.
2023K10-198444	Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2024	8.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	Söz konusu proje Yatırım Programında kabul edilmiş olup (15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 sayılı Mükerrer Resmi Gazete. Karar Sayısı: 6703; Proje No: 2023K10-198444), KDV dahil toplam 8 Milyon TL Döner Sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 2023-2024 yıllarını kapsamaktadır. Proje 15.06.2023 tarihinde imzalan protokol ile başlatılmıştır. Protokol ve eki teknik şartnamesi çerçevesinde 03.07.2023 tarihli ve 978583 sayılı dilekçe ile Yüklenici tarafından Proje Başlangıç Raporu tarafımıza sunulmuş olup, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek üzere inceleme ve değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)-(Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2025	9.500.000		3.500.000	0	% 0,0	Mâli nedenlerden dolayı Kamu Hizmet Sunucusu olarak üniversite (ODTÜ) ile protokol imzalanamamış olup, bahse konu Ar-Ge projesinin 10/05/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2014/6228 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında belirlenecek yeni yüklenici ile protokol imzalanacaktır.
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	13.429.000	10.206.000	3.223.000	0	% 0,0	IPA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmış olup 3 yıllık projenin 2023 3. çeyrekte tamamlanması planlanmaktadır. Yeşil Mutabakat Eylem Planının da önemli çıktılarında olan, Ulusal Emisyon Stratejisi Eylem Planının hazırlanması, EKÖK Belgelendirme Yazılımı oluşturulması ve mevcut en iyi tekniklere yönelik sektörel tebliğlerin ve kılavuzların hazırlanması ile EKÖK mevzuatı uyumlaştırılmasına yönelik sektörlerin altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar DIES Projesi ile tamamlanacaktır.
AB katkısı			76.097.000	60.877.000	15.220.000	0	% 0,0	Proje kapsamında; proje başlangıcından 30 Haziran 2023 döneminde, 1 Açılış Toplantısı, 11 Çevrimiçi Çalıştay, 9 Yüz yüze Çalıştay, 2 Farkındalık Semineri, 4 Eğitimcilerin Eğitimi, 23 farklı ilde 236 saha ziyareti, 2 çalışma ziyareti, 1 Staj Programı, 1 yurtdışı toplantı katılımı 9 Proje Yönlendirme Kurulu Toplantısı ve 20 Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, EKÖK Belgelendirme Yazılımı geliştirilmekte olup, 11 sektörel kılavuz ve 10 adet sektörel uyum raporu hazırlanmış,18 adet sektörel tebliğ eki bununla birlikte taslak çerçeve mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2023	8.953.000	4.111.000	4.842.000	0	% 0,0	2023 yılı ilk iki çeyreğinde dönemi kapsamında proje faaliyetlerinin ilerlemesi aşağıdaki şekildedir: - Proje'ye Zeyilname ile 7 Ekim 2022 tarihinde eklenen "Risk Değerlendirmesi ve Alternatif İyileştirme Teknolojileri Eğitimi" 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) merkez (9) ve il müdürlüğü (83) personelinin katılımı ile Antalya'da düzenlendi. Ulusal ve uluslararası uzmanların risk değerlendirmesi, teknoloji seçimi, vaka çalışmaları, vb. anlatıldığı bu eğitime toplam 92 temsilci katıldı. Eğitim raporu yazıldı ve onaylandı - Proje'nin 30'uncu ve 31'inci Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantıları sırasıyla 15 Şubat ve 22 Mart tarihinde düzenlendi. Proje'nin 7'inci Yönelendirme Komitesi Toplantısı tüm paydaşların katılımıyla 5 Nisan 2023 tarihinde yapıldı. - Altı aylık faaliyet döneminin anlatıldığı 7'inci Faaliyet Raporu 22 Mart 2023 tarihinde taslak olarak Bakanlık değerlendirmesine sunuldu ve 05 Nisan 2023 tarihinde onaylandı. Proje'nin 3'üncü İlerleme Raporu 7 Şubat 2023 tarihinde onaylandı. 3. İlerleme Raporu'nu proje paydaşlarına resmi olarak 18 Nisan'da sunduk. 5 Nisan tarihinde onaylanan 7. Faaliyet Raporu'nun basılı versiyonu Haziran 2023 te sunuldu. - Risk Değerlendirme Uzmanı, Kirlenmiş Sahalar Uzmanı, Yazılım Uzmanı ve Toprak Kirliliği Uzmanı için sözleşme imza süreci Mart 2023 itibarıyla tamamlandı. - İkinci bileşen kapsamında iyileştirme çalışması yürütülecek iki pilot saha tespit edildi. Saha analizi ve FIDIC 1999 Red Book'a göre ihale dosyasının düzenlenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. İhale dosyasının nihai hali 15 Mart 2023 tarihinde teknik dairelerin görüşlerine sunuldu. Proje'nin inşaat bileşeni kapsamındaki süreci değerlendirmek için 27 Mart 2023 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sözleşme Makamı, Faydalanıcı Kurum ve UNDP Proje Ekibi bir araya geldi. - Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamındaki revizyonları değerlendirmek üzere 18 Ocak 2023 tarihinde Su ve Toprak Dairesi ile bir toplantı düzenlendi. Risk Değerlendirme Uzmanı tarafından hazırlanan Kirlenmiş Sahalar Risk Değerlendirmesi Teknik Rehberi 30 Mart 2023 tarihli toplantıda değerlendirildi. Bu toplantı notlarına göre güncellenen taslak doküman 5 Nisan 2023 tarihinde teknik daireye sunuldu. Yönetmeliğe bağlı rehberlerin güncellenmesi için çalışmalar devam ediyor. Haziran ayında revize versiyon sunuldu - Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi Alanında Yetkinlikleri ÇŞİDB Tarafından Belgelendirilmiş Şirketler İçin Eğitim hazırlıkları tamamlandı. İki günlük eğitimin 3-4 Mayıs tarihinde Ankara'da yapıldı, 55 kişi katıldı. Eğitim raporu yazıldı ve onaylandı. -10 Mayıs tarihinde risk değerlendirme uzmanı ve yetkilendirilmiş şirketler yönetmelik revizyonu, jenerik risk değerlendirme üzerine zoomda toplandı. Toplantıya Bakanlık merkez personeli (7), kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi alanında yetkinlikleri ÇŞİDB tarafından belgelendirilmiş şirketler (22) ve UNDP temsilcileri (4) dahil toplam 33 kişi katıldı. -32. Ocu 27 Nisan, 33. Ocu 25 Mayıs, 34. Ocu 21 Haziran tarihinde tamamlandı. -"Risk Değerlendirmesi ve Alternatif İyileştirme Teknolojileri Eğitimi" ve "Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi Alanında Yetkinlikleri ÇŞİDB Tarafından Belgelendirilmiş Şirketler için Eğitim" faaliyetlerinin Türkçe ve İngilizce dijital eğitim sertifikalarını katılımcılarla paylaştık.
AB katkısı			50.731.000	23.296.000	27.435.000	0	% 0,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	16.467.000	6.563.000	593.000	0	% 0,0	01/01-30/06/2023 dönemleri arasında proje aşağıdaki faaliyetler çerçevesinde ilerlemiştir: -İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Strateji Geliştirme çalışmaları düzenlenmiştir.Çalıştaylarda Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi'nin yapılandırılmasına odaklanılarak katılımcılar ile birlikte Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında yer alacak taslak eylemler geliştirilmiştir. -AB Döngüsel Ekonomi Paketi'nde yer alan tedbirlerin Türkiye ekonomisinin kilit değer zincirleri olarak seçilen "Elektrik elektronik ve BİT", "Piller ve araçlar", "Ambalaj", "Plastikler", "Tekstil", "İnşaat ve binalar", "Gıda" sektörleri üzerindeki etkilerini tanımlamak amacıyla Sektörel Etki Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir.
AB katkısı			93.312.000	37.195.000	3.356.000	0	% 0,0	
<b>10 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>611.689.000</b>	<b>229.270.000</b>	<b>204.628.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>% 1,0</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>619.689.000</b>	<b>229.270.000</b>	<b>206.628.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>% 1,0</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>220.140.000</b>	<b>121.368.000</b>	<b>46.011.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.550.000	910.000	640.000	0	% 0,0	Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen "Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi" kapsamında iki ürün grubunda (sert yüzey temizleyiciler ve doğal taş) çevre etiketi kriterleri yayımlanmıştır. Aynı proje kapsamında yatak ürün grubu için çevre etiketi kriterleri hazırlanmış olup yayımlanma aşamasındadır.
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2025	333.729.000	166.229.000	54.500.000	5.881.509	% 10,8	
	Genel Bütçe Ödeneği	2014-2025	204.654.000	99.154.000	34.500.000	5.881.509	% 17,0	Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyon işi için Nisan, Mayıs ve Haziran hakediş işlemleri tamamlanmış olup, ödeme yapılacaktır. Ayrıca, 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri tarafından da bölgesel İstasyonların Bakım-Onarım hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
	Döner Sermaye Ödeneği	2014-2025	129.075.000	67.075.000	20.000.000	0	% 0,0	Ayrıca, 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünden gelen sarf ve yedek malzeme ihtiyaçları ve bütçe olanakları doğrultusunda değerlendirme yapılarak ihtiyaçlar temin edilecektir. Güneydoğu Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı illerde hava kalitesinin ön değerlendirme projesinin 2022 yılındaki döviz kuru dalgalanmalarından dolayı proje bütçesinin oldukça üzerine çıkmasından dolayı gerçekleştirilemediğinden yıl sonuna kadar Şırnak-Silopi haricinde istasyon kurulumu öngörülmemektedir. İstasyon hedefi tutturmak için diğer kurum ve kuruluşlara ait ve Bakanlığımız kriterlerine uygun olan istasyonların Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına entegre edilme çalışmaları devam etmektedir. Şırnak İli Silopi ilçesinde hava kalitesi izleme istasyonu kurulumu işine ait 2.863.270 TL (KDV Dahil) ödeme ile ilgili iş ve işlemlerin sonuçlandırılma çalışmaları devam etmektedir.



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2021-2024	4.750.000	2.250.000	1.250.000	0	% 0,0	Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda yenilenmesi gereken istasyonlara ait tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu tespitler ışığında teknik şartname hazırlama çalışmaları tamamlanmış olup, yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları devam etmektedir.
2023K10-198440	Kuzey İç Anadolu THM Analitik Laboratuvar Kurulum (Çevre Sektörü)	2023-2023	6.500.000		6.500.000	0	% 0,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesi uyarınca Açık İhale usulü ile 12/05/2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Firma İle 30.05.2023 tarihinde Sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam maliyeti 3.955.000,00-TL (KDV Hariç) dir. 2023K10-198440 nolu proje kapsamında Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Analitik Laboratuvar Kurulumuna Esas Cihaz ve Ekipman Alımı" mal alımı işi ile mal alımı gerçekleştirilemeyen ve Teknik Şartnamenin EK-3'ünde yer alan numune hazırlama işlemleri için gerekli olan ekipmanları temin etmek için ikinci kez pazarlık usulü ile ihaleye çıkmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/f. Maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile 07/06/2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Firma İle 22.06.2023 tarihinde Sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam maliyeti 1.437.800,00 TL (KDV Hariç) dir. Proje kapsamında yer alan tüm cihazlar 120 takvim günü içerisinde en geç Ekim ayında teslim edilecektir.
2023K10-198441	Mobil Emisyon Laboratuvarı Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2023-2023	2.006.000		2.006.000	0	% 0,0	Mal alımı ihalesinin onaylanmasının ardından ihale komisyonu oluşturulmuş ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na resmi yazı ile bildirilmiştir.
2023K10-198442	Hava Kalitesi Ölçüm Aracı Alımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2023	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	Araç alımı için Cumhurbaşkanlığından izin beklenmektedir. İzin alınmasının ardından, araçta gerekli cihaz ve ekipmanların temin edilmesi için yaklaşık maliyet belirleme çalışmalarına geçilecektir.
2023K10-198443	Laboratuvar Ön İşlem, Analiz Cihazları ve Mobil Araç Alımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2023	20.886.000		20.886.000	0	% 0,0	01/03/2023 tarihinde Bakanlığımız ilgili birimine yazılan yazı ile 2 adet T13 kamyon ve 1 adet T8 pick-up alımı işlemlerinin başlatılması talebinde bulunuldu. Aracın üst yapısının laboratuvar olarak dizayn edilmesi ve gerekli cihaz/ekipmanın satın alınmasına ilişkin şartnamelerin hazırlanmasına başlanmakla birlikte, araç alımı yapılmadığından herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>219.460.000</b>	<b>102.314.000</b>	<b>44.896.000</b>	<b>5.881.509</b>	<b>% 13,1</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>154.961.000</b>	<b>67.075.000</b>	<b>45.886.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>374.421.000</b>	<b>169.389.000</b>	<b>90.782.000</b>	<b>5.881.509</b>	<b>% 6,5</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	4.278.043.000	716.365.000	958.241.000	111.362.546	% 11,6	Proje hedef amaç ve göstergelerine uygun olarak ilerlemektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	4.218.648.000	681.692.000	950.000.000	106.647.009	% 11,2	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	59.395.000	34.673.000	8.241.000	4.715.537	% 57,2	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	5.462.296.000		16.449.000	0	% 0,0	Dünya Bankası Yönetim Kurulunda Onay ve imza süreçleri devam etmektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	5.376.275.000		8.603.000	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	86.021.000		7.846.000	0	% 0,0	
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	4.998.758.000	9.445.000	385.198.000	10.386.905	% 2,7	07/09/2021 tarihinde TR-9261 "Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği "İkraz Anlaşması", 16/05/2022 tarihinde "Küresel Afet Risk Azaltma Fonundan temin edilen Hibe Anlaşması" imzalanmıştır. İkraz Anlaşması kapsamında Marmara Bölgesinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerinde üniversite, yurt ve valilik binası olmak üzere belirlenen 13 kampüsteki 33 yapının güçlendirme projelerinin hazırlanması kapsamında Kamu Binalarında Yapısal Fizibilite , Enerji Denetimi, Yapısal - Enerji Güçlendirme Tasarımı ve İnşaat Kontrollüğü için (WB/CS-DESSUP-01) Danışmanlık Hizmeti sözleşmesi 22.12.2022 tarihinde imzalanmış olup , hizmete ilişkin süreç devam etmektedir. Türkiye'nin Muhtelif İllerinde Bulunan Kamu Binalarında Ön Sismik ve Enerji Verimliliği Değerlendirme İşi kapsamında teknik yardım danışmanlık hizmeti (WB/CS-TA-01) sözleşmesi 15.03.2023 tarihinde imzalanmış olup , hizmete ilişkin süreç devam etmektedir. Yapısal Fizibilite, Enerji Denetimi, Yapısal- Enerji Güçlendirme Tasarımı konusunda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü' ne teknik destek sağlanması kapsamındaki danışmanlık hizmeti (WB/CS-TA-04) sözleşmesi 01.06.2023 tarihinde imzalanmış olup , hizmete ilişkin süreç devam etmektedir.
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	734.483.000	9.445.000	100.977.000	10.386.905	% 10,3	
	Hibe Ödeneği	2021-2027	14.108.000	0	8.465.000	0	% 0,0	
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2023-2026	4.250.167.000	0	275.756.000	0		

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*.Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	6.376.262.000	0	640.000.000	0	% 0,0	Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçilmiş illerde temel hizmetlere ve dirençli konutlara erişimi yeniden sağlamak amacıyla 296,5 milyon ABD Doları tutarında krediyi, Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi için 27.06.2023 tarihinde onaylamıştır. İkraz Anlaşmasını müteakip proje kapsamında ihale süreçlerine başlanması planlanmaktadır.
2023K14-196774	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	6.000.000		6.000.000	0	% 0,0	06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı Bakanlığımızca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 18 ilde hasar tespit çalışmaları yürütüldüğünden ve sahada afet koordinasyon çalışmalarında bulunduğundan şu ana kadar söz konusu proje hakkında herhangi bir iş ve işlem yapılamamıştır.
2023K14-196775	Afet Sonrası Bina Güvenliği Teyidi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	5.750.000		5.750.000	0	% 0,0	06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı Bakanlığımızca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 18 ilde hasar tespit çalışmaları yürütüldüğünden ve sahada afet koordinasyon çalışmalarında bulunduğundan şu ana kadar söz konusu proje hakkında herhangi bir iş ve işlem yapılamamıştır.
2023K14-196776	Afet Sonrası Betonarme Yapıların Güvenliği (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	2.400.000		2.400.000	0	% 0,0	06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı Bakanlığımızca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 18 ilde hasar tespit çalışmaları yürütüldüğünden ve sahada afet koordinasyon çalışmalarında bulunduğundan şu ana kadar söz konusu proje hakkında herhangi bir iş ve işlem yapılamamıştır.
2023K14-196777	Afet Sonrası Haritalama ve Bölge Tarama (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	2.600.000		2.600.000	0	% 0,0	06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı Bakanlığımızca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 18 ilde hasar tespit çalışmaları yürütüldüğünden ve sahada afet koordinasyon çalışmalarında bulunduğundan şu ana kadar söz konusu proje hakkında herhangi bir iş ve işlem yapılamamıştır.
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Döner Sermaye)	2021-2023	64.885.000	0	35.200.000	12.943.989	% 36,8	Kazı, temel, bodrum ve zemin kat betonarme imalatları tamamlanmış olup, 1. Kat imalatları devam etmektedir.
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	75.218.000	0	50.000.000	13.235.873	% 26,5	Bodrum perde imalatları devam etmektedir.
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	İhale talimatı beklenmektedir.
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	46.476.000	0	30.000.000	0	% 0,0	Yapım işinin temel kazısı ve zemin güçlendirme imalatları tamamlanmış olup, zemin kat tabliye imalatları devam etmektedir. İş yaklaşık %17 seviyesindedir.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	Proje revizyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	250.243.000	0	25.048.000	0	% 0,0	İş ihaleye çıkmış ancak aşırı yüksek teklif verildiğinden iptal edilmiştir. Yeniden ihale çalışmalarına başlanacaktır.
2018K07-24212	İlusu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	13.950.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	16.000.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2024	144.000.000	40.000.000	90.000.000	13.582.128	% 15,1	İşin ihalesi yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	80.000.000	33.164.000	40.000.000	8.830.063	% 22,1	İşin ihalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	173.000.000	30.116.000	75.000.000	46.437.360	% 61,9	İşin ihalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.
2023K07-195172	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	2.000.000		2.000.000	79.650	% 4,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukları harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parsellasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2023K07-209692	Tamamlama ve Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	16.000.000		16.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukları harcama yapılacaktır.
	Kesin Hesap	2023-2023	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukları harcama yapılacaktır.
	İskan Konutları Altyapı İşleri	2023-2023	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukları harcama yapılacaktır.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	<i>Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2016-2026	851.640.000	129.850.000	189.950.000	6.765.600	% 3,6	Aksaray, Ankara, Batman, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2023 yılı itibarıyla bu iş için ayrılan ödenek miktarı 189.950.000 TL olarak belirlenmiştir. 30.06.2023 tarihi itibarıyla Erzurum, İzmir, Çorum, Muş, Karaman, Batman ve Tunceli illerinde toplam da 6.765.600 TL'lik harcama gerçekleşmiştir. 15 adet konut tamamlanmıştır.
	<i>Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2026	77.027.000	2.000.000	10.000.000	0	% 0,0	
	<i>Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	34.100.000	5.100.000	13.500.000	0	% 0,0	
	<i>Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	30.400.000	12.000.000	10.000.000	201.600	% 2,0	Batman ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 52 hak sahibi aile için 201.600 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	<i>Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	2.800.000	450.000	500.000	0	% 0,0	
	<i>Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2026	30.000.000	800.000	1.000.000	0	% 0,0	
	<i>Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2026	27.000.000	6.000.000	9.000.000	0	% 0,0	
	<i>Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2026	30.000.000	4.000.000	10.000.000	0	% 0,0	
	<i>Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	30.000.000	4.000.000	7.000.000	180.000	% 2,6	Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 32 hak sahibi aile için 180.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	<i>Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	19.000.000	3.000.000	3.000.000	0	% 0,0	
	<i>Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	30.000.000	1.500.000	5.000.000	0	% 0,0	
	<i>Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	97.073.000	50.000.000	30.000.000	3.930.000	% 13,1	Erzurum ilindeki 19 uygulamada yer alan toplam 303 hak sahibi aile için 3.930.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	<i>Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	İğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	27.000.000	0	7.000.000	0	% 0,0	
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	31.050.000	3.800.000	11.000.000	0	% 0,0	
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	30.000.000	8.000.000	10.000.000	1.792.500	% 17,9	İzmir ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 50 hak sahibi aile için 1.792.500 TL harcama gerçekleşmiştir. 7 adet konut tamamlanmıştır.
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	15.000.000	500.000	5.000.000	0	% 0,0	
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	17.000.000	1.000.000	4.438.000	90.000	% 2,0	Karaman ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 10 hak sahibi aile için 90.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 1 adet konut tamamlanmıştır.
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	35.000.000	12.000.000	7.000.000	0	% 0,0	
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	15.000.000	1.000.000	4.000.000	0	% 0,0	
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	1.250.000	0	1.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	3.750.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	48.000.000	1.000.000	6.000.000	0	% 0,0	
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	28.000.000	1.000.000	5.000.000	277.500	% 5,6	Muş ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 85 hak sahibi aile için 277.500 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	28.000.000	1.000.000	7.000.000	0	% 0,0	
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	45.000.000	11.000.000	8.000.000	0	% 0,0	
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	88.650.000	0	10.000.000	294.000	% 2,9	Tunceli ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 183 hak sahibi aile için 294.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 7 adet konut tamamlanmıştır.
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	9.000.000	700.000	1.500.000	0	% 0,0	
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Elazığ İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2023-2025	22.500.000		5.000.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K07-195173	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2025			20.000.000	12.496.000	% 62,5	Kamulaştırma ve konut satın alımları için kullanılmaktadır. 30.06.2023 tarihi itibarıyla Tekirdağ, Ankara, Muş, Çorum, Adıyaman ve Aydın illerinde toplam da 33 adet satın alma işlemi (konut) için 12.496.000 TL ödenek adı geçen illere gönderilmiştir. Satın alması yapılan 33 konut hak sahiplerine teslim edilmiştir.
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	21.651.028.000	794.417.000	2.223.386.000	185.963.115	% 8,4	
2 Proje		08 TOPLAM	851.690.000	129.850.000	190.000.000	6.765.600	% 3,6	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	81.635.000	0	51.950.000	12.943.989	% 24,9	
		GENEL TOPLAM	22.743.877.000	958.940.000	2.465.336.000	210.388.241	% 8,5	
2 Proje		HİBE	159.524.000	34.673.000	24.552.000	4.715.537	% 19,2	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	191.345.000	0	137.000.000	13.235.873	% 9,7	
		Kamu laştırma	0	0	20.000.000	12.496.000	% 62,5	



**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİ F HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2025	2.791.000		750.000	6.095	% 0,8	Proje kapsamında; -BEP-TR yazılımı ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı için gerekli şartname ve protokol çalışmaları devam etmekte olup, üniversiteler ile yapılacak protokol vasıtası ile araştırma ve geliştirme projeleri kapsamında "iklim verilerinin güncellenmesi ve sürekli güncelleme için gerekli metodoloji ve algoritmaları hazırlama", -Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu hazırlama, işlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2023K01-198902	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	530.000		530.000	304.155	% 57,4	TSE'ye deney ve muayene ücreti ile kalibrasyon ödemesi yapılmıştır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.321.000</b>	<b>0</b>	<b>1.280.000</b>	<b>310.250</b>	<b>% 24,2</b>	

## COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021E06-164350	Trafik Sorununun Çözümü için Akıllı Şehirler (Kentçi Ulaşım Sektörü)	2021-2023	13.176.000	8.676.000	4.500.000	281.914	% 6,3	Proje kapsamında gerçekleştirilmekte olan Trafik Güvenliği Analiz Platformu İşi için 238.910 TL + KDV hak ediş ödemesi yapılmıştır. Bununla birlikte Trafik Yoğunluğu Analiz Platformu Projesi hayata geçirilmektedir. Proje kapsamında 700.000 TL + KDV bedel üzerinden 09.06.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup henüz hak ediş ödemesi yapılmamıştır. Kalan bütçenin ise ülke ölçeğinde kent içi ulaşım ve trafik güvenliğine ilişkin kapasite geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022E06-182027	Kent İçi Hareketlilik Analizleri (Kentçi Ulaşım Sektörü)	2022-2023	4.500.000	1.000.000	3.500.000	1.178.248	% 33,7	Proje kapsamında Kent İçi Hareketlilik Analizleri yazılımına yönelik geliştirme süreçleri tamamlanmış olup 998.515 TL + KDV hak ediş ödemesi yapılmıştır. Test, pilot uygulama ve yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Proje 2023 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Kalan bütçenin ise ülke ölçeğinde kent içi ulaşımına yönelik kapasite geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2022-2023	6.120.000	3.000.000	3.120.000	0	% 0,0	Proje 2022 ve 2023 yıllarına aittir. 14.10.2022 tarihinde 4.788.000 TL + KDV bedelle sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında projeye ait Proje Metodolojisi Raporu, Proje Yönetim Planı (PYP), Analiz ve Tasarım Raporları, Ulusal Veri Sözlüğü hazırlama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Raporlama Altyapı Bileşeni lisans alımı gerçekleştirildi. 2022 yılı sonunda 5 adet iş paketi için 2.394.000 TL + KDV 1 adet hak ediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2023 yılın sonuna kadar proje ödeneği kullanılacaktır. Proje ödemeleri proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K01-205613	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	102.500.000		102.500.000	25.264.239		
	Dijital Dönüşüm V3	2023-2023	25.000.000		25.000.000	24.475.277	% 97,9	Bakanlık hizmetlerine ait uygulamaların bakım, idame güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Toplam 20.741.760 TL + KDV tutarında 3 hakediş gerçekleştirilmiştir.
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2023-2023	45.000.000		45.000.000	0	% 0,0	Teknik şartname çalışmaları devam etmekte olup ihale aşamasındadır. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 9.555.084,75 TL + KDV tutarında tümleşik bilgisayar proje kapsamında sipariş edilmiştir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2023-2023	30.000.000		30.000.000	625.282	% 2,1	Teknik şartname çalışmaları devam etmekte olup ihale aşamasındadır. Microsoft Premier Destek Paketi temini için proje kapsamında 410.000,00 TL + KDV harcama gerçekleştirilmiştir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.

## COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2023-2023	2.500.000		2.500.000	163.680	% 6,5	Proje kapsamındaki işler ve bu işlerdeki gerçekleştirmeler aşağıda sunulmaktadır. - Belgenet Bakım ve Güncelleme Hizmet Alımı İşi 2023 yılı Belgenet bakım ve güncelleme hizmeti alınımının yapılması ilgili birime resmi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu işin sözleşmesinin imzalanması beklenmektedir. - Bakanlık Kurumsal İnternet Sitesi Bakım ve Ek Geliştirme Hizmetleri Alımı İşi 2023 yılı Bakanlığımız web sayfalarının bakım ve ek geliştirme işi sözleşmesi 24.05.2023 tarihinde 302.000 TL + KDV bedel ile imzalanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız diğer birimlerince satın alınıp tarafımıza idamesi için bildirilen internet sitelerinin Bakanlık alt yapısına alınması, her bir iş için 24.000 TL + KDV bedel ile sağlanması hususu sözleşme kapsamında yer almaktadır. İşe ait ödemeler üç dönem halinde yapılacaktır. Teknik şartnamede yer alan hususlara göre web sayfalarımızın bakım ve geliştirme işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. - İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Bakım ve Güncelleme İşi İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS) için sözleşme 01.03.2023 tarihinde imzalanmıştır. İlk hakediş ödemesi 163.680,00 TL yapılmıştır. Proje ödemeleri proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K01-205713	Bakanlık Uygulamaları Performans İzleme ve Yönetim (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	4.500.000		4.500.000	0	% 0,0	Ödenek 2023 yılında meydana gelen deprem afeti nedeniyle 2023 yılında kullanılmayacak olup 2024 yılına revizesi için yazı yazılmıştır.
2023K01-205725	MEBİS Projesi Bakım Onarımı İşi İdamesi (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2024	8.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında temin edilecek hizmet temini işinin ihalesi tamamlanmıştır. Sözleşme 13/06/2023 tarihinde imzalanmıştır. Proje ödeneği 2023 yılı sonuna kadar kullanılacaktır. Proje kapsamında yapılan işler için ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K01-205737	Yerel Yönetim Hizmetlerinin Yapay Zekâ Teknolojileri İle Ölçeklendirilmesi (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2024	5.640.000		3.000.000	0	% 0,0	Ödenek 2023 yılında meydana gelen deprem afeti nedeniyle 2023 yılında kullanılmayacak olup 2024 yılına revizesi için yazı yazılmıştır.
2022K60-181334	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2023	4.000.000	2.000.000	2.000.000	446.040	% 22,3	TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile 4.200.000,00 TL + KDV bedel üzerinden 17.05.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda "Kent Bilgi Sistemi Altyapısı İdame, Ek Geliştirme ve Yaygınlaştırma İşi"nin Teknik şartnamenin "10. Hakedişler" maddesi kapsamında 2023 yılı içerisinde 1 hak ediş ödemesi yapılmış olup, ödemesi yapılacak olan 3 hak ediş vardır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2024	5.768.000		3.768.000	0	% 0,0	Ödenek 2023 yılında meydana gelen deprem afeti nedeniyle 2023 yılında kullanılmayacak olup 2024 yılına revizesi için yazı yazılmıştır.

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K60-205399	Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	22.000.000		12.000.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasındadır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K60-205413	TUCBS Çalışabilirlik, Uyumlaştırma ve Entegrasyon (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	7.500.000		3.000.000	108.560	% 3,6	6 Şubat' ta yaşanan deprem afeti nedeniyle 92.000,00 TL + KDV tutarında uzaktan görüntüleme işi temin edilmiştir. Proje kapsamında yapılacak diğer hizmet alımları ihale aşamasındadır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K60-205704	Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	26.960.000		18.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu Hizmet Temini işi ihale edilmiştir 17.07.2023 tarihinde 5.871.400 TL + KDV tutarında sözleşme imzalandı. Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu Projesi ve Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Sunucu Temini işi için ihale tamamlanmıştır. Tip 1 Sunucu için 4.184.700 TL + KDV ve Tip 2 Sunucu için 1.100.516,80 TL + KDV tutarlarından en avantajlı teklifler alınmıştır sözleşme süreci devam etmektedir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K60-205743	Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	14.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme Projesi ve Merkezi Orta Katman Projesi kapsamında Veri Depolama Ünitesi Temini işi için 11.05.2023 tarihinde 13.590.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi kapsamında hizmet temini işi için ihale ilanı verildi. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K09-181337	E-Plan Otomasyon Sistemi İdame ve Yenileme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	3.700.000	2.000.000	1.700.000	284.970	% 16,8	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme Projesi ve Merkezi Orta Katman Projesi kapsamında Veri Depolama Ünitesi Temini işi için 11.05.2023 tarihinde 13.590.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi kapsamında hizmet temini işi için ihale ilanı verildi. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-187448	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.500.000	2.500.000	2.000.000	0	% 0,0	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme Projesi ve Merkezi Orta Katman Projesi Kapsamında Veri Depolama Ünitesi Temini işi için 11.05.2023 tarihinde 13.590.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
	Akıllı Şehir Coğrafi Veri Sözlüğü	2022-2023	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında; akıllı şehir veri sözlüğü ile hedef kullanıcı ve uygulama alanı bazında; kurumsal yapı, merkezi kurum ve/veya yerel yönetim düzeyinde karar destek sağlayacak veri sözlüğü oluşturulması amacıyla akıllı şehir kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerde yer alan varlıklara ilişkin Akıllı Şehir Veri Sözlüğü ve Veri Modeline ilişkin altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. 2023 yılında bu çalışmalar ilişkin raporlama ve dokümantasyon çalışmaları yapılarak yayınlanacaktır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
	Akıllı Şehir Rehberliği İkinci Faz Uygulamaları	2022-2023	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje 2023 yılında devam etmekte olup; Açık Veri Platformu kurulumu, önyüz tasarım ve veri seti yönetiminin sağlanması ve rehberlik kılavuzunun hazırlanarak Yerel Yönetimlerimizin kullanımına sunulmuştur. Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Pilot Uygulaması kapsamında Bir pilot ilde Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Belgesi hazırlanacaktır. Yerel Akıllı Şehir Mimarisi Pilot Uygulaması Kapsamında ülke genelinde yaygın kullanılan akıllı şehir uygulamalarının incelenmesi, bu uygulamaların yerel mimaride ne şekilde konumlandırılması gerektiği oluşturulmuş olan 4 gruba yönelik detaylı olarak raporlanacak ve çalışmaları tamamlanacaktır. Akıllı Şehir Uygulama Rehberlik Kılavuzları hazırlanarak kullanıcılara sunulacaktır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K08-183815	Atık Yönetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2022-2023	3.558.000	458.000	3.100.000	0	% 0,0	Ulusal Çevre Bilgi Sistemi ve Alt Uygulamalarının Geliştirilmesi (UÇBS) Projesi kapsamında 1. ve 2. hakedişler 2022 yılında yapılmıştır. 2023 yılında henüz hakediş işlemi yapılmamıştır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K10-181851	ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED) Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Çevre Sektörü)	2022-2023	5.000.000	1.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Ulusal Çevre Bilgi Sistemi ve Alt Uygulamalarının Geliştirilmesi (UÇBS) Projesi kapsamında 1. ve 2. hakedişler 2022 yılında yapılmıştır. 2023 yılında henüz hakediş işlemi yapılmamıştır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K10-183741	Çevre Denetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Çevre Sektörü)	2022-2023	2.586.000	500.000	2.086.000	0	% 0,0	Veri aktarım ve yayına alma çalışmaları devam etmektedir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
<b>12 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>103.248.000</b>	<b>18.134.000</b>	<b>60.154.000</b>	<b>2.299.732</b>	<b>% 3,8</b>	
<b>6 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>140.760.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>126.120.000</b>	<b>25.264.239</b>	<b>% 20,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>244.008.000</b>	<b>21.134.000</b>	<b>186.274.000</b>	<b>27.563.971</b>	<b>% 14,8</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	62.669.000	24.807.000	6.426.000	3.532.365	% 55,0	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibarıyla sona ermiştir. Sadece Harcama Doğrulama Raporu ödemesi ödenecektir. Geri kalan 3 bileşenin uygulaması devam etmektedir.
<i>AB katkısı</i>			355.117.000	105.914.000	36.412.000	20.016.733	% 55,0	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	5.794.175.300	3.445.044.000	1.535.764.300	385.254.905	% 25,1	
	AB Hibesi		4.957.223.300	2.928.276.000	1.305.384.300	324.353.446	% 24,8	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		353.118.000	217.180.000	96.405.000	25.135.166	% 26,1	
	Mahalli İdare Katkısı		483.834.000	299.588.000	133.975.000	35.766.293	% 26,7	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>62.669.000</b>	<b>24.807.000</b>	<b>6.426.000</b>	<b>3.532.365</b>	<b>% 55,0</b>	
	<i>AB KATKISI</i>		<b>355.117.000</b>	<b>105.914.000</b>	<b>36.412.000</b>	<b>20.016.733</b>	<b>% 55,0</b>	
	<i>İçmesuyu Sektörü Projesi</i>		<b>5.794.175.300</b>	<b>3.445.044.000</b>	<b>1.535.764.300</b>	<b>385.254.905</b>	<b>% 25,1</b>	

**2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 02.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	<b>Çarşamba Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>196.077.000</b>	<b>193.119.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.231.332</b>	<b>% 97,2</b>	
	AB Hibesi		166.663.000	164.150.000	8.000.000	7.846.632		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		11.766.000	11.588.000	600.000	553.880		
	Mahalli İdare Katkısı		17.648.000	17.381.000	900.000	830.820		
Alt proje-2	<b>Bandırma Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>378.701.000</b>	<b>242.597.000</b>	<b>131.872.000</b>	<b>36.849.311</b>	<b>% 27,9</b>	
	AB Hibesi		321.894.000	206.207.000	112.090.000	31.321.914		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		22.723.000	14.556.000	7.913.000	2.210.959		
	Mahalli İdare Katkısı		34.084.000	21.834.000	11.869.000	3.316.438		
Alt proje-3	<b>Bismil Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>196.502.000</b>	<b>192.287.000</b>	<b>18.274.000</b>	<b>18.270.776</b>	<b>% 100,0</b>	
	AB Hibesi		167.025.000	163.443.000	15.531.000	15.530.159		Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.265.000	12.980.000	1.235.000	1.233.277		
	Mahalli İdare Katkısı		16.212.000	15.864.000	1.508.000	1.507.339		
Alt proje-4	<b>Çankırı Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>584.560.000</b>	<b>86.174.000</b>	<b>202.341.000</b>	<b>31.611.662</b>	<b>% 15,6</b>	
	AB Hibesi		529.090.000	73.247.000	172.221.000	26.869.913		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		22.189.000	5.171.000	12.058.000	1.896.700		
	Mahalli İdare Katkısı		33.281.000	7.756.000	18.062.000	2.845.050		
Alt proje-5	<b>Elbistan Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>358.684.000</b>	<b>349.355.000</b>	<b>21.809.000</b>	<b>21.803.420</b>	<b>% 100,0</b>	
	AB Hibesi		304.880.000	296.951.000	18.535.000	18.532.907		Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		24.212.000	23.582.000	1.475.000	1.471.731		
	Mahalli İdare Katkısı		29.592.000	28.822.000	1.799.000	1.798.782		
Alt proje-6	<b>Giresun Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>431.244.300</b>	<b>180.721.000</b>	<b>228.621.300</b>	<b>34.773.379</b>	<b>% 15,2</b>	
	AB Hibesi		366.554.300	153.612.000	194.327.300	29.557.372		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		25.877.000	10.844.000	13.718.000	2.086.403		
	Mahalli İdare Katkısı		38.813.000	16.265.000	20.576.000	3.129.604		
Alt proje-7	<b>İğdır Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>378.658.000</b>	<b>373.975.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.697.613</b>	<b>% 99,9</b>	
	AB Hibesi		321.857.000	317.878.000	1.443.000	1.442.972		Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		25.561.000	25.244.000	115.000	114.589		
	Mahalli İdare Katkısı		31.240.000	30.853.000	141.000	140.053		
Alt proje-8	<b>Kastamonu Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>282.811.000</b>	<b>279.823.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		240.387.000	237.849.000	1.561.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		16.970.000	16.790.000	111.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		25.454.000	25.184.000	166.000	0		

Alt proje-9	<b>Niksar Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>387.137.000</b>	<b>346.687.000</b>	<b>35.925.000</b>	<b>19.830.809</b>	<b>% 55,2</b>	
	AB Hibesi		329.063.000	294.683.000	30.535.000	16.856.187		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		23.230.000	20.802.000	2.156.000	1.189.848		
	Mahalli İdare Katkısı		34.844.000	31.202.000	3.234.000	1.784.773		
Alt proje-10	<b>Rize Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>396.088.000</b>	<b>167.351.000</b>	<b>218.864.000</b>	<b>24.852.893</b>	<b>% 11,4</b>	
	AB Hibesi		336.673.000	142.248.000	186.034.000	21.124.959		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		23.766.000	10.041.000	13.132.000	1.491.174		
	Mahalli İdare Katkısı		35.649.000	15.062.000	19.698.000	2.236.760		
Alt proje-11	<b>Sivas Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>203.161.000</b>	<b>198.733.000</b>	<b>19.413.000</b>	<b>19.368.237</b>	<b>% 99,8</b>	Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		172.686.000	168.923.000	16.900.000	16.856.187		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.190.000	11.924.000	1.005.000	1.004.820		
	Mahalli İdare Katkısı		18.285.000	17.886.000	1.508.000	1.507.230		
Alt proje-12	<b>Sorgun Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>145.875.000</b>	<b>135.926.000</b>	<b>14.900.000</b>	<b>14.541.958</b>	<b>% 97,6</b>	
	AB Hibesi		123.992.000	115.536.000	12.500.000	12.360.664		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		8.753.000	8.156.000	900.000	872.517		
	Mahalli İdare Katkısı		13.130.000	12.234.000	1.500.000	1.308.776		
Alt proje-13	<b>Şırnak Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>186.250.000</b>	<b>174.000.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>4.127.059</b>	<b>% 33,7</b>	
	AB Hibesi		158.312.000	147.900.000	10.412.000	3.508.000		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.572.000	11.745.000	827.000	278.577		
	Mahalli İdare Katkısı		15.366.000	14.355.000	1.011.000	340.482		
Alt proje-14	<b>Trabzon Su Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>344.290.000</b>	<b>217.829.000</b>	<b>109.641.000</b>	<b>19.194.059</b>	<b>% 17,5</b>	
	AB Hibesi		292.643.000	185.154.000	93.194.000	16.314.950		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		20.659.000	13.070.000	6.579.000	1.151.644		
	Mahalli İdare Katkısı		30.988.000	19.605.000	9.868.000	1.727.465		
Alt proje-15	<b>Yüksekova Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>193.672.000</b>	<b>185.312.000</b>	<b>15.838.000</b>	<b>15.583.910</b>	<b>% 98,4</b>	Projenin sonuna yaklaşmıştır, öngörülenden fazla ilerleme olmuştur.
	AB Hibesi		164.618.000	157.514.000	13.500.000	13.246.324		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.074.000	12.509.000	1.052.000	1.051.914		
	Mahalli İdare Katkısı		15.980.000	15.289.000	1.286.000	1.285.672		
Alt proje-16	<b>Suluova Entegre Su Tesisi</b>	<b>2020-2025</b>	<b>298.755.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>155.934.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		253.939.000	4.445.000	132.115.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		20.167.000	353.000	10.777.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		24.649.000	432.000	13.042.000	0		
Alt proje-17	<b>Doğubayazıt Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>266.313.000</b>	<b>115.925.000</b>	<b>139.203.000</b>	<b>9.351.495</b>	<b>% 6,7</b>	
	AB Hibesi		226.362.000	98.536.000	118.321.000	7.948.771		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.978.000	7.825.000	9.397.000	631.226		
	Mahalli İdare Katkısı		21.973.000	9.564.000	11.485.000	771.498		
Alt proje-18	<b>Aksaray Entegre Su Projesi</b>	<b>2021-2025</b>	<b>565.397.000</b>	<b>0</b>	<b>197.842.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		480.585.000	0	168.165.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		38.166.000	0	13.355.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		46.646.000	0	16.322.000	0		



**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023F00-198507	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2023-2023	6.150.000		6.150.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2023-2023	6.150.000		6.150.000	0	% 0,0	Bu proje kapsamında Datça Kamusal Mekan ve Meydan Düzenlemesi ile Körfez Çevre Düzeni Planı (Millet Bahçesi) projelerinin teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmak üzere olup ihale aşaması geçilerek proje temini yapılacaktır.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2024	35.600.000	13.500.000	12.100.000	7.228.151	% 59,7	Projenin 2023 yılı ödeneği olan 12.100.000 TL (KDV Dahil) ödeneğın, 7.228.151 TL'si harcanarak "Dalyan (Muğla/Ortaca) Kanalı Tekne Bağlama İskelesi Yapım İşı"nin birinci kısmı tamamlanmıştır.
2023F00-198819	Marmara Adası Yürüyüş Yolları (Turizm Sektörü)	2023-2023	20.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 25/04/2023 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2023	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokolü hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2023F00-198897	Sarsala Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2023-2025	29.000.000		5.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokolü hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (*.*.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2025	163.178.000	22.658.000	40.000.000	0	% 0,0	"Eskil (Aksaray) Belediyesi Tatarlı ve Tol Yaylaları İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Teşkil Edilmesi İşi" kapsamında Eskil Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 5.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup işin ihale süreci devam etmektedir.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2025	96.647.000	11.647.000	25.000.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2025	66.531.000	11.011.000	15.000.000	0	% 0,0	
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (*.*.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2026	65.996.000	6.764.000	27.000.000	0	% 0,0	"Altınova (Yalova) Hersek Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi" kapsamında Altınova Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 10.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup işin ihale süreci devam etmektedir.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2025	37.764.000	6.764.000	15.000.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2026	28.232.000		12.000.000	0	% 0,0	

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	30.301.000	16.001.000	7.150.000	446.040	% 6,2	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2024	7.600.000	3.600.000	2.000.000	0	% 0,0	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2024	12.800.000	8.000.000	2.400.000	354.000	% 14,8	1-Datça-Bozburun Öçkb, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları Ve Kentsel Tasarım Rehberi İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 2-Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 3-İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Araştırma, Analiz, Değerlendirme, Sentez Raporu Hazırlanması İşi (İş Yeniden Başlatıldı) 4-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı ÖÇKB, Ballıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri "Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin" 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 5-Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi Sit Alanlarında İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi ( Ödeme Evrakları Gönderildi) 6-Yalova İli Termal İlçesi Turizm Tesis Alanında Bulunan Tarihi Sit Alanında İmar Planına Esas İlave Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (İş Tamamlandı) 7-Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yalıncağ-Karakusunlar Mahallesi Adaylar Akademisi İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (İhale Öncesi İşlemler yapılıyor) 8-İhlara ÖÇKB, 2. Etap 1/25.000 Ölçekli Nip Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt İşi (İhale Öncesi İşlemler yapılıyor) 9-Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi Sit Alanlarında İmar Planı İşi (İş devam ediyor)
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2024	2.901.000	1.401.000	750.000	92.040	% 12,3	1-Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Selime Belediyesi, Selime 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Revizyonu Ve Plan Açıklama Raporunun Hazırlanması İşi (Ödeme evrakları Gönderildi)
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2024	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0	% 0,0	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması yapımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	2021-2024	18.589.000	5.900.000	7.733.000	0	% 0,0	

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	2.800.000	1.800.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje 2022 yılında tamamlanmış olup 2023 yılı içerisinde uygulama projesi hazırlık çalışmaları planlanmaktadır.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Sürüngenlerin Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması, İzlenmesi	2021-2023	1.289.000	1.056.000	233.000	0	% 0,0	2021 yılında başlayan projenin bugüne kadar %78,6 ödemesi tamamlanmış olup, 2023 Aralık ayında %21,4'ü ödenerek proje tamamlanacaktır.
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2024	14.500.000	3.044.000	6.500.000	0	% 0,0	Proje uygulama projesi olarak Yatırım ve Projeler Dairesi Başkanlığına aktarılmıştır.
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2023	924.000	654.000	270.000	0	% 0,0	Biyoçeşitlilik kısmı tamamlanmış olup, otlama yönetimi kısmında sözleşme bedelinin % 20 si tutarındaki 4.hakedişi olan 93.078.40 TL (+KDV) tutarındaki ödeme evrakları hazırlanmış olup, henüz ödemesi gerçekleştirilmemiştir.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.500.000	995.000	505.000	0	% 0,0	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	580.000	513.000	67.000	0	% 0,0	Proje 2022 yılında tamamlandı. 2023 ödenek fazlası var.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	50.000	40.000	10.000	0	% 0,0	Proje gerçekleştirilmedi. Ödenek fazlası.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2022-2023	870.000	442.000	428.000	0	% 0,0	2022 yılında sözleşme bedelinin % 50,8 tutarında ödeme yapılmış olup, 2023 yılın ilk 6 aylık dönemde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2022K10-183742	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2022-2023	5.760.000	325.000	5.435.000	0	% 0,0	
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2023	5.760.000	325.000	5.435.000	0	% 0,0	

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	<i>Genel Bütçe Ödeneği</i>		800.000	325.000	475.000	0	% 0,0	2022-2023 yıllarını kapsayan proje için 2023 yılı içerisinde henüz ödeme yapılmamıştır. Ara Rapor Temmuz ayında teslim edilmiş olup ödeme işlemleri başlatılacaktır. Toplam sözleşme bedeli 453,266 TL'dir.
	<i>Döner Sermaye Ödeneği</i>		4.960.000		4.960.000	0	% 0,0	Döner Sermaye İşletmesi Ödeneğinden Sözleşme Doğrultusunda kullanılacak

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE N SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2024	6.708.000	2.343.000	2.365.000	0	% 0,0	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2024	5.978.000	1.978.000	2.000.000	0	% 0,0	"Erzincan ili, Kemaliye ilçesi, Kemaliye ve Çevresi Potansiyel Doğal Sit Alanının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında hazırlanan Sonuç Raporu teslim edilmiş olup 18.05.2023 tarihli ve E-20054479-250[250]-6460491 sayılı yazı ile 2. Hakediş ödemesi (96.000,00+KDV) yapılmıştır. "Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Erzurum, Bingöl, Bayburt, Iğdır, Siirt, Sinop, Amasya İllerinde Bulunan Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 24.05.2023 tarihinde Online Çevre Proje İnşaat Mühendislik Danışmanlık Yazılım Bilişim ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 1.374.000,00 TL+KDV' dir.
	Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2022-2023	730.000	365.000	365.000	0	% 0,0	
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	5.207.000	3.442.000	1.515.000	0	% 0,0	
	Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2023	3.850.000	2.792.000	1.058.000	0	% 0,0	Karasal Biyoçeşitlilik kısmı tamamlanmış olup; denizel biyoçeşitlilik kısmında 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.
	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2021-2023	450.000	315.000	135.000	0	% 0,0	21.06.2023 tarihinde tamamlanmış olup; son hakedişi olan sözleşme tutarının % 30'u 114.063.00 TL (+KDV) tutarındaki dilim henüz ödenmemiş olup, izleyen günlerde ödenecektir.
	İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2022-2024	907.000	335.000	322.000	0	% 0,0	2022 yılında sözleşme bdelinin % 35 tutarında ödeme yapılmış olup, 2023 yılın ilk 6 aylık dönemde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2016K10-150495	İklim Değişikliğinin Ekosisteme Etkisi Araştırması (Çevre Sektörü)	2021-2024	3.500.000	1.050.000	1.225.000	575.840	% 47,0	Sözleşme tutarı 2.440.000.00 TL (+KDV) olan projenin 3.hakedişi olan % 20'lik ödeme dilimi tutarı 492.257.76 TL si 2023 yılı ilk altı ayı içerisinde ödenmiştir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	11.000.000	0	8.500.000	3.811.324	% 44,8	2022K10-188090 proje nolu Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (Kara-Kıyı ve Denizel Alanda) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında Ön rapor ve 1. Ara Rapor'un idareye teslimi sonrasında proje için ayrılan bütçenin %35'lik dilimi yükleneciye ödenmiştir. Projenin arazi çalışmaları devam etmekte olup projenin 2025 yılının başında bitmesi öngörülmektedir.
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2026	1.500.000.000	150.000.000	423.040.000	0	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)		500.000.000	0	125.000.000	0	% 0,0	2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihalesi yapılarak işe başlanmıştır. Bakanlığımız 2022 yılı Döner Sermaye Ödeneği olan KDV Dahil 100.000.000,00 TL Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına 2022 yılı sonu itibari ile gönderilmiştir. 2023 yılı Bakanlığımız Genel Bütçe ve Döner Sermaye Ödeneğinden toplam 204.697.686,03 TL tutarın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına aktarılması ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir.
	Döner Sermaye Ödeneği		500.000.000	100.000.000	198.040.000	0	% 0,0	
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı		500.000.000	50.000.000	100.000.000	0	% 0,0	
2023K10-199539	Mağaraların Araştırılması Projesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	3.540.000		3.540.000	0	% 0,0	1-Karadelik Mağrasının Araştırılması [Tabiatın Gizli Hazinelelerinin (Mağara ve Anıt Ağaçlar) Keşfi ve Korunması İçin Farkındalık Projesi]. Sözleşmesi imzalandı, çalışmalara başlandı.2- Karasal Mağaraların Araştırılması Projesi. Sözleşme imzalandı, çalışmalara başlandı. 3- Karasal Mağaraların Araştırılması Projesi. Sözleşme imzalandı, çalışmalara başlandı.
2023K10-199541	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	16.000.000		16.000.000	0	% 0,0	İstanbul ve Kocaeli İlleri Anıt Ağaç Rehabilitasyonu. Sözleşme imzalandı, çalışmalara başlandı.
2023K10-199553	Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	20.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Burdur İl Özel İdaresi ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 16/06/202 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.
2023K10-210241	Barma Yaylası Turbalık Alanı Koruma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokolü hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2023-2025			2.000.000	37.094	% 1,9	İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 37.100,00 TL Ödenek Gönderildi.
<b>14 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>673.279.000</b>	<b>44.210.000</b>	<b>204.488.000</b>	<b>8.250.031</b>	<b>% 4,0</b>	
<b>9 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>788.674.000</b>	<b>129.422.000</b>	<b>322.040.000</b>	<b>3.811.324</b>	<b>% 1,2</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>1.461.953.000</b>	<b>173.632.000</b>	<b>526.528.000</b>	<b>12.061.355</b>	<b>% 2,3</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>Belediye Katkısı</b>	<b>500.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>37.094</b>	<b>% 1,9</b>	



## YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2025	6.600.000	5.100.000	500.000	0	% 0,0	YERELBİLGİ sistemi 1391 Belediye, 187 mahalli idare birliği, 33 belediye bağlı idaresinin istatistiki her türlü verisini toplamaya yarayan ve bunu anlık olarak raporlayabilen bir sistemdir. Sistem kullanımının tanıtılması ve farkındalığın artırılması için 2021 yılında 13 bölgede bütün yerel yönetim temsilcileri ile 81 İl Müdürlüğü yerel yönetimler şube müdürlerine gerekli eğitimler verilmiştir. 2022/1 sayılı Bakanlık Genelgesi ile YERELBİLGİ sistemi bütün yerel yönetimlerimizin kullanımına açılmış olup aktif olarak kullanılmaktadır. LAR projesinden finanse edildiği için Genel Müdürlüğümüz bütçesinden harcama yapılmamıştır. Proje tamamlanmıştır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	13.000.000	4.000.000	2.500.000	0	% 0,0	Proje ile büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede söz konusu proje ile daha önceki yıllarda "Belediyelerde Hizmet Önceliklendirme Rehberi" hazırlanmıştır. Yine proje kapsamında 2023 yılı içinde kırsal mahalleler ilişkin rehber, insan kaynakları yönetim stratejisinin oluşturulması, belediyelerin dış ilişkiler kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarının yapılması planlanmakta idi. Ancak depremin vermiş olduğu etki ve maliyetlerde yükselmeden kaynaklı bu projelere ilişkin 2023 yılında herhangi bir şey yapılamamıştır. Yılın geri kalanında ise kırsal mahallelere ilişkin rehber çalışmaları devam etmekte olup kırsal mahalle belirleme buralara sağlanan faydalar ve buna ilişkin çalışmaları içeren rehber yayımlanması için çalışmalara başlanacaktır.
2023K07-195171	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	3.800.000.000		3.800.000.000	630.339.468	% 16,6	KÖYDES Projesi ödeneğinin yarısı olan 1.9 Milyar TL ödenek İLBANK KÖYDES hesaplarına aktarılmıştır. Kalan yarısının aktarımı beklenmektedir. Proje kapsamında Bakan oluru ile onaylanan işlerin ve ihale aşamasından sonra artan ödenekler yada iptal edilen projelerin yerine alınan yeni projelerin iş ve işlemleri devam etmektedir. Proje kapsamında Büyükşehir olmayan 51 ilimizden yapılan işlerin aylık izleme raporları Genel Müdürlüğümüz ile paylaşılmaktadır.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.819.600.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

Dipnot: 637

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

## MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K01-198846	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	1.800.000		1.800.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2023-2023	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2023-2023	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2023-2023	1.500.000		1.500.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2023-2025			200.000.000	182.950.238	% 91,5	200.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 182.950.238.-₺ ödeme yapılmış olup, 17.049.762.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2023-2025			4.000.000	2.191	% 0,1	4.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 2.191,00.-₺ ödeme yapılmış olup, 3.997.809,00.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000.000</b>	<b>182.952.429</b>	<b>% 89,7</b>	

**ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020A05-168456	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormanlık Sektörü)	2020-2024	44.930.000	10.830.000	16.900.000	183.591	% 1,1	Ana Proje olduğundan açıklamaları aşağıdaki 3 alt projede yapılmıştır.
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2020-2024	43.500.000	10.500.000	16.150.000	183.591	% 1,1	<p>"İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgâr Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya-Karapınar Örneği" kapsamında arazi incelemesi ve ön etüt yapılmıştır. Teknik şartname hazırlıklarına başlanmıştır.</p> <p>"İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgâr Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya-Çumra Örneği" projeleri kapsamında arazi incelemesi ve ön etüt yapılmıştır. Teknik şartname hazırlıklarına başlanmıştır.</p> <p>"Doğayla İç İçer Merkezine Gençliği Alan, Millet Bahçelerine Kardeş Yeni Yutak Alanları "Gençlik Bahçeleri" Yalova Örneği Projesi " projeleri kapsamında arazi incelemesi ve ön etüt yapılmıştır.</p> <p>"Kırşehir İli Boztepe İlçesi Malya TİGEM Arazisinde Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Çalıştı Türlerle Karbon Yutak Alanı Uygulama Projesi " projeleri kapsamında arazi incelemesi ve ön etüt yapılmıştır. Teknik şartname hazırlıklarına başlanmıştır.</p> <p>"Karaman İli Ayrancı İlçesi Divle Köyü Arazisinde Yeşil Kalkınma Hedefi ile Gelir Getirici ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Karbon Yutak Alanı Oluşturma Uygulama Projesi " projeleri kapsamında arazi incelemesi ve ön etüt yapılmıştır. Teknik şartname hazırlıklarına başlanmıştır.</p> <p>"Kurak ve/veya Yarı Kurak Alanların Restorasyonunda Farklı Su Hasadı Tekniklerinin Etkinliğinin Belirlenmesi Projesi: Ankara Örneği" kapsamında arazi incelemesi ve ön etüt yapılmıştır. Paydaş kurumlardan gerekli yasal izinler alınmış. Proje kapsamında teknik şartname hazırlıklarına başlanmıştır.</p> <p>Konya- Karaman Karbon yutak alanı oluşturmak amacı ile fidan alımı 2 adet proje kurum personeline yapılmaktadır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Van ili Çatak İlçesi Aksebük ve Alaçayır Çığ Tehlike Değerlendirme Projesi arazi çalışmaları yapıldı.</li> <li>- Trabzon ili Düzköy İlçesi Çayırbağı - Zeliha Mahallesi Kaya Düşmesi Projesi arazi çalışmaları yapıldı.</li> </ul> <p>11 (onbir) adet projenin ihale çalışmaları devam etmekte olup Ağustos ayında ihaleleri gerçekleştirilecektir.</p> <p>Kurum personeline yapılacak olan Giresun ili Bektaş yaylası Turizm Merkezi Çığ Tehlike Değerlendirme projesi arazi ve ofis çalışmaları sürdürülmektedir.</p> <p>2023 yılı içerisinde yapılacak olan Entegre Mikro Havza Projeleri kapsamında potansiyel alan çalışmaları tamamlanmış olup Kahramanmaraş ili Afşin ve Elbistan ilçelerinde ön etüt çalışmaları yapılmıştır.</p> <p>Aksaray ili Güllağaç İlçesi Demirci beldesi ağaçlandırma - uygulama projesi ihale evrakları hazırlandı ve ihalenin Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p>
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2020-2024	780.000	180.000	400.000	0	% 0,0	<p>14-15 Haziran tarihinde "Arazi Tahribatının Dengelenmesi-Karak Destek Sistemi'nin Kullanımı ve Yaygınlaştırılması Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Arazi Tahribatı eğilimlerini kombine şekilde yorumlama imkanı veren "müdahale hiyerarşisi" sekmesi ile, faydalanıcılara sürdürülebilir arazi kullanımına ilişkin olarak alınması gereken önlemler Sistem tarafından sunulmaktadır.</p> <p>PRAIS IV raporlamasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası verilerin karşılaştırılabileceği bir uygulama sekmesi eklenmiştir.</p> <p>2023-2024 yıllarında ülkemizin ATD Hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, ATD parametrelerini izlemeye yönelik çalışmalar yürütmek ayrıca ATD konusunda mevcut kapasitenin geliştirilmesini sağlamaya yönelik faaliyetlere devam edilecektir</p>
	Çölleşme ve Kuraklığa Dirençli Şehirler	2022-2024	650.000	150.000	350.000	0	% 0,0	<p>Proje kapsamında pilot bölge olarak Konya ili Karapınar İlçesi seçilmiştir. Bu kapsamda Konya ve Karapınar'da kamu kurum ve kuruluşları ikili görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Proje sürecinde yerelden kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ve katkıları ile çözüm odaklı çalıştay ve toplantılar 2023 yılı ikinci yarısında düzenlenecektir.</p>

**ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormanlık Sektörü)	2023-2025	8.400.000		2.850.000	0	% 0,0	Ana Proje olduğundan açıklamaları aşağıdaki 4 alt projede yapılmıştır.
	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2025	4.500.000		1.500.000	0	% 0,0	UASİS sisteminin taşınması ve Bakanlık sunucularına kurulumu tamamlanmıştır. 2021 yılına ait taslak arazi örtüsü haritası üretilmiş olup, verinin etiketleme ve düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılı arazi haritası üretmek için gerekli olan yardımcı verilerin temin çalışması devam etmektedir.
	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2025	1.650.000		550.000	0	% 0,0	Proje Kapsamında; İzleme sistemlerinin güncellenmesi amacıyla 2023 yılı Ocak-Haziran Döneminde; Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi altında "Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi WEB Tabanlı Yazılım Güncellemesi" ve "Oyuntu Erozyonuna Duyarlı Alanların Mekânsal Olarak Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Türleri Bakımından Raporlanması" çalışmalarına başlanmıştır. Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi kapsamında sistemin beş ana parametresinden biri olan "K" Toprağın Erozyona duyarlılığı parametresinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. RUSLE C (Bitkisel Örtü ve Ürün) faktörün NDVI- CORINE- Meşçere verileri kullanılarak güncellenmesi çalışmaları yapılarak aylık bitki örtüsü faktörü hesaplamaları yapılmıştır. Proje kapsamında ihale çalışmalarına başlanmış, ilk 6 aylık dönemde harcama yapılmamıştır.
	Toprak Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2023-2025	1.650.000		550.000	0	% 0,0	Tarım dışı alanlarda Toprak haritalama Projesi büro çalışmaları sürdürülmektedir.
	Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası	2023-2025	600.000		250.000	0	% 0,0	Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS)'nin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Türkiye Çölleşme Modeli (TÇM) çalışmalarına başlanmıştır. 2020-2021 yıllarında mevcut durum tespiti, ham verilerin depolanması çalışmaları yürütülen Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası; Arazi Tahribatının Dengelenmesi- Karar Destek Sistemine entegre edilmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle ilgili kurumlardan güncel veri talebinde bulunulmuş, 2023 yılında da kurumlardan gelen verilerin incelenmesi, temizliği ve analizi yapılmaktadır. 2023-2024 yıllarında güncellenmesi tamamlanacak TÇM ve Hassasiyet Haritasının 2024 yılı itibari ile tehlike ve risk haritalarının üretilmesi çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
2023A05-196786	Bolaman ve Çekerek Nehri Havzaları Rehabilitasyonu (Ormanlık Sektörü)	2023-2028	10.000.000		1.250.000	0	% 0,0	TULIP Projesi kapsamında, LDN, UASİS Bitki Örtüsü verisi ve Erozyon İzleme verileri proje paydaş kurumları ile paylaşılacaktır. TULIP Projesi kapsamında İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi. Kasım 2023 tarihinde İzleme ve Değerlendirme Eğitimi ile ilgili hazırlıkların yapılması planlanmaktadır.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>63.330.000</b>	<b>10.830.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>183.591</b>	<b>% 0,9</b>	

## STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2023	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2023K09-198533	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2023-2023	4.900.000		4.900.000	4.350.683	% 88,8	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2023-2023	4.900.000		4.900.000	3.454.274	% 70,5	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2022K09-207663	Şanlıurfa İl Müdürlüğü GES Kurulumu (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.800.000	0	4.800.000	0	% 0,0	İl Müdürlüğüne ihale talimatı gönderilmiştir.
2023G00-195180	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2023-2023	2.200.000		2.200.000	198.169	% 9,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.003.127</b>	<b>% 66,7</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>6.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>18.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>8.003.127</b>	<b>% 45,0</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.06.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023G00-195180	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2023-2023	100.000		100.000	0	% 0,0	
2023K09-198533	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2023-2023	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2023-2023	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2023-2023	1.705.000		1.705.000	1.705.000	% 100,0	1 adet T04 tipi taşıt alımı (TOGG) yapılmıştır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>1.705.000</b>	<b>0</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>% 100,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.005.000</b>	<b>0</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>% 85,0</b>	
