



2023 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

3. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2023 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.257.365.000,00	4.448.025.894,97	4.607.951.517,90	% 103,6
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	756.980.000,00	798.568.425,23	715.844.129,24	% 89,6
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	453.954.000,00	875.926.905,82	496.848.479,01	% 56,7
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	339.854.000,00	761.226.905,82	464.043.263,85	% 61,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	68.100.000,00	68.700.000,00	32.265.215,16	% 47,0
	Kentsel Dirençlilik Projesi-DB Kredisi Karşılığı	46.000.000,00	46.000.000,00	540.000,00	% 1,2
05	CARİ TRANSFERLER	5.263.627.000,00	10.758.764.277,74	7.924.823.771,92	% 73,7
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	1.069.395.000,00	1.069.395.000,00	866.940.000,00	% 81,1
	Kentsel Dönüşüm Genel Bütçe Ödeneği ve Ek Ödenek	208.459.000,00	208.459.000,00	208.459.000,00	% 100,0
	Kentsel Dirençlilik Projesi-DB Kredisi Karşılığı	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	% 0,0
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	% 100,0
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	% 0,0
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	1.232.000.000,00	1.232.000.000,00	1.103.014.000,00	% 89,5
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	315.000.000,00	294.696.000,00	113.424.000,00	% 38,5
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	110.000.000,00	110.000.005,85	107.251.840,02	% 97,5
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	27.573.000,00	40.014.271,89	25.524.431,90	% 63,8
	İskan Uygulamaları Ödeneği	1.000.000,00	4.000.000,00	10.500,00	% 0,3
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	200.000,00	200.000,00	200.000,00	% 100,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.019.188.000,00	17.008.260.829,19	10.028.248.580,94	% 59,0
	Bakanlık Yatırım Programı	1.793.188.000,00	2.989.069.000,00	371.301.199,60	% 12,4
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	226.000.000,00	226.000.000,00	210.661.951,63	% 93,2
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	12.000.000.000,00	7.890.065.645,61	% 65,8
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	15.000.000,00	6.197.265,46	% 41,3
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	1.778.191.829,19	1.550.022.518,64	% 87,2
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	11.379.934.000,00	15.215.418.304,50	14.453.619.624,58	% 95,0
	Bakanlık Yatırım Programı	359.934.000,00	372.405.000,00	177.239.096,29	% 47,6
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	% 100,0
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	453.380.577,28	% 44,4
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	13.304,50	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	73.000.000,00	72.999.951,01	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
08	BORÇ VERME	190.000.000,00	190.000.000,00	22.342.750,00	% 11,8
GENEL TOPLAM		24.321.048.000,00	49.294.964.637,45	38.249.678.853,59	% 77,6



BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

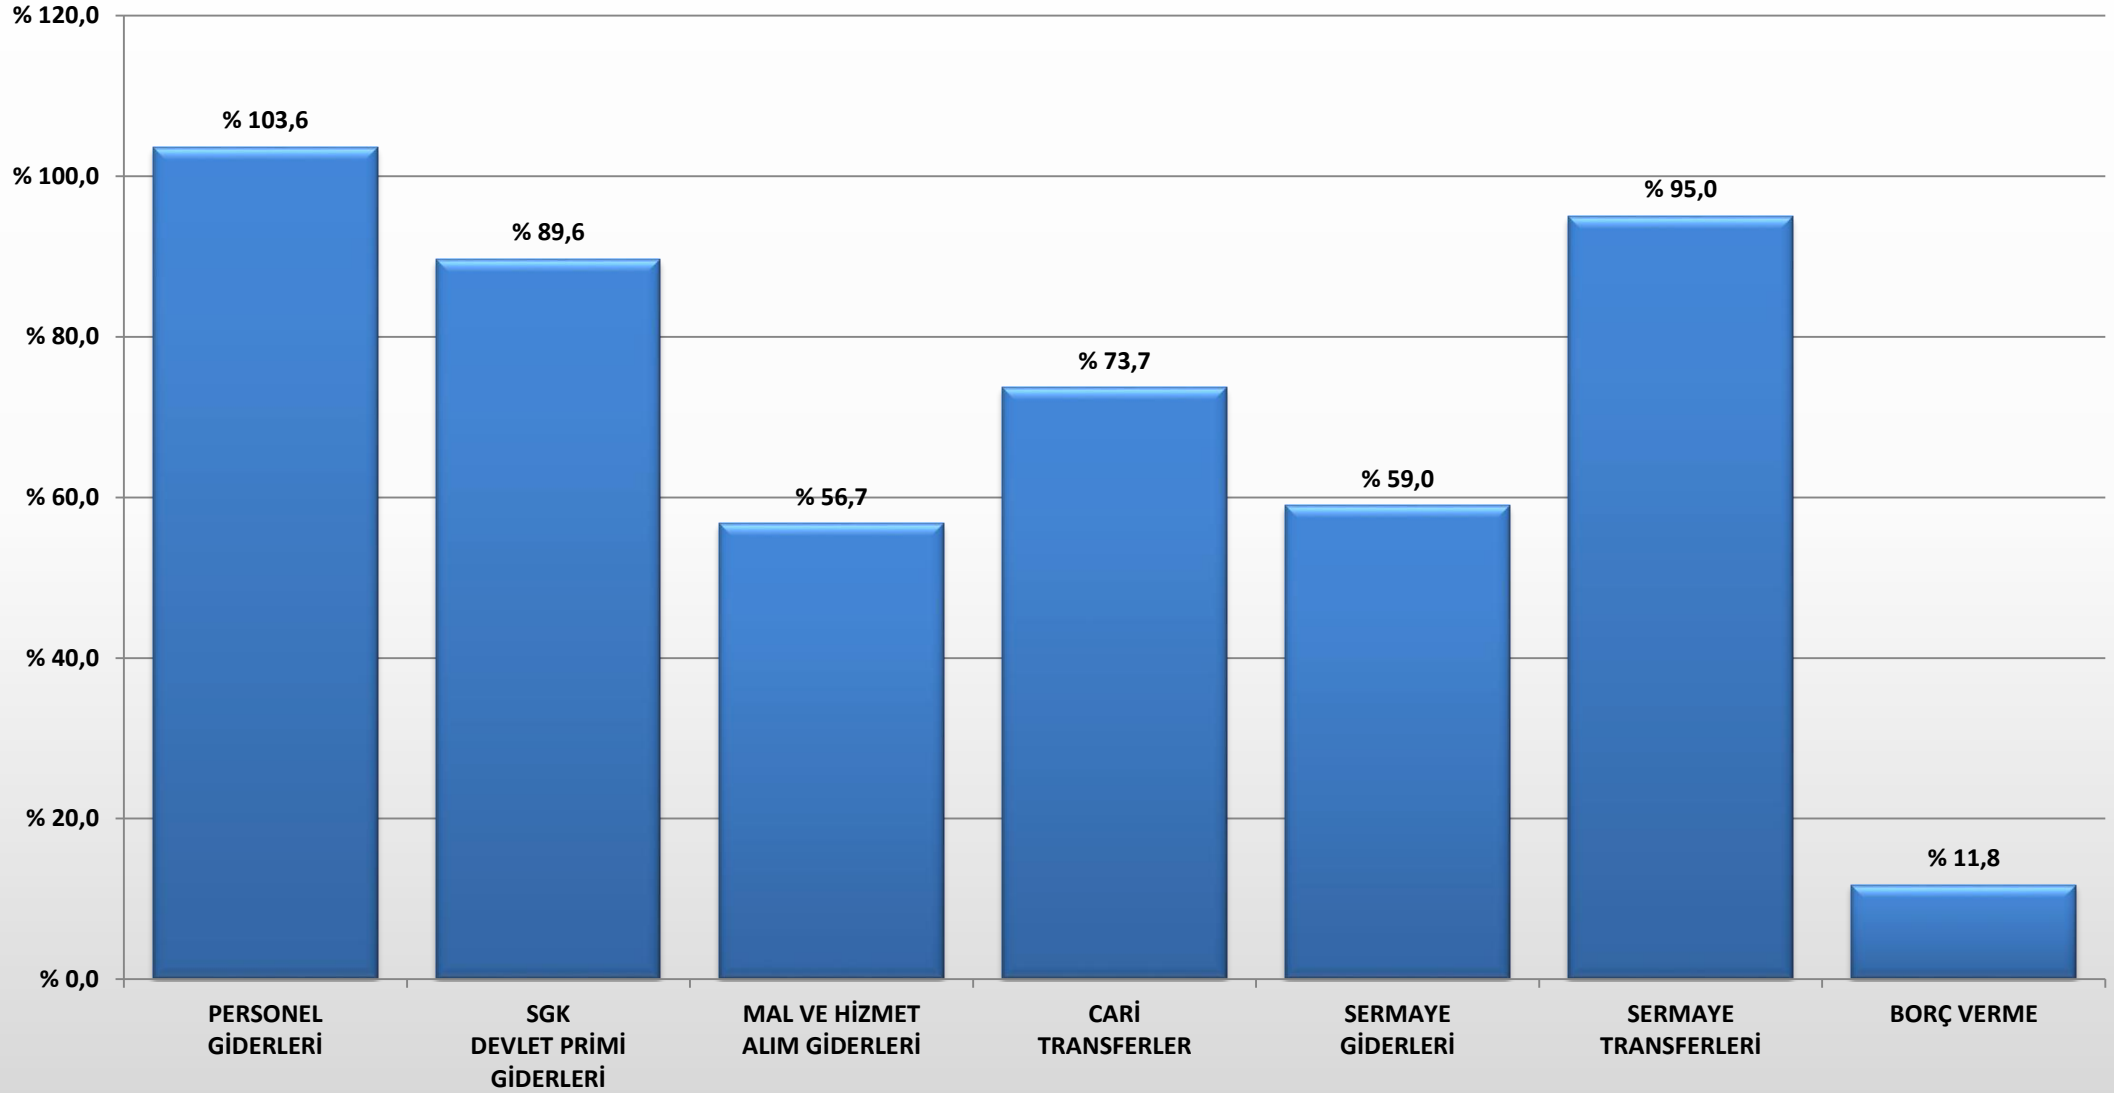




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2023 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2023 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	66.355.000,00	24.516.000,00	2.553.060,00	% 10,4
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	11	836.829.000,00	206.663.000,00	30.433.333,30	% 14,7
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	6	374.429.000,00	90.782.000,00	23.410.144,91	% 25,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	20	23.039.844.000,00	2.965.336.000,00	359.537.550,82	% 12,1
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	0	0,00	0,00	0,00	
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	3.321.000,00	1.280.000,00	488.873,19	% 38,2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	19	364.901.000,00	201.274.000,00	79.938.454,22	% 39,7
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	6.211.961.300,00	6.426.000,00	3.564.554,72	% 55,5
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	21	1.972.006.000,00	526.493.000,00	225.827.952,00	% 42,9
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	3.819.600.000,00	3.000.000,00	0,00	% 0,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	63.330.000,00	21.000.000,00	10.359.059,00	% 49,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	18.300.000,00	17.800.000,00	14.174.236,00	% 79,6
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	2.005.000,00	2.005.000,00	1.705.000,00	% 85,0
GENEL TOPLAM	97	36.779.081.300,00	4.072.775.000,00	751.992.218,16	% 18,5
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	70	35.583.521.300,00	3.516.274.000,00	555.292.661,12	% 15,8
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	27	1.195.560.000,00	556.501.000,00	196.699.557,04	% 35,3
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		226.000.000,00	210.661.951,63	% 93,2



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

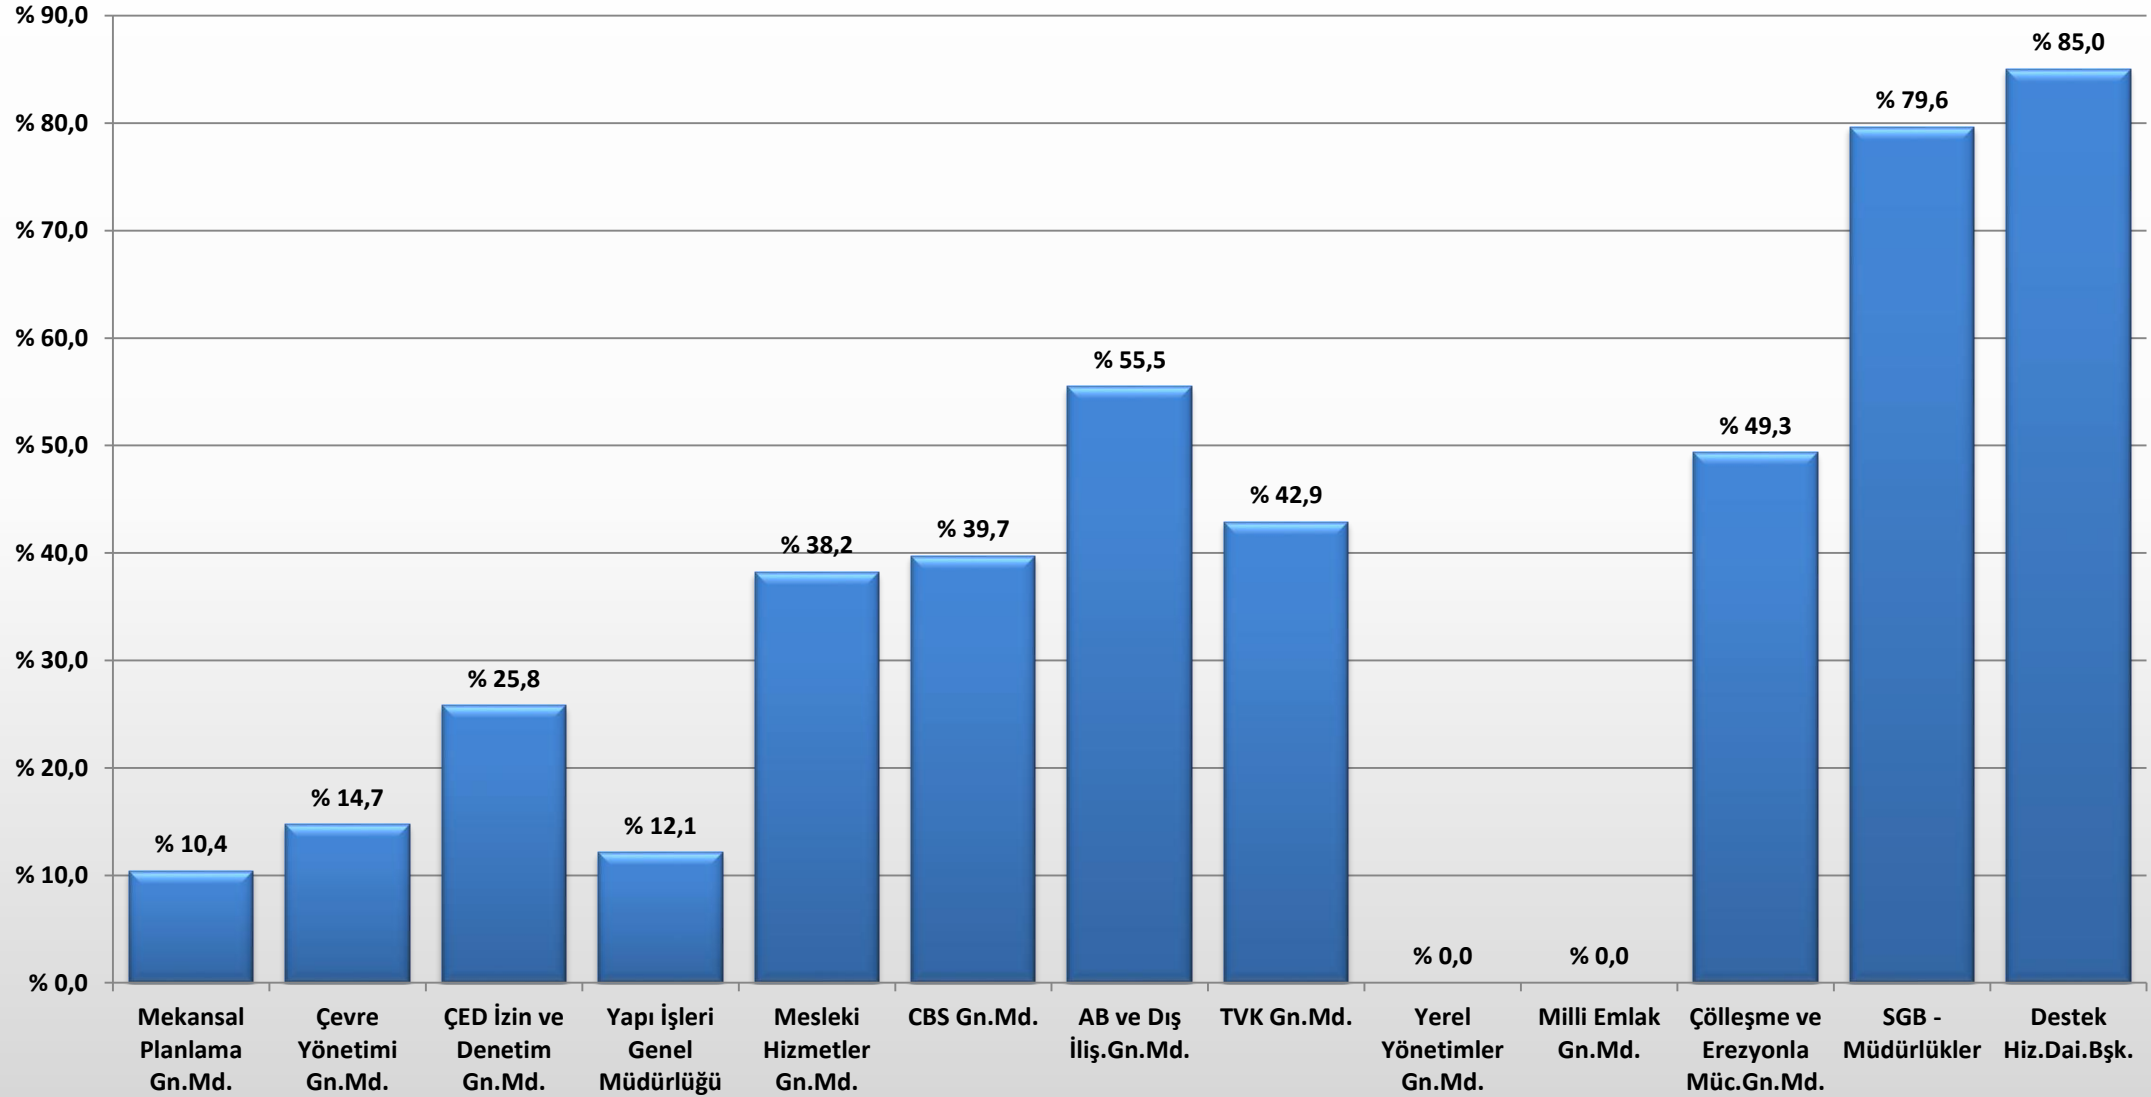



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2023 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	88.659.000,00	89.916.000,00	63.463.419,20	% 70,6
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	3.274.158.000,00	3.277.843.304,56	1.660.439.573,16	% 50,7
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	220.190.000,00	221.110.000,00	178.209.992,41	% 80,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	2.017.015.000,00	15.706.387.604,64	8.944.795.601,72	% 57,0
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	12.939.639.000,00	22.190.810.869,23	20.412.951.670,85	% 92,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	61.065.000,00	61.197.000,00	55.404.498,56	% 90,5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	114.397.000,00	145.597.000,00	91.068.668,54	% 62,5
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	130.583.000,00	204.433.005,79	204.433.005,79	% 100,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	261.872.000,00	300.979.350,00	193.477.830,46	% 64,3
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	23.748.000,00	23.748.000,00	22.964.135,64	% 96,7
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	429.151.000,00	433.551.000,00	265.600.684,36	% 61,3
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	59.320.000,00	59.322.000,00	37.986.127,00	% 64,0
Personel Genel Müdürlüğü	21.212.000,00	21.694.000,00	21.694.000,00	% 100,0
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	21.798.000,00	121.798.000,00	67.425.876,66	% 55,4
Özel Kalem Müdürlüğü	101.280.000,00	101.280.000,00	22.818.806,33	% 22,5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	237.286.000,00	434.564.634,73	393.483.489,70	% 90,5
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	7.689.000,00	7.689.000,00	7.383.245,92	% 96,0
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	34.689.000,00	34.689.000,00	34.689.000,00	% 100,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı	336.857.000,00	316.555.000,00	134.204.097,17	% 42,4
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	3.782.000,00	3.782.000,00	3.566.515,84	% 94,3
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	10.687.000,00	10.687.000,00	10.687.000,00	% 100,0
İl Müdürlükleri	3.914.664.000,00	5.516.870.868,50	5.412.471.614,28	% 98,1
Yurtdışı Teşkilatı	11.307.000,00	10.460.000,00	10.460.000,00	% 100,0
TOPLAM	24.321.048.000,00	49.294.964.637,45	38.249.678.853,59	% 77,6



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2023 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

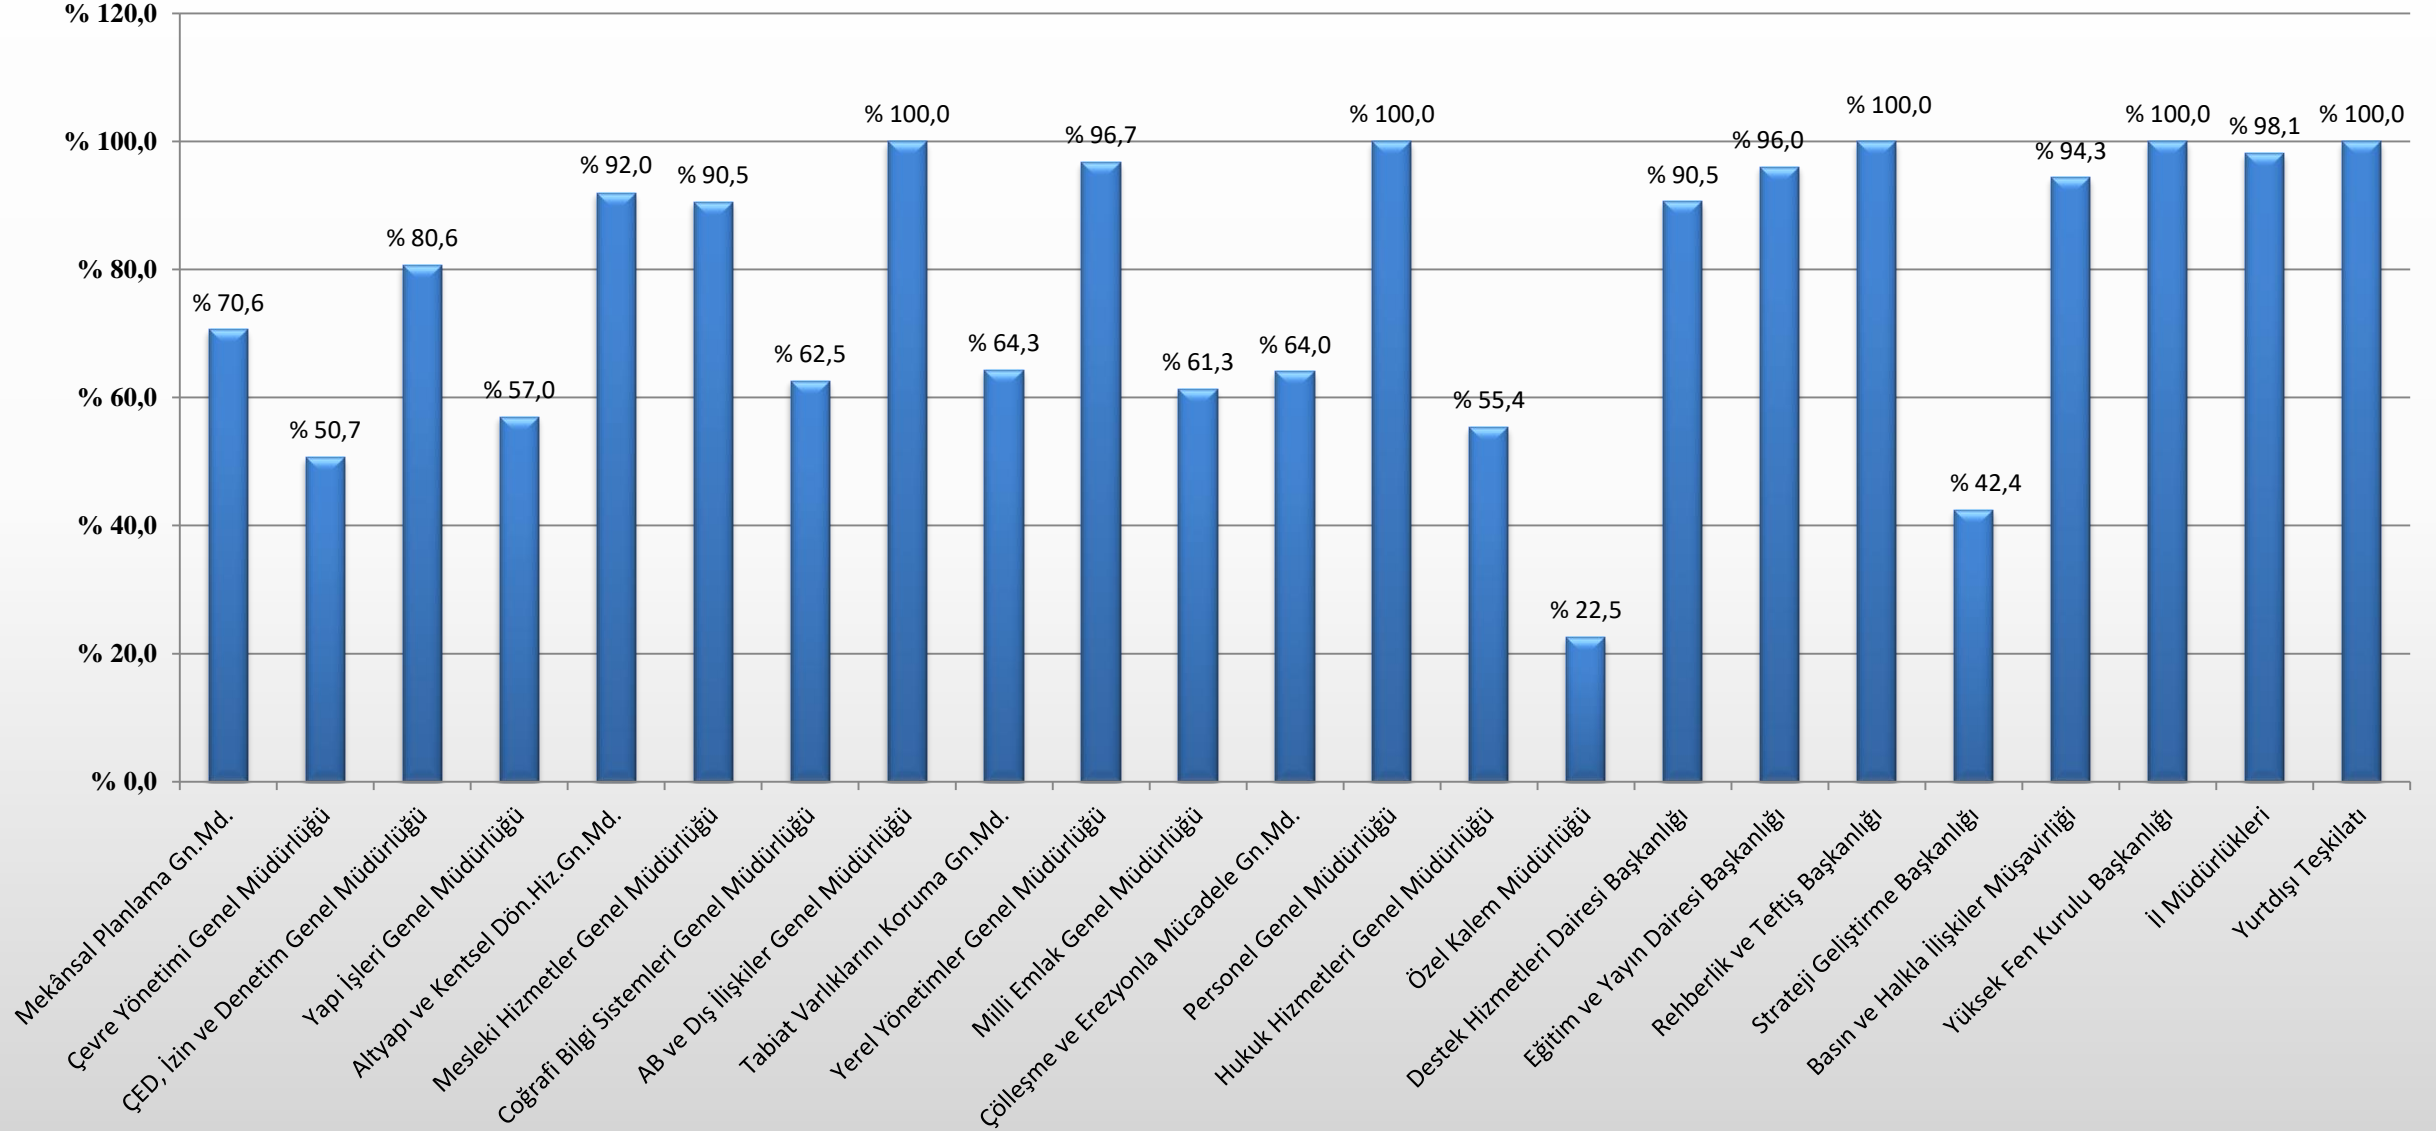

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Harcama Birimi Bazında

2023 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K09-162464	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2023	4.000.000	2.500.000	1.500.000	0	% 0,0	
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	4.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2024	28.816.000	7.799.000	7.587.000	505.202	% 6,7	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2024	19.416.000	3.486.000	2.500.000	0	% 0,0	2023 İhale süreci devam ediyor.
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2023	9.400.000	4.313.000	5.087.000	505.202	% 9,9	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi işi için 505.202,04 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2024	18.000.000	0	6.000.000	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K09-200027	Mücadir Alan Bilgi Sisteminin Oluşturulması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2023-2023	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapıldı. Yüklenici ile sözleşme imzalandı.
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2024	6.390.000		2.280.000	170.921	% 7,5	Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi (Fiyat Farkı) 170.921,06TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2024	6.390.000		2.280.000	170.921	% 7,5	
2023K09-198533	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi (2 Nolu Hakediş) 358.720,00 TL, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulama İşi (6 Nolu Hakediş) 503.723,21 TL, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulama İşi (7 Nolu Hakediş) 377.563,53 TL, Samsun İli Tekkeköy İlçesi İmar Uygulamaları Projesi (3 Nolu Hakediş) 251.779,10 TL, Bilecik İli Söğüt İlçesi İmar Uygulamaları Projesi (2 Nolu Hakediş) 385.151,78 TL olmak üzere toplam 1.876.937,62 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
	Örnek İmar Uygulamaları Kesin Hesabı	2023-2023	4.149.000		4.149.000	1.876.937	% 45,2	
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	65.355.000	10.299.000	23.516.000	2.553.060	% 10,9	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	1.000.000	0	1.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	66.355.000	10.299.000	24.516.000	2.553.060	% 10,4	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	500.000.000	200.000.000	165.000.000	22.518.333	% 13,6	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneğinden hakediş kapsamında 49.953.569 TL harcama yapılmıştır. 6 şubat 2023 ve sonrasında meydana gelen depremler nedeni ile ödeneğin 65 milyon TL olarak belirtilmesi sebebiyle yıl sonu harcama tahmini 65 milyon TL öngörülmüştür. 2018-2023 proje detay listesi Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 8/9/2023 tarihli yazı ile onaylanmış olup bu çerçevede ödenek çerçevesinde işlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması sağlanmaktadır.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme Kılavuzu Hazırlama (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2024	4.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Proje bütçesi dikkate alındığında 2022 yılı içerisinde artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2023 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize yapılarak başvurulmuştur. Bütçe 4milyon TL olarak süresi 2022-2024 olarak revize edilmiştir. Proje revizesi çalışmaları yürütülmekte olup henüz 2023 yılı için ayrılan ödenekten herhangi bir harcama yapılmamıştır. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir. Projenin süresinde revize talebi bulunmaktadır. O nedenle yıl sonuna kadar harcama yapılması öngörülmektedir.
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2024	12.350.000	2.310.000	5.390.000	0	% 0,0	
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2024	3.500.000	0	2.700.000	0	% 0,0	Projenin 3f kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmış olup, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden teklif istenmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi bütçenin üstünde 4.500.000 tl fiyat teklifinde bulunmuştur. Projenin 3f kapsamında gerçekleştirilmesi için proje bütçesinin arttırılması talep edilmiştir.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.850.000	2.310.000	2.690.000	0	% 0,0	Şartname kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen projede; yazılıma esas geliştirme, araştırma-geliştirme süreçlerine esas faaliyetler sürdürülmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2025	15.000.000	3.000.000	7.000.000	0	% 0,0	08/11/2022 tarihinde, Bakanlığımız ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında yapılan sözleşme ile başlayan projenin ilk hakedişi 2022 yılı 4. çeyreğinde yapılmıştır. Projenin 2023 yılı 3. döneminde, Teknik Şartname kapsamında hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan Kıyı Tesisleri ve Plan Analizleri Raporu'nda 2. kez eksiklik tespit edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanmasının ardından yıl bitmeden 2. hakediş ödemesi yapılacaktır. Ayrıca, Ekim ayında sunulacak rapora istinaden 3. hakediş ödemesi gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması planlanmış ve bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ek bütçe talebinde bulunulmuş ve 2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar ile projenin toplam bütçesi 15.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bahse konu CBS tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması için teknik şartname hazırlanarak yaklaşık maliyet tespit çalışmaları devam etmektedir
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	9.990.000	3.080.000	3.580.000	1.500.000	% 41,9	TURKSAT ile yürütülen proje şartnamesi kapsamında belirlenen iller için veri üretimi çalışmaları planlanan şekilde gerçekleştirilmiş olup, iş planı çerçevesinde faaliyetler sürdürülmektedir.
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2024	12.000.000	0	6.000.000	2.950.000	% 49,2	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında 07.09.2023 tarihinde İstanbul'da kamu kurum temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile Proje Açılış Toplantısı düzenlenmiştir.
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (Çevre Sektörü)	2023-2025	10.000.000	0	3.500.000	2.000.000	% 57,1	04/01/2023 tarihli ve 5447350 sayılı Olur kapsamında söz konusu Projenin Türksat A.Ş. ile yapılması kararlaştırılmıştır. Gerekli satınalma süreçleri tamamlanarak 07/04/2023 tarihinde Türksat A.Ş. ile Sözleşme imzalanmıştır. Projenin Teknik Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında, yazılıma bakım, onarım ve destek aşaması fiilen başlamış olup, modernizasyon kapsamındaki analiz ve tasarım çalışmaları devam etmektedir. Sözleşmede belirtilen yer alan Proje Yönetim Planı ve Son kullanıcı cihazları 25/04/2023 tarihinde sunulmuş ve tarafımızca uygun bulunarak ödemesi yapılmıştır.
2023K10-198444	Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2024	8.000.000	0	2.035.000	1.465.000	% 72,0	Proje zaman planı, proje organizasyonu, proje ekibi ve risk yönetimi hususlarından oluşan Proje Yönetim Planı idareye sunulmuş ve onaylanmıştır. Yönetim planı çerçevesinde proje çalışmaları devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)-(Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2025	9.500.000		3.500.000	0	% 0,0	Mâli nedenlerden dolayı Kamu Hizmet Sunucusu olarak üniversite (ODTÜ) ile protokol imzalanamamış olup, bahse konu Ar-Ge projesinin 10/05/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2014/6228 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında belirlenecek yeni yüklenici ile protokol imzalanacaktır.
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	14.271.000	10.206.000	4.065.000	0	% 0,0	IPA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmış olup 3 yıllık projenin 2023 4. çeyrekte tamamlanması planlanmaktadır. Yeşil Mutabakat Eylem Planının da önemli çıktılarından olan, Ulusal Emisyon Stratejisi Eylem Planının hazırlanması, EKÖK Belgelendirme Yazılımının oluşturulması ve mevcut en iyi tekniklere yönelik sektörel tebliğlerin ve kılavuzların hazırlanması ile EKÖK mevzuatı uyumlaştırılmasına yönelik sektörlerin altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar DIES Projesi ile tamamlanacaktır. Proje kapsamında; proje başlangıcından 30 Eylül 2023'e kadar, 1 Açılış Toplantısı, 11 Çevrimiçi Çalıştay, 9 Yüz yüze Çalıştay, 2 Farkındalık Semineri, 4 Eğiticilerin Eğitimi, 23 farklı ilde 237 saha ziyareti, 2 çalışma ziyareti, 1 Uluslararası Toplantı katılımı, 1 Staj Programına katılım, 9 Proje Yönlendirme Kurulu Toplantısı ve 20 Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, EKÖK Belgelendirme Yazılımı geliştirilmekte olup, 11 sektörel kılavuz ve 10 adet sektörel uyum raporu hazırlanmış, bununla birlikte taslak çerçeve mevzuat çalışmaları devam etmektedir.
AB katkısı			76.097.000	60.877.000	15.220.000	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2023	5.111.000	4.111.000	1.000.000	0	% 0,0	<p>2023 yılı ilk iki çeyreğinde dönemi kapsamında proje faaliyetlerinin ilerlemesi aşağıdaki şekildedir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proje'ye Zeyilname ile 7 Ekim 2022 tarihinde eklenen "Risk Değerlendirmesi ve Alternatif İyileştirme Teknolojileri Eğitimi" 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) merkez (9) ve il müdürlüğü (83) personelinin katılımı ile Antalya'da düzenlendi. Ulusal ve uluslararası uzmanların risk değerlendirmesi, teknoloji seçimi, vaka çalışmaları, vb. anladığı bu eğitime toplam 92 temsilci katıldı. Eğitim raporu yazıldı ve onaylandı - Proje'nin 30'uncu ve 31'inci Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantıları sırasıyla 15 Şubat ve 22 Mart tarihinde düzenlendi. Proje'nin 7'inci Yönelendirme Komitesi Toplantısı tüm paydaşların katılımıyla 5 Nisan 2023 tarihinde yapıldı. - Altı aylık faaliyet döneminin anlatıldığı 7'inci Faaliyet Raporu 22 Mart 2023 tarihinde taslak olarak Bakanlık değerlendirmesine sunuldu ve 05 Nisan 2023 tarihinde onaylandı. Proje'nin 3'üncü İlerleme Raporu 7 Şubat 2023 tarihinde onaylandı. 3. İlerleme Raporu'nu proje paydaşlarına resmi olarak 18 Nisan'da sunduk. 5 Nisan tarihinde onaylanan 7. Faaliyet Raporu'nun basılı versiyonu Haziran 2023 te sunuldu. - Risk Değerlendirme Uzmanı, Kirlenmiş Sahalar Uzmanı, Yazılım Uzmanı ve Toprak Kirliliği Uzmanı için sözleşme imza süreci Mart 2023 itibarıyla tamamlandı. - İkinci bileşen kapsamında iyileştirme çalışması yürütülecek iki pilot saha tespit edildi. Saha analizi ve FIDIC 1999 Red Book'a göre ihale dosyasının düzenlenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. İhale dosyasının nihai hali 15 Mart 2023 tarihinde teknik dairelerin görüşlerine sunuldu. Proje'nin inşaat bileşeni kapsamındaki süreci değerlendirmek için 27 Mart 2023 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sözleşme Makamı, Faydalanıcı Kurum ve UNDP Proje Ekibi bir araya geldi. - Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamındaki revizyonları değerlendirmek üzere 18 Ocak 2023 tarihinde Su ve Toprak Dairesi ile bir toplantı düzenlendi. Risk Değerlendirme Uzmanı tarafından hazırlanan Kirlenmiş Sahalar Risk Değerlendirmesi Teknik Rehberi 30 Mart 2023 tarihli toplantıda değerlendirildi. Bu toplantı notlarına göre güncellenen taslak doküman 5 Nisan 2023 tarihinde teknik daireye sunuldu. Yönetmeliğe bağlı rehberlerin güncellenmesi için çalışmalar devam ediyor. Haziran ayında revize versiyon sunuldu - Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi Alanında Yetkinlikleri ÇŞİDB Tarafından Belgelendirilmiş Şirketler İçin Eğitim hazırlıkları tamamlandı. İki günlük eğitimin 3-4 Mayıs tarihinde Ankara'da yapıldı, 55 kişi katıldı. Eğitim raporu yazıldı ve onaylandı. -10 Mayıs tarihinde risk değerlendirme uzmanı ve yetkilendirilmiş şirketler yönetmelik revizyonu, jenerik risk değerlendirme üzerine zoomda toplandı. Toplantıya Bakanlık merkez personeli (7), kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi alanında yetkinlikleri ÇŞİDB tarafından belgelendirilmiş şirketler (22) ve UNDP temsilcileri (4) dahil toplam 33 kişi katıldı. -32. Ocu 27 Nisan, 33. Ocu 25 Mayıs, 34. Ocu 21 Haziran tarihinde tamamlandı. - "Risk Değerlendirmesi ve Alternatif İyileştirme Teknolojileri Eğitimi" ve "Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi Alanında Yetkinlikleri ÇŞİDB Tarafından Belgelendirilmiş Şirketler için Eğitim" faaliyetlerinin Türkçe ve İngilizce dijital eğitim sertifikalarını katılımcılarla paylaştık. - 35. OCU toplantısı 31 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. - 36. OCU toplantısı 28 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi. - Proje kapsamında 12-13 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara'da "Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Yönetmeliği Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. - 37. OCU toplantısı 26 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi.
AB katkısı			50.731.000	23.296.000	27.435.000	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	16.467.000	6.563.000	3.593.000	0	% 0,0	Türkiye'de End of Waste (Atık Sonu) Konseptinin Geliştirilmesi Projesi" 25.04.2023 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Söz konusu projenin sözleşme bütçesi 1.191.601,00 Avro olup, proje süresi 24 aydır. Başlangıç raporu (Inception report) Bakanlığımıza sunulmuş, saha ziyaretleri başlamış anketler ahızrlanarak işlemler iletilmiştir. 15.06.2023 tarihinde açılış toplantısı yapılmıştır.
AB katkısı			93.312.000	37.195.000	3.356.000	0	% 0,0	
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	608.689.000	229.270.000	204.628.000	28.968.333	% 14,2	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	8.000.000	0	2.035.000	1.465.000	% 72,0	
		GENEL TOPLAM	616.689.000	229.270.000	206.663.000	30.433.333	% 14,7	
		AB KATKISI	220.140.000	121.368.000	46.011.000	0	% 0,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.558.000	910.000	648.000	0	% 0,0	Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kriter Belirleme Çalışmalarına Yönelik Hizmet Alımı İşi ve ek protokolü kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Bu yıl içerisinde henüz ödeme gerçekleştirilmemiştir.
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulumu ve Bakım-Onarımı	2014-2025	333.729.000	166.229.000	54.492.000	16.967.541	% 31,1	
	Genel Bütçe Ödeneği	2014-2025	204.654.000	99.154.000	34.492.000	14.055.741	% 40,8	Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyon işi düzenli aylık hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından da bölgesel İstasyonların Bakım-Onarım hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
	Döner Sermaye Ödeneği	2014-2025	129.075.000	67.075.000	20.000.000	2.911.800	% 14,6	İhaleye çıkmıştır. İhale tarihi 31.10.2023 tür. Aynı proje kapsamında Silopi de 1 adet HKİ İstasyonu kurulum işi bitmiştir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2021-2024	4.750.000	2.250.000	1.250.000	0	% 0,0	Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda yenilenmesi gereken istasyonlara ait tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu tespitler ışığında teknik şartname hazırlama çalışmaları tamamlanmış olup, yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları devam etmektedir.
2023K10-198440	Kuzey İç Anadolu THM Analitik Laboratuvar Kurulum (Çevre Sektörü)	2023-2023	6.500.000		6.500.000	6.442.604	% 99,1	Kuzey İç Anadolu THM Analitik Laboratuvar Kurulum Projesi Ekim 2023 ayı itibarıyla tamamlanmıştır.
2023K10-198441	Mobil Emisyon Laboratuvarı Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2023-2023	2.006.000		2.006.000	0	% 0,0	Sözleşmesi imzalanan iş, muayene kabul aşamasındadır.
2023K10-198442	Hava Kalitesi Ölçüm Aracı Alımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2023	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	Araç alımı için Cumhurbaşkanlığından izin yazısı gelmiş olup, araçta gerekli cihaz ve ekipmanların temin edilmesi için yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları devam etmektedir.
2023K10-198443	Laboratuvar Ön İşlem, Analiz Cihazları ve Mobil Araç Alımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2023	20.886.000		20.886.000	0	% 0,0	2 adet T13 kamyon alınma sürecinde, 1 adet T8 pick-up için izin bekleniyor. Bu işlemler sonuçlandığında donanım alımına çıkılacaktır.
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	219.468.000	102.314.000	44.896.000	20.498.345	% 45,7	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	154.961.000	67.075.000	45.886.000	2.911.800	% 6,3	
		GENEL TOPLAM	374.429.000	169.389.000	90.782.000	23.410.145	% 25,8	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	4.278.043.000	716.365.000	1.458.241.000	173.608.986	% 11,9	Proje hedef amaç ve göstergelerine uygun olarak ilerlemektedir. 2023 yılı 4. çeyrekte tahsis edilen bütçenin harcanması planlanmaktadır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	4.218.648.000	681.692.000	1.450.000.000	163.575.767	% 11,3	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	59.395.000	34.673.000	8.241.000	10.033.219	% 121,7	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	5.462.296.000		16.449.000	0	% 0,0	Dünya Bankası Yönetim Kurulunda Onay ve imza süreçleri devam etmektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	5.376.275.000		8.603.000	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	86.021.000		7.846.000	0	% 0,0	
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2028	102.150.000		4.086.000	0	% 0,0	Proje onaylanmış olup harcama gerçekleşmemiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2028	0		0	0		
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2028	102.150.000		4.086.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	4.998.758.000	9.445.000	385.198.000	19.561.478	% 5,1	07/09/2021 tarihinde TR-9261 "Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği "İkraz Anlaşması", 16/05/2022 tarihinde "Küresel Afet Risk Azaltma Fonundan temin edilen Hibe Anlaşması" imzalanmıştır. İkraz Anlaşması kapsamında Marmara Bölgesinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerinde üniversite, yurt ve valilik binası olmak üzere belirlenen 13 kampüsteki 33 yapının güçlendirme projelerinin hazırlanması kapsamında Kamu Binalarında Yapısal Fizibilite , Enerji Denetimi, Yapısal - Enerji Güçlendirme Tasarımı ve İnşaat Kontrollüğü için (WB/CS-DESSUP-01) Danışmanlık Hizmeti sözleşmesi 22.12.2022 tarihinde imzalanmış olup , hizmete ilişkin süreç devam etmektedir. Türkiye'nin Muhtelif İllerinde Bulunan Kamu Binalarında Ön Sismik ve Enerji Verimliliği Değerlendirme İşi kapsamında teknik yardım danışmanlık hizmeti (WB/CS-TA-01) sözleşmesi 15.03.2023 tarihinde imzalanmış olup , hizmete ilişkin süreç devam etmektedir. Yapısal Fizibilite, Enerji Denetimi, Yapısal- Enerji Güçlendirme Tasarımı konusunda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü' ne teknik destek sağlanması kapsamındaki danışmanlık hizmeti (WB/CS-TA-04) sözleşmesi 01.06.2023 tarihinde imzalanmış olup , hizmete ilişkin süreç devam etmektedir. Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme Fonundan temin edilen hibe bünyesinde "İleri Mühendislik Uygulamaları ve Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım Danışmanlık Hizmeti"WB/CS-TA-02 sözleşmesi 11.07.2023 tarihinde imzalanmış olup , hizmete ilişkin süreç devam etmektedir. Proje kapsamında ihale süreçleri devam etmektedir.
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	734.483.000	9.445.000	100.977.000	19.561.478	% 19,4	
	Hibe Ödenegi	2021-2027	14.108.000	0	8.465.000	0	% 0,0	
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2023-2026	4.250.167.000	0	275.756.000	0		
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	6.376.262.000	0	640.000.000	0	% 0,0	Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçilmiş illerde temel hizmetlere ve dirençli konutlara erişimi yeniden sağlamak amacıyla 296,5 milyon ABD Doları tutarında krediyi, Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi için 27.06.2023 tarihinde onaylamıştır. İkraz Anlaşması 01.09.2023 tarihinde imzalanmış olup, proje kapsamında ihale süreçleri başlamıştır.
2023K14-196774	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	7.500.000		7.500.000	6.695.331	% 89,3	Proje kapsamında araç alımları gerçekleştirilmiştir.
2023K14-196775	Afet Sonrası Bina Güvenliği Teyidi (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	5.750.000		5.750.000	0	% 0,0	Alım işlemleri yürütülmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K14-196776	Afet Sonrası Betonarme Yapıların Güvenliği (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	2.400.000		2.400.000	0	% 0,0	Alım işlemleri yürütülmektedir.
2023K14-196777	Afet Sonrası Haritalama ve Bölge Tarama (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2023-2023	1.100.000		1.100.000	0	% 0,0	Alım işlemleri yürütülmektedir.
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Döner Sermaye)	2021-2023	67.357.000	0	35.200.000	29.573.543	% 84,0	
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	75.218.000	0	50.000.000	13.235.873	% 26,5	
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	46.476.000	0	30.000.000	15.000.000	% 50,0	
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.*.Arsa Karşılığı)	2021-2023	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	250.243.000	0	25.048.000	0	% 0,0	İş ihaleye çıkmış ancak aşırı yüksek teklif verildiğinden iptal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığından proje tutarının güncellenmesi geldikten sonra yeniden ihale çalışmalarına başlanacaktır.
2018K07-24212	İlisu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	13.950.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	16.000.000	0	1.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2024	144.000.000	40.000.000	90.000.000	19.299.946	% 21,4	İşin ihalesi yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	80.000.000	33.164.000	40.000.000	18.906.992	% 47,3	İşin ihalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	173.000.000	30.116.000	75.000.000	69.251.675	% 92,3	İşin ihalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.
2023K07-195172	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	2.000.000		2.000.000	296.850	% 14,8	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parsestasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2023K07-209692	Tamamlama ve Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	16.000.000		16.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
	Kesin Hesap	2023-2023	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
	İskan Konutları Altyapı İşleri	2023-2023	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	<i>Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2016-2026	851.640.000	129.850.000	189.950.000	22.342.750	% 11,8	Aksaray, Ankara, Batman, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2023 yılı itibarıyla bu iş için ayrılan ödenek miktarı 189.950.000 TL olarak belirlenmiştir. 30.09.2023 tarihi itibarıyla Erzurum, Erzincan İzmir, Çorum, Muş, Karaman, Batman, Kars ve Tunceli illerinde toplam da 22.342.750 TL'lik harcama gerçekleşmiştir. Toplamda 19 adet konut tamamlanmıştır.
	<i>Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2026	77.027.000	2.000.000	10.000.000	540.000	% 5,4	Aksaray ilindeki 9 uygulamada yer alan toplam 183 hak sahibi aile için 540.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	<i>Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	34.100.000	5.100.000	13.500.000	0	% 0,0	
	<i>Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	30.400.000	12.000.000	10.000.000	222.750	% 2,2	Batman ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 52 hak sahibi aile için 222.750 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	<i>Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	2.800.000	450.000	500.000	0	% 0,0	
	<i>Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2026	30.000.000	800.000	1.000.000	0	% 0,0	
	<i>Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2026	27.000.000	6.000.000	9.000.000	0	% 0,0	
	<i>Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2026	30.000.000	4.000.000	10.000.000	0	% 0,0	
	<i>Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	30.000.000	4.000.000	7.000.000	360.000	% 5,1	Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 32 hak sahibi aile için 360.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 1 konut tamamlanmıştır.
	<i>Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	19.000.000	3.000.000	3.000.000	0	% 0,0	
	<i>Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	30.000.000	1.500.000	5.000.000	3.138.000	% 62,8	Erzincan ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 27 hak sahibi aile için 3.138.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	<i>Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2025	97.073.000	50.000.000	30.000.000	5.850.000	% 19,5	Erzurum ilindeki 19 uygulamada yer alan toplam 303 hak sahibi aile için 5.850.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	İğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	27.000.000	0	7.000.000	0	% 0,0	
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	31.050.000	3.800.000	11.000.000	0	% 0,0	
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	30.000.000	8.000.000	10.000.000	2.692.500	% 26,9	İzmir ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 50 hak sahibi aile için 2.692.500 TL harcama gerçekleşmiştir. 9 konut tamamlanmıştır.
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	15.000.000	500.000	5.000.000	90.000	% 1,8	K.Maraş ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 16 hak sahibi aile için 90.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	17.000.000	1.000.000	4.438.000	90.000	% 2,0	Karaman ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 10 hak sahibi aile için 90.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 1 konut tamamlanmıştır.
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	35.000.000	12.000.000	7.000.000	660.000	% 9,4	Kars ilindeki 4 uygulamada yer alan toplam 79 hak sahibi aile için 660.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	15.000.000	1.000.000	4.000.000	0	% 0,0	
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	1.250.000	0	1.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	3.750.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	48.000.000	1.000.000	6.000.000	420.000	% 7,0	Malatya ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 44 hak sahibi aile için 420.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Biten konut henüz yoktur.
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	28.000.000	1.000.000	5.000.000	1.595.500	% 31,9	Muş ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 85 hak sahibi aile için 1.595.500 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 1 konut tamamlanmıştır.
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2025	28.000.000	1.000.000	7.000.000	0	% 0,0	
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	45.000.000	11.000.000	8.000.000	0	% 0,0	
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	88.650.000	0	10.000.000	6.684.000	% 66,8	Tunceli ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 183 hak sahibi aile için 6.684.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 7 konut tamamlanmıştır.
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2026	9.000.000	700.000	1.500.000	0	% 0,0	
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2026	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Elazığ İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2023-2025	22.500.000		5.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K07-195173	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2025			20.000.000	16.983.213	% 84,9	Kamulaştırma ve konut satın alımları için kullanılmaktadır. 30.09.2023 tarihi itibarıyla Tekirdağ, Ankara, Muş, Çorum, Adıyaman, İstanbul, Kastamonu ve Aydın illerinde toplam da 44 adet satın alma işlemi (konut) için 16.983.213 TL ödenek adı geçen illere gönderilmiştir. Satın alması yapılan 44 konut/tarım arazisi hak sahiplerine teslim edilmiştir.
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	21.651.028.000	794.417.000	2.723.386.000	290.892.708	% 10,7	
2 Proje		08 TOPLAM	851.690.000	129.850.000	190.000.000	22.342.750	% 11,8	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	84.107.000	0	51.950.000	36.268.874	% 69,8	
		GENEL TOPLAM	22.746.349.000	958.940.000	2.965.336.000	359.537.551	% 12,1	
2 Proje		HİBE	159.524.000	34.673.000	24.552.000	10.033.219	% 40,9	
1 Proje		AB KATKISI	102.150.000	0	4.086.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	191.345.000	0	137.000.000	28.235.873	% 20,6	
		Kamu laştırma	0	0	20.000.000	16.983.213	% 84,9	

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	0 Proje	06 ve 07 TOPLAM	0	0	0	0		

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİ F HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2025	2.791.000		750.000	6.519	% 0,9	<p>*Proje kapsamında öncelikle BEP-TR yazılımı ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı için gerekli iklim verilerinin güncellenmesi ve sürekli güncellemeyi mümkün kılacak yazılım için gerekli metodoloji ve algoritma için şartname ve protokol çalışmaları devam etmekte olup, üniversiteler ile yapılacak protokol kapsamında Arastırma ve Gelistirme Projeleri kapsamında işin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p> <p>*Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu hazırlama, işlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p> <p>*- 25-26/04/2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi etkinliğine katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 26-28/04/2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği ve Mevzuatı konulu eğitime katılım sağlanmıştır.</p> <p>*-10-13/05/2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeşil Sertifika konusundaki faaliyetlere katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 14-16/06/2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 11. Küresel Isınma Konferansına katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 18-20/09/2023 tarihleri arasında Kızılcahamam'da düzenlenen Uluslararası Okullarda ve Öğrenci Yaşam Alanlarında İç Hava Kalitesi Zirvesine katılım sağlanmıştır.</p> <p>*- 26/09-01/10/2023 tarihleri arasında Nahçıvan'da düzenlenen Türkiye- Azerbaycan Enerji Forumuna katılım sağlanmıştır.</p>
2023K01-198902	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	530.000		530.000	482.354	% 91,0	TSE'ye deney ve muayene ücreti ile argon tüpü ödemesi yapılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.321.000	0	1.280.000	488.873	% 38,2	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021E06-164350	Trafik Sorununun Çözümü için Akıllı Şehirler (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2021-2023	13.176.000	8.676.000	4.500.000	281.914	% 6,3	Proje Kapsamında Trafik Yoğunluğu Analiz Hizmeti işine 3.800.000,00 TL + KDV tutarında, Gerçek Zamanlı İnsan Araç Sayma Uygulaması için 405.000,00 TL sözleşme imzalanacaktır ve gerçekleştirilmekte olan Trafik Güvenliği Analiz Platformu işi için 238.910 TL + KDV hak ediş ödemesi yapılmıştır. Bununla birlikte Trafik Yoğunluğu Analiz Platformu Projesi hayata geçirilmektedir. Proje kapsamında 700.000 TL + KDV bedel üzerinden 09.06.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup henüz hak ediş ödemesi yapılmamıştır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022E06-182027	Kent İçi Hareketlilik Analizleri (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2022-2023	4.500.000	1.000.000	3.500.000	1.178.248	% 33,7	Proje kapsamında Kent İçi Hareketlilik Analizleri yazılımına yönelik geliştirme süreçleri tamamlanmış olup 998.515 TL + KDV hak ediş ödemesi yapılmıştır. Projenin Kent İçi Hareketlilik Analizleri Sistemi Hizmeti Temini işi için 2.124.500,00 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Trafik Yoğunluğu Analiz Hizmeti işine 3.800.000,00 TL + KDV tutarında imzalanan sözleşme Proje kapsamında olup hak ediş ödemeleri proje ödeneklerinden karşılanacaktır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2022-2023	6.120.000	3.000.000	3.120.000	0	% 0,0	Proje 2022 ve 2023 yıllarına aittir. 14.10.2022 tarihinde 4.788.000 TL + KDV bedelle sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında projeye ait Proje Metodolojisi Raporu, Proje Yönetim Planı (PYP), Analiz ve Tasarım Raporları, Ulusal Veri Sözlüğü hazırlama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Raporlama Altyapı Bileşeni lisans alımı gerçekleştirildi. 2022 yılı sonunda 5 adet iş paketi için 2.394.000 TL + KDV 1 adet hak ediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2023 yılın sonuna kadar proje ödeneği kullanılacaktır. Proje ödemeleri proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K01-205613	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	102.500.000		102.500.000	60.395.322	% 58,9	Projenin Altprojeleri Dijital Dönüşüm V3, Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini, Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini ve Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini gerçekleştirilmektedir.
	Dijital Dönüşüm V3	2023-2023	25.000.000		25.000.000	24.475.277	% 97,9	Bakanlık hizmetlerine ait uygulamaların bakım, idame güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Toplam 20.741.760 TL + KDV tutarında 3 hakediş gerçekleştirilmiştir.
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2023-2023	45.000.000		45.000.000	32.530.923	% 72,3	Teknik şartname çalışmaları devam etmekte olup ihale aşamasındadır. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 24.260.354,09 TL + KDV tutarında tümleşik bilgisayar proje kapsamında temin edilmektedir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2023-2023	30.000.000		30.000.000	3.225.442	% 10,8	Teknik şartname çalışmaları devam etmekte olup ihale aşamasındadır. Microsoft Premier Destek Paketi temini için proje kapsamında 410.000,00 TL + KDV harcama gerçekleştirilmiştir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2023-2023	2.500.000		2.500.000	163.680	% 6,5	Proje kapsamındaki işler ve bu işlerdeki gerçekleştirmeler aşağıda sunulmaktadır. - Belgenet Bakım ve Güncelleme Hizmet Alımı İşi 2023 yılı Belgenet bakım ve güncelleme hizmeti alınımının yapılması ilgili birime resmi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu işin sözleşmesinin imzalanması beklenmektedir. - Bakanlık Kurumsal İnternet Sitesi Bakım ve Ek Geliştirme Hizmetleri Alımı İşi 2023 yılı Bakanlığımız web sayfalarının bakım ve ek geliştirme işi sözleşmesi 24.05.2023 tarihinde 302.000 TL + KDV bedel ile imzalanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız diğer birimlerince satın alınıp tarafımıza idamesi için bildirilen internet sitelerinin Bakanlık alt yapısına alınması, her bir iş için 24.000 TL + KDV bedel ile sağlanması hususu sözleşme kapsamında yer almaktadır. İşe ait ödemeler üç dönem halinde yapılacaktır. Teknik şartnamede yer alan hususlara göre web sayfalarımızın bakım ve geliştirme işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. - İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Bakım ve Güncelleme İşi İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS) için sözleşme 01.03.2023 tarihinde imzalanmıştır. İlk hakediş ödemesi 163.680,00 TL yapılmıştır. Proje ödemeleri proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K01-205713	Bakanlık Uygulamaları Performans İzleme ve Yönetim (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	4.500.000		4.500.000	0	% 0,0	Ödenek 2023 yılında meydana gelen deprem afeti nedeniyle 2023 yılında kullanılmayacak olup 2024 yılına revizesi için yazı yazılmıştır.
2023K01-205725	MEBİS Projesi Bakım Onarımı İşi İdamesi (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2024	8.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 2023-2024 yıllarını kapsayan dönemde temin edilecek hizmet temini işinin ihalesi tamamlanmıştır. Sözleşme 13/06/2023 tarihinde imzalanmıştır. Proje ödeneği 2023 yılı sonuna kadar kullanılacaktır. Proje kapsamında yapılan işler için ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K01-205737	Yerel Yönetim Hizmetlerinin Yapay Zekâ Teknolojileri İle Ölçeklendirilmesi (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2023-2024	5.640.000		3.000.000	0	% 0,0	Ödenek 2023 yılında meydana gelen deprem afeti nedeniyle 2023 yılında kullanılmayacak olup 2024 yılına revizesi için yazı yazılmıştır.
2022K60-181334	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2023	4.000.000	2.000.000	2.000.000	446.040	% 22,3	TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile 4.200.000,00 TL + KDV bedel üzerinden 17.05.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda "Kent Bilgi Sistemi Altyapısı İdame, Ek Geliştirme ve Yaygınlaştırma İşi"nin Teknik şartnamenin "10. Hakedişler" maddesi kapsamında 2023 yılı içerisinde 1 hak ediş ödemesi yapılmış olup, ödemesi yapılacak olan 3 hak ediş vardır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2024	5.768.000		3.768.000	0	% 0,0	Ödenek 2023 yılında meydana gelen deprem afeti nedeniyle 2023 yılında kullanılmayacak olup 2024 yılına revizesi için yazı yazılmıştır.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K60-205399	Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	22.000.000		12.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Atlas Uygulamasının Bakım Hizmeti Alımı ve Ek Fonksiyon Geliştirilmesi İşi için 6.000.000,00 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K60-205413	TUCBS Çalışabilirlik, Uyumlaştırma ve Entegrasyon (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	7.500.000		3.000.000	108.560	% 3,6	6 Şubat' ta yaşanan deprem afeti nedeniyle 92.000,00 TL + KDV tutarında uzaktan görüntüleme işi temin edilmiştir. Proje kapsamında 2023-2024 yıllarını kapsayan dönemde Coğrafi Veri Üretim İşi için 8.500.000,00 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Lisans Bakım ve Güncelleme Hizmetleri için 10. ay içerisinde 1.290.000,00 TL + KDV tutarında ödeme yapılacaktır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K60-205704	Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	26.960.000		18.500.000	16.308.000	% 88,2	Proje kapsamında Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu Hizmet Temini işi ihale edilmiştir 17.07.2023 tarihinde 5.871.400 TL + KDV tutarında sözleşme imzalandı. Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu Projesi ve Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Sunucu Temini İşi için ihale tamamlanmıştır. Tip 1 Sunucu için 4.184.700 TL + KDV ve Tip 2 Sunucu için 1.100.516,80 TL + KDV tutarlarından en avantajlı teklifler alınmıştır sözleşme süreci devam etmektedir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K60-205743	Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi (**_Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	14.000.000		10.000.000	645.600	% 6,5	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme Projesi ve Merkezi Orta Katman Projesi Kapsamında Veri Depolama Ünitesi Temini işi için 11.05.2023 tarihinde 13.590.000 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Proje Kapsamından temin edilecek donanımlar için 4.500.000,00 TL + KDV ödemesi yapılacaktır. Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi kapsamında hizmet temini işi için ihale ilanı verildi. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2023K60-217018	TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, Güncelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	120.893.000		15.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yürütecek protokol için Kıbrıs Koordinasyon Merkezinde çalışmalar devam etmektedir. Proje takviminde ödemeleri gerçekleştirilecektir.
2022K09-181337	E-Plan Otomasyon Sistemi İdame ve Yenileme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	3.700.000	2.000.000	1.700.000	574.770	% 33,8	Proje kapsamında "e-Plan Otomasyon Sistemi Modernizasyonu İşi"nin yapılmasına yönelik TÜRKSAT ile 17.05.2022 tarihinde 2023 yılının sonuna kadar sözleşme yapılmıştır. Yazılım geliştirme süreçleri tamamlanmış olup projenin kullanıcı desteği, bakım ve ilave geliştirme süreçleri devam etmektedir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-187448	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.500.000	2.500.000	2.000.000	0	% 0,0	Proje Alt Projeleri Akıllı Şehir Coğrafi Veri Sözlüğü ve Akıllı Şehir Rehberliği İkinci Faz Uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
	Akıllı Şehir Coğrafi Veri Sözlüğü	2022-2023	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında; akıllı şehir veri sözlüğü ile hedef kullanıcı ve uygulama alanı bazında; kurumsal yapı, merkezi kurum ve/veya yerel yönetim düzeyinde karar destek sağlayacak veri sözlüğü oluşturulması amacıyla akıllı şehir kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerde yer alan varlıklara ilişkin Akıllı Şehir Veri Sözlüğü ve Veri Modeline ilişkin altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. 2023 yılında bu çalışmalar ilişkin raporlama ve dokümantasyon çalışmaları yapılarak yayınlanacaktır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
	Akıllı Şehir Rehberliği İkinci Faz Uygulamaları	2022-2023	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje 2023 yılında devam etmekte olup; Açık Veri Platformu kurulumu, önyüz tasarım ve veri seti yönetiminin sağlanması ve rehberlik kılavuzunun hazırlanarak Yerel Yönetimlerimizin kullanımına sunulmuştur. Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Pilot Uygulaması kapsamında Bir pilot ilde Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Belgesi hazırlanacaktır. Yerel Akıllı Şehir Mimarisi Pilot Uygulaması Kapsamında ülke genelinde yaygın kullanılan akıllı şehir uygulamalarının incelenmesi, bu uygulamaların yerel mimaride ne şekilde konumlandırılması gerektiği oluşturulmuş olan 4 gruba yönelik detaylı olarak raporlanacak ve çalışmaları tamamlanacaktır. Akıllı Şehir Uygulama Rehberlik Kılavuzları hazırlanarak kullanıcılara sunulacaktır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K08-183815	Atık Yönetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2022-2023	3.558.000	458.000	3.100.000	0	% 0,0	Ulusal Çevre Bilgi Sistemi ve Alt Uygulamalarının Geliştirilmesi (UÇBS) Projesi kapsamında 1. ve 2. hakedişler 2022 yılında yapılmıştır. 2023 yılında henüz hakediş işlemi yapılmamıştır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K10-181851	ÇED Süreci Yönetim Sistemi (e-ÇED) Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Çevre Sektörü)	2022-2023	5.000.000	1.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Ulusal Çevre Bilgi Sistemi ve Alt Uygulamalarının Geliştirilmesi (UÇBS) Projesi kapsamında 1. ve 2. hakedişler 2022 yılında yapılmıştır. 2023 yılında henüz hakediş işlemi yapılmamıştır. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
2022K10-183741	Çevre Denetim Uygulaması Yazılım Geliştirme (ÇED ile koordineli olarak yürütülüyor) (Çevre Sektörü)	2022-2023	2.586.000	500.000	2.086.000	0	% 0,0	Veri aktarım ve yayına alma çalışmaları devam etmektedir. Ödemeler proje takvimine uygun yapılacaktır.
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	224.141.000	18.134.000	75.154.000	18.897.532	% 25,1	
6 Proje		DÖNER SERMAYE	140.760.000	3.000.000	126.120.000	61.040.922	% 48,4	
		GENEL TOPLAM	364.901.000	21.134.000	201.274.000	79.938.454	% 39,7	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	62.669.000	24.807.000	6.426.000	3.564.555	% 55,5	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibariyle sona ermiştir. Geri kalan 3 bileşenin uygulaması devam etmektedir.
<i>AB katkısı</i>			355.117.000	105.914.000	36.412.000	20.199.143	% 55,5	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	5.794.175.300	3.445.044.000	1.535.764.300	492.408.883	% 32,1	Açıklamalar aşağıda verilmiştir.
	AB Hibesi		4.957.223.300	2.928.276.000	1.305.384.300	408.744.512	% 31,3	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		353.118.000	217.180.000	96.405.000	33.814.398	% 35,1	
	Mahalli İdare Katkısı		483.834.000	299.588.000	133.975.000	49.849.973	% 37,2	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	62.669.000	24.807.000	6.426.000	3.564.555	% 55,5	
	<i>AB KATKISI</i>		355.117.000	105.914.000	36.412.000	20.199.143	% 55,5	
	<i>İçmesuyu Sektörü Projesi</i>		5.794.175.300	3.445.044.000	1.535.764.300	492.408.883	% 32,1	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	Çarşamba Atıksu Tesisi	2019-2023	196.077.000	193.119.000	16.435.000	16.228.619	% 98,7	Projenin sonuna yaklaşmıştır.
	AB Hibesi		166.663.000	164.150.000	14.000.000	13.794.326		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		11.766.000	11.588.000	974.000	973.717		
	Mahalli İdare Katkısı		17.648.000	17.381.000	1.461.000	1.460.576		
Alt proje-2	Bandırma Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	378.701.000	242.597.000	131.872.000	60.770.416	% 46,1	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		321.894.000	206.207.000	112.090.000	51.654.853		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		22.723.000	14.556.000	7.913.000	3.646.225		
	Mahalli İdare Katkısı		34.084.000	21.834.000	11.869.000	5.469.337		
Alt proje-3	Bismil Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	196.502.000	192.287.000	26.642.000	26.639.140	% 100,0	Projenin sonuna yaklaşmıştır.
	AB Hibesi		167.025.000	163.443.000	22.644.000	22.643.269		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.265.000	12.980.000	1.799.000	1.798.142		
	Mahalli İdare Katkısı		16.212.000	15.864.000	2.199.000	2.197.729		
Alt proje-4	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	584.560.000	86.174.000	202.341.000	85.864.132	% 42,4	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		529.090.000	73.247.000	172.221.000	72.984.512		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		22.189.000	5.171.000	12.058.000	5.151.848		
	Mahalli İdare Katkısı		33.281.000	7.756.000	18.062.000	7.727.772		
Alt proje-5	Elbistan Atıksu Tesisi	2019-2024	358.684.000	349.355.000	32.803.000	31.788.063	% 96,9	Projenin sonuna yaklaşmıştır.
	AB Hibesi		304.880.000	296.951.000	28.000.000	27.021.333		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		24.212.000	23.582.000	2.150.000	2.144.072		
	Mahalli İdare Katkısı		29.592.000	28.822.000	2.653.000	2.622.659		
Alt proje-6	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2025	431.244.300	180.721.000	228.621.300	85.473.811	% 37,4	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		366.554.300	153.612.000	194.327.300	72.652.739		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		25.877.000	10.844.000	13.718.000	5.128.429		
	Mahalli İdare Katkısı		38.813.000	16.265.000	20.576.000	7.692.643		
Alt proje-7	İğdır Atıksu Tesisi	2019-2024	378.658.000	373.975.000	2.478.000	2.475.153	% 99,9	Projenin sonuna yaklaşmıştır.
	AB Hibesi		321.857.000	317.878.000	2.105.000	2.103.880		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		25.561.000	25.244.000	168.000	167.073		
	Mahalli İdare Katkısı		31.240.000	30.853.000	205.000	204.200		
Alt proje-8	Kastamonu Atıksu Tesisi	2019-2024	282.811.000	279.823.000	1.838.000	0	% 0,0	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		240.387.000	237.849.000	1.561.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		16.970.000	16.790.000	111.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		25.454.000	25.184.000	166.000	0		

Alt proje-9	Niksar Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	387.137.000	346.687.000	42.500.000	42.334.156	% 99,6	Projenin sonuna yaklaşılmıştır.
	AB Hibesi		329.063.000	294.683.000	36.000.000	35.984.033		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		23.230.000	20.802.000	2.600.000	2.540.049		
	Mahalli İdare Katkısı		34.844.000	31.202.000	3.900.000	3.810.074		
Alt proje-10	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	396.088.000	167.351.000	218.864.000	61.591.632	% 28,1	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		336.673.000	142.248.000	186.034.000	52.352.887		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		23.766.000	10.041.000	13.132.000	3.695.498		
	Mahalli İdare Katkısı		35.649.000	15.062.000	19.698.000	5.543.247		
Alt proje-11	Sivas Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	203.161.000	198.733.000	24.700.000	24.417.446	% 98,9	Projenin sonuna yaklaşılmıştır.
	AB Hibesi		172.686.000	168.923.000	21.000.000	20.754.829		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.190.000	11.924.000	1.500.000	1.465.047		
	Mahalli İdare Katkısı		18.285.000	17.886.000	2.200.000	2.197.570		
Alt proje-12	Sorgun Atıksu Tesisi	2019-2023	145.875.000	135.926.000	25.900.000	25.790.522	% 99,6	Projenin sonuna yaklaşılmıştır.
	AB Hibesi		123.992.000	115.536.000	22.000.000	21.996.441		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		8.753.000	8.156.000	1.500.000	1.465.047		
	Mahalli İdare Katkısı		13.130.000	12.234.000	2.400.000	2.329.035		
Alt proje-13	Şırnak Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	186.250.000	174.000.000	12.250.000	10.508.125	% 85,8	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		158.312.000	147.900.000	10.412.000	8.931.906		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.572.000	11.745.000	827.000	709.299		
	Mahalli İdare Katkısı		15.366.000	14.355.000	1.011.000	866.920		
Alt proje-14	Trabzon Su Tesisi	2019-2025	344.290.000	217.829.000	109.641.000	39.921.078	% 36,4	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		292.643.000	185.154.000	93.194.000	33.932.916		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		20.659.000	13.070.000	6.579.000	2.395.265		
	Mahalli İdare Katkısı		30.988.000	19.605.000	9.868.000	3.592.897		
Alt proje-15	Yüksekova Atıksu Tesisi	2019-2024	193.672.000	185.312.000	30.500.000	29.456.794	% 96,6	Projenin sonuna yaklaşılmıştır.
	AB Hibesi		164.618.000	157.514.000	26.000.000	25.038.275		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		13.074.000	12.509.000	2.000.000	1.988.333		
	Mahalli İdare Katkısı		15.980.000	15.289.000	2.500.000	2.430.186		
Alt proje-16	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2025	298.755.000	5.230.000	155.934.000	6.683.009	% 4,3	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		253.939.000	4.445.000	132.115.000	5.723.484		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		20.167.000	353.000	10.777.000	404.011		
	Mahalli İdare Katkısı		24.649.000	432.000	13.042.000	555.515		
Alt proje-17	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2025	266.313.000	115.925.000	139.203.000	45.724.521	% 32,8	Devam etmektedir.
	AB Hibesi		226.362.000	98.536.000	118.321.000	38.865.843		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.978.000	7.825.000	9.397.000	3.086.405		
	Mahalli İdare Katkısı		21.973.000	9.564.000	11.485.000	3.772.273		
Alt proje-18	Aksaray Entegre Su Projesi	2021-2025	565.397.000	0	133.242.000	0	% 0,0	Henüz uygulamaya başlamamıştır.
	AB Hibesi		480.585.000	0	113.360.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		38.166.000	0	9.202.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		46.646.000	0	10.680.000	0		

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023F00-198507	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2023-2023	6.150.000		6.150.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2023-2023	6.150.000		6.150.000	0	% 0,0	Bu proje kapsamında Datça Kamusal Mekan ve Meydan Düzenlemesi ile Körfez Çevre Düzeni Planı (Millet Bahçesi) projelerinin sözleşmeleri imzalanmış olup tasarım çalışmaları devam etmektedir. Gümüşhane Arzular Rekreasyon Alanı ve Acıgöl Maar Gölü Karşılama Merkezi Projelerinin ihale süreçleri devam etmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2024	35.600.000	13.500.000	12.100.000	9.917.337	% 82,0	Projenin 2023 yılı ödeneği olan 12.100.000 TL (KDV Dahil) ödeneğin, 9.917.336,61 TL'si harcanarak "Dalyan (Muğla/Ortaca) Kanalı Tekne Bağlama İskelesi Yapım İşİ"nin birinci kısmı tamamlanmıştır. "Dalyan (Muğla/Ortaca) Kanalı Tekne Bağlama İskelesi 2. Etap Yapım İşİ"nin ihale çalışmaları devam etmektedir.
2023F00-198819	Marmara Adası Yürüyüş Yolları (Turizm Sektörü)	2023-2023	20.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Balikesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 25/04/2023 tarihinde mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2023	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokolü hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2023F00-198897	Sarsala Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2023-2025	29.000.000		5.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokolü hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (*Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2025	163.178.000	22.658.000	40.000.000	0	% 0,0	"Eskil (Aksaray) Belediyesi Tatarlı ve Tol Yaylaları İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemi Teşkil Edilmesi İşi" kapsamında Eskil Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 5.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup iş devam etmektedir.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2025	96.647.000	11.647.000	25.000.000	0	% 0,0	"Aksaray İli, Eskil İlçesi Başaran, Bayramdügün, Böget, Celil, Güneşli, Katrançı, Sağsak, Filikçi, Çukuryurt, Kökez ve Gümüşdügün Köylerinde Mevcut İçmesuyu Güneş Enerjili Motopomp Sistemlerinin Kapasite Artırımı İşi" kapsamında Eskil (Aksaray) Kaymakamlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 3.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup iş devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2025	66.531.000	11.011.000	15.000.000	0	% 0,0	"Arzularkabaköy (Gümüşhane) Belediyesi İçmesuyu Temini İşi" kapsamında Arzularkabaköy Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 3.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup iş devam etmektedir.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (*Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2026	65.996.000	6.764.000	27.000.000	0	% 0,0	"Altınova (Yalova) Hersek Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapım İşi" kapsamında Altınova Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 10.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup iş devam etmektedir.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2025	37.764.000	6.764.000	15.000.000	0	% 0,0	"Cihanbeyli (Konya) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı 1.Etap Yapım İşi" Cihanbeyli Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 7.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup işin ihale süreci devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2026	28.232.000		12.000.000	0	% 0,0	"Ula (Muğla) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı Mal Alım İşi" Ula Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 2.500.000,00 TL (KDV Dahil) bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup işin ihale süreci devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	30.301.000	16.001.000	7.150.000	446.040	% 6,2	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2024	7.600.000	3.600.000	2.000.000	0	% 0,0	Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı Projesi hizmet alım ihalesi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2024	12.800.000	8.000.000	2.400.000	354.000	% 14,8	1-Datça-Bozburun Öçkb, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları Ve Kentsel Tasarım Rehberi İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 2-Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 3-İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Araştırma, Analiz, Değerlendirme, Sentez Raporu Hazırlanması İşi (İş Devam Ediyor) 4-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı ÖÇKB, Balıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri "Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin" 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 5-Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi Sit Alanlarında İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (Ödeme Evrakları Gönderildi) 6-Yalova İli Termal İlçesi Turizm Tesis Alanında Bulunan Tarihi Sit Alanında İmar Planına Esas İlave Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (Ödeme Aşamasında) 7-Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yalıncağ-Karakusunlar Mahallesi Adalet Akademisi İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (Sözleşme İmzalandı İş Başlatıldı) 8-İhlara ÖÇKB, 2. Etap 1/25.000 Ölçekli Nip Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt İşi (Sözleşme İmzalandı İş Başlatıldı) 9-Kocaeli İli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi Sit Alanlarında İmar Planı İşi (İş devam ediyor)
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2024	2.901.000	1.401.000	750.000	92.040	% 12,3	1-Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Selime Belediyesi, Selime 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Revizyonu Ve Plan Açıklama Raporunun Hazırlanması İşi (Ödeme evrakları Gönderildi)
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2024	7.000.000	3.000.000	2.000.000	0	% 0,0	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	2021-2024	18.589.000	5.900.000	7.733.000	0	% 0,0	
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	2.800.000	1.800.000	1.000.000	0	% 0,0	1. Etap projesi tamamlanmış olup 2. Etap projesi ihale aşamasındadır.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Sürüngenlerin Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması, İzlenmesi	2021-2023	1.289.000	1.056.000	233.000	0	% 0,0	2021-2022 yılları arasında 722.334 TL ödeme yapılarak Teknik Şartnameye göre projenin %78.6'sı tamamlanmıştır. 2023 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2024	14.500.000	3.044.000	6.500.000	0	% 0,0	Projenin Fizibilite ve Uygulama projeleri tamamlanmış olup, Uygulama faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2023	924.000	654.000	270.000	0	% 0,0	Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Araştırma Projesi'nin %100 tamamlanmıştır.394.400,00 .-+KDV Sözleşme Bedelli Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Otlatma Yönetimi projesinin %50'si gerçekleştirilmiştir.2023 yılı içinde kesin raporu idareye teslim edilerek işin kalan %50'si tamamlanacaktır.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.500.000	995.000	505.000	202.325	% 40,1	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	580.000	513.000	67.000	0	% 0,0	Proje 2022 yılında tamamlandı. 2023 ödenek fazlası var.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2023	50.000	40.000	10.000	0	% 0,0	Proje gerçekleştirilmedi. Ödenek fazlası.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2022-2023	870.000	442.000	428.000	202.325	% 47,3	Sözleşme bedelinin % 25'lik ödeme dilimi tutarı olan 168.604,50 TL si 01.01.2023-30.09.2023 tarihleri içerisinde ödenmiştir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183742	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2022-2023	5.760.000	325.000	5.435.000	4.960.000	% 91,3	
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2023	5.760.000	325.000	5.435.000	4.960.000	% 91,3	
	<i>Genel Bütçe Ödeneği</i>		800.000	325.000	475.000	0	% 0,0	"Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi 2022-2023" kapsamında, 2023 yılında 185.839,06 TL ödeme yapılarak, Teknik Şartnameye göre projenin %41'tamamlanmıştır. 2023 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
	<i>Döner Sermaye Ödeneği</i>		4.960.000		4.960.000	4.960.000	% 100,0	"Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi'nde Flamingoların ve Yaşam Alanlarının Korunması İçin Su Temini Yapım İş'i" tamamlanmış olup proje bedeli, Cihanbeyli (Konya) Belediye Başkanlığına aktarılmıştır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2024	6.708.000	2.343.000	2.365.000	113.280	% 4,8	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2024	5.978.000	1.978.000	2.000.000	113.280	% 5,7	"Erzincan ili, Kemaliye ilçesi, Kemaliye ve Çevresi Potansiyel Doğal Sit Alanının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında hazırlanan Sonuç Raporu teslim edilmiş olup 18.05.2023 tarihli ve E-20054479-250[250]-6460491 sayılı yazı ile 2. Hakediş ödemesi (96.000,00+KDV) yapılmıştır. "Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Erzurum, Bingöl, Bayburt, Iğdır, Siirt, Sinop, Amasya İllerinde Bulunan Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 24.05.2023 tarihinde Online Çevre Proje İnşaat Mühendislik Danışmanlık Yazılım Bilişim ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 1.374.000,00 TL+KDV'dir.
	Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2022-2023	730.000	365.000	365.000	0	% 0,0	
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	5.207.000	3.442.000	1.515.000	0	% 0,0	
	Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2023	3.850.000	2.792.000	1.058.000	0	% 0,0	Karaburun -Ildır ÖÇK Bölgesi Karasal Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi Sonuç Toplantısı yapılmış ve iş tamamlanmıştır.2.800.000.- +Kdv Sözleşme bedelli Denizel Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi Sonuç Toplantısı yapılmış ve Final Raporu idareye teslim edilmiştir.İşin %64 bedeli ödenmiş olup; kalan %36 kısım 2023 yılı içinde ödenecektir.işin %100'ü tamamlanacaktır.
	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2021-2023	450.000	315.000	135.000	0	% 0,0	Foça ÖÇK Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi Sonuç Toplantısı yapılmış ve Final Raporu idareye teslim edilmiştir.İşin %100 tamalanmıştır.İşe ait ödemenin %70 tamamlanmıştır.%30 kalan ödemesi 2023 yılı içinde yapılacaktır.
	İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2022-2024	907.000	335.000	322.000	0	% 0,0	İhlara ÖÇK Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi işinin %70'i gerçekleşmiştir.İşin 2024 yılında kalan %30 kısmı tamamlanacaktır.
2016K10-150495	İklim Değişikliğinin Ekosisteme Etkisi Araştırması (Çevre Sektörü)	2021-2024	3.500.000	1.050.000	1.225.000	575.840	% 47,0	Sözleşme tutarı 2.440.000.00 TL (+KDV) olan projenin 3.hakedişi olan % 20'lik ödeme dilimi tutarı 492.157.76 TL'si 2023 yılı ilk dokuz ayı içerisinde ödenmiştir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	11.000.000	0	8.500.000	3.811.324	% 44,8	2022K10-188090 proje nolu Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (Kara-Kıyı ve Denizel Alanda) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında Ön rapor ve 1. Ara Rapor olmak üzere 2 adet hakediş düzenlenmiştir. Projenin arazi çalışmaları devam etmekte olup projenin 2025 yılının başında bitmesi öngörülmektedir.
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2026	1.500.000.000	150.000.000	412.952.000	204.697.686	% 49,6	
	Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)		500.000.000	0	125.000.000	125.000.000	% 0,0	2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihalesi yapılarak işe başlanmıştır. Bakanlığımız 2022 yılı Döner Sermaye Ödeneği olan KDV Dahil 100.000.000,00 TL Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına 2022 yılı sonu itibarı ile gönderilmiştir. 2023 yılı Bakanlığımız Genel Bütçe ve Döner Sermaye Ödeneğinden toplam 204.697.686,03 TL tutar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına aktarılmıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		500.000.000	100.000.000	187.952.000	79.697.686	% 42,4	
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı		500.000.000	50.000.000	100.000.000	0	% 0,0	
2023K10-199539	Mağaraların Araştırılması Projesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	3.593.000		3.593.000	1.104.120	% 30,7	Karasal Mağaraların Araştırılması Projesi 1. Hakediş yapıldı. 459.000,00 TL.) 2. Hakediş yapıldı. 459.000,00 TL.) Ödemesi 10. Ayda yapılacak. Denizel Mağaraların Araştırılması Projesi 1. Hakediş yapıldı. (645.120,00 TL)
2023K10-199541	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	16.000.000		16.000.000	0	% 0,0	İstanbul ve Kocaeli İlleri Anıt Ağaç Rehabilitasyonu 1. Hakediş yapıldı. (8.669.859,00 TL.) Ödemesi 10. Ayda yapılacak.
2023K10-199553	Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	30.000.000		30.000.000	0	% 0,0	Burdur İl Özel İdaresi ile Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) arasında 16/06/202 tarihinde mali katkı protokolü imzalanan "Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi" işinin sözleşmesi 21/09/2023 tarihinde imzalanmış olup iş devam etmektedir.
2023K10-210241	Barma Yaylası Turbalık Alanı Koruma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2023-2023	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	Mali katkı protokolü hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2023-2025			2.000.000	37.094	% 1,9	
14 Proje		06 ve 07 TOPLAM	673.279.000	44.210.000	204.488.000	136.254.822	% 66,6	
9 Proje		DÖNER SERMAYE	798.727.000	129.422.000	322.005.000	89.573.130	% 27,8	
		GENEL TOPLAM	1.472.006.000	173.632.000	526.493.000	225.827.952	% 42,9	
1 Proje		Belediye Katkısı	500.000.000	50.000.000	100.000.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	2.000.000	37.094	% 1,9	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2025	6.600.000	5.100.000	500.000	0	% 0,0	YERELBİLGİ sistemi 1391 Belediye, 187 mahalli idare birliği, 33 belediye bağlı idaresinin istatistik her türlü verisini toplamaya yarayan ve bunu anlık olarak raporlayabilen bir sistemdir. Sistem kullanımının tanıtılması ve farkındalığın artırılması için 2021 yılında 13 bölgede bütün yerel yönetim temsilcileri ile 81 İl Müdürlüğü yerel yönetimler şube müdürlerine gerekli eğitimler verilmiştir. 2022/1 sayılı Bakanlık Genelgesi ile YERELBİLGİ sistemi bütün yerel yönetimlerimiz kullanıma açılmış olup aktif olarak kullanılmaktadır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	13.000.000	4.000.000	2.500.000	0	% 0,0	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzde planlanan projeler bulunmakta idi. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisi Belgesinin Hazırlanması, Belediyelerin Dış İlişkiler Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alanın Belirlenmesi, Bu Yerlere Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Rehber İle Politika Önerileri projeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak 2023 yılında yaşanan deprem felaketinden kaynaklı projelerimize başlanamamış 2024 yılına kalmış olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2023K07-195171	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2023-2023	3.800.000.000		3.800.000.000	1.448.516.850	% 38,1	KÖYDES Projesinin yarısı olan 1.9 milyar TL ödenek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 07.04.2023 tarihinde İLBANK KÖYDES hesaplarına aktarılmıştır. Geriye kalan 1.9 milyar TL ödenegine ise aktarımı beklenmektedir. Proje kapsamında iş ve işlemler devam etmekte olup hakediş ödemeleri için ödenek aktarımı beklenmektedir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.819.600.000	9.100.000	3.000.000	0	% 0,0	

Dipnot: 637

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K01-198846	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2023-2023	6.200.000		6.200.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2023-2023	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2023-2023	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2023-2023	5.900.000		5.900.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2023-2025			200.000.000	193.639.453	% 96,8	
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2023-2025			4.000.000	2.191	% 0,1	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	6.200.000	0	6.200.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	204.000.000	193.641.644	% 94,9	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020A05-168456	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormanlık Sektörü)	2020-2024	44.930.000	10.830.000	16.900.000	8.979.575	% 53,1	Ana proje olup detay bilgileri alt projelerde verilmiştir.
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2020-2024	43.500.000	10.500.000	16.150.000	8.979.575	% 55,6	İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgar Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya-Karapınar Örneği İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Adakale Karbon Yutak Alan Uygulama Projesi: Konya- Çumra Örneği Yalova Üniversitesi Kampüsü Yeni Karbon Yutak Alanları Oluşturma Projesi Kurak ve/veya Yarı Kurak Alanların Restorasyonunda Farklı Su Hasadı Tekniklerinin Etkinliğinin Belirlenmesi Projesi: Ankara Örneği Kahramanmaraş İli Afşin ilçesinde 1 adet Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi 2 adet Çığ Kontrol Projesi 3 adet Kaya Düşmesi Kontrol Projesi 6 adet Sel ve Erozyon Kontrol Projesi 2 adet Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projesi Giresun Bektaş Yaylası Turizm Merkezi Çığ Tehlike Değerlendirme Projesi Gediz Havzası Kemalpaşa Alt Havzası Toprak Profil Yerlerinin Tespiti ve Sınıflandırılması Projesi Aksaray İli Gülağaç İlçesi Demirci Beldesi Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi JGK'nın talep ettiği öncelikli belirlenen yerlerden 21 ile ait 649 pafta çalışılmış olup 353 paftada potansiyel Çığ Başlama Bölgeleri tespit edilmiştir. İlgili paftalar Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmiştir.
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2020-2024	780.000	180.000	400.000	0	% 0,0	ÇMUSEP (Çölleşme ile Mücadele Strateji ve Eylem Planı) güncelleme çalışmalarına ilişkin hizmet alımı ve çalıştay işleri için teknik şartnameler tamamlanmış olup işin başlamasına yönelik olur süreci devam etmektedir.
	Çölleşme ve Kuraklığa Dirençli Şehirler	2022-2024	650.000	150.000	350.000	0	% 0,0	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile projenin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilemeyeceği belirtilmiş olup 2024 yılı bütçesinde projeye ait kaleme yer verilmemiştir. Projenin devam edemeyeceği anlaşıldığından 2023 yılı ödeneği kullanılmamıştır.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormanlık Sektörü)	2023-2025	8.400.000		2.850.000	270.000	% 9,5	Ana proje olup detay bilgileri alt projelerde verilmiştir.
	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2025	4.500.000		1.500.000	0	% 0,0	UASİS yazılımı ile üretilmiş olan taslak arazi örtüsü haritasının etiketlenmesi ve düzenlenmesi işi kapsamında hizmet alımı ihalesi süreci tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2025	1.650.000		550.000	270.000	% 49,1	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi WEB Tabanlı Yazılım Güncellemesi (Veri aktarımı, yeni sorgulamaların eklenmesi, sonuç gösterimlerinin düzenlenmesi vb.) konusunda hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. "Oyuntu Erozyonuna Duyarlı Alanların Belirlenmesi Projesi" kapsamında alt parametrelerden olan Toprak erozyonu duyarlılığı (K Faktör) ve Litoloji faktörünün sınıflandırma çalışmaları konusunda hizmet alımı yapılmıştır.
	Toprak Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2023-2025	1.650.000		550.000	0	% 0,0	
	Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası	2023-2025	600.000		250.000	0	% 0,0	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile, Çölleşme Hassasiyet Haritasının ham verileri paylaşılmış olup verilerin incelenmesi ve analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir. Akabinde veri bazında mevcut durum analizi yapıp, güncel verilerin eklenerek model oluşturulması ve model değerlendirmeleri yapılacaktır. Model değerlendirmeleri ve modele girdi sağlayacak/sağlayabilecek verilerin neler olabileceği hususunda, katsayı ve ağırlıkların yeniden değerlendirilmesi ve alternatif modellerin değerlendirilmesi hususunda katkı sağlayabilecek danışman araştırılması yapılmaktadır. Oluşturulacak model sonucunda çölleşme hassasiyet haritası güncellenecek ve tehlike ve risk haritalarına geçiş için altlık oluşturulacaktır. 2023-2024 yıllarında güncellenmesi tamamlanacak TÇM ve Hassasiyet Haritasından, 2024 yılı itibari ile tehlike ve risk haritalarının üretilmesi çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
2023A05-196786	Bolaman ve Çekerek Nehri Havzaları Rehabilitasyonu (Ormanlık Sektörü)	2023-2028	10.000.000		1.250.000	1.109.484	% 88,8	Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde 1 adet Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi Kayseri ili Erciyes İlçesinde 1 adet Entegre Sel ve Erozyon Kontrol Projesi
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	63.330.000	10.830.000	21.000.000	10.359.059	% 49,3	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2023	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2023K09-198533	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2023-2023	4.900.000		4.900.000	4.724.427	% 96,4	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2023-2023	4.900.000		4.900.000	4.122.174	% 84,1	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2022K09-207663	Şanlıurfa İl Müdürlüğü GES Kurulumu (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2022-2023	4.800.000	0	4.800.000	3.734.831	% 77,8	İl Müdürlüğüne ihale talimatı gönderilmiştir.
2023G00-195180	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2023-2023	2.200.000		2.200.000	1.592.804	% 72,4	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	12.000.000	0	12.000.000	10.439.405	% 87,0	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	6.300.000	500.000	5.800.000	3.734.831	% 64,4	
		GENEL TOPLAM	18.300.000	500.000	17.800.000	14.174.236	% 79,6	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2023 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2022 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2023 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2023 30.09.2023 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023G00-195180	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2023-2023	100.000		100.000	0	% 0,0	
2023K09-198533	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2023-2023	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2023-2023	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2023-2023	1.705.000		1.705.000	1.705.000	% 100,0	1 adet T04 tipi taşıt alımı (TOGG) yapılmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	300.000	0	300.000	0	% 0,0	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	1.705.000	0	1.705.000	1.705.000	% 100,0	
		GENEL TOPLAM	2.005.000	0	2.005.000	1.705.000	% 85,0	
