



2024 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

2. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2024 İtibarıyla HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.510.094.000,00	12.281.831.710,94	5.703.671.930,85	% 46,4
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.503.685.000,00	1.710.344.193,12	756.861.389,73	% 44,3
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	725.012.000,00	1.730.353.730,88	465.125.954,19	% 26,9
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.268.000,00	1.630.080.574,48	442.489.740,04	% 27,1
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	104.744.000,00	100.273.156,40	22.636.214,15	% 22,6
05	CARİ TRANSFERLER	224.845.034.000,00	224.832.897.402,72	41.742.944.590,24	% 18,6
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	219.740.028.000,00	219.740.028.000,00	39.408.326.000,00	% 17,9
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	1.771.000.000,00	1.771.000.000,00	0,00	% 0,0
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.038.684.000,00	% 74,1
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	356.000.000,00	342.908.000,00	162.024.000,00	% 47,2
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	179.193.000,00	179.193.000,00	111.548.550,77	% 62,3
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	46.631.000,00	47.000.402,72	21.402.039,47	% 45,5
	İskan Uygulamaları Ödeneği	1.818.000,00	1.818.000,00	10.000,00	% 0,6
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	364.000,00	950.000,00	950.000,00	% 100,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.624.871.000,00	64.603.510.682,40	44.375.761.683,35	% 68,7
	Bakanlık Yatırım Programı	14.337.871.000,00	14.413.811.747,10	3.275.831.916,71	% 22,7
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	287.000.000,00	287.000.000,00	238.999.372,49	% 83,3
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	45.745.000.000,00	37.777.494.722,14	% 82,6
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	338.000.000,00	157.067.031,36	% 46,5
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	3.819.698.935,30	2.926.368.640,65	% 76,6
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	18.282.187.000,00	18.756.930.304,50	10.654.608.913,46	% 56,8
	Bakanlık Yatırım Programı	428.271.000,00	353.901.000,00	68.212.563,07	% 19,3
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	10.000.000.000,00	% 62,5
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	33.693.638,73	% 2,3
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	13.304,50	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	300.000.000,00	300.000.000,00	3.602.712,00	% 1,2
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	113.916.000,00	113.916.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-İPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	67.100.000,00	67.099.999,66	% 100,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	482.000.000,00	482.000.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	250.500.000,00	225.451.400,00	28.830.000,00	% 12,8
GENEL TOPLAM		271.741.383.000,00	324.141.319.424,56	103.727.804.461,82	% 32,0



BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

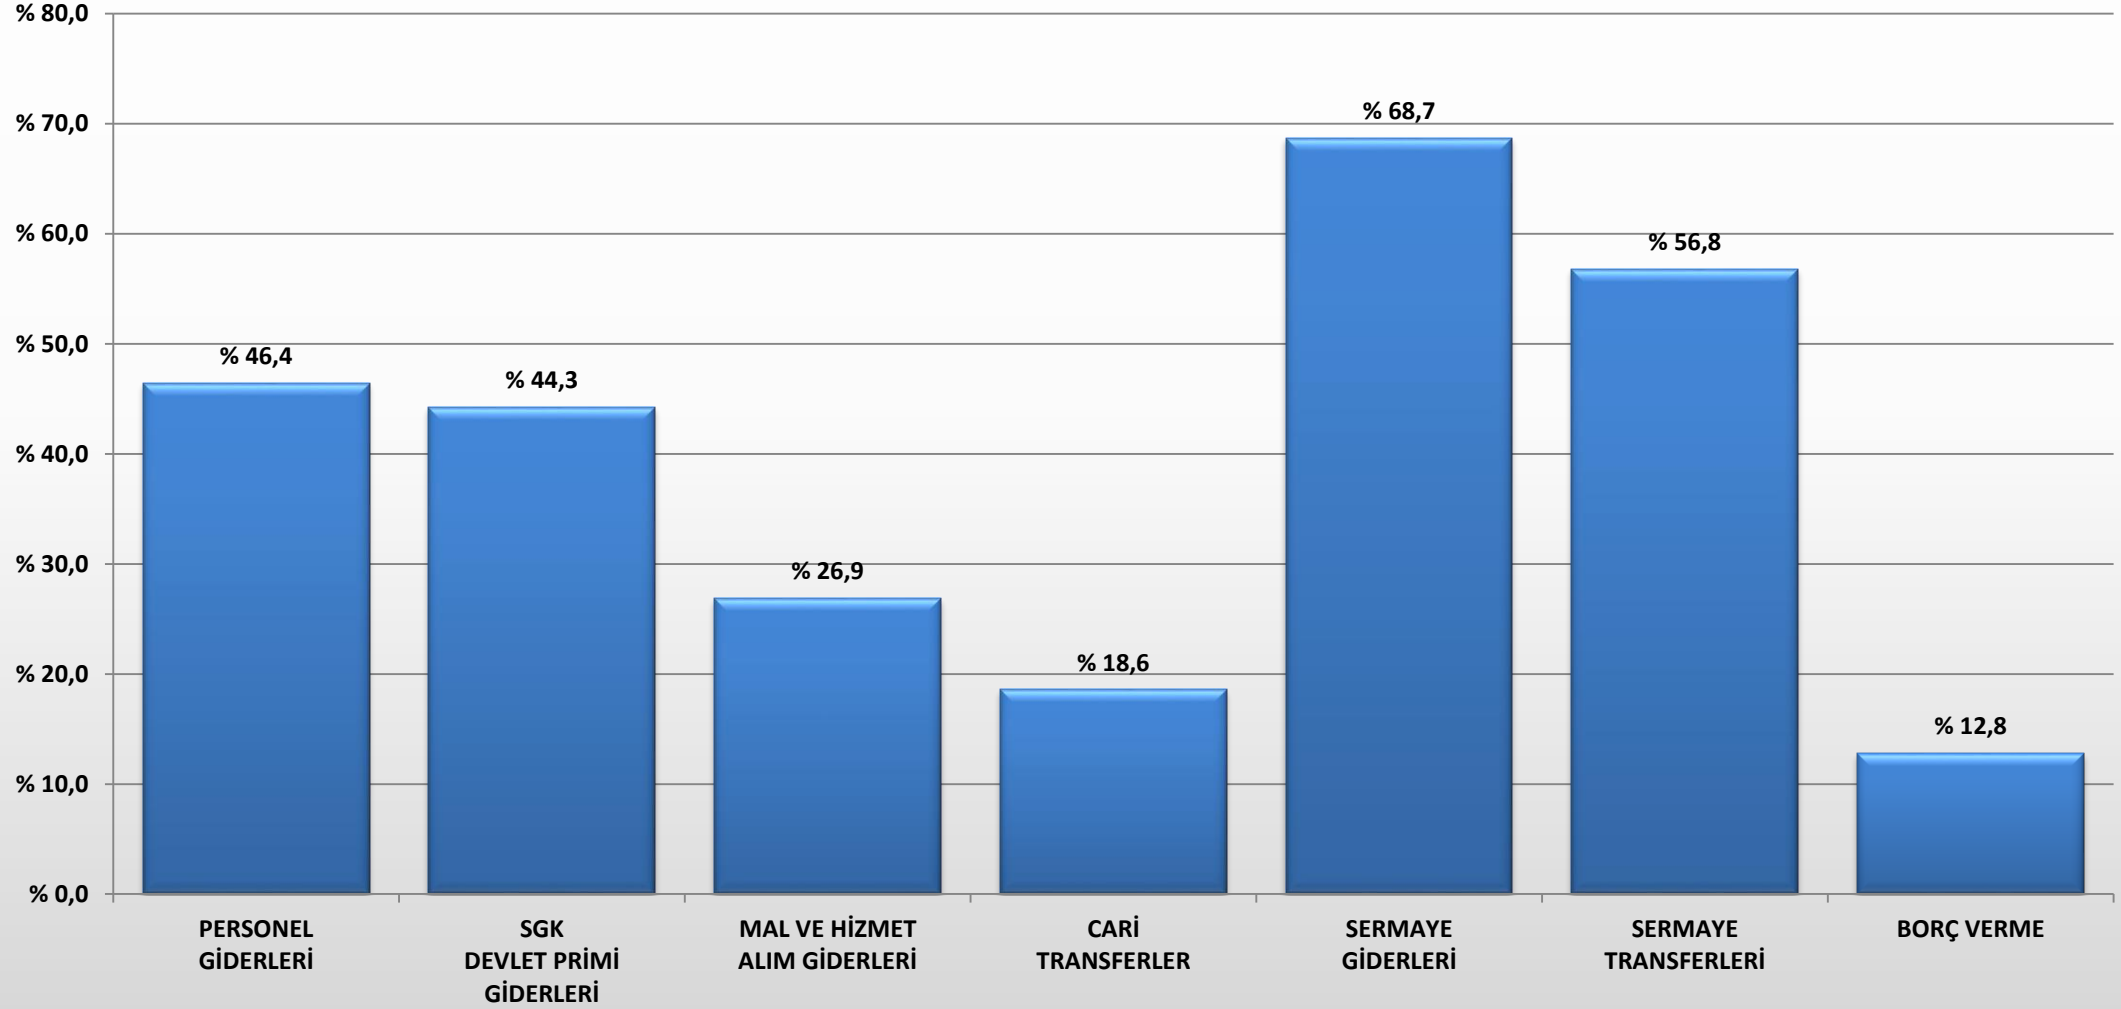




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2024 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2024 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	5	57.846.000,00	33.028.000,00	1.583.990,00	% 4,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	13	1.213.940.000,00	196.999.500,00	18.240.373,45	% 9,3
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	3	620.160.000,00	237.790.000,00	11.046.769,00	% 4,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	24	51.806.236.000,00	14.134.791.400,00	3.270.076.431,65	% 23,1
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	7.250.000,00	5.675.000,00	900.425,48	% 15,9
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	19	704.090.000,00	440.000.000,00	47.103.845,60	% 10,7
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	9.183.080.000,00	8.203.000,00	866.410,00	% 10,6
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	27	3.223.440.500,00	519.509.100,00	79.765.568,14	% 15,4
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	5.027.899.000,00	4.950.000,00	0,00	% 0,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	26.370.000,00	26.370.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	4	153.630.000,00	34.745.000,00	1.103.080,00	% 3,2
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	227.164.000,00	172.752.000,00	12.273.452,29	% 7,1
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	3	150.090.000,00	80.090.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	107	72.401.195.500,00	15.894.903.000,00	3.442.960.345,61	% 21,7
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	76	69.719.307.500,00	14.828.906.000,00	3.349.683.454,09	% 22,6
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	31	2.681.888.000,00	1.065.997.000,00	93.276.891,52	% 8,8
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		287.000.000,00	238.999.372,49	% 83,3



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

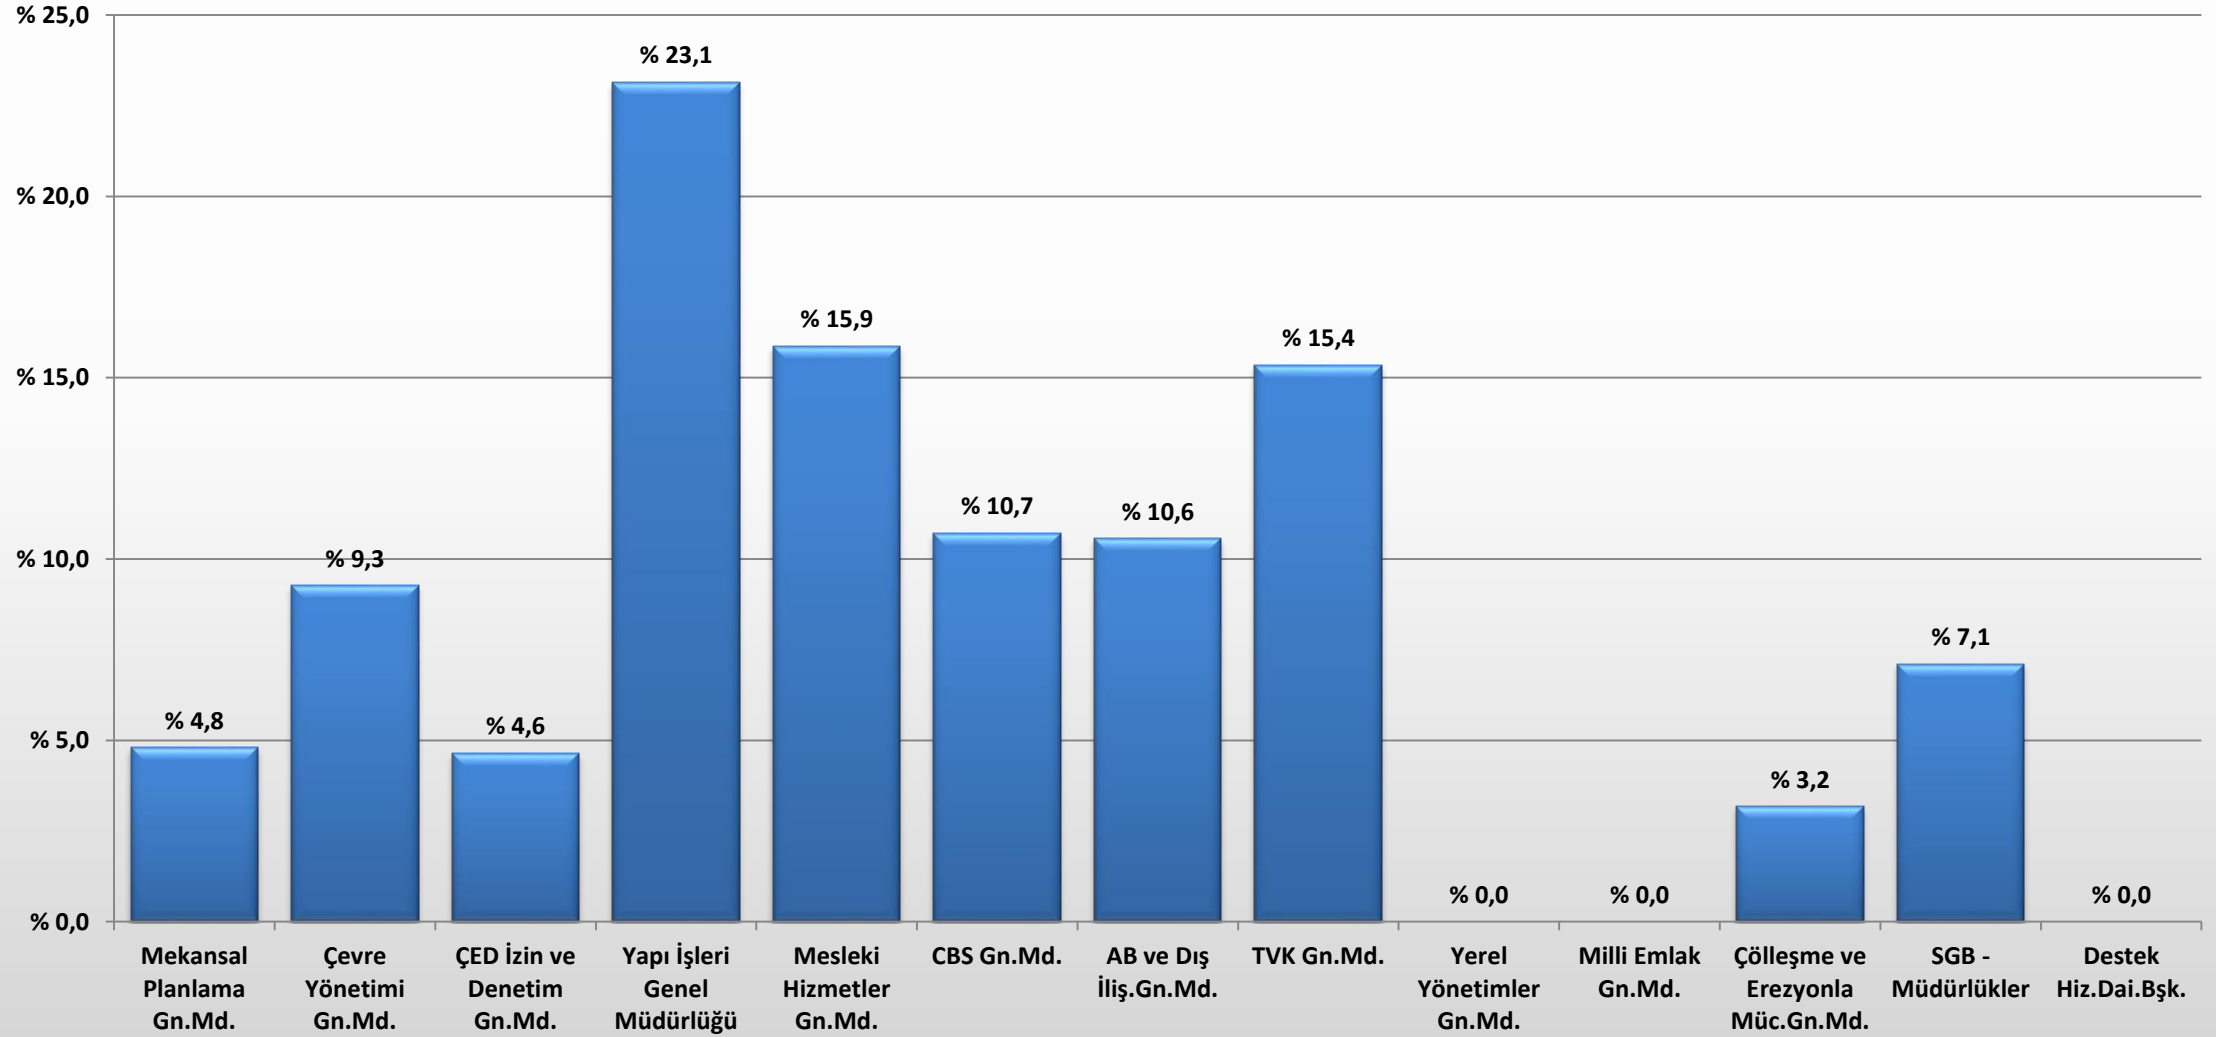



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 REVİZE ÖDENEĞİ	30.06.2024 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	196.686.000,00	193.294.000,00	83.186.196,38	% 43,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	6.767.900.000,00	6.748.738.170,90	2.180.282.047,62	% 32,3
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	616.707.000,00	597.341.835,29	201.808.861,28	% 33,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	14.615.447.000,00	62.833.016.715,41	43.547.180.942,17	% 69,3
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	270.000,00	5.814.000,00	5.683.657,40	% 97,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	160.201.000,00	160.126.000,00	75.056.845,33	% 46,9
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	334.306.000,00	317.806.000,00	81.709.279,07	% 25,7
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	275.611.000,00	342.916.000,00	220.518.670,61	% 64,3
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	498.614.000,00	446.068.977,40	140.908.155,33	% 31,6
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	64.031.000,00	63.481.000,00	28.526.782,85	% 44,9
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	466.763.000,00	474.133.000,00	315.480.871,07	% 66,5
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	135.579.000,00	132.824.000,00	54.759.761,01	% 41,2
Personel Genel Müdürlüğü	66.350.000,00	66.350.000,00	34.453.097,76	% 51,9
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	84.872.000,00	1.005.872.000,00	391.436.494,10	% 38,9
Özel Kalem Müdürlüğü	94.510.000,00	93.821.000,00	31.198.708,78	% 33,3
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	616.808.000,00	941.130.086,82	249.792.545,35	% 26,5
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	20.552.000,00	20.552.000,00	9.287.810,44	% 45,2
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	119.018.000,00	119.053.000,00	56.888.136,14	% 47,8
Strateji Geliştirme Başkanlığı	236.148.917.000,00	236.136.411.000,00	49.598.581.119,29	% 21,0
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	8.776.000,00	8.776.000,00	5.248.297,94	% 59,8
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	54.199.000,00	54.199.000,00	25.743.172,82	% 47,5
İl Müdürlükleri	10.360.652.000,00	13.345.186.638,74	6.372.316.230,28	% 47,7
Yurtdışı Teşkilatı	34.614.000,00	34.409.000,00	17.756.778,80	% 51,6
TOPLAM	271.741.383.000,00	324.141.319.424,56	103.727.804.461,82	% 32,0



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

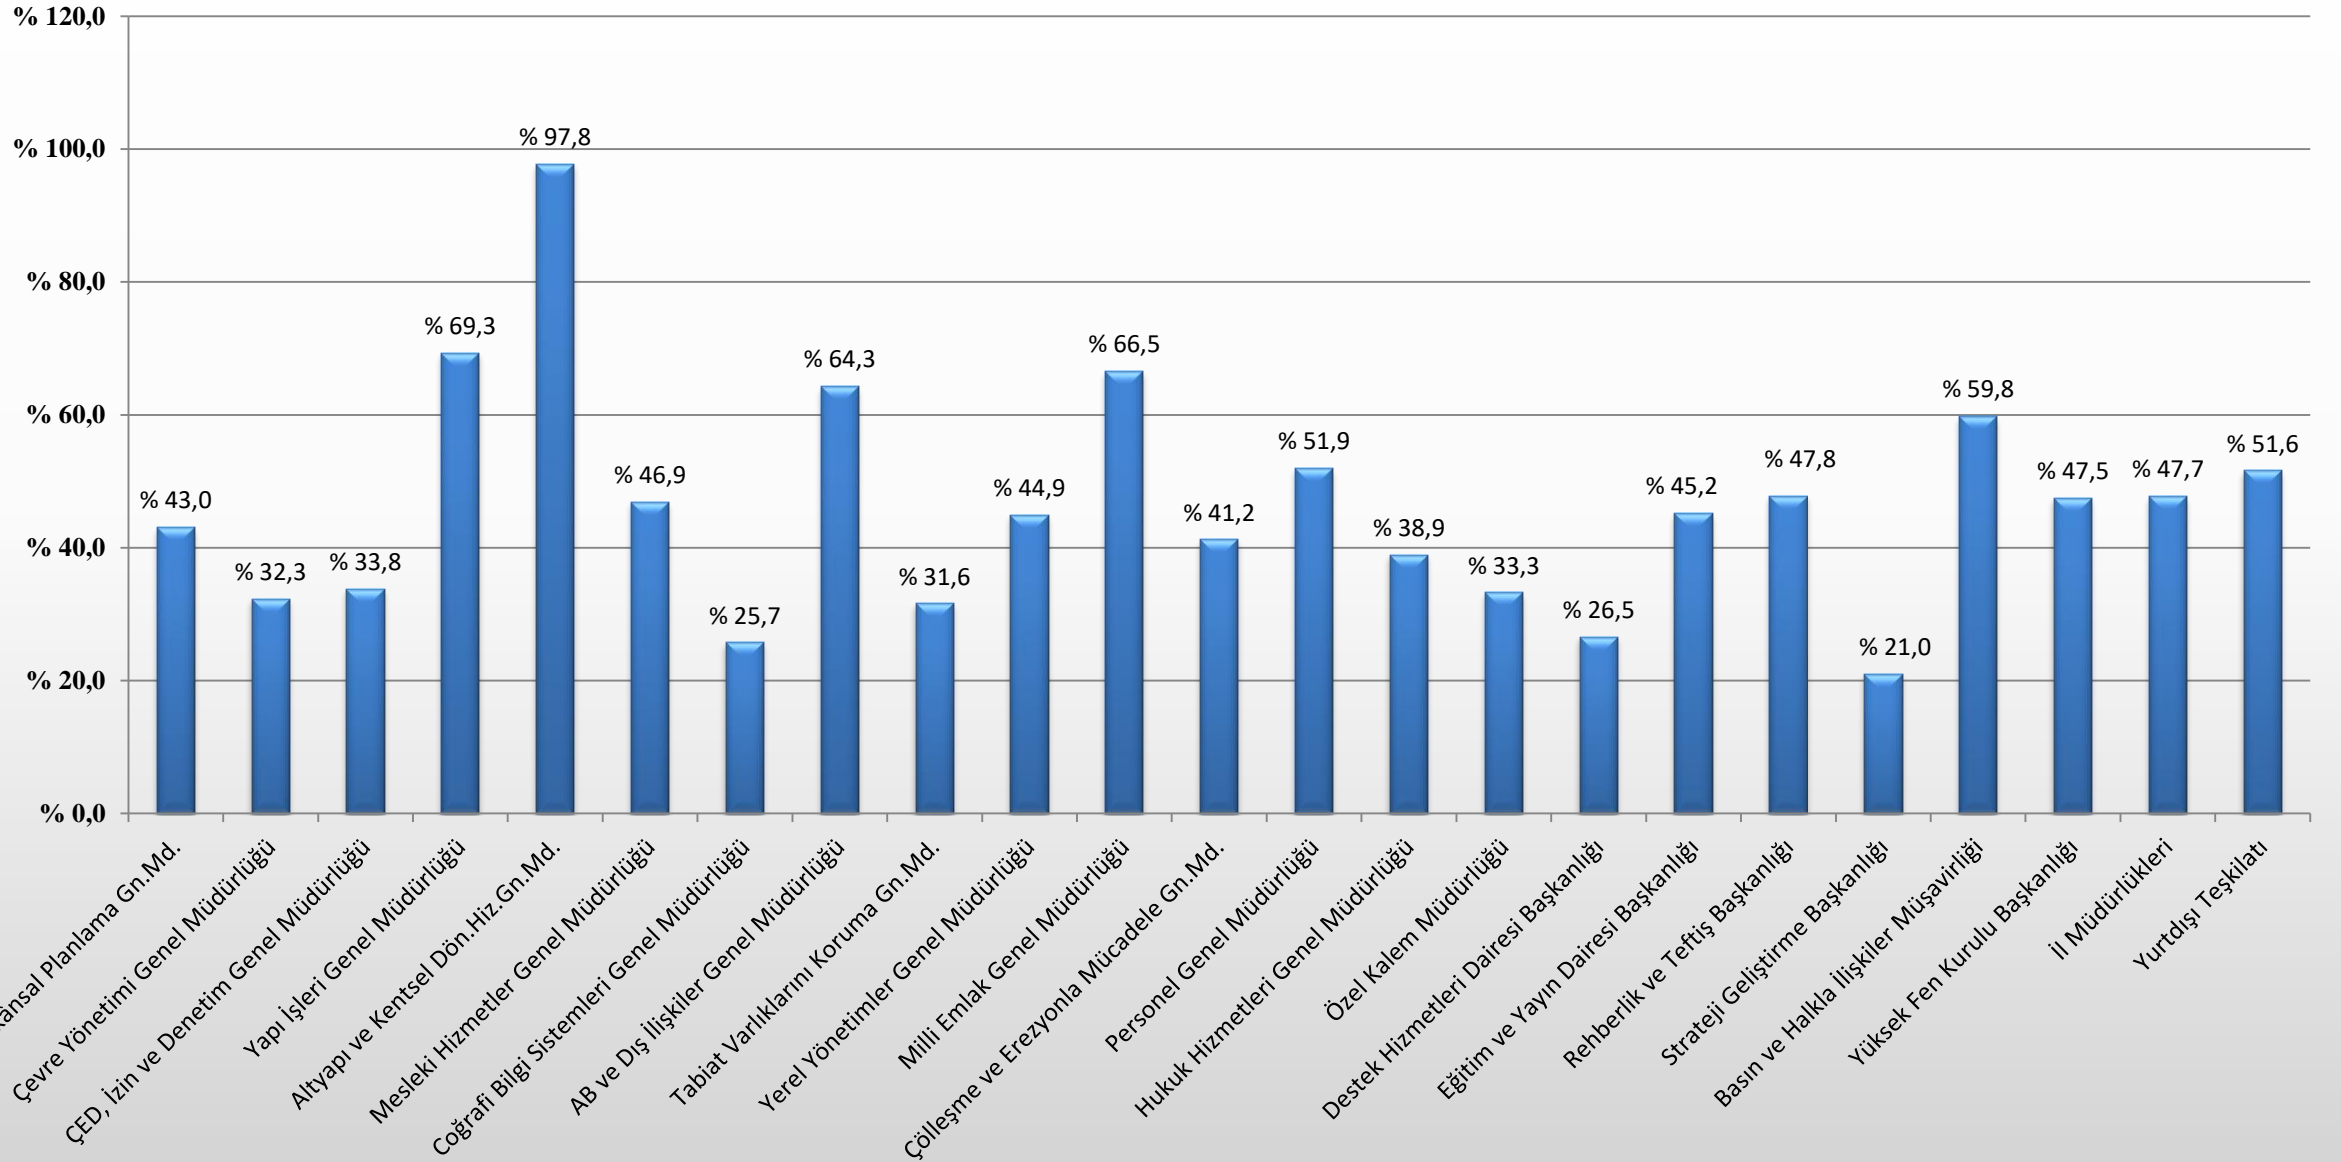

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Harcama Birimi Bazında

2024 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2025	28.456.000	9.286.000	15.327.000	1.583.990	% 10,3	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2025	19.416.000	3.486.000	12.087.000	1.583.990	% 13,1	<p>Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması, Genel Müdürlüğümüz kontrol ve denetiminde, 1 Mayıs 2018 tarihi itibari ile 81 İl Müdürlüğümüz, Belediyeler ve Özel Sektör tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporu onay sürecine ilişkin tüm iş ve işlemler, kâğıt ortamının yanı sıra eş zamanlı olarak Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması üzerinden de gerçekleştirilmektedir.</p> <p>Tüm veri, harita vb. girişler ve iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı bu sistem üzerinden yürütülmekte olup etüt raporlarına ait sayısal verilerin tamamı ortak bir portal altında depolanmakta ve ilgili paydaş kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.</p> <p>Ayrıca afet tehlikelerinin belirlenmesi ve planlamada dikkate alınmasına ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda verilerin analiz edilebilmesi amacıyla "Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde Veri Analizi" projesi 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmış olup, proje çalışmalarına 11.01.2024 tarihi itibari ile başlamıştır.</p> <p>20.03.2024 tarihinde projenin iş kalemlerine göre %15'lik kısmı tamamlanmış olup, ilk hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Bu kapsamda, YERBİS Yazılımı Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı hazırlanmış ve YERBİS uygulaması açık kaynak kodlu (PostgreSQL) olarak yazılmıştır.</p> <p>Yazılım geliştirme ve güncelleme çalışmaları proje takvimine uygun devam etmektedir.</p>
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2024	9.040.000	5.800.000	3.240.000	0	% 0,0	<p>İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi Projesi için Piyasa Araştırması ve Yaklaşık Maliyet hesabı hazırlanmış olup yaklaşık maliyetin proje ödenek bedelinden fazla çıkması nedeniyle proje gerçekleştirilememektedir.</p>

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2025	18.000.000	1.000.000	10.800.000	0	% 0,0	2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan "Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi- Etap 1" projesi ile 3 yerleşim alanında yer alan aktif fay zonları 1/1.000 ölçekte haritalanacak, fay sakınım zonları belirlenerek Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS) üzerinden ilgili kurum/kuruluşların kullanımına açılacaktır. 2023 yılında projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet belirlenebilmesi için müellif firmalardan teklif mektupları alınarak ihale süreci başlatılmış ancak bütçe yetersizliği nedeniyle ihale süreci tamamlanamamıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe talebinde bulunulmuştur. Arttırılan bütçe ile yeniden teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır, ancak bu süreçte de tasarruf tedbirleri nedeniyle proje bütçesinde tekrar kesintiler meydana gelmiştir. Düzenlenen proje bütçesine uygun olacak şekilde projenin Teknik Şartnamesi tekrar revize edilerek hazırlıkları tamamlanmış olup, ihale süreci devam etmektedir.
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2025	6.390.000	1.000.000	4.401.000	0	% 0,0	Projeye ilişkin yılın 6 ayında herhangi bir harcama yapılmamış olup, örnek imar uygulamalarının yapıldığı Adana, Trabzon, Çankırı ve Ardahan İllerinde dosya kontrolü işlemi devam etmektedir.Bolu İlinde ise askı işreci devam etmektedir.
	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2025	6.390.000	1.000.000	4.401.000	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	3.000.000		1.500.000	0	% 0,0	Proje'ye ilişkin şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Proje maliyetlerinde artışlara bağlı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığından ek bütçe istenmiş olmasından dolayı ek bütçe verilmesi durumunda ihale sürecine 2024 yılının ikinci yarısında başlanılması öngörülmektedir.
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	2.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje'ye ilişkin şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Proje maliyetlerinde artışlara bağlı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığından ek bütçe istenmiş olmasından dolayı ek bütçe verilmesi durumunda ihale sürecine 2024 yılının ikinci yarısında başlanılması öngörülmektedir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	52.846.000	11.286.000	30.528.000	1.583.990	% 5,2	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	5.000.000	0	2.500.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	57.846.000	11.286.000	33.028.000	1.583.990	% 4,8	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	25.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Söz konusu proje Yatırım Programında kabul edilmiş (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete. Karar Sayısı: 8082; Proje No: 2024K06-226052) ve Proje tutarı toplam 25 Milyon TL olup; 2024-2026 yıllarını kapsamaktadır. Güncel durumda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca tarafımıza gönderilen yazıda, söz konusu projenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü ve Bakanlık Makamı onayına sunulmasına karar verildiğine dair komisyon kararı tarafımıza bildirilmiştir. Bu kapsamda protokol hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması amacıyla 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu bağlamda, bahse konu projeye ilişkin hazırlanan teknik şartname revize edilmiş olup,yaklaşık maliyet tespitine esas teşkil edecek olan fiyat tekliflerinin yeniden düzenlenerek tarafımıza sunulması ilgili kurumdan talep edilmiştir. İlgili kurumdan yaklaşık maliyet fiyat teklifi gelmiş olup, satın alma komisyonuna esas teşkil edecek kesin fiyat teklifi için yazışmalar devam etmektedir.
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	50.000.000		15.000.000	0	% 0,0	Söz konusu proje Yatırım Programında kabul edilmiş (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete. Karar Sayısı: 8082; Proje No: 2024K06-226053) ve Proje tutarı toplam 50 Milyon TL olup; 2024-2026 yıllarını kapsamaktadır. Güncel durumda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca tarafımıza gönderilen yazıda, söz konusu projenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü ve Bakanlık Makamı onayına sunulmasına karar verildiğine dair komisyon kararı tarafımıza bildirilmiştir. Bu kapsamda protokol hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması amacıyla 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu bağlamda, bahse konu projeye ilişkin hazırlanan teknik şartname revize edilmiş olup, satın alma komisyonuna esas teşkil edecek kesin fiyat teklifinin yeniden düzenlenerek tarafımıza sunulması ilgili kurumdan talep edilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2026	808.998.000	265.000.000	135.000.000	4.812.756	% 3,6	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneginden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneginden hakediş kapsamında 49.953.569 TL, 2023 yılı ödeneginden 157.584.504 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılı yatırım programında 150 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 2024 yılı KAP detay liste Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 28/3/2024 tarihli yazı ile onaylanmıştır. Proje bütçesi tasarruf tedbirleri kapsamında güncellenmiş olup 135 milyon TL'dir. 9/7/2024 tarihinde proje değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2025	4.000.000	500.000	1.800.000	0	% 0,0	Proje bütçesi dikkate alındığında artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2025 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize yapılarak başvurulmuştur.
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	9.781.000	6.721.000	3.060.000	0	% 0,0	TURKSAT ile yürütülmekte olan proje kapsamında, şehirlerin 3 boyutlu hava kalitesi haritalarına esas veri işleme, veri üretimi, analiz ve geliştirme çalışmaları, web arayüzünün işlemleri, vatandaş odaklı hava kalitesi izleme hizmeti analizi ile şartname kapsamında belirlenen iş paketlerine ait faaliyetler iş planı çerçevesinde sürdürülmektedir. Projenin Aralık ayı itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2024	11.609.000	6.110.000	5.499.000	3.000.000	% 54,6	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında 07.09.2023 tarihinde İstanbul'da kamu kurum temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile Proje Açılış Toplantısı düzenlenmiştir. 2023 yılında protokol kapsamında 3.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü Çalıştayı, 1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da kamu, akademi, dernek ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Çalıştayı 05.01.2024 tarihinde Ankara'da kamu, akademi, dernek ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 07.03.2024 tarihinde Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Raporları sunulmuş olup revizyon için Bakanlık tarafından görüşler iletilmiştir. Otomotiv, Tüketici Ürünleri İmalatı, Plastik ve Tekstil "Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Çalıştaylar 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul'da ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gıda, Balıkçılık ve Tarım, Tekstil ile Konut ve İnşaat sektörlerine ait Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Raporları sunulmuş olup Bakanlık tarafından değerlendirilmiştir. 2024 yılında protokol kapsamında 3.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
2023K10-198444	Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2024	8.100.000	2.000.000	6.100.000	2.000.000	% 32,8	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) işbirliğinde yürütülmekte olan "Barselona Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Dokümanlar Çevresinde Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı Projesi"nde geçen sürede 8 iş paketine ilişkin proje ekibi tarafından çalışmalara devam edilmekte olup, 3 iş paketine ilişkin çalışmalar ise tamamlanmıştır.
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)	2018-2026	9.500.000	0	3.150.000	0	% 0,0	
	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2026	9.500.000	0	3.150.000	0	% 0,0	Mâli nedenlerden dolayı Kamu Hizmet Sunucusu olarak üniversite (ODTÜ) ile protokol imzalanamamış olup, bahse konu Ar-Ge projesinin 10/05/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2014/6228 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında belirlenecek yeni yüklenici ile protokol imzalanacaktır. Projeye ilişkin protokolün nihai hali çalışılmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2025	14.074.000	5.046.000	5.328.000	0	% 0,0	
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2025	5.500.000	0	1.800.000	0	% 0,0	Projenin 3f kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmış olup, Yıldız Teknik Üniversitesinden teklif istenmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi bütçenin üstünde 4.500.000 tl fiyat teklifinde bulunmuştur. Proje bütçesinin arttırılması talep edilmiştir. 2024 yılı bütçe teklifinde proje tutarı 5.500.000 tl olarak yer almaktadır. Projenin TÜBİTAK ile gerçekleştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak görüşmeler sonuçlandırılmamıştır. Bu nedenle, projenin üniversiteler ile gerçekleştirilmesi için ön görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, süreç devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında proje faaliyetleri gözden geçirilerek, proje Teknik Şartnamesi güncellenmiştir. Proje için alınan teklifler ve gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda projenin hedeflerine belirlenen bütçe ile ulaşılamayacağı görülmektedir. Projenin amaçlarına ulaşılması ve başarılı şekilde sonuçlandırılması için mevcut 5.500.000 TL proje bütçesinin yeterli olmayacağı görülmekte olup proje bütçesinin 7.000.000 TL olarak güncellenmesi önerilmiştir.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.574.000	5.046.000	3.528.000	0	% 0,0	İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmekte olan projede şartname kapsamında yazılıma esas geliştirme, iyileştirme analizleri, emisyon envanteri ve veri işleme, güncelleme, raporlama, modelleme, tahminleme ile birlikte araştırma-geliştirme süreçlerine esas faaliyetler iş planı çerçevesinde sürdürülmektedir. Projenin Ağustos ayı itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2026	15.209.000	5.119.000	2.290.500	0	% 0,0	Proje, aynı proje adı ve proje numarası altında 2 aşamalı olarak yürütülmekte olup projenin toplam bütçesi 15.210.000 ₺'dir. Birinci aşama (Faz-1), 08/11/2022 tarihinde TÜRKİYE Uydular Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan Sözleşme ile yürürlüğe girmiştir. Projenin birinci fazı için imzalanan Sözleşme bedeli 7.000.000,00 ₺'dir. Bu aşamada yapılacak 5 (beş) hakediş ödemesinin 1. hakedişi 2.975.461,84 ₺; 2. hakedişi 944.082,36 ₺ ve 3. hakedişi 1.071.468,00 ₺ (yüklenici kaynaklı rapor teslimlerinde yaşanan gecikme nedeniyle emanete alınmıştır.) olarak gerçekleştirilmiştir. Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması için mevcut bütçe 8.000.000 ₺ olup ikinci fazın gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşık maliyet teklifi alınmasına ilişkin çalışmalar devam ederken 2025 yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında 12.000.000 ₺ ilave bütçe talep edilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (Çevre Sektörü)	2023-2025	10.646.000	3.526.000	3.204.000	2.033.807	% 63,5	Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyonu Yazılım Geliştirme Çalışmaları kapsamında; 1. Entegrasyon bileşenleri 2. Portal Altyapı ve Sistem Yönetim Modülü 3. Referans Veriler Modülü 4. Yetkilendirme ve Teşkilat Yapısı Modülü geliştirilmiş ve geliştirilen modüllerin fonksiyon ve entegrasyon testleri yazılım geliştirme faaliyetleri ile eş zamanlı olarak yürütülmüştür. 5. Kamera izleme sistemine yönelik kurulum konfigürasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Testler sonrası devreye alınacaktır. 6. İstatistik sorgulama arayüzleri çalışmaları tamamlanmıştır. Testler sonrası devreye alınacaktır. 7. Raporlama modülü entegrasyonu yapılmış olup, testler sonrası devreye alınacaktır. 8. Yukarıda yer alan modüllerin testleri Temmuz 2024 dönemi içerisinde tamamlanacak ve gerçek ortamda devreye alınacaktır.
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2024	13.050.000	7.080.000	5.970.000	0	% 0,0	Proje faaliyetlerinin zamanında tamamlanması ve kaliteli çıktılara ulaşılması için proje paydaşlarının ortak kararı ile sunulan üçüncü Zeyilname talebi 05 Nisan 2024 tarihinde onaylanmıştır. Proje'de 4 aylık bir süre uzatımı yapılmıştır ve proje kapanış tarihi 08 Ağustos 2024 olarak güncellenmiştir. 9. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 04 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştır. 2024 yılı 2. çeyrek döneminde projede dört Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje Bağımsız Nihai Değerlendirme Süreci tamamlanmıştır. Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi ve İzlenmesi Teknik Kılavuzu 14 Haziran 2024 tarihinde onaylanmış ve nihai haline getirilmiştir. Proje Kapanış Toplantısı 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığının talebi doğrultusunda yıl sonuna kadar Proje ödemesinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.
AB katkısı			73.950.000	40.121.000	33.829.000	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	24.004.000	10.351.000	7.598.000	6.393.810	% 84,2	"Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek" projesi 07.02.2022 tarihinde resmi olarak başlamıştır. "Türkiye'de End of Waste (Atık Sonu) Konseptinin Geliştirilmesi Projesi" 25.04.2023 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Söz konusu projenin sözleşme bütçesi 1.191.601,00 Avro olup, proje süresi 24 aydır. Başlangıç raporu (Inception report) Bakanlığımıza sunulmuş ve 26.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. 15.06.2023 tarihinde açılış toplantısı yapılmıştır. Saha ziyaretleri ve anketler tamamlanmıştır.
AB katkısı			136.019.000	58.657.000	43.055.000	37.000.000	% 85,9	
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	920.871.000	309.453.000	172.899.500	16.240.373	% 9,4	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	83.100.000	2.000.000	24.100.000	2.000.000	% 8,3	
		GENEL TOPLAM	1.003.971.000	311.453.000	196.999.500	18.240.373	% 9,3	
		AB KATKISI	209.969.000	98.778.000	76.884.000	37.000.000	% 48,1	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2025	466.200.000	220.000.000	109.890.000	11.046.769	% 10,1	Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyon işi hakedişi ile 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce bölgesel olarak İstasyonların Bakım-Onarımı hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 2024 yılı için de ihale süreci tamamlanacak 2 Temiz Hava Merkezi Md. olmakla birlikte diğer birimlerin ilgili yıla ait hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
	Genel Bütçe Ödeneği		258.200.000	133.000.000	49.890.000	11.046.769	% 22,1	İhale yapılmış olup, sözleşme imzalama süreci devam etmektedir.
	Döner Sermaye Ödeneği		208.000.000	87.000.000	60.000.000	0	% 0,0	Hava kalitesi izleme istasyonlarının kurulumu için gerekli şartname hazırlanmış olup, yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları tamamlanmıştır Ancak 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile söz konusu işe ait bütçe ödeneği %10 oranında kesintiye uğradığından ihtiyaçlar bütçe olanakları çerçevesinde tekrardan gözden geçirilerek yaklaşık maliyet belirleme çalışmalarına yeniden başlanmıştır. İhale yapılmasının ardından istasyon kurulumları gerçekleştirilecektir.
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2024-2024	108.000.000		108.000.000	0	% 0,0	Proje henüz başlamamış olup yüklenici ile sözleşme imzalanma aşamasındadır. Projenin Temmuz ayı içerisinde başlaması öngörülmektedir.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2026	13.160.000	1.558.000	2.700.000	0	% 0,0	Proje protokolü Genel Müdürlüğümüz ve ODTÜ-DBE arasında 10/07/2024 tarihinde imzalanmıştır. Proje protokol bedeli 27.300.000 TL (KDV hariç) tutarındadır. 2024 yılı ödemeleri 14.300.000 TL (KDV hariç) ve 2025 ödemeleri 13.000.000 TL (KDV hariç) tutarındadır. Proje yeni başladığı için henüz bir ödeme yapılmamıştır.
2023K10-198443	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3 (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2024-2025	32.800.000		17.200.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	379.360.000	134.558.000	160.590.000	11.046.769	% 6,9	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	240.800.000	87.000.000	77.200.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	620.160.000	221.558.000	237.790.000	11.046.769	% 4,6	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	7.295.458.000	4.139.147.000	2.336.311.000	1.838.469.802	% 78,7	İhale süreçleri tamamlanmış olup, süreçler planlanan şekilde yürütülmektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	7.218.198.000	4.068.687.000	2.329.511.000	1.836.292.744	% 78,8	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	77.260.000	70.460.000	6.800.000	2.177.059	% 32,0	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	9.344.660.000	19.884.000	617.719.000	1.039.017	% 0,2	Proje kapsamında ihaleler devam etmekte olup, proje planlanan şekilde ilerlemektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	9.197.500.000	10.400.000	574.719.000	1.039.017	% 0,2	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	147.160.000	9.484.000	43.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2028	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	2024 yılı içerisinde harcama planlanmamaktadır.
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2028	0	0	0	0		
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2028	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2 (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2024-2029	11.038.290.000		20.000	0	% 0,0	Kredi anlaşması imzalanmadığı için herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	7.709.000.000	104.520.000	5.963.100.000	1.192.259.853	% 20,0	KADİYAP projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iller kapsamında Kahramanmaraş,Elazığ, Malatya illerinde ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanmış (Betonarme + Hafif Çalılık) 1800 adet kırsal konut inşaatı devam etmekte olup Fiziki seviyeleri %35-40 seviyelerindedir.
2024G00-224663	Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA) (Konut Sektörü)	2024-2025	6.622.200.000		3.658.400.000	0	% 0,0	JICA kredisi son aşamaya gelmiş olup Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek alanlarda ihaleye çıkılacaktır.
	JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2024-2025	5.518.500.000		3.048.900.000	0	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği	2024-2025	1.103.700.000		609.500.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2024-2026	1.500.000.000		500.000.000	0	% 0,0	
	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı	2024-2026	1.200.000.000		490.000.000	0	% 0,0	Çapa Hastanesi projesi tamamlanma aşamasında olup, en kısa sürede ihaleye çıkarılacaktır.
	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat	2024-2026	300.000.000		10.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Döner Sermaye)	2021-2024	77.000.000	61.500.000	27.500.000	26.692.866	% 97,1	Sözleşmesi 24.01.2023 tarihinde imzalanmış ve işe başlanmıştır. Bina %90 seviyesinde tamamlanmıştır. Çevre düzenleme imalatları devam etmektedir.
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2024	78.218.000	50.000.000	28.218.000	17.245.651	% 61,1	Sözleşmesi 12.01.2023 tarihinde imzalanarak işe başlanmış olup Bina %65 seviyelerinde tamamlanmıştır. Kaba İnşaatı bitti. Çatı ve cephe kaplamaları devam etmektedir. İç mekan sıva ve boya imalatları devam etmektedir.
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	Yapım işi ihalesi henüz yapılmamıştır
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2024	46.476.000	26.800.000	19.676.000	12.652.000	% 64,3	Birinci kısmın iş bitim tarihi 04.07.2024 olup binanın zemin iyileştirme, kaba ve ince imalatları genel olarak tamamlanmıştır. Kapı ve pencere doğrama imatlarının tamamlanmasını müteakip birinci kısmın geçici kabul aşamasına geçilecek olup, inşaat ilerleme oranı işin birinci kısım için fiziki olarak yaklaşık %97 seviyesindedir. İşin ikinci kısmı düşünüldüğünde inşaat ilerleme yüzdesi fiziki olarak toplamda %87 seviyesindedir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	Yapım işi ihalesi henüz yapılmamıştır

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	5.409.500.000	51.075.000	457.090.000	127.182.177	% 27,8	
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	1.004.900.000	34.175.000	195.615.000	89.943.014	% 46,0	KADEV projesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi- Kilyos Kampüsü- 1. Öğrenci Yurdu Binası, Yabancı Diller ,Yüksekokulu (YADYOK) A ve B Blok Binaları ve Sosyal Tesis/Yurt Binası işi ihale edilmiş , Boğaziçi Üniversitesi - Uçaksavar,Kampüsü - Superdorm Binası,İTÜ- Ayazağa Kampüsü – Vadi Yemekhane, Vadi Erkek Yurdu (B-C-D-E Blokları) Binaları ,İstanbul Teknik Üniversitesi (Ayazağa Kampüsü) – Uzay Uçak Fakültesi, Gemi İnşaat Fakültesi, MadenFakültesi, Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu Binaları ,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa – Avcılar Kampüsü Rektörlük İdari Binası ve Öğrenci Kültür Merkeziile Büyükçekmece Kampüsü C Blok Yurt Binası ve V Blok Yurt Binası ,Marmara Üniversitesi (Göztepe Kampüsü) – Yabancı Diller Yüksek Okulu, Teknik Eğitim Fakültesi,Atatürk Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Binaları ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi – Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor BilimleriFakültesi Binaları ihaleleri değerlendirme aşamasındadır.
	Hibe Ödeneği	2021-2027	19.500.000	3.900.000	15.600.000	2.069.040	% 13,3	
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2023-2026	4.385.100.000	13.000.000	245.875.000	35.170.123	% 14,3	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K14-224896	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	20.000.000		20.000.000	0	% 0,0	İş, ihale aşamasındadır. (DMO)
2024K14-224923	Afet Koordinasyon Çadırı Alımı (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	İş, ihale aşamasındadır. (DMO)
2024K14-224931	İnsansız Hava Araçları Modernizasyonu (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	İş, piyasa araştırması aşamasındadır.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2025	145.000.000		130.000.000	0	% 0,0	İş yeni başlamıştır ve devam etmektedir.2024 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2024K14-235229	İletişim Merkezleri İnşaatı (Singapur Kızılhaç Derneği Hibesi) (Afetler Sektörü)	2024-2024	16.188.000		16.188.000	0	% 0,0	Singapur Kızılhaç Derneğince Hibe edilen bütçe kapsamında Kahramanmaraş,Hatay ve Malatya illerinde yapılacak olan iletişim merkezleri için Projeler ve yaklaşık maliyetler hazırlanmış olup İhale edilmesi planlanmaktadır.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçbeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2024	159.500.000	110.000.000	49.500.000	18.424.531	% 37,2	İşin ihalesi yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır. İş devam etmektedir.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	76.200.000	42.000.000	34.200.000	19.479.148	% 57,0	İşin ihalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmıştır. Konut inşaatları tamamlanmış olup çevre düzenleme ve altyapı işleri devam etmektedir. İşin geçici kabulünün en kısa sürede yapılması planlanmaktadır.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	130.600.000	100.000.000	30.600.000	21.945.135	% 71,7	İşin ihalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatları tamamlanmak üzere olup, işin 2024 yılı içerisinde bitirilmesi beklenilmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	444.000.000	0	90.000.000	0	% 0,0	24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Olur'u ile tahmini ödenek teminine esas revize bedeli onaylanmış olup İhale Daire Başkanlığı tarafından yeniden ihalesi yapılacaktır. Henüz harcama yoktur.
2024K07-224135	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	2.700.000		2.700.000	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukları harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2024K07-224137	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	4.500.000		4.500.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukları harcama yapılmaktadır.
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	115.000.000		35.100.000	0	% 0,0	Bu sene yatırım programına girmiş olup öntümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır.
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	55.000.000		18.000.000	0	% 0,0	Bu sene yatırım programına girmiş olup öntümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır.
2016K07-2797	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (**08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2027	1.332.900.000	311.088.000	225.406.400	28.830.000	% 12,8	
	Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	72.000.000	12.000.000	13.500.000	4.300.000	% 31,9	Aksaray ilindeki 9 uygulamada yer alan toplam 149 hak sahibi aile için 13.500.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Haziran ayı sonu itibariyle 4.300.000 TL ödenek harcanmıştır. Biten konut yoktur.
	Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	44.000.000	18.600.000	6.714.000	0	% 0,0	Ankara ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 44 hak sahibi aile için 6.714.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	142.640.000	22.000.000	9.576.000	0	% 0,0	Batman ilindeki 4 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 9.576.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	954.000	950.000	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	1.804.000	1.800.000	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	33.000.000	15.000.000	9.000.000	0	% 0,0	Bolu ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 900.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	25.500.000	14.000.000	7.650.000	0	% 0,0	Çankırı ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 22 hak sahibi aile için 7.650.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	56.000.000	11.000.000	10.125.000	0	% 0,0	Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 10.125.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	9.000.000	6.000.000	900.000	400.000	% 44,4	Denizli ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 3 hak sahibi aile için 900.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup 400.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 1 konut tamamlanmıştır.
	Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	59.288.000	6.500.000	6.075.000	3.750.000	% 61,7	Erzincan ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 69 hak sahibi aile için 6.075.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Haziran ayı sonu itibarıyla 3.750.000 TL ödenek harcanmıştır. Biten konut yoktur.
	Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	211.249.000	80.000.000	44.550.000	9.800.000	% 22,0	Erzurum ilindeki 15 uygulamada yer alan toplam 291 hak sahibi aile için 44.550.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Haziran ayı sonu itibarıyla 9.800.000 TL ödenek harcanmıştır. Henüz biten konut yoktur. Aşkale İlçesi Akören köyünde 2023 yılında ince işleri kalan 2 adet konut tamamlanarak haksahiplerine teslim edilmiştir.
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Iğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	19.200.000	0	12.137.400	0	% 0,0	Iğdır ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 32 hak sahibi aile için 12.137.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	65.000.000	14.800.000	10.935.000	0	% 0,0	Isparta ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 65 hak sahibi aile için 10.935.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	31.000.000	18.000.000	9.000.000	1.800.000	% 20,0	İzmir ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 33 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup, Haziran ayı sonu itibarıyla 1.800.000 TL ödenek harcanmıştır. Henüz biten konut yoktur.
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	14.500.000	5.500.000	5.400.000	450.000	% 8,3	K.Maraş ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 16 hak sahibi aile için 5.400.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Haziran ayı sonu itibarıyla 450.000 TL ödenek harcanmıştır 1 konut tamamlanmıştır.
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	29.438.000	5.438.000	2.700.000	0	% 0,0	Karaman ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 2.700.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	34.150.000	19.000.000	10.935.000	0	% 0,0	Kars ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 25 hak sahibi aile için 10.935.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	35.000.000	5.000.000	4.860.000	0	% 0,0	Kastamonu ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 35 hak sahibi aile için 4.800.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	140.706.000	7.000.000	9.000.000	0	% 0,0	Malatya ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	73.880.000	5.000.000	7.200.000	300.000	% 4,2	Muş ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 75 hak sahibi aile için 7.200.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Haziran ayı sonu itibariyle 300.000 TL ödenek harcanmıştır. 1 konut tamamlanmıştır.
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	19.000.000	1.000.000	5.400.000	0	% 0,0	Niğde ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 19 hak sahibi aile için 5.400.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	44.825.000	19.000.000	11.520.000	0	% 0,0	Sivas ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 12.800.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	107.282.000	10.000.000	18.000.000	8.030.000	% 44,6	Tunceli ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 104 hak sahibi aile için 18.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Haziran ayı sonu itibariyle 8.030.000 TL ödenek harcanmıştır. Henüz biten konut yoktur.
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	13.436.000	8.500.000	1.215.000	0	% 0,0	Uşak ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 14 hak sahibi aile için 1.215.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Elazığ İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2023-2027	50.000.000	5.000.000	9.000.000	0	% 0,0	Elazığ ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 50 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K07-224136	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	45.000		45.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2026			30.000.000	23.800.129	% 79,3	Kamulaştırma kapsamında konut ve tarım arazisi satın alımları için kullanılmaktadır. 30.06.2024 tarihi itibarıyla Adıyaman ve Sinop illerinde, toplam 26 adet satın alma işlemi (konut ve tarım arazisi) için 23.800.128,80 TL ödenek illerine gönderilmiştir.
15 Proje		06 ve 07 TOPLAM	49.662.688.000	4.482.782.000	13.731.840.000	3.214.553.566	% 23,4	
2 Proje		08 TOPLAM	1.332.945.000	311.088.000	225.451.400	28.830.000	% 12,8	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	254.000.000	61.500.000	177.500.000	26.692.866	% 15,0	
		GENEL TOPLAM	51.509.741.000	4.939.214.000	14.134.791.400	3.270.076.432	% 23,1	-296.495.000
4 Proje		HİBE	260.108.000	83.844.000	81.588.000	4.246.098	% 5,2	
1 Proje		AB KATKISI	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	194.345.000	76.800.000	104.894.000	29.897.651	% 28,5	
		Kamu İştirme	0	0	30.000.000	23.800.129	% 79,3	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2025	2.250.000	750.000	675.000	45.258	% 6,7	*Proje kapsamında öncelikle BEP-TR yazılımı ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı için gerekli iklim verilerinin güncellenmesi ve sürekli güncellemeyi mümkün kılacak yazılım için gerekli metodoloji ve algoritma için şartname ve protokol çalışmaları devam etmekte olup, üniversiteler ile yapılacak protokol kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında işin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. **Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu hazırlama işlerinin gerçekleştirilmesi devam etmektedir. *- 27-29/02/2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 23. Ozon paneline katılım sağlanmıştır.
2023K01-198902	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2024-2024	5.500.000		5.500.000	855.167	% 15,5	
	Genel Bütçe Ödeneği		1.000.000		1.000.000	855.167	% 85,5	TSE Deney ve Muayene Ücreti ile Laboratuvar TÜRKAK Denetim Ödemesi yapılmıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.250.000	750.000	1.675.000	900.425	% 53,8	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	4.000.000	0	4.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	7.250.000	750.000	5.675.000	900.425	% 15,9	

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2024	6.200.000	3.000.000	3.200.000	0	% 0,0	Söz konusu işe ait ihale süreci tamamlandı ve 4.788.000TL bedelle sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında projeye ait Proje Metodolojisi Raporu, Proje Yönetim Planı (PYP), Analiz ve Tasarım Raporları, Ulusal Veri Sözlüğü hazırlama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Raporlama Altyapı Bileşeni lisans alımı gerçekleştirildi.
2023K60-205399	Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	14.970.000	7.770.000	7.200.000	0	% 0,0	Projeye 2023 Yılı Yatırım Programının Bilişim Altyapısı Sektöründe 22.000.000 TL proje tutarı ve 12.000.000 TL 2023 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Projenin 2023 yılı ödeneğinin 7.770.334 TL si harcanmıştır. 2024 yılında tasarruf tedbirleri kapsamında proje ödeneğinde revize olmuş, toplam proje tutarı 14.970.000 TL olarak belirlenmiş, 2024 yılı kalan ödenek ise 7.200.000 TL'dir. 2024 yılında herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiş, 2024 yılı sonunda proje tamamlanınca ödeme gerçekleştirilecektir.
2023K60-205413	TUCBS Çalışabilirlik, Uyumlaştırma ve Entegrasyon (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	15.600.000	3.000.000	12.600.000	4.434.516	% 35,2	28 il özel idaresi tarafından üretilen coğrafi ve sözel veri varlığı tespit edildi, 51 il özel idaresi yönetici ve teknik personelinin katılımlarıyla 06.12.2023 tarihinde çalıştay düzenlendi. 28 il özel idaresi için entegrasyon çalışmaları 17.04.2024 tarihinde tamamlanmıştır.
2023K60-205704	Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	24.490.000	17.290.000	7.200.000	0	% 0,0	30 Mayıs 2024 tarihinde sözleşme yapılmış olup proje kapsamında 7.733.160 TL gerçekleştirilecektir. Proje bütçesi 8 milyon TL'den 7.2 milyon TL'ye düştüğünden 533.160 TL eksik bulunmaktadır.
2023K60-205743	Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	13.735.000	9.735.000	4.000.000	0	% 0,0	TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, Güncelleme projesi altında tahsis edilmiştir.
2023K60-217018	TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, Güncelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	96.000.000	15.000.000	81.000.000	0	% 0,0	Mevcut platformun analizi tamamlanmış olup, projenin ikinci fazı olan yeni platformun tasarım ve analizi çalışmalarına devam edilmektedir.
2023K60-230220	MEBİS Projesi Bakım Onarımı İş İdamesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	8.027.000	2.927.000	5.100.000	0	% 0,0	Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) yazılımlarının günümüz teknolojilerine ve Bakanlığımız bilişim stratejilerine uygun, açık kaynak kodlu olarak yeniden geliştirilmesi kapsamında, Yönetim Modülü, Login Modülü, Taşınmaz Modülü, Ecrimisil Modülü, Taşınır Mal ve Tasfiye Modülü, Belgenet Modülü, Satış Modülü, İmar Barışı, Tahsis, Kurum Tahsis Modülü, Kira Modülü, İrtifak Modülü, CBS Web, Edinim ve Trampa Modülü, Davalar Modülü, Ohal Modülü, Kamu Konutları, Onarım Modülü, SMS Modülü, İş Zekası - Rapor Modülü, Yardım Modülü, Muvafakat Modülü ve Terk Modülü ile MİLE İlan sitesi (milliemark.gov.tr), MİLE Kurum Tahsis sitesi (kurumtahsis.csb.gov.tr), MİLE Evrak Arşiv sitesi (mileevrak.csb.gov.tr) ve MİLE Kamu Taşınmazları Sistemi (milekts.csb.gov.tr) web siteleri Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) Projesi yazılım çalışmaları tamamlanarak 16.01.2023 tarihinde devreye alınmıştır.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K60-230225	Bakanlık Uygulamaları Performans İzleme ve Yönetim (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	6.500.000	0	6.500.000	0	% 0,0	Projenin ihalesi henüz gerçekleştirilmemiştir. AR-GE çalışmaları devam etmektedir. Ürün ile ilgili demo çalışmalar yapılmaktadır.
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2025	9.768.000	0	5.400.000	0	% 0,0	Proje Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi ile birleştirilerek ihaleye çıkılacaktır. Yaklaşık maliyet işlemleri tamamlanmış olup, ihale aşamasındadır.
2024K60-230216	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	213.200.000		213.200.000	12.752.280	% 6,0	İhale 28.12.2023 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış olup 01.01.2024 -31.12.2024 tarihleri arasında geçerlidir. İhale süreci devam etmektedir.Sözleşme Bedeli : 30.991.500,00 (Otuzmilyondokuzyüzdoksanbinbeşyüz TL) 1-5. Ay hakkeşileri hakkeş ödemesi kalmıştır. Hizmet alımı ihalesi olduğundan hizmet devam etmektedir.
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2024-2024	149.200.000		149.200.000	8.456.280	% 5,7	04.06.2024 tarihinde yüklenici firmalarla sözleşme imzalanmış olup Ürünler teslim süresi içerisinde teslim edilecektir. Ürünler henüz teslim edilmediğinden Muayene Kabulü gerçekleşmemiş olup, ödemesi yapılmamıştır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2024-2024	60.000.000		60.000.000	3.840.000	% 6,4	Proje kapsamında MDR Ürün temini, Tehdit istihbarat hizmeti ve Güvenlik Testleri Hizmet Alımı işi 1.477.750,00 TL'ye alımları gerçekleştirilmiştir.CSIT Bilişim A.Ş. ile 25.03.2024 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzalanmış olup sözleşme bedeli 3.200.000,00 TL dir. Yedekleme türünü ile sözleşme tarihi itibarıyla lisanslar yüklenmiş olup, sunucuların yedekleri alınmaktadır.
	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2024-2024	4.000.000		4.000.000	456.000	% 11,4	Proje kapsamında Belgenet Bakım ve Güncelleme işlemlerine ilişkin 2024 Yılı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Belgenet) Garanti ve Bakım Hizmeti Temini İşi için TÜRKSAT A.Ş. ile 22.03.2024 tarihinde 1.343.816,69 TL+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. Bakanlık Kurumsal İnternet Sitesine ilişkin 2024 yılı için web bakım hizmeti çalışmaları devam etmektedir. 2024 yılı için İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS) bakım, onarım ve güncelleme hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K60-230223	KÖYDES Yatırım İzleme Sisteminin İdamesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	2.500.000		2.500.000	0	% 0,0	2024 yılı 2. yarısı itibarı ile bakım idame sözleşmesi imzalanarak, bakım onarımı yapılacaktır.
2024K60-230229	Dijital Şehir İkizleri (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	İhale gerçekleştirilmiş olup sözleşme aşamasındadır.Proje yıl sonunda tamamlanacak olup tek hakediş yapılacaktır.2025 Yılı Yatırım Programı için Akıllı Şehir Dijital Yönetim Platformu Projesi teklif edilmektedir.
2024K60-230232	Derin Öğrenme Hava Fotoğrafi İşleme ve Modelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	4.500.000		4.500.000	0	% 0,0	Söz konusu proje ile ilgili olarak teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet çalışmaları başlatılmıştır. Gelen teklifler değerlendirildiğinde yaklaşık maliyetin proje bütçesinin çok üzerinde kaldığı tespit edilmiştir.
2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000		9.000.000	0	% 0,0	e-Plan Otomasyon Sistemleri halihazırda işleyen bir sistem olduğundan, sözleşmenin imzalandığı 22.05.2024 tarihinden itibaren, projede görev alacak personellerin görevlendirilmesi yapılmış, uygulama planı ve proje takvimi hazırlanmış, çağrı merkezi, destek, bakım ve yazılım geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. e-Plan Otomasyon Sistemleri OCR Aracı ve Entegre Arama Motoru Geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Üç aylık hakediş dönemlerinde 2024 yılında üç 2025 yılında 4 hakediş yapılacak olup henüz hakediş yapılmamıştır.
2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000		13.500.000	0	% 0,0	İş 2024-2025 yıllarını kapsamaktadır. İhale bedeli KDV dahil 29.748.000 TL'dir. İşin 2024 yılı bütçesi azaltılmış, 2025 yılındaki bütçesine aktarılmış, toplam bütçesi korunmuştur. İhale kapsamında 2024 yılı sonunda ödenecek hakedişten KDV dahil 1.374.000 eksik kalmaktadır. 2025 Yılı yatırım programına revize proje fişi olarak teklif edilmiştir.
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4 (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2026	200.000.000		45.000.000	29.917.050	% 66,5	Proje kapsamında çalıştırılan danışman personel Bakanlık yazılımlarına ait bakım ve güncellemeleri yapmaya devam etmektedir. Proje ihalesi 18.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, sözleşmesi 09.01.2024 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamında şu ana dek toplam 29.680.704 TL tutarında iki hakediş ödemesi yapılmıştır. İş 31.12.2026 yılında tamamlanacaktır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	5.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanmış olup proje yönetim planı hazırlanmaktadır.Proje 2024-2025 yıllarını kapsamaktadır.
2024K09-229670	Akıllı Şehir Standartlarının Yaygınlaştırılması (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	4.500.000		4.500.000	0	% 0,0	İşin başlangıcından bu yana proje ekibi oluşturulmuş, proje yöneticisi ve akademik danışmanlara yönelik görevlendirmeler yapılmış, proje takvimi ve uygulama planı hazırlanmıştır. İşin ihalesi gerçekleştirilmiş olup 4.393.200 TL bedel ile 22.05.2024 tarihinde sözleşme altına alınmıştır. İşin bitiş tarihi 06.12.2024'tür.
2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	9.500.000		3.600.000	0	% 0,0	Bu proje, Mobil Altyapı Geliştirme projesi ile birleştirilerek ihaleye çıkacaktır. Yaklaşık maliyet işlemleri tamamlanmış olup, ihale aşamasındadır.
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	238.928.000	43.060.000	148.500.000	4.434.516	% 3,0	
9 Proje		DÖNER SERMAYE	465.162.000	15.662.000	291.500.000	42.669.330	% 14,6	
		GENEL TOPLAM	704.090.000	58.722.000	440.000.000	47.103.846	% 10,7	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	48.837.000	30.581.000	8.203.000	866.410	% 10,6	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibarıyla sona ermiştir. Geri kalan 3 bileşenin uygulaması devam etmektedir.
AB katkısı			276.719.000	173.278.000	46.479.000	4.909.657	% 10,6	
2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2026	8.857.524.000	6.045.479.000	1.952.865.000	401.315.569	% 20,6	Açıklamalar aşağıda verilmiştir.
	AB Hibesi		7.537.461.000	5.139.151.000	1.663.405.000	341.118.234	% 20,5	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		551.656.000	378.966.000	120.175.000	25.090.737	% 20,9	
	Mahalli İdare Katkısı		768.407.000	527.362.000	169.285.000	35.106.597	% 20,7	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	48.837.000	30.581.000	8.203.000	866.410	% 10,6	
	AB KATKISI		276.719.000	173.278.000	46.479.000	4.909.657	% 10,6	
	İçmesuyu Sektörü Projesi		8.857.524.000	6.045.479.000	1.952.865.000	401.315.569	% 20,6	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	Çarşamba Atıksu Tesisi	2019-2023	287.358.000	282.208.000	5.150.000	145.508	% 2,8	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 19.09.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		244.078.000	239.878.000	4.200.000	123.682		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.432.000	16.932.000	500.000	8.730		
	Mahalli İdare Katkısı		25.848.000	25.398.000	450.000	13.096		
Alt proje-2	Bandırma Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	577.544.000	473.044.000	104.500.000	26.851.854	% 25,7	Proje kapsamında yer alan entegre su projesi 2. yapım işinin kesin kabulü 13.10.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi yapım işinin ve müşavirlik sözleşmelerinin uygulaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		490.688.000	402.088.000	88.600.000	22.824.076		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		34.882.000	28.382.000	6.500.000	1.611.111		
	Mahalli İdare Katkısı		51.974.000	42.574.000	9.400.000	2.416.667		
Alt proje-3	Bismil Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	272.545.000	270.865.000	1.680.000	1.265.479	% 75,3	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 04.01.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		231.536.000	230.236.000	1.300.000	1.075.657		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		18.533.000	18.283.000	250.000	85.420		
	Mahalli İdare Katkısı		22.476.000	22.346.000	130.000	104.402		
Alt proje-4	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	610.460.000	340.280.000	263.900.000	50.737.824	% 19,2	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		518.739.000	289.239.000	224.200.000	43.127.151		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.716.000	20.416.000	15.900.000	3.044.269		
	Mahalli İdare Katkısı		55.005.000	30.625.000	23.800.000	4.566.404		
Alt proje-5	Elbistan Atıksu Tesisi	2019-2024	531.622.000	491.372.000	40.250.000	15.004.842	% 37,3	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 30.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		451.760.000	417.660.000	34.100.000	12.754.115		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		35.925.000	33.175.000	2.750.000	1.012.827		
	Mahalli İdare Katkısı		43.937.000	40.537.000	3.400.000	1.237.900		
Alt proje-6	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2025	679.445.000	487.035.000	182.250.000	65.774.752	% 36,1	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		577.480.000	413.980.000	154.900.000	55.908.539		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		40.822.000	29.222.000	10.950.000	3.946.485		
	Mahalli İdare Katkısı		61.143.000	43.833.000	16.400.000	5.919.728		
Alt proje-7	İğdır Atıksu Tesisi	2019-2024	540.492.000	533.522.000	6.970.000	1.155.000	% 16,6	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 21.07.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		459.295.000	453.495.000	5.800.000	981.750		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.612.000	36.012.000	600.000	77.963		
	Mahalli İdare Katkısı		44.585.000	44.015.000	570.000	95.288		
Alt proje-8	Kastamonu Atıksu Tesisi	2019-2024	415.389.000	403.919.000	11.470.000	961.830	% 8,4	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 07.06.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		353.032.000	343.332.000	9.700.000	817.555		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		24.985.000	24.235.000	750.000	57.710		
	Mahalli İdare Katkısı		37.372.000	36.352.000	1.020.000	86.565		

Alt proje-9	Niksar Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	563.745.000	558.295.000	20.120.000	20.085.227	% 99,8	Proje kapsamın yer alan şebeke ve kanalizasyon hattı yapım işi olan 2. yapım işinin kesin kabulü 30.06.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi yapım işinin ise geçici kabulü 31.12.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. Projenin sonuna
	AB Hibesi		478.952.000	474.552.000	17.100.000	17.072.443		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		34.047.000	33.497.000	1.210.000	1.205.114		
	Mahalli İdare Katkısı		50.746.000	50.246.000	1.810.000	1.807.670		
Alt proje-10	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	647.382.000	381.897.000	258.050.000	38.607.137	% 15,0	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		550.219.000	324.614.000	219.300.000	32.816.066		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		38.868.000	22.913.000	15.500.000	2.316.428		
	Mahalli İdare Katkısı		58.295.000	34.370.000	23.250.000	3.474.642		
Alt proje-11	Sivas Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	296.108.000	296.093.000	442.270.000	57.273.268	% 12,9	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 06.03.2024 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		251.685.000	251.680.000	378.290.000	48.682.277		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.770.000	17.765.000	27.340.000	3.436.396		
	Mahalli İdare Katkısı		26.653.000	26.648.000	36.640.000	5.154.594		
Alt proje-12	Sorgun Atıksu Tesisi	2019-2023	212.650.000	212.635.000	15.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 11.08.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		180.745.000	180.740.000	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.763.000	12.758.000	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		19.142.000	19.137.000	5.000	0		
Alt proje-13	Şırnak Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	271.506.000	271.491.000	15.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin kesin kabulü 17.11.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		230.773.000	230.768.000	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		18.330.000	18.325.000	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		22.403.000	22.398.000	5.000	0		
Alt proje-14	Trabzon Su Tesisi	2019-2025	547.955.000	373.805.000	163.300.000	5.971.054	% 3,7	Proje kapsamında yer alan yapım işinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		465.735.000	317.735.000	138.800.000	5.075.396		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		32.888.000	22.428.000	9.800.000	358.263		
	Mahalli İdare Katkısı		49.332.000	33.642.000	14.700.000	537.395		
Alt proje-15	Yüksekova Atıksu Tesisi	2019-2024	286.782.000	270.582.000	16.200.000	15.538.558	% 95,9	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 09.09.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		243.595.000	229.995.000	13.600.000	13.207.774		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		19.464.000	18.264.000	1.200.000	1.048.853		
	Mahalli İdare Katkısı		23.723.000	22.323.000	1.400.000	1.281.931		
Alt proje-16	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2025	594.758.000	75.878.000	365.710.000	56.752.215	% 15,5	Proje kapsamında ; Müşavirlik işi sözleşmesi 30.08.2023 tarihinde başlamıştır. 2. yapım işi olan yağmursuyu hatları yapımı işi 06.11.2023 tarihinde başlamıştır.1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapım işi ise 22.01.2024 tarihinde başlamıştır.Uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		509.284.000	64.984.000	313.200.000	48.239.383		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.027.000	4.587.000	22.110.000	3.830.775		
	Mahalli İdare Katkısı		49.447.000	6.307.000	30.400.000	4.682.058		
Alt proje-17	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2025	411.993.000	322.558.000	71.000.000	45.191.022	% 63,6	Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu toplama hattı yapım işinin geçici kabulü 03.03.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi inşaatının uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		350.075.000	274.175.000	60.300.000	38.412.369		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		27.892.000	21.772.000	4.800.000	3.050.394		
	Mahalli İdare Katkısı		34.026.000	26.611.000	5.900.000	3.728.259		
Alt proje-18	Aksaray Entegre Su Projesi	2021-2025	1.109.790.000	0	15.000	0	% 0,0	
	AB Hibesi		949.790.000	0	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		67.700.000	0	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		92.300.000	0	5.000	0		

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023F00-198507	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2024-2024	9.500.000		9.500.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2024-2024	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Ayvalık Arboretum Proje Temini	2024-2024	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Proje Temini	2024-2024	1.500.000		1.500.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2025	49.600.000	18.600.000	17.000.000	10.740.203	% 63,2	10.740.202,99 TL ödemesi yapılmıştır. 2024 yılı içerisinde iş tamamlanacaktır.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2025	29.000.000	0	10.900.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2024F00-224157	Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2024-2024	8.000.000		8.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2024F00-224162	Köyceğiz Çevre ve Sahil Düzenleme (Turizm Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2024F00-224165	Büyükada Meydan Düzenleme ve Cephe Yenileme (Turizm Sektörü)	2024-2024	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (*.*.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2026	280.258.000	62.658.000	60.000.000	0	% 0,0	
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2026	179.647.000	36.647.000	40.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2026	100.611.000	26.011.000	20.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (*.*.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2026	120.264.000	33.764.000	53.500.000	7.000.000	% 13,1	
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2026	77.264.000	21.764.000	33.500.000	7.000.000	% 20,9	Çalışmalar devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2026	43.000.000	12.000.000	20.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2025	46.951.000	23.151.000	11.520.000	708.000	% 6,1	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2025	11.950.000	5.600.000	3.240.000	0	% 0,0	1)Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Ortofoto Harita Üretimi Ve Hâlihazır Harita Alımı İşi(iş ihale edildi) 2)Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Göcek ve Dalaman Koyları Ortofoto Harita Üretimi ve Hâlihazır Harita Alımı İşi ihale edilmesi için Yönetim hizmetleri daire başkanlığına yazışmalar yapılmaktadır.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2025	16.480.000	10.400.000	3.140.000	708.000	% 22,5	1-Datça-Bozburun ÖÇKB, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları ve Kentsel Tasarım Rehberi İşi (130 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 2-Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İşi (560 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 3-Muğla İli, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Arazi Kullanıma Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu Hazırlanması İşi (46132 Ha) (İş Ödemesi Yapıldı 590.000 +Kdv) 4-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İşi (46132 Ha) (İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor) 5-İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor 6-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı ÖÇKB, Ballıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri "Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin" 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (450 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 7-Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yalıncağ-Karakusunlar Mahallesi Adalet Akademisi İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (26,85 Ha) (1. Aşama (İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi) Tamamlandı İmar Planı İşi Devam Ediyor) 8-Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu İşi (740.309 Ha) (İhale Aşamasında) 9-İmar Planı Paftalarının Taranması Ve Koordinatlandırılması İşi (İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor) 10-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kıyı Kesimi 1.Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (Sözleşme Aşamasında)
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2025	6.321.000	2.151.000	1.900.000	0	% 0,0	
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2025	12.200.000	5.000.000	3.240.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K10-90489	Fethiye İç Körfezi Deniz Dibi Tarama ve Temizliği (Çevre Sektörü)	2024-2024	1.800.000		1.800.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	2021-2024	53.463.000	9.544.000	11.199.100	0	% 0,0	
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	48.463.000	9.544.000	9.032.100	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2024	5.000.000		2.167.000	0	% 0,0	Proje ihale aşamasındadır.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	1.152.000	657.000	495.000	136.876	% 27,7	
	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları	2022-2024	1.152.000	657.000	495.000	136.876	% 27,7	Proje 31.06.2024 tarihi itibarıyla fiili tamamlanmış olup, Sonuç Raporu ve Ekleri incelenmek üzere teslim edilmiştir. Muayene kabul İşlemlerinden sonra kalan % 30 luk ödemesi yapıldı. (136.875.60 TL ödeme Alt proje olan ve 2023 yılında tamamlanan Foça ÖÇK Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi Kesin Hakediş Tutarıdır.)
2016K10-150495	İklim Değişikliğinin Ekosisteme Etkisi Araştırması (Çevre Sektörü)	2021-2024	3.377.500	2.275.000	1.102.500	0	% 0,0	Proje tamamlanmıştır.Son hakediş ödemesi yapılacaktır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2025	10.700.000	3.978.000	2.700.000	0	% 0,0	
	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı	2017-2025	10.700.000	3.978.000	2.700.000	0	% 0,0	"Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Erzurum, Bingöl, Bayburt, Iğdır, Siirt, Sinop, Amasya İllerinde Bulunan Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 24.05.2023 tarihinde Online Çevre Proje İnşaat Mühendislik Danışmanlık Yazılım Bilişim ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 1.374.000,00 TL+KDV (1.621.320,00 TL KDV dahil) 1. Hakediş Bedeli (%40) 549.6000,00 TL + KDV (659.520,00 TL KDV dahil) 1. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 15.12.2023 tarihinde ve 8242342 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. Proje çalışmaları 29.05.2024 tarihinde tamamlanmış olup 2. Hakediş Bedeli (%60) 824.400,00 TL+KDV 2024 yılında ödenecektir. "Mersin İli, Silifke İlçesi, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" çalışmaları 09.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup Hakediş ödemesi (%100) 300.000,00 TL+KDV (360.000,00 KDV dahil) 2024 yılında yapılacaktır. 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan "Antalya, Karaman, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" hizmet alımı işine ilişkin ihale işlemleri devam etmektedir. (2024-2025) 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan "Balıkesir, Bartın, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop ve Zonguldak İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" hizmet alımı işine ilişkin ihale yapılmış olup işlemler devam etmektedir. (2024-2025)
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2025	8.500.000		3.420.000	0	% 0,0	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2024-2025	3.200.000		990.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlanması ve Yaklaşık Maliyetin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ve ihale hazırlık aşaması devam etmektedir.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2024-2025	2.500.000		1.170.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlanması ve Yaklaşık Maliyetin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ve ihale hazırlık aşaması devam etmektedir.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2024-2025	2.800.000		1.260.000	0	% 0,0	2024-2025 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan "Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı Yönetim Planının Hazırlanması Projesi" hizmet alımı işine ilişkin ihale işlemleri başlatılmıştır. (2024-2025)

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	11.000.000	7.794.000	5.000	0	% 0,0	Projenin arazi çalışmaları devam etmekte olup projenin 2025 yılının başında bitmesi öngörülmektedir.
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2027	1.704.100.000	405.000.000	285.190.000	61.180.490	% 21,5	2024 yılının ilk 6 ayında hakedişli olarak 109.054.650,96 TL ödenmiş olup iş devam etmektedir. Yıl içerisinde Protokol doğrultusunda Hakediş Ödemeleri yapılmaya devam edecektir.
	Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)		850.000.000	125.000.000	146.090.000	46.265.794	% 31,7	
	Döner Sermaye Ödeneği		854.100.000	280.000.000	139.100.000	14.914.696	% 10,7	
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı		800.000.000	150.000.000	200.000.000	50.000.000	% 25,0	
2024K10-225388	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2024	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	560.000		560.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi hazırlanmaktadır.
	Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	535.000		535.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi hazırlanmaktadır.
	Patara ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	1.040.000		1.040.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi hazırlanmaktadır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Belek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	800.000		800.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi hazırlanmaktadır.
	Göksu Deltası ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	1.065.000		1.065.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi hazırlanmaktadır.
2024K10-225397	Marmara Adası Maden Ocağı Rehabilitasyon (Çevre Sektörü)	2024-2024	40.000		40.000	0	% 0,0	Ödeneği Revize edilerek Marmara Projelerinde Kullanılacak.
2024K10-225398	Marmara Denizinde Deniz Çayırı Alanı Tespiti (Çevre Sektörü)	2024-2024	5.960.000		5.960.000	0	% 0,0	Proje başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Projeye ait 1.Hakediş hazırlanmış olup, yükleniciye ödeme sürecindedir.
2024K10-225399	Marmara Denizi Denizanası Artışı Araştırılma FAZ-II (Çevre Sektörü)	2024-2024	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Proje başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Projeye ait 1.Hakediş hazırlanmış olup, yükleniciye ödeme sürecindedir.
2024K10-225400	Mağaraların Araştırılması (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2024	2.700.000		2.700.000	0	% 0,0	İhalesi yapılmış olup sözleşme imzalanma aşamasındadır.
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgözü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	8.500.000		2.677.500	0	% 0,0	İhale aşamındadır.
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	6.675.000		1.800.000	0	% 0,0	İhale aşamındadır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme (Çevre Sektörü)	2024-2026	35.000.000		6.300.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.
2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme (**Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	2.900.000		1.200.000	0	% 0,0	Proje başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Projeye ait 1.Hakediş hazırlanmış olup, yükleniciye ödeme sürecindedir.
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	3.000.000		1.500.000	0	% 0,0	09.05.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış olup arazi çalışmaları devam etmektedir. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 06.10.2024.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2024-2026			5.000.000	0	% 0,0	
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.145.218.500	183.205.000	257.504.100	57.850.872	% 22,5	
8 Proje		DÖNER SERMAYE	1.278.222.000	384.216.000	262.005.000	21.914.696	% 8,4	
		GENEL TOPLAM	2.423.440.500	567.421.000	519.509.100	79.765.568	% 15,4	
1 Proje		Belediye Katkısı	800.000.000	150.000.000	200.000.000	50.000.000	% 25,0	
		Kamu laştırma	0	0	5.000.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2025	7.899.000	5.100.000	450.000	0	% 0,0	YERELBİLGİ Sistemi ile her yıl 11 adet form düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç olan veriler Sistem ile toplanacaktır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	20.000.000	6.500.000	4.500.000	0	% 0,0	Söz konusu proj ile ilgili olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları beklenmişti. Yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ancak gelinen noktada Cumhurbaşkanlığının 2024/7 Sayılı ve Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesi yayımlanmış olup yapılacak ihaleler durdurulmuştur.
2024K07-224132	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	5.000.000.000		5.000.000.000	0	% 0,0	KÖYDES Projesi program Olurları Bakan bey tarafından 10.07.2024 tarihinde imzalandığı için bu tarihten itibaren proje iş ve işlemlerine iller tarafından başlama yapılacaktır. Şu anda herhangi bir harcama yapılmamıştır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	5.027.899.000	11.600.000	4.950.000	0	% 0,0	

Dipnot: 652

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K01-225160	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2024-2024	26.370.000		26.370.000		% 0,0	
	Harita Alımları	2024-2024	135.000		135.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2024-2024	135.000		135.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2024-2024	26.100.000		26.100.000	9.000.000	% 34,5	26.100.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış olup, 9.000.000.-'e ödenek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgili tertibine aktarma yapılmıştır. 17.100.000.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2024-2026			250.000.000	221.260.590	% 88,5	250.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 221.260.590.-'e ödeme yapılmış olup, 28.739.410.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2024-2026			2.000.000	2.000.000	% 100,0	2.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, ve harcanmıştır. Kullanılabilir ödenek bulunmamaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	26.370.000	0	26.370.000	0	% 0,0	
Kamu laştırma			0	0	252.000.000	223.260.590	% 88,6	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormanlık Sektörü)	2023-2026	37.050.000	2.850.000	7.115.000	0	% 0,0	
	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2026	29.500.000	1.500.000	5.000.000	0	% 0,0	UASİS Yazılımı Bakım Hizmeti işi kapsamında 03.05.2024 tarihinde yüklenici "TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi" ile KDV hariç 5.700.508,90 TL bedel ile sözleşme imzalanmış ve bir yıllık bakım hizmet süreci başlamıştır. UASİS İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında 2024 yılı için 5.000.000 TL bütçe ayrılmış olup sözleşme gereği çalışma raporu-1 kapsamındaki hizmetlerin tamamlanmasını müteakip ile 4.160.000 TL + KDV ödeneğinin harcanması planlanmaktadır.
	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2025	1.650.000	550.000	495.000	0	% 0,0	
	Toprak Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2023-2025	1.650.000	550.000	495.000	0	% 0,0	Alt yapı hazırlıkları ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasındaki veri transfer uyum çalışmaları tamamlanmış olup devamı için çalışmalar sürdürülmektedir. Projede 2024 yılı içerisinde harcama yapılması planlanmamaktadır.
	Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası	2023-2025	750.000	250.000	225.000	0	% 0,0	
	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	2024-2026	3.500.000		900.000	0	% 0,0	
2023A05-196786	Bolaman ve Çekerek Nehri Havzaları Rehabilitasyonu (Ormanlık Sektörü)	2023-2028	10.000.000	1.635.000	250.000	0	% 0,0	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormanlık Sektörü)	2024-2026	60.580.000		27.380.000	1.103.080	% 4,0	
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2024-2026	60.400.000		27.200.000	1.103.080	% 4,1	Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Ayazini Köyü Sel kontrol Revize Projesi tamamlanmıştır. 3 adet çığ tehlike değerlendirme projesi Genel Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır. 5 adet projenin ihalesi yapılmış olup uygulama aşamasına başlanmıştır. Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Oluşturulması kapsamında rehber kitap hazırlanmıştır. 2024 yılında hedeflenen 2 projenin etüt çalışmaları devam etmektedir. 2024 yılı için 1.420.000 TL bütçe ayrılmış olup hizmetlerin tamamlanması şartı ile KDV Dahil 1.420.000 TL lik ödeneğin harcanması planlanmaktadır. Önceki yıllarda tesis edilen Aksaray ve Ankara(Pursaklar) yutak alanlarına ait sahalarda bakım çalışmaları yıl sonuna kadar yapılması planlanmaktadır. Kayseri, Çankırı ve Kırşehir illerinde Yeni Karbon Yutak Alanları yıl sonuna kadar oluşturulacak olup projelendirme süreci devam etmektedir. Yeni kurulan taşra birimlerinin entegrasyonunun sağlanması kapsamında Konya ilinde 3-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında Merkez ve Taşra Teşkilatı Koordinasyon ve Proje Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2024-2024	180.000		180.000	0	% 0,0	
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi (Ormanlık Sektörü)	2024-2027	46.000.000		7.000.000	0	% 0,0	Proje başlangıç çalışmayı yıl içinde gerçekleştirecektir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	107.630.000	4.485.000	34.745.000	1.103.080	% 3,2	
1 Proje		UNDP HİBESİ	46.000.000	0	7.000.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2024	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	
	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (**.Döner Sermaye)	2024-2025	57.629.000		20.192.000	0	% 0,0	İhalesi Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 12.06.2024 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 43.850.000 TL (KDV dahil 57.608.400 TL) üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır.
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	151.475.000		135.000.000	0	% 0,0	Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 07.02.2024 tarihli ve E-16517702-602.07.04-8696978 sayılı yazı ile ihale talimatı verilmiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği		5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		146.475.000		130.000.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-224617	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2024-2024	6.300.000		6.300.000	6.157.577	% 97,7	
	Hizmet Binası Onarımı	2024-2024	7.200.000		7.200.000	6.115.875	% 84,9	
2024G00-224585	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2024-2024	3.060.000		3.060.000	0	% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	21.560.000	0	21.560.000	12.273.452	% 56,9	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	205.604.000	500.000	151.192.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	227.164.000	500.000	172.752.000	12.273.452	% 7,1	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2025	150.000.000		80.000.000	0	% 0,0	
2024G00-224585	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2024-2024	90.000		90.000	0	% 0,0	
2024K09-224617	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2024-2024	0		0			
	Hizmet Binası Onarımı	2024-2024	0		0			
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	90.000	0	90.000	0	% 0,0	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	150.000.000	0	80.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	150.090.000	0	80.090.000	0	% 0,0	
