



2024 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

3. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2024 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.510.094.000,00	12.279.472.910,94	8.958.133.018,18	% 73,0
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.503.685.000,00	1.712.702.993,12	1.176.040.925,55	% 68,7
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	725.012.000,00	1.732.137.654,43	852.369.806,10	% 49,2
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.268.000,00	1.636.054.498,03	817.104.910,17	% 49,9
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	104.744.000,00	96.083.156,40	35.264.895,93	% 36,7
05	CARİ TRANSFERLER	224.845.034.000,00	225.282.678.402,72	59.729.703.806,40	% 26,5
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	219.740.028.000,00	219.740.028.000,00	55.149.799.000,00	% 25,1
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	1.771.000.000,00	1.771.000.000,00	992.584.476,87	% 56,0
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	2.750.000.000,00	3.199.781.000,00	3.199.779.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	356.000.000,00	342.908.000,00	239.287.500,00	% 69,8
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	179.193.000,00	179.193.000,00	115.632.844,45	% 64,5
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	46.631.000,00	47.000.402,72	31.645.985,08	% 67,3
	İskan Uygulamaları Ödeneği	1.818.000,00	1.818.000,00	25.000,00	% 1,4
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	364.000,00	950.000,00	950.000,00	% 100,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.624.871.000,00	94.555.928.631,83	80.871.362.277,76	% 85,5
	Bakanlık Yatırım Programı	14.337.871.000,00	14.676.185.747,10	6.222.589.216,11	% 42,4
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	287.000.000,00	307.000.000,00	270.722.735,46	% 88,2
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	74.245.000.000,00	69.621.166.967,01	% 93,8
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	338.000.000,00	276.181.091,67	% 81,7
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	4.989.742.884,73	4.480.702.267,51	% 89,8
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	18.282.187.000,00	21.023.623.165,50	18.671.708.513,90	% 88,8
	Bakanlık Yatırım Programı	428.271.000,00	353.901.000,00	172.450.564,54	% 48,7
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	895.658.134,70	% 62,2
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	700.013.304,50	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	300.000.000,00	300.000.000,00	10.000.000,00	% 3,3
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	113.916.000,00	113.916.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	67.100.000,00	67.099.999,66	% 100,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	2.048.692.861,00	1.526.499.815,00	% 74,5
08	BORÇ VERME	250.500.000,00	225.451.400,00	83.581.000,00	% 37,1
GENEL TOPLAM		271.741.383.000,00	356.811.995.158,54	170.342.899.347,89	% 47,7



BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

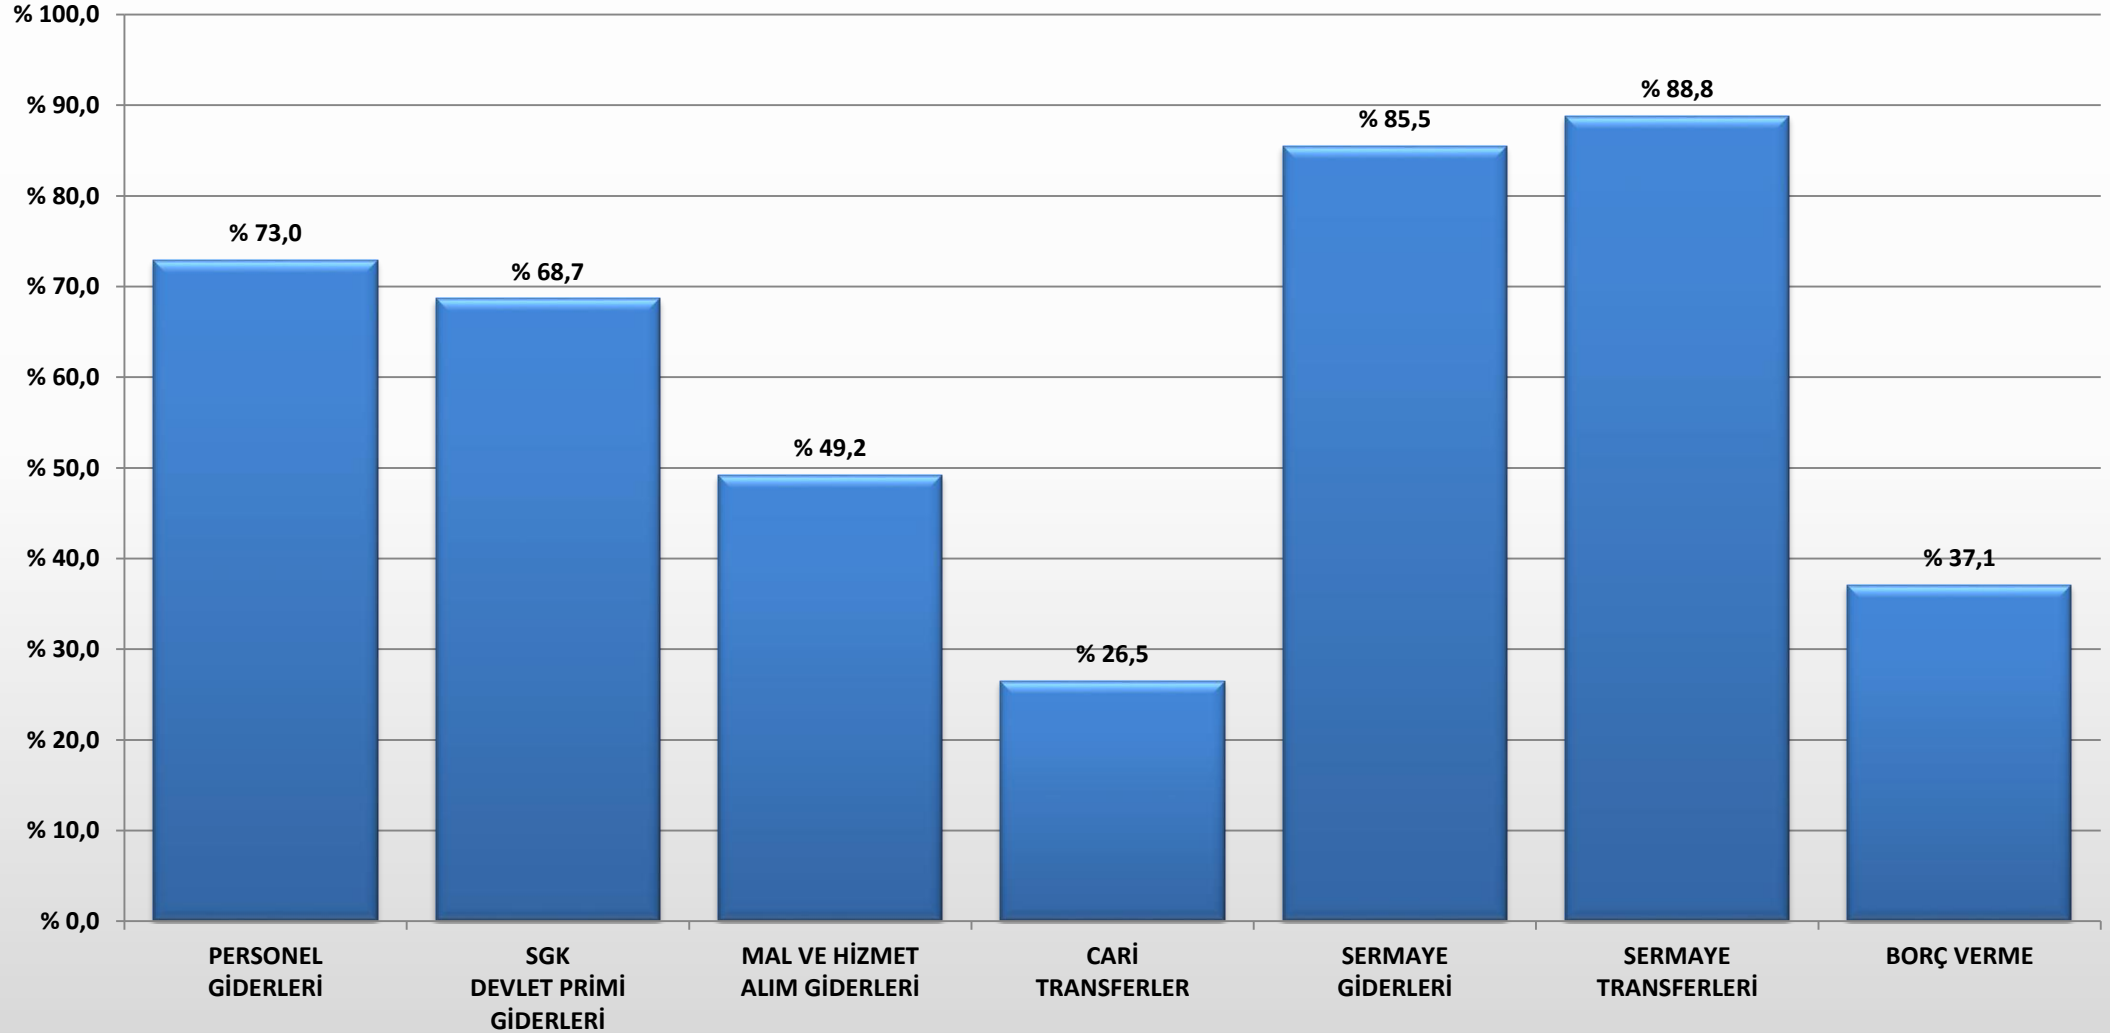




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2024 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2024 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	5	63.596.000,00	34.528.000,00	2.137.080,00	% 6,2
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	13	1.213.940.000,00	196.999.500,00	22.475.374,00	% 11,4
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	3	620.160.000,00	237.790.000,00	44.500.543,00	% 18,7
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	24	59.020.110.000,00	14.397.665.400,00	6.253.126.292,00	% 43,4
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	7.250.000,00	5.675.000,00	1.822.302,00	% 32,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	19	704.090.000,00	440.000.000,00	90.092.724,00	% 20,5
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	9.183.080.000,00	8.203.000,00	4.413.795,00	% 53,8
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	28	3.223.440.500,00	523.109.100,00	299.060.494,00	% 57,2
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	5.027.899.000,00	4.950.000,00	240.000,00	% 4,8
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	26.370.000,00	25.870.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	4	153.630.000,00	34.745.000,00	1.774.698,80	% 5,1
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	227.164.000,00	172.752.000,00	13.711.777,00	% 7,9
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	3	150.090.000,00	80.090.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	108	79.620.819.500,00	16.162.377.000,00	6.733.355.079,80	% 41,7
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	76	76.916.707.500,00	15.078.406.000,00	6.443.529.299,80	% 42,7
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	32	2.704.112.000,00	1.083.971.000,00	289.825.780,00	% 26,7
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		287.000.000,00	270.722.735,46	% 94,3



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

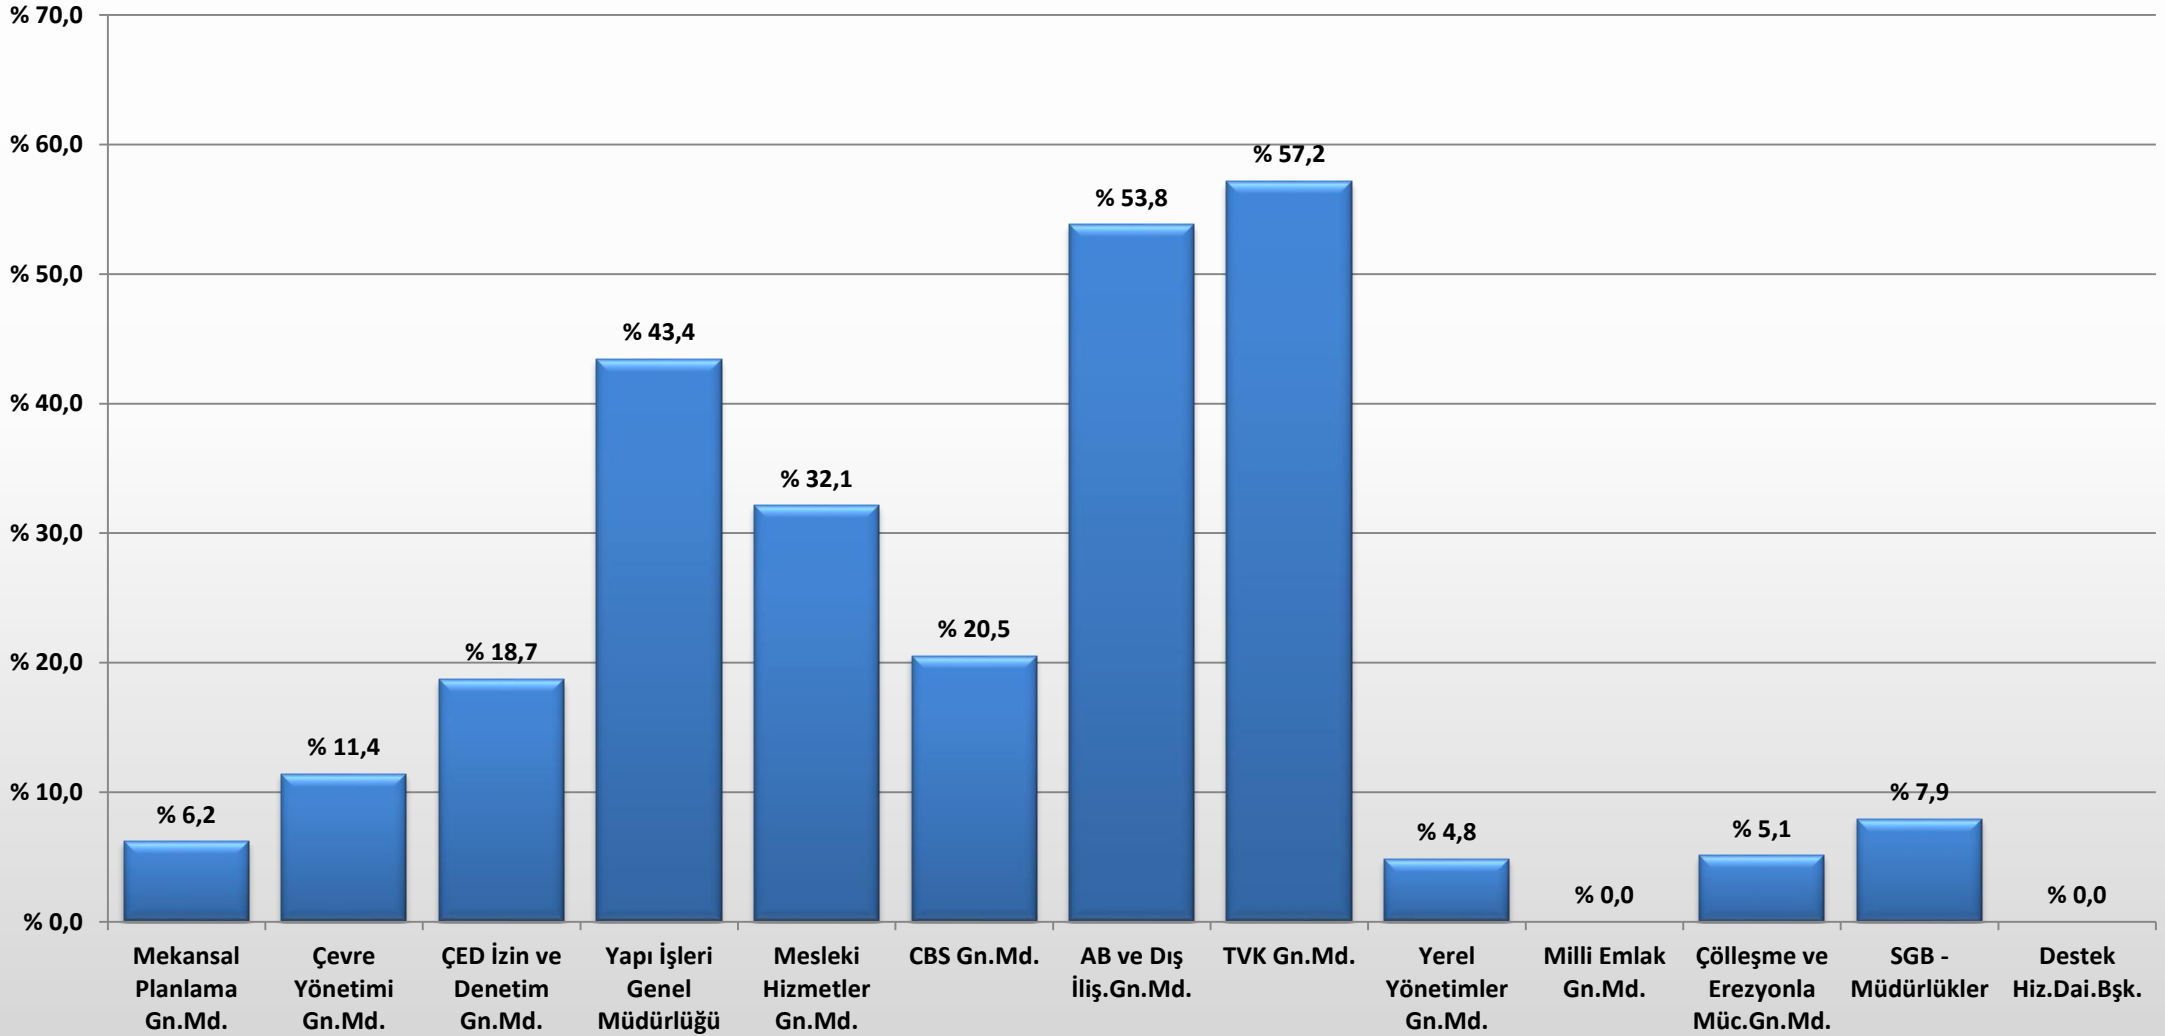



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2024 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	196.686.000,00	193.320.000,00	130.153.830,47	% 67,3
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	6.767.900.000,00	7.899.519.170,90	5.255.507.568,18	% 66,5
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	616.707.000,00	589.311.835,29	313.686.172,44	% 53,2
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	14.615.447.000,00	93.719.056.566,16	80.153.677.989,11	% 85,5
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	270.000,00	5.814.000,00	5.683.657,40	% 97,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	160.201.000,00	160.126.000,00	116.831.410,57	% 73,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	334.306.000,00	317.806.000,00	129.973.683,14	% 40,9
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	275.611.000,00	342.916.000,00	252.907.991,22	% 73,8
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	498.614.000,00	446.068.977,40	292.435.396,88	% 65,6
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	64.031.000,00	63.481.000,00	44.641.884,61	% 70,3
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	466.763.000,00	493.633.000,00	394.217.395,53	% 79,9
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	135.579.000,00	132.980.200,00	84.459.371,55	% 63,5
Personel Genel Müdürlüğü	66.350.000,00	66.350.000,00	53.745.921,75	% 81,0
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	84.872.000,00	1.005.872.000,00	748.703.187,11	% 74,4
Özel Kalem Müdürlüğü	94.510.000,00	94.537.400,00	52.903.078,18	% 56,0
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	616.808.000,00	959.951.886,82	423.475.800,43	% 44,1
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	20.552.000,00	20.552.000,00	14.583.555,21	% 71,0
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	119.018.000,00	119.053.000,00	88.721.588,45	% 74,5
Strateji Geliştirme Başkanlığı	236.148.917.000,00	236.136.411.000,00	71.432.479.231,50	% 30,3
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	8.776.000,00	10.379.600,00	8.166.754,97	% 78,7
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	54.199.000,00	54.199.000,00	39.889.461,60	% 73,6
İl Müdürlükleri	10.360.652.000,00	13.941.279.321,97	10.278.971.259,70	% 73,7
Yurtdışı Teşkilatı	34.614.000,00	39.377.200,00	27.083.157,89	% 68,8
TOPLAM	271.741.383.000,00	356.811.995.158,54	170.342.899.347,89	% 47,7



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

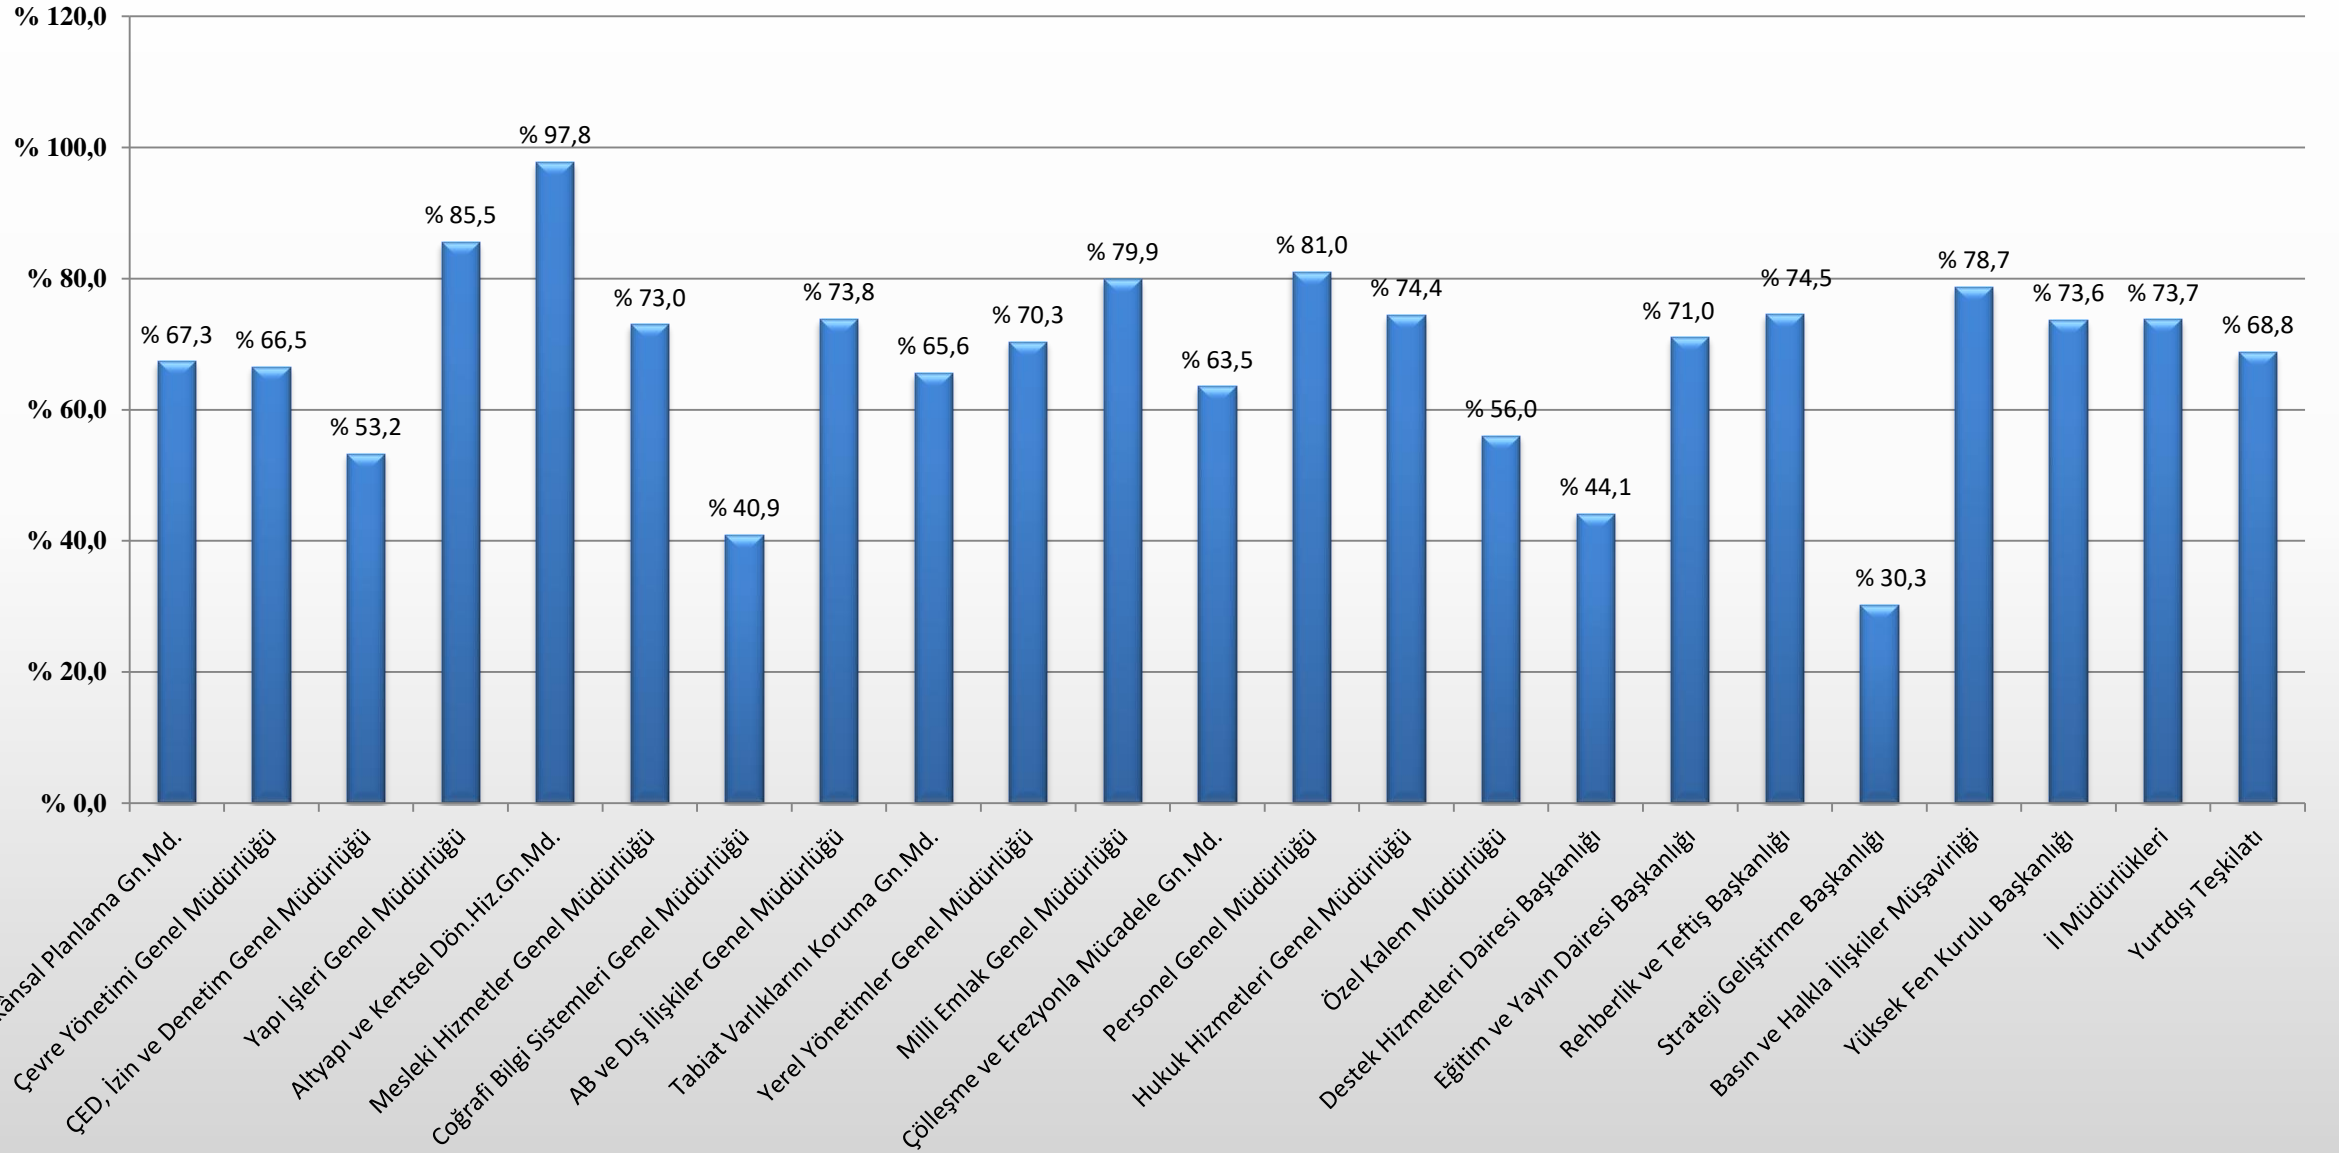

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Harcama Birimi Bazında

2024 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2025	28.456.000	9.286.000	15.327.000	1.881.000	% 12,3	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2025	19.416.000	3.486.000	12.087.000	1.881.000	% 15,6	<p>Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması, Genel Müdürlüğümüz kontrol ve denetiminde, 1 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile 81 İl Müdürlüğümüz, Belediyeler ve Özel Sektör tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporu onay sürecine ilişkin tüm iş ve işlemler, kâğıt ortamının yanı sıra eş zamanlı olarak Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması üzerinden de gerçekleştirilmektedir.</p> <p>Tüm veri, harita vb. girişler ve iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı bu sistem üzerinden yürütülmekte olup etüt raporlarına ait sayısal verilerin tamamı ortak bir portal altında depolanmakta ve ilgili paydaş kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.</p> <p>Ayrıca afet tehlikelerinin belirlenmesi ve planlamada dikkate alınmasına ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda verilerin analiz edilebilmesi amacıyla "Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde Veri Analizi" projesi 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmış olup, proje çalışmalarına 11.01.2024 tarihi itibarı ile başlamıştır.</p> <p>20.03.2024 tarihinde projenin iş kalemlerine göre %15'lik kısmı tamamlanmış olup, ilk hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Bu kapsamda, - YERBİS Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı hazırlanmış ve - YERBİS uygulaması açık kaynak kodlu (PostgreSQL) olarak yazılmıştır. Yazılım geliştirme ve güncelleme çalışmaları proje takvimine uygun devam etmektedir.</p>
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2024	9.040.000	5.800.000	3.240.000	0	% 0,0	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Projesi için yaklaşık maliyete yönelik fiyat teklifleri alınmış olup yaklaşık maliyetin projenin 2024 yılı bütçesinden fazla olması nedeniyle proje gerçekleştirilememektedir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2025	18.000.000	1.000.000	10.800.000	0	% 0,0	<p>2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan “Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi- Etap 1” projesi ile 3 yerleşim alanında yer alan aktif fay zonları 1/1.000 ölçekte haritalanacak, fay sakınım zonları belirlenerek Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS) üzerinden ilgili kurum/kuruluşların kullanımına açılacaktır.</p> <p>2023 yılında projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet belirlenebilmesi için müellif firmalardan teklif mektupları alınarak ihale süreci başlatılmış ancak bütçe yetersizliği nedeniyle ihale süreci tamamlanamamıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe talebinde bulunulmuştur. Arttırılan bütçe ile yeniden teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır, ancak bu süreçte de tasarruf tedbirleri nedeniyle proje bütçesinde tekrar kesintiler meydana gelmiştir.</p> <p>Düzenlenen proje bütçesine uygun olacak şekilde projenin Teknik Şartnamesi tekrar revize edilerek ihale süreci başlatılmış, ancak ön yeterlilik başvurusu yapan istekli sayısı yetersizliği nedeniyle ihale gerçekleştirilememiştir. Projenin yapılabilmesi için 2024 yılı Eylül ayı içerisinde tekrar piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenmiştir.</p> <p>Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan belirlenen yaklaşık maliyet doğrultusunda proje bütçesinin tekrar revize edilmesi talebinde bulunulmuştur.</p>
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2025	6.390.000	1.000.000	4.401.000	256.080	% 5,8	Proje devam etmektedir.
	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2025	6.390.000	1.000.000	4.401.000	256.080	% 5,8	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması (**Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	5.250.000		2.000.000	0	% 0,0	İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanı Planı: Proje maliyetlerinde artışlara bağlı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığından ek bütçe istenmiş, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünün 11.07.2024. tarihli ve E-98177452-602.07-30523 sayılı yazı ile ek bütçe talebi uygun görülerek projenin toplam bütçesi 5.250.000 tl olmuştur. (2024 yılı için 2.000.000 tl, 2025 yılı için 3.250.000 tl) Bu kapsamda projeye ilişkin şartname hazırlıkları tamamlanmış olup ihale süreci başlamıştır. 2024 yılı sonuna doğru projenin başlaması öngörülmektedir.
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı (**Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	5.500.000		2.000.000	0	% 0,0	Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu: Proje maliyetlerinde artışlara bağlı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığından ek bütçe istenmiş,Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünün 11.07.2024. tarihli ve E-98177452-602.07-30523 sayılı yazı ile ek bütçe talebi uygun görülerek projenin toplam bütçesi 5.500.000 tl olmuştur. (2024 yılı için 2.000.000 tl, 2025 yılı için 3.500.000 tl). Bu kapsamda projeye ilişkin şartname hazırlıkları tamamlanmış olup ihale süreci başlamıştır. 2024 yılı sonuna doğru projenin başlaması öngörülmektedir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	52.846.000	11.286.000	30.528.000	2.137.080	% 7,0	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	10.750.000	0	4.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	63.596.000	11.286.000	34.528.000	2.137.080	% 6,2	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	25.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Söz konusu proje Yatırım Programında kabul edilmiş (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete. Karar Sayısı: 8082; Proje No: 2024K06-226052) ve Proje tutarı toplam 25 Milyon TL olup; 2024-2026 yıllarını kapsamaktadır. Güncel durumda, söz konusu projeye ilişkin Genel Müdürlük Makamına Ödenek Yetki Devri yapılmış olup, protokol taslağının İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci Maddesi gereğince incelenerek uygun görüldüğüne dair Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yazısı tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu yazıda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda protokole son şeklinin verilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, en kısa sürede imzalanarak işe başlanması planlanmaktadır.
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	50.000.000		15.000.000	0	% 0,0	Söz konusu proje Yatırım Programında kabul edilmiş (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete. Karar Sayısı: 8082; Proje No: 2024K06-226053) ve Proje tutarı toplam 50 Milyon TL olup; 2024-2026 yıllarını kapsamaktadır. Güncel durumda, söz konusu projeye ilişkin Genel Müdürlük Makamına Ödenek Yetki Devri yapılmış olup, protokol taslağının İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci Maddesi gereğince incelenerek uygun görüldüğüne dair Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yazısı tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu yazıda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda protokole son şeklinin verilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, en kısa sürede imzalanarak işe başlanması planlanmaktadır.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2026	808.998.000	265.000.000	135.000.000	4.812.756	% 3,6	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya aktıtan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneğinden hakediş kapsamında 49.953.569 TL, 2023 yılı ödeneğinden 157.584.504 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılı yatırım programında 150 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 2024 yılı KAP detay liste Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 28/3/2024 tarihli yazı ile onaylanmıştır. Proje bütçesi tasarruf tedbirleri kapsamında güncellenmiş olup 135 milyon TL'dir. 9/7/2024 tarihinde proje değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje detay liste onayını müteakip hakediş bazı ödemeler yapılacaktır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2025	4.000.000	500.000	1.800.000	0	% 0,0	Proje bütçesi dikkate alındığında artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2025 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize yapılarak başvurulmuştur.
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	9.781.000	6.721.000	3.060.000	1.400.000	% 45,8	TURKSAT ile yürütülmekte olan proje kapsamında, şehirlerin 3 boyutlu hava kalitesi haritalarına esas veri işleme, veri üretimi, analiz ve geliştirme çalışmaları, web arayüzünün işlemleri, vatandaş odaklı hava kalitesi izleme hizmeti analizi ile şartname kapsamında belirlenen iş paketlerine ait faaliyetler iş planı çerçevesinde sürdürülmüştür. Projenin Aralık ayı itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir.
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2024	11.609.000	6.110.000	5.499.000	3.000.000	% 54,6	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında 07.09.2023 tarihinde İstanbul'da kamu kurum temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile Proje Açılış Toplantısı düzenlenmiştir. 2023 yılında protokol kapsamında 3.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü Çalıştayı, 1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da kamu, akademi, dernek ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Çalıştayı 05.01.2024 tarihinde Ankara'da kamu, akademi, dernek ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 07.03.2024 tarihinde Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Raporları sunulmuş olup revizyon için Bakanlık tarafından görüşler iletilmiştir. Otomotiv, Tüketici Ürünleri İmalatı, Plastik ve Tekstil "Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Çalıştaylar 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul'da ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gıda, Balıkçılık ve Tarım, Tekstil ile Konut ve İnşaat sektörlerine ait Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Raporları sunulmuş olup Bakanlık tarafından değerlendirilmiştir. 2024 yılında protokol kapsamında 3.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
2023K10-198444	Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2024	8.100.000	2.000.000	6.100.000	4.835.000	% 79,3	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) işbirliğinde yürütülmekte olan "Barcelona Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Dokümanlar Çerçevesinde Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı Projesi"nde geçen süreçte 2. ve 3. Ara Raporlar kabul edilerek, ödemeleri tamamlanmıştır. Yıl sonuna kadar Çalışma Ziyareti, Çalıştay, Rehberler Hazırlanması, Kapanış Toplantısının yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)	2018-2026	9.500.000	0	3.150.000	0	% 0,0	
	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2026	9.500.000	0	3.150.000	0	% 0,0	Mali nedenlerden dolayı Kamu Hizmet Sunucusu olarak üniversite (ODTÜ) ile protokol imzalanamamış olup, bahse konu Ar-Ge projesinin 10/05/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2014/6228 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında belirlenecek yeni yüklenici ile protokol imzalanacaktır. Projeye ilişkin Bakan Olur' u alınmış olup protokol imzalanma sürecindedir.
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2025	14.074.000	5.046.000	5.328.000	0	% 0,0	
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2025	5.500.000	0	1.800.000	0	% 0,0	Projenin 3f kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmış olup, Yıldız Teknik Üniversitesinden teklif istenmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi bütçenin üstünde 4.500.000 tl fiyat teklifinde bulunmuştur. Proje bütçesinin arttırılması talep edilmiştir. 2024 yılı bütçe teklifinde proje tutarı 5.500.000 tl olarak yer almaktadır. Projenin TÜBİTAK ile gerçekleştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak görüşmeler sonuçlandırılmamıştır. Bu nedenle, projenin üniversiteler ile gerçekleştirilmesi için ön görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, süreç devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında proje faaliyetleri gözden geçirilerek, proje Teknik Şartnamesi güncellenmiştir. Proje için alınan teklifler ve gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda projenin hedeflerine belirlenen bütçe ile ulaşılamayacağı görülmektedir. Projenin amaçlarına ulaşılması ve başarılı şekilde sonuçlandırılması için mevcut 5.500.000 TL proje bütçesinin yeterli olmayacağı görülmekte olup proje bütçesinin 7.000.000 TL olarak güncellenmesi önerilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.574.000	5.046.000	3.528.000	0	% 0,0	İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmekte olan projede şartname kapsamında yazılıma esas geliştirme, iyileştirme analizleri, emisyon envanteri ve veri işleme, güncelleme, raporlama, modelleme, tahminleme ile birlikte araştırma-geliştirme süreçlerine esas faaliyetler iş planı çerçevesinde sürdürülmüş olup, projenin bütününe bozmayan eksikliklerin giderilmesi beklenmektedir.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2026	15.209.000	5.119.000	2.290.500	0	% 0,0	Proje, aynı proje adı ve proje numarası altında 2 aşamalı olarak yürütülmekte olup projenin toplam bütçesi 15.210.000 ₺'dir. Birinci aşama (Faz-1), 08/11/2022 tarihinde TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan Sözleşme ile yürürlüğe girmiştir. Projenin birinci fazı için imzalanan Sözleşme bedeli 7.000.000,00 ₺'dir. Bu aşamada yapılacak 5 (beş) hakediş ödemesinin 1. hakedişi 2.975.461,84 ₺.; 2. hakedişi 944.082,36 ₺ ve 3. hakedişi 1.071.468,00 ₺ (yüklenici kaynaklı rapor teslimlerinde yaşanan gecikme nedeniyle emanete alınmıştır.) olarak gerçekleştirilmiştir. Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması için mevcut bütçe 8.000.000 ₺ olup ikinci fazın gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşık maliyet teklifi alınmasına ilişkin çalışmalar devam ederken 2025 yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında 12.000.000 ₺ ilave bütçe talep edilmiştir.
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (Çevre Sektörü)	2023-2025	10.646.000	3.526.000	3.204.000	2.033.807	% 63,5	Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyonu Yazılım Geliştirme Çalışmaları kapsamında; 1. AspX ve Angular/Webapi altyapılarının birarada çalışabilmesi için gerekli altyapının testleri tamamlanmış ve production ortamına alınmıştır. 2. Portal ana sayfası angular/webapi altyapısına döndürülmüştür. 3. Geliştirilen ve devreye alınan modüller menü yapısı üzerinden yönlendirilerek yeni uygulamaya yavaş yavaş geçilmektedir. 4. Uygulamanın güvenliği açısından hem eski uygulamada, hem de yeni uygulama tarafında gerekli tedbirler alınarak Multifaktör kimliklendirme (sms entegrasyonu) hem istasyon, hem de kurum kullanıcılarına uygulanmıştır. 5. Kamera izleme sistemine yönelik kurulum konfigürasyon ve güvenlik testi çalışmaları tamamlanmıştır. Şu an production ortamında kurulu durumdadır. İstasyon uygulamasının yeni sürümü ile birlikte izleme özellikleri devreye girecektir. 6. İstasyon Uygulaması yeni sürümü hazırlanmış, cihaz üreticileri için gerekli dokümantasyon hazırlanmış ve portal'e konmuştur. 7. İstatistik sorgulama arayüzleri çalışmaları tamamlanmış ve devreye alınmıştır. 8. Sorgulama ekranlarından testleri bitenler devreye alınmıştır. 9. ölçüm uygulaması çalışmaları devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2024	13.050.000	7.080.000	5.970.000	0	% 0,0	2024 yılı 1. çeyrekte; Proje'nin İnşaat Bileşeni iptaline yönelik paydaşlar ile ortak karar alınmış olup, ikinci zeyilname ile bu karar uygulamaya alınmıştır. Takip eden aylarda Erzincan'ın Iliç ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle, Bakanlık personelinin iş yoğunluğu ve seyahat sıklığı artmıştır. Proje faaliyetlerinin zamanında tamamlanması ve kaliteli çıktılara ulaşılması için proje paydaşlarının ortak kararı ile üçüncü Zeyilname onaylanmıştır. Proje'de 4 aylık bir süre uzatımı yapılmış olup, kapanış tarihi 8 Ağustos 2024 olarak güncellenmiştir. Projenin kalan faaliyetlerinin bu süre zarfında uygulanması hedeflenmiştir. 4-8 Mart 2024 tarihleri arasında Hollanda'ya üçüncü çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Bu ziyarette KOK'larla kirlenmiş sahaların yönetimine ve yasal çerçevelere ilişkin bilgi paylaşımı yapılmıştır. KSBS yazılımı ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Eğitimleri tamamlanmıştır. Ankara'da bir günlük Yaygınlaştırma Semineri düzenlenmiş ve farklı sektörlerden, akredite firmalardan, üniversitelerden temsilcilere mevcut durum aktarılmıştır. 9. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 04 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştır. 2024 yılı 2. çeyrek döneminde projede dört Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje Bağımsız Nihai Değerlendirme Süreci tamamlanmıştır. 2024 yılı 3.çeyrek döneminde, Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi ve İzlenmesi Teknik Kılavuzu, Kirlenmiş Sahaların Risk Değerlendirmesi Teknik Kılavuzu, Entegre Kimyasal Yönetimi Raporu ve KOK'larla Kirlenmiş Sahaların İmin Teknik Kılavuz nihai hale getirilmiştir. Proje Kapanış Toplantısı 24 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden talep edilen bir ödeme bulunmadığı için harcama gerçekleşme oranımız %0 olarak belirtilmiştir.
AB katkısı			73.950.000	40.121.000	33.829.000	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	24.004.000	10.351.000	7.598.000	6.393.811	% 84,2	"Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek" projesi 07.02.2022 tarihinde resmi olarak başlamıştır. "Türkiye'de End of Waste (Atık Sonu) Konseptinin Geliştirilmesi Projesi" 25.04.2023 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Söz konusu projenin sözleşme bütçesi 1.191.601,00 Avro olup, proje süresi 24 aydır. Başlangıç raporu (Inception report) Bakanlığımıza sunulmuş ve 26.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. 15.06.2023 tarihinde açılış toplantısı yapılmıştır. Saha ziyaretleri ve anketler tamamlanmıştır.
AB katkısı			136.019.000	58.657.000	43.055.000	36.055.000	% 83,7	
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	920.871.000	309.453.000	172.899.500	17.640.374	% 10,2	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	83.100.000	2.000.000	24.100.000	4.835.000	% 20,1	
		GENEL TOPLAM	1.003.971.000	311.453.000	196.999.500	22.475.374	% 11,4	
		AB KATKISI	209.969.000	98.778.000	76.884.000	36.055.000	% 46,9	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2025	466.200.000	220.000.000	109.890.000	44.500.543	% 40,5	
	Genel Bütçe Ödeneği		258.200.000	133.000.000	49.890.000	20.985.934	% 42,1	Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyon işi hakedişi ile 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne bölgesel olarak İstasyonların Bakım-Onarımı hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 2024 yılı için de Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakım, Onarım işine ait sözleşme imzalanmış olup, iş süreci devam etmektedir.
	Döner Sermaye Ödeneği		208.000.000	87.000.000	60.000.000	23.514.609	% 39,2	İhale yapılarak, ilgili Yüklenici ile sözleşmeler imzalanmış olup malzeme teslimleri devam etmektedir. Ayrıca, kalan ödenek ile tekrardan sarf ve yedek malzeme alımı ile ilgili süreci başlatılmış olup, yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları devam etmektedir.
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2024-2024	108.000.000		108.000.000	0	% 0,0	Hava kalitesi izleme istasyonlarının kurulumu için gerekli şartname hazırlanmış olup, yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları tamamlanmıştır Ancak 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile söz konusu işe ait bütçe ödeneği %10 oranında kesintiye uğradığından iltihyaçlar bütçe olanakları çerçevesinde tekrardan gözden geçirilerek yaklaşık maliyet belirleme çalışmalarına yeniden başlanmış olup, ihale yapılmasının ardından istasyon kurulumları gerçekleştirilecektir.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2026	13.160.000	1.558.000	2.700.000	0	% 0,0	Bakanlığımız ile TÜBİTAK MAM arasında " Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Yaygınlaştırılması Projesi" protokolü 24.07.2024 tarihinde imzalanmış olup, 1 (bir) ürün grubunda (Yağlayıcılar) kriter belirleme çalışmaları devam etmektedir. Projenin ilk ödeme süreçleri başlamıştır.
2023K10-198443	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3 (*Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2024-2025	32.800.000		17.200.000	0	% 0,0	Proje protokolü 10/07/2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü ile imzalanmış olup proje faaliyetleri başlamıştır. Proje bedeli 2024 yılı için 14.300.000 TL (KDV Hariç) ve 2025 yılı için 13.000.000 TL (KDV Hariç) tutarındadır. Projenin ilk ödemesi İş Termin Planının sunulması sonrasında 6.864.000 TL (KDV dahil) ödeme işlemleri süreçleri başlamıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	379.360.000	134.558.000	160.590.000	20.985.934	% 13,1	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	240.800.000	87.000.000	77.200.000	23.514.609	% 30,5	
		GENEL TOPLAM	620.160.000	221.558.000	237.790.000	44.500.543	% 18,7	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	7.295.458.000	4.139.147.000	2.786.311.000	2.558.468.718	% 91,8	Proje planlandığı şekilde devam etmektedir. Ek Ödenek beklenmektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	7.218.198.000	4.068.687.000	2.779.511.000	2.555.512.176	% 91,9	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	77.260.000	70.460.000	6.800.000	2.956.542	% 43,5	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	9.344.660.000	19.884.000	167.719.000	0	% 0,0	İhale süreçleri devam etmektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	9.197.500.000	10.400.000	124.719.000	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	147.160.000	9.484.000	43.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2028	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	2024 yılı içerisinde Harcama planlanmamaktadır.
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2028	0	0	0	0		
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2028	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2 (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2024-2029	11.038.290.000		20.000	0	% 0,0	Projenin Efektif olması bekleniyor.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	14.910.000.000	104.520.000	5.713.100.000	3.253.020.909	% 56,9	KADİYAP projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iller kapsamında Kahramanmaraş,Elazığ, Malatya illerinde ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanmış (Betonarme + Hafif Çalılık) 1800 adet kırsal konut inşaatı devam etmekte olup Fiziki seviyeleri %45-60 seviyelerinde dir.
2024G00-224663	Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA) (Konut Sektörü)	2024-2025	6.622.200.000		3.658.400.000	0	% 0,0	JICA kerdı kapsamında müşavirlih ihalesi yapılarak değerlendirme aşamasında , yapılacak konutlar ihale aşamasındadır.
	JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2024-2025	5.518.500.000		3.048.900.000	0	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği	2024-2025	1.103.700.000		609.500.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2024-2026	1.500.000.000		400.000.000	0	% 0,0	Çapa Hastanesi projesi tamamlanma aşamasında olup, projeler teslim edilir edilmez ihaleye çıkılacaktır.
	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı	2024-2026	1.200.000.000		390.000.000	0	% 0,0	
	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat	2024-2026	300.000.000		10.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Döner Sermaye)	2021-2024	89.874.000	61.500.000	28.374.000	23.093.129	% 81,4	Sözleşmesi 24.01.2023 tarihinde imzalanmış ve işe başlanmıştır. Eski Hizmet Binamızın yıkımında son aşamaya gelinmiş olup akabinde çevre düzenleme işlemleri tamamlanarak geçici kabul aşamasına geçilecektir.
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2024	78.218.000	50.000.000	28.218.000	28.218.000	% 100,0	Sözleşmesi 12.01.2023 tarihinde imzalanarak işe başlanmış olup Bina %70 seviyelerinde tamamlanmıştır. Dış cephe imalatları tamamlanmak üzere dir.Kapı, pencere doğrama imalatları ile duvar, döşeme ve tavan kaplama imalatları devam etmektedir.
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	Proje arasa karşılığı yapımından vazgeçilmiştir.
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2024	46.476.000	26.800.000	19.676.000	19.676.000	% 100,0	Yapım işi iki kısımdan oluşmakta olup, ilk kısım yeni hizmet binası, nizamiye binası ve bağlantılı bahçe duvarının yapımını içeren işin %89,35 lik kısmını, ikinci kısım ise mevcut hizmet binasının yıkımı ile otopark, sosyal faaliyet alanı ve çevre düzenlemesi imalatlarından oluşan %10,65 lik kısmı içermektedir. Birinci kısım imalatları tamamlanmış, geçici kabul işlemleri gerçekleştirilmiş ve 13.09.2024 tarihinde yapı kullanma izin belgesi alınarak hizmet binasına taşınma işlemleri tamamlanmıştır. İkinci kısım imalatları kapsamında yer teslimi yapılarak 01.10.2024 tarihli yıkım ruhsatı kapsamında eski hizmet binasının yıkımına başlanmıştır. Sözleşme kapsamında yükleniciye devredilecek olan arsarlardan işin nakdi olarak %89,35 inşaat ilerleme oranına tekabül eden ilk 12 adetinin devri gerçekleştirilmiş olup, fiziksel ilerleme yüzdesi %90 seviyesindedir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	Yapım işi ihalesi henüz yapılmamıştır

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	5.409.500.000	51.075.000	1.057.090.000	247.601.441	% 23,4	Proje devam etmektedir.
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	1.004.900.000	34.175.000	195.615.000	126.008.836	% 64,4	
	Hibe Ödeneği	2021-2027	19.500.000	3.900.000	15.600.000		% 0,0	
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2023-2026	2.560.730.000	13.000.000	245.875.000	121.592.605	% 49,5	
	Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	238.120.000		24.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılarak yer teslimi yapılmış olup fiziki %75 seviyesindedir.
	Boğaziçi Üniv.Uçaksavar Kampüsü Superdorm Binası (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	130.250.000		68.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılarak müşavir tarafından yer teslimi yapılmıştır. Avans ödemesi yapılmıştır.
	İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	183.500.000		98.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılarak müşavir tarafından yer teslimi yapılmıştır. Avans ödemesi yapılmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	285.000.000		100.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılarak müşavir tarafından yer teslimi yapılmıştır.
	İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	137.500.000		50.000.000	0	% 0,0	İhalesi iptal edildi.
	Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	140.000.000		60.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılarak müşavir tarafından yer teslimi yapılmıştır.
	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	240.000.000		90.000.000	0	% 0,0	İhalesi yapılarak müşavir tarafından yer teslimi yapılmıştır.
	Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci Yurtları (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	120.000.000		50.000.000	0	% 0,0	Gazanfer Bilge Yurt Binası ihalesi iptal edilerek iki bina birlikte ihale edilmesi planlanmaktadır.
	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	350.000.000		60.000.000	0	% 0,0	Projeleri inceleme aşamasındadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K14-224896	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	20.000.000		20.000.000	19.295.952	% 96,5	Proje tamamlandı.
2024K14-224923	Afet Koordinasyon Çadırı Alımı (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	2.000.000		2.000.000	559.575	% 28,0	Proje tamamlandı.
2024K14-224931	İnsansız Hava Araçları Modernizasyonu (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet belirlenmiş olup, yıl sonuna kadar ihalenin gerçekleşmesi bekleniyor.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2025	145.000.000		130.000.000	0	% 0,0	İş yeni başlamıştır. Devam etmektedir. 2024 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2024K14-235229	İletişim Merkezleri İnşaatı (Singapur Kızılhaç Derneği Hibesi) (Afetler Sektörü)	2024-2024	16.188.000		16.188.000	0	% 0,0	
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçbeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2024	159.500.000	110.000.000	49.500.000	23.080.480	% 46,6	İşin ihalesi 30.06.2022 tarihinde yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 20.05.2024 tarihinde işin geçici kabulü de yapılmıştır. Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 133.080.479,38 TL'yi bulmuştur.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	76.200.000	42.000.000	34.200.000	19.479.149	% 57,0	İşin ihalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmıştır. Konut inşaatları tamamlanmış olup çevre düzenleme ve altyapı işleri devam etmektedir. Konut kuraları çekilmiş olup borçlandırma işlemleri devam etmektedir.Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 61.479.148,39 TL'yi bulmuştur.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	130.600.000	100.000.000	30.600.000	27.086.481	% 88,5	İşin ihalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve Konut inşaatları tamamlanmış olup çevre düzenleme ve altyapı işleri devam etmektedir. Konut kuraları çekilmiş olup borçlandırma işlemleri devam etmektedir.Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 127.086.480,15 TL'yi bulmuştur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	444.000.000	0	90.000.000	0	% 0,0	24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Olur'u ile tahmini ödenek teminine esas revize bedeli onaylanmış olup 04.07.2024 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. Yapılan sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 16.06.2028 olarak güncellenmiştir. Henüz harcama yoktur.
2024K07-224135	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	2.700.000		2.700.000	816.000	% 30,2	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2024K07-224137	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	4.500.000		4.500.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	115.000.000		35.100.000	0	% 0,0	Bu sene yatırım programına girmiş olup önmümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır.
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	55.000.000		18.000.000	0	% 0,0	Bu sene yatırım programına girmiş olup önmümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır.
2016K07-2797	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2027	1.332.900.000	311.088.000	225.406.400	83.581.000	% 37,1	
	Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	72.000.000	12.000.000	13.500.000	12.550.000	% 93,0	Aksaray ilindeki 9 uygulamada yer alan toplam 149 hak sahibi aile için 13.500.000 TL yıllık ödenek revize ile 35.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup Eylül ayı sonu itibarıyla 11.050.000 TL ödenek harcanmıştır. Biten konut yoktur.
	Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	44.000.000	18.600.000	6.714.000	0	% 0,0	Ankara ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 44 hak sahibi aile için 6.714.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	142.640.000	22.000.000	9.576.000	0	% 0,0	Batman ilindeki 4 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 9.576.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	954.000	950.000	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	1.804.000	1.800.000	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	33.000.000	15.000.000	9.000.000	0	% 0,0	Bolu ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 1.000.000 TL'ye düşürülmüş olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	25.500.000	14.000.000	7.650.000	2.550.000	% 33,3	Çankırı ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 22 hak sahibi aile için 7.650.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Eylül ayı sonu itibarıyla 2.550.000 TL ödenek harcanmıştır.Bitene konut yoktur.
	Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	56.000.000	11.000.000	10.125.000	0	% 0,0	Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 10.125.000 TL yıllık ödenek revize ile 2.125.000 TL'ye düşürülmüş olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Bitene konut yoktur.
	Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	9.000.000	6.000.000	900.000	550.000	% 61,1	Denizli ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 3 hak sahibi aile için 900.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Eylül ayı sonu itibarıyla 550.000 TL ödenek harcanmıştır. 2 konut tamamlanmıştır.
	Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	59.288.000	6.500.000	6.075.000	5.500.000	% 90,5	Erzincan ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 69 hak sahibi aile için 6.075.000 TL yıllık ödenek revize ile 12.750.000 TL'ye yükseltilmiş olup Eylül ayı sonu itibarıyla 3.200.000 TL ödenek harcanmıştır. 10 konut tamamlanmıştır
	Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	211.249.000	80.000.000	44.550.000	30.625.000	% 68,7	Erzurum ilindeki 15 uygulamada yer alan toplam 291 hak sahibi aile için 44.550.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Eylül ayı sonu itibarıyla 30.625.000 TL ödenek harcanmıştır.2 konut tamamlanmıştır. Ayrıca Aşkale İlçesi Akören köyünde 2023 yılından önce işleri kalan 2 adet konut da tamamlanarak haksahiplerine teslim edilmiştir.
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Iğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	19.200.000	0	12.137.400	0	% 0,0	Iğdır ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 32 hak sahibi aile için 12.137.000 TL yıllık ödenek revize ile 2.137.400 TL'ye düşürülmüş olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Bitene konut yoktur.
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	65.000.000	14.800.000	10.935.000	0	% 0,0	Isparta ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 65 hak sahibi aile için 10.935.000 TL yıllık ödenek revize ile 935.000 TL'ye düşürülmüş olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Bitene konut yoktur.
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	31.000.000	18.000.000	9.000.000	2.550.000	% 28,3	İzmir ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 33 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 4.000.000 TL'ye düşürülmüş olup, Eylül ayı sonu itibarıyla 850.000 TL ödenek harcanmıştır. 1 konut tamamlanmıştır
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	14.500.000	5.500.000	5.400.000	880.000	% 16,3	K.Maraş ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 16 hak sahibi aile için 5.400.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Eylül ayı sonu itibarıyla 430.000 TL ödenek harcanmıştır 1 konut tamamlanmıştır.
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	29.438.000	5.438.000	2.700.000	0	% 0,0	Karaman ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 2.700.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Bitene konut yoktur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	34.150.000	19.000.000	10.935.000	0	% 0,0	Kars ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 25 hak sahibi aile için 10.935.000 TL yıllık ödenek revize ile 2.435.000 TL'ye düşürülmüş olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	35.000.000	5.000.000	4.860.000	0	% 0,0	Kastamonu ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 35 hak sahibi aile için 4.860.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	140.706.000	7.000.000	9.000.000	0	% 0,0	Malatya ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	73.880.000	5.000.000	7.200.000	1.550.000	% 21,5	Muş ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 75 hak sahibi aile için 7.200.000 TL yıllık ödenek revize ile 3.200.000 TL'ye düşürülmüş olup Eylül ayı sonu itibarıyla 1.550.000 TL ödenek harcanmıştır. 4 konut tamamlanmıştır.
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	19.000.000	1.000.000	5.400.000	0	% 0,0	Niğde ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 19 hak sahibi aile için 5.400.000 TL yıllık ödenek revize ile 400.000 TL'ye düşürülmüş olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	44.825.000	19.000.000	11.520.000	4.200.000	% 36,5	Sivas ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 11.520.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Eylül ayı sonu itibarıyla 4.200.000 TL ödenek harcanmıştır. Biten konut yoktur.
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	107.282.000	10.000.000	18.000.000	21.526.000	% 119,6	Tunceli ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 104 hak sahibi aile için 18.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 43.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup Eylül ayı sonu itibarıyla 21.526.000 TL ödenek harcanmıştır. 1 konut tamamlanmıştır.
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	13.436.000	8.500.000	1.215.000	600.000	% 49,4	Uşak ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 14 hak sahibi aile için 1.215.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Eylül ayı sonu itibarıyla 600.000 TL ödenek harcanmıştır. Biten konut yoktur.
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Elazığ İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2023-2027	50.000.000	5.000.000	9.000.000	500.000	% 5,6	Elazığ ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 50 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 15.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup Eylül ayı sonu itibarıyla 500.000 TL ödenek harcanmıştır. Biten konut yoktur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K07-224136	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	45.000		45.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2026			30.000.000	27.775.159	% 92,6	Kamulaştırma kapsamında konut ve tarım arazisi satın alımları için kullanılmaktadır. 30.09.2024 tarihi itibarıyla Adıyaman, Çorum, İstanbul, Samsun ve Malatya illerinde, toplam 29 adet satın alma işlemi (konut ve tarım arazisi) için 27.775.158,80 TL ödenek illerine gönderilmiştir.
15 Proje		06 ve 07 TOPLAM	56.863.688.000	4.482.782.000	13.981.840.000	6.126.596.636	% 43,8	
2 Proje		08 TOPLAM	1.332.945.000	311.088.000	225.451.400	83.581.000	% 37,1	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	266.874.000	61.500.000	190.374.000	42.948.656	% 22,6	
		GENEL TOPLAM	58.723.615.000	4.939.214.000	14.397.665.400	6.253.126.292	% 43,4	6.917.379.000
4 Proje		HİBE	260.108.000	83.844.000	81.588.000	2.956.542	% 3,6	
1 Proje		AB KATKISI	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	194.345.000	76.800.000	104.894.000	47.894.000	% 45,7	
		Kamu İştirme	0	0	30.000.000	27.775.159	% 92,6	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2025	2.250.000	750.000	675.000	45.258	% 6,7	*Proje kapsamında öncelikle BEP-TR yazılımı ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı için gerekli iklim verilerinin güncellenmesi ve sürekli güncellemeyi mümkün kılacak yazılım için gerekli metodoloji ve algoritma için şartname ve protokol çalışmaları devam etmekte olup, üniversiteler ile yapılacak protokol kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında için gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. **Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu hazırlama işlerinin gerçekleştirilmesi devam etmektedir.
2023K01-198902	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2024-2024	5.500.000		5.500.000	1.777.043	% 32,3	
	Genel Bütçe Ödeneği		1.000.000		1.000.000	902.768	% 90,3	Optik Emisyon Cihazı Bakım Onarım ve Kalibrasyon ücreti ile Çeşitli illerde yapılan piyasa gözetimi ve denetimlerinde alınan numunelerin değerlendirilmesi için yaptırılan deneylere ilişkin TSE faturalarının ödemeleri yapılmıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		4.000.000		4.000.000	874.276	% 21,9	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.250.000	750.000	1.675.000	948.026	% 56,6	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	4.000.000	0	4.000.000	874.276	% 21,9	
		GENEL TOPLAM	7.250.000	750.000	5.675.000	1.822.302	% 32,1	

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2024	6.200.000	3.000.000	3.200.000	2.872.800	% 89,8	Söz konusu işe ait ihale süreci tamamlandı ve 4.788.000TL bedelle sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında projeye ait Proje Metodolojisi Raporu, Proje Yönetim Planı (PYP), Analiz ve Tasarım Raporları, Ulusal Veri Sözlüğü hazırlama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Raporlama Altyapı Bileşeni lisans alımı gerçekleştirildi. Müteahhitlik ve Şantiye Şefliği Bilişim Sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanarak kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı sonunda 2.394.000TL ve 2024 yılında 2.045.720,88TL Hak ediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2023K60-205399	Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	14.970.000	7.770.000	7.200.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 2023 yılında sözleşme imzalanmış söz konusu proje kapsamında 2024 yılında 5.100.000,00 TL ödeme gerçekleştirilecektir.
2023K60-205413	TUCBS Çalışabilirlik, Uyumlaştırma ve Entegrasyon (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	15.600.000	3.000.000	12.600.000	4.434.516	% 35,2	"Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Entegrasyon Projesi Hizmet Alımı İşi" (18 İl İçin) sözleşme imzalanmış proje kapsamındaki ödemeler son çeyrekte yapılacaktır.
2023K60-205704	Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	25.825.000	17.290.000	8.535.000	648.516	% 7,6	Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu işi ; - İş Paketi 1: Veri Konsolidasyonu Çalışmaları - İş Paketi 2: Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi (10 il kapsamında) - İş Paketi 3: Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu Konferansı çalışmalarını kapsamaktadır. İş Paketi 3 çalışmaları (büyükşehir, il, ilçe belediyeleri ve su ve kanalizasyon idarelerinin katılım sağladığı 3 günlük konferans) çalışmaları tamamlanmış olup hakediş yapılmıştır. Diğer proje çalışmaları devam etmektedir.
2023K60-205743	Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	13.735.000	9.735.000	4.000.000	0	% 0,0	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi(TUCBS) E-Devlet Entegrasyonu İşletme ve Güncelleme Projesi kapsamında bazı hizmetlerin projeye dahil edilmesi nedeniyle 2024 yılı için proje kapsamında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Söz konusu projenin 2025 yılına aktarımı planlanmaktadır.
2023K60-217018	TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, Güncelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	96.000.000	15.000.000	81.000.000	0	% 0,0	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi(TUCBS) E-Devlet Entegrasyonu İşletme ve Güncelleme Projesi için sözleşme imzalanmış olup 2024 yılı sonuna kadar tüm ödemeler gerçekleştirilecektir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K60-230220	MEBİS Projesi Bakım Onarımı İşi İdamesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	8.027.000	2.927.000	5.100.000	2.601.600	% 51,0	Söz Konusu işe ait ihale süreci tamamlandı yıl sonu itibariyle proje sonlanacaktır. Ödemeler 2024 yılı sonunda yapılacaktır. Proje ödeneğine 180.000,00 TL öşnwgw ihtiyaç bulunmaktadır.
2023K60-230225	Bakanlık Uygulamaları Performans İzleme ve Yönetim (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	6.500.000	0	6.500.000	0	% 0,0	Ürün ihtiyaç belirleme aşamasındadır. Müteakip olarak teknik şartnamesi hazırlanıp ihaleye çıkılacaktır.
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2025	9.768.000	0	5.400.000	0	% 0,0	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklennesi Projesi ile ortak olarak 05.08.2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Sözleşme imzalanma aşamasındadır.
2024K60-230216	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	213.200.000		213.200.000	33.413.926	% 15,7	
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2024-2024	149.200.000		149.200.000	25.797.623	% 17,3	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini işleri yapılmaktadır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2024-2024	60.000.000		60.000.000	5.318.585	% 8,9	1-Yedekleme Yazılım Lisansı temin edilmiştir. 3.200.000,00 +KDV 2-Microsoft Destek Paketi Alımı yapılmıştır. 590.000,00 + KDV 3-SSL Sertifika temini yapılmıştır: 152.585,00 +KDV 4-Tehdit İstihbarat Uygulaması: 618.000,00 KDV hariç
	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2024-2024	4.000.000		4.000.000	2.297.718	% 57,4	2024 Yılı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Belgenet) Garanti ve Bakım Hizmeti Temini İşi için TÜRSAT A.Ş. ile 22.03.2024 tarihinde 1.343.816,69 TL+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. Hakediş çalışmaları devam etmekte olup Eylül sonu itibariyle proje için herhangi bir ödeme yapılmamıştır. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS) Bakım ve Destek Hizmeti işi için 358.000 TL bedelli 3. hakediş yapılmıştır.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K60-230223	KÖYDES Yatırım İzleme Sisteminin İdamesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	2.500.000		2.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında hizmet alım sözleşmesi imzalanmış hizmet alım kapsamında ödemeler 2024 yılı son çeyreğinde yapılacaktır.
2024K60-230229	Dijital Şehir İkizleri (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Proje devam etmekte olup, proje kapsamında henüz hak ediş ödemesi gerçekleştirilmemiştir.
2024K60-230232	Derin Öğrenme Hava Fotoğrafı İşleme ve Modelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	3.165.000		3.165.000	0	% 0,0	Proje ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle herhangi bir alım gerçekleştirilmemektedir.
2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000		9.000.000	1.271.592	% 14,1	Yazılım geliştirme ve bakım çalışmaları devam etmektedir. OCR aracı geliştirilmesi süreci tamamlanmıştır.
2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000		13.500.000	0	% 0,0	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme Projesi çalışmaları devam etmekte olup, henüz hakediş yapılmamıştır.
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4 (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2026	200.000.000		45.000.000	44.666.774	% 99,3	Sözleşmesi kapsamında 4. hakediş gerçekleştirilmiştir. Fiyat farkı dahil olmak üzere toplam 49.687.749,33 TL ödeme yapılmıştır

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	5.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Proje devam etmekte olup, proje kapsamında henüz hak ediş ödemesi gerçekleştirilmemiştir.
2024K09-229670	Akıllı Şehir Standartlarının Yaygınlaştırılması (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	4.500.000		4.500.000	183.000	% 4,1	Proje kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiş ve teknoloji araştırma raporları hazırlanmış olup kontrol süreçleri devam etmektedir. Yazılım geliştirme ve pilot uygulama çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.
2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	9.500.000		3.600.000	0	% 0,0	Mobil Altyapı Geliştirme Projesi ile ortak olarak 05.08.2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Sözleşme imzalanma aşamasındadır.
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	238.928.000	43.060.000	148.500.000	6.537.624	% 4,4	
9 Proje		DÖNER SERMAYE	465.162.000	15.662.000	291.500.000	83.555.100	% 28,7	
GENEL TOPLAM			704.090.000	58.722.000	440.000.000	90.092.724	% 20,5	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	48.837.000	30.581.000	8.203.000	4.413.795	% 53,8	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibariyle sona ermiştir. Geri kalan 3 bileşenin uygulaması devam etmektedir. Dört bileşenden biri olan yeni teknik yardım projesi başlamıştır.
AB katkısı			276.719.000	173.278.000	46.479.000	4.909.657	% 10,6	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2026	8.857.524.000	6.045.479.000	1.952.865.000	647.062.921	% 33,1	Açıklamalar aşağıda verilmiştir.
	AB Hibesi		7.537.461.000	5.139.151.000	1.663.405.000	550.003.483	% 33,1	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		551.656.000	378.966.000	120.175.000	40.507.262	% 33,7	
	Mahalli İdare Katkısı		768.407.000	527.362.000	169.285.000	56.552.177	% 33,4	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	48.837.000	30.581.000	8.203.000	4.413.795	% 53,8	
	AB KATKISI		276.719.000	173.278.000	46.479.000	4.909.657	% 10,6	
	İçmesuyu Sektörü Projesi		8.857.524.000	6.045.479.000	1.952.865.000	647.062.921	% 33,1	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	Çarşamba Atıksu Tesisi	2019-2023	287.358.000	282.208.000	20.200.000	19.007.613	% 94,1	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 19.09.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. Projenin sonuna yaklaşılmıştır, hesaplardaki kur farkı ve ödemelerin ileri kayması gibi durumlardan fazla harcama gözükmemektedir.
	AB Hibesi		244.078.000	239.878.000	17.000.000	16.156.471		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.432.000	16.932.000	1.200.000	1.140.457		
	Mahalli İdare Katkısı		25.848.000	25.398.000	2.000.000	1.710.685		
Alt proje-2	Bandırma Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	577.544.000	473.044.000	104.500.000	50.145.569	% 48,0	Proje kapsamında yer alan entegre su projesi 2. yapım işinin kesin kabulü 13.10.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi yapım işinin ve müşavirlik sözleşmelerinin uygulaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		490.688.000	402.088.000	88.600.000	42.623.734		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		34.882.000	28.382.000	6.500.000	3.008.734		
	Mahalli İdare Katkısı		51.974.000	42.574.000	9.400.000	4.513.101		
Alt proje-3	Bismil Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	272.545.000	270.865.000	1.680.000	1.265.479	% 75,3	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 04.01.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		231.536.000	230.236.000	1.300.000	1.075.657		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		18.533.000	18.283.000	250.000	85.420		
	Mahalli İdare Katkısı		22.476.000	22.346.000	130.000	104.402		
Alt proje-4	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	610.460.000	340.280.000	244.865.000	70.338.224	% 28,7	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		518.739.000	289.239.000	208.405.000	59.787.490		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.716.000	20.416.000	14.705.000	4.220.293		
	Mahalli İdare Katkısı		55.005.000	30.625.000	21.755.000	6.330.440		
Alt proje-5	Elbistan Atıksu Tesisi	2019-2024	531.622.000	491.372.000	40.250.000	15.004.842	% 37,3	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 30.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		451.760.000	417.660.000	34.100.000	12.754.115		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		35.925.000	33.175.000	2.750.000	1.012.827		
	Mahalli İdare Katkısı		43.937.000	40.537.000	3.400.000	1.237.900		
Alt proje-6	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2025	679.445.000	487.035.000	182.250.000	127.470.515	% 69,9	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		577.480.000	413.980.000	154.900.000	108.349.938		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		40.822.000	29.222.000	10.950.000	7.648.231		
	Mahalli İdare Katkısı		61.143.000	43.833.000	16.400.000	11.472.346		
Alt proje-7	İğdır Atıksu Tesisi	2019-2024	540.492.000	533.522.000	6.970.000	1.155.000	% 16,6	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 21.07.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		459.295.000	453.495.000	5.800.000	981.750		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.612.000	36.012.000	600.000	77.963		
	Mahalli İdare Katkısı		44.585.000	44.015.000	570.000	95.288		
Alt proje-8	Kastamonu Atıksu Tesisi	2019-2024	415.389.000	403.919.000	11.470.000	6.311.542	% 55,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 07.06.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		353.032.000	343.332.000	9.700.000	5.364.811		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		24.985.000	24.235.000	750.000	378.693		
	Mahalli İdare Katkısı		37.372.000	36.352.000	1.020.000	568.039		
Alt proje-9	Niksar Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	563.745.000	558.295.000	20.120.000	20.085.227	% 99,8	Proje kapsamın yer alan şebeke ve kanalizasyon hattı yapım işi olan 2. yapım işinin kesin kabulü 30.06.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi yapım işinin ise geçici kabulü 31.12.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		478.952.000	474.552.000	17.100.000	17.072.443		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		34.047.000	33.497.000	1.210.000	1.205.114		
	Mahalli İdare Katkısı		50.746.000	50.246.000	1.810.000	1.807.670		

Alt proje-10	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	647.382.000	381.897.000	258.050.000	65.995.230	% 25,6	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		550.219.000	324.614.000	219.300.000	56.095.946		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		38.868.000	22.913.000	15.500.000	3.959.714		
	Mahalli İdare Katkısı		58.295.000	34.370.000	23.250.000	5.939.571		
Alt proje-11	Sivas Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	296.108.000	296.093.000	442.270.000	57.273.163	% 12,9	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 06.03.2024 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		251.685.000	251.680.000	378.290.000	48.682.188		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.770.000	17.765.000	27.340.000	3.436.390		
	Mahalli İdare Katkısı		26.653.000	26.648.000	36.640.000	5.154.585		
Alt proje-12	Sorgun Atıksu Tesisi	2019-2023	212.650.000	212.635.000	15.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 11.08.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		180.745.000	180.740.000	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.763.000	12.758.000	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		19.142.000	19.137.000	5.000	0		
Alt proje-13	Şırnak Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	271.506.000	271.491.000	4.000.000	3.495.132	% 87,4	Proje kapsamında yer alan yapım işinin kesin kabulü 17.11.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi de Ağustos ayı itibarıyla bitmiştir. Son ödemesi yapılmıştır.2023'te bitmesi planlanan proje 2024'te tamamlanmıştır. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		230.773.000	230.768.000	3.000.000	2.970.862		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		18.330.000	18.325.000	500.000	235.921		
	Mahalli İdare Katkısı		22.403.000	22.398.000	500.000	288.348		
Alt proje-14	Trabzon Su Tesisi	2019-2025	547.955.000	373.805.000	163.300.000	5.971.054	% 3,7	Proje kapsamında yer alan yapım işinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		465.735.000	317.735.000	138.800.000	5.075.396		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		32.888.000	22.428.000	9.800.000	358.263		
	Mahalli İdare Katkısı		49.332.000	33.642.000	14.700.000	537.395		
Alt proje-15	Yüksekova Atıksu Tesisi	2019-2024	286.782.000	270.582.000	16.200.000	15.538.558	% 95,9	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 09.09.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		243.595.000	229.995.000	13.600.000	13.207.774		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		19.464.000	18.264.000	1.200.000	1.048.853		
	Mahalli İdare Katkısı		23.723.000	22.323.000	1.400.000	1.281.931		
Alt proje-16	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2025	594.758.000	75.878.000	365.710.000	135.047.480	% 36,9	Proje kapsamında ; Müşavirlik işi sözleşmesi 30.08.2023 tarihinde başlamıştır. 2. yapım işi olan yağmursuyu hatları yapımı işi 06.11.2023 tarihinde başlamıştır.1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapım işi ise 22.01.2024 tarihinde başlamıştır.Uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		509.284.000	64.984.000	313.200.000	114.790.358		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.027.000	4.587.000	22.110.000	9.115.705		
	Mahalli İdare Katkısı		49.447.000	6.307.000	30.400.000	11.141.417		
Alt proje-17	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2025	411.993.000	322.558.000	71.000.000	52.958.294	% 74,6	Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu toplama hattı yapım işinin geçici kabulü 03.03.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi inşaatının uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		350.075.000	274.175.000	60.300.000	45.014.550		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		27.892.000	21.772.000	4.800.000	3.574.685		
	Mahalli İdare Katkısı		34.026.000	26.611.000	5.900.000	4.369.059		
Alt proje-18	Aksaray Entegre Su Projesi	2021-2025	1.109.790.000	0	15.000	0	% 0,0	Proje bütçesinin revizyonu sonucunda, Avrupa Komisyonu tarafından tekrar onaylanması gerekliliği nedeniyle, IPA II uygunluk dönemi içerisinde tamamlanamayacak olması ve revize bütçenin kısıtlı olan IPA II bütçesinin bu proje için yetersiz hale geldiği görülmesine istinaden, söz konusu proje IPA kapsamında sürece devam edilemeyeceği, 15 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen Sektörel İzleme Komitesi toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
	AB Hibesi		949.790.000	0	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		67.700.000	0	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		92.300.000	0	5.000	0		

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023F00-198507	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2024-2024	9.500.000		9.500.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2024-2024	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	"Seydikemer Çevre Düzenleme Projesi" için APM Tasarım Mimarlık firması ile 1.788.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle sözleşme imzalanmış olup proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
	Ayvalık Arboretum Proje Temini	2024-2024	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması beklenmektedir.
	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Proje Temini	2024-2024	1.500.000		1.500.000	0	% 0,0	Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması beklenmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2025	49.600.000	18.600.000	17.000.000	10.740.203	% 63,2	10.740.202,99 TL ödemesi yapılmıştır. İş devam etmektedir.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2025	29.000.000	0	10.900.000	0	% 0,0	Mali Katkı Protokolü hazırlıkları devam etmektedir.
2024F00-224157	Karahayıt Kırmızı Su Travertenleri Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2024-2024	8.000.000		8.000.000	0	% 0,0	Mali Katkı Protokolü hazırlıkları devam etmektedir.
2024F00-224162	Köyceğiz Çevre ve Sahil Düzenleme (Turizm Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Mali Katkı Protokolü hazırlıkları devam etmektedir.
2024F00-224165	Büyükada Meydan Düzenleme ve Cephe Yenileme (Turizm Sektörü)	2024-2024	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024F00-238491	Çat Barajındaki Yüzen Adaları Koruma (**.Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2024-2024	3.600.000		3.600.000	0	% 0,0	
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (**.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2026	280.258.000	62.658.000	60.000.000	0	% 0,0	
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2026	179.647.000	36.647.000	40.000.000	0	% 0,0	"Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif İçmesuyu Şebeke Hattı Ekipmanı Mal Alımı İşi" için Sultanhanı Belediye Başkanlığı ile 2.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle protokol imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2026	100.611.000	26.011.000	20.000.000	0	% 0,0	Mali Katkı Protokolü hazırlıkları devam etmektedir.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2026	120.264.000	33.764.000	53.500.000	10.000.000	% 18,7	
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2026	77.264.000	21.764.000	33.500.000	10.000.000	% 29,9	"Cihanbeyli (Konya) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı 1.Etap Yapım İşinin Tamamlanması" için 15.03.2024 tarihinde 7.000.000,00 TL (KDV Dahil) ödeme yapılmıştır. "Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşi" için Sultanhanı Belediye Başkanlığı ile 7.000.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle protokol imzalanmış olup ihale süreci devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2026	43.000.000	12.000.000	20.000.000	0	% 0,0	Mali Katkı Protokolü hazırlıkları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2025	46.951.000	23.151.000	11.520.000	847.200	% 7,4	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2025	11.950.000	5.600.000	3.240.000	0	% 0,0	1)Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Ortofoto Harita Üretimi Ve Hâlihazır Harita Alımı İlişkin iş ve işlemler devam etmektedir(iş ihale edildi) 2)Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Göcek ve Dalaman Koyları Ortofoto Harita Üretimi ve Hâlihazır Harita Alımı İlişkin iş ve işlemler devam etmektedir
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2025	16.480.000	10.400.000	3.140.000	847.200	% 27,0	1-Datça-Bozburun ÖÇKB, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları ve Kentsel Tasarım Rehberi İşi (130 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 2-Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İşi (560 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 3-Muğla İli, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Arazi Kullanıma Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu Hazırlanması İşi (46132 Ha) (İş Ödemesi Yapıldı 590.000 +Kdv) 4-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İşi (46132 Ha) (Sözleşme İmzalandı 230.000 +kdv) 5-İhlara ÖÇKB 2. Etap 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İşi (6336 Ha) (Sözleşme İmzalandı 300.000 +kdv) 6-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı ÖÇKB, Ballıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri "Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin" 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (450 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 7-Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yalıncağ-Karakusunlar Mahallesi Adalet Akademisi İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (26,85 Ha) (1. Aşama (İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi) Tamamlandı İmar Planı İşi Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 116.000 +kdv) 8-Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu İşi (740.309 Ha) (İhale Aşamasında) 9-İmar Planı Paftalarının Taranması Ve Koordinatlandırılması İşi (İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor) 10-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kıyı Kesimi 1.Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vee 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (Sözleşme İmzalandı 61.000 + kdv)
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2025	6.321.000	2.151.000	1.900.000	0	% 0,0	
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2025	12.200.000	5.000.000	3.240.000	0	% 0,0	Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerden İmar Uygulamasına İlişkin talep olmadığından Harcama yapılmamıştır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K10-90489	Fethiye İç Körfezi Deniz Dibi Tarama ve Temizliği (Çevre Sektörü)	2024-2024	1.800.000		1.800.000	0	% 0,0	
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	2021-2024	53.463.000	9.544.000	11.199.100	0	% 0,0	
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	41.463.000	9.544.000	9.032.100	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2024	12.000.000		2.167.000	0	% 0,0	Projeye ait 1.hakediş ödemesi yapılmış olup,çalışmalar devam etmektedir.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	1.152.000	657.000	495.000	136.876	% 27,7	
	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları	2022-2024	1.152.000	657.000	495.000	136.876	% 27,7	Proje 31.06.2024 tarihi itibarıyla fiili tamamlanmış olup, Sonuç Raporu ve Ekleri incelenmek üzere teslim edilmiştir. Muayene kabul İşlemlerinden sonra kalan % 30 luk ödemesi yapılacaktır. (136.875.60 TL ödeme Alt proje olan ve 2023 yılında tamamlanan Foça ÖÇK Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi Kesin Hakediş Tutarıdır.)
2016K10-150495	İklim Değişikliğinin Ekosisteme Etkisi Araştırması (Çevre Sektörü)	2021-2024	3.377.500	2.275.000	1.102.500	732.000	% 66,4	Proje tamamlanmıştır.Son hakediş ödemesi yapılmıştır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2025	10.700.000	3.978.000	2.700.000	360.000	% 13,3	
	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı	2017-2025	10.700.000	3.978.000	2.700.000	360.000	% 13,3	"Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Erzurum, Bingöl, Bayburt, Iğdır, Siirt, Sinop, Amasya İllerinde Bulunan Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 24.05.2023 tarihinde Online Çevre Proje İnşaat Mühendislik Danışmanlık Yazılım Bilişim ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır. "Mersin İli, Silifke İlçesi, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" çalışmaları 09.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup Hakediş ödemesi (%100) 300.000,00 TL+KDV (360.000,00 KDV dahil) 16/07/2024 tarihinde yapılmıştır. 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan "Antalya, Karaman, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" hizmet alımı işine ilişkin 02.08.2024 tarihinde 1.940.000,00 TL+KDV bedelle sözleşme imzalanmış olup proje süreci devam etmektedir.(2024-2025) "Balıkesir, Bartın, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop ve Zonguldak İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" hizmet alımı işine sözleşme 27/06/2024 tarihinde 1.447.000,00 TL+KDV bedelle imzalanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. (2024-2025)
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2025	8.500.000		3.420.000	361.800	% 10,6	
	Karaburun-İlçeri Körfezi ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama	2024-2025	3.200.000		990.000	0	% 0,0	20.08.2024 tarihinde ihalesi yapılmıştır.İhalede verilen teklifler bütçenin üzerinde kaldığından ihalesi iptal olmuştur. İlave bütçe istenilmiş olup, bütçe geldiğinde tekrar ihalesi yapılacaktır.
	Karaburun-İlçeri Körfezi ÖÇKB Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.500.000		1.170.000	361.800	% 30,9	07.06.2024 tarihinde işe başlanmıştır.Hazırlanan Ön Rapor doğrultusunda 1. hakediş ödemesi yapılmıştır.
	Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.800.000		1.260.000	0	% 0,0	Projenin sözleşmesi 14.08.2024 tarihinde imzalanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	11.000.000	7.794.000	5.000	0	% 0,0	Projenin arazi çalışmaları devam etmekte olup projenin 2025 yılının başında bitmesi öngörülmektedir.
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2027	1.704.100.000	405.000.000	285.190.000	267.408.415	% 93,8	2024 yılının ilk 9 ayında hakedişli olarak 267.408.415,00 TL ödenmiş olup iş devam etmektedir. Yıl içerisinde Protokol doğrultusunda Hakediş Ödemeleri yapılmaya devam edecektir.
	Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)		850.000.000	125.000.000	146.090.000	146.090.000	% 100,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		854.100.000	280.000.000	139.100.000	121.318.415	% 87,2	
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı		800.000.000	150.000.000	200.000.000	180.704.964	% 90,4	
2024K10-225388	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2024	4.000.000		4.000.000	1.524.000	% 38,1	
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	560.000		560.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmektedir.
	Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	535.000		535.000	264.000	% 49,3	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi yapılmıştır.
	Patara ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	1.040.000		1.040.000	360.000	% 34,6	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi yapılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Belek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	800.000		800.000	360.000	% 45,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi yapılmıştır.
	Göksu Deltası ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	1.065.000		1.065.000	540.000	% 50,7	Proje Çalışmaları devam etmekte olup 1.hakediş ödemesi yapılmıştır.
2024K10-225397	Marmara Adası Maden Ocağı Rehabilitasyon (Çevre Sektörü)	2024-2024	40.000		40.000	0	% 0,0	Proje Ödeneği Marmara Projelerine Revizyon edilerek aktarıldı.
2024K10-225398	Marmara Denizinde Deniz Çayırı Alanı Tespiti (Çevre Sektörü)	2024-2024	5.960.000		5.960.000	3.020.000	% 50,7	Proje çalışmaları devam etmektedir. Projeye ait 1. ve 2. Hakediş ödemesi yükleniciye yapılmıştır.
2024K10-225399	Marmara Denizi Denizanası Artışı Araştırılma FAZ-II (Çevre Sektörü)	2024-2024	3.000.000		3.000.000	1.800.000	% 60,0	Proje çalışmaları devam etmektedir. Projeye ait 1. ve 2. Hakediş ödemesi yükleniciye yapılmıştır.
2024K10-225400	Mağaraların Araştırılması (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2024	2.700.000		2.700.000	0	% 0,0	Karasal Mağaraların Araştırılması Hizmet Alım işi sözleşmesi imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgözü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	8.500.000		2.677.500	0	% 0,0	05.08.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup 04.09.2024 tarihinde işe başlanılmıştır. Ön Rapor sunulmuştur. (ödemesiz)
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	6.675.000		1.800.000	0	% 0,0	06.08.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup 02.09.2024 tarihinde işe başlanılmıştır. Ön Rapor sunulmuştur. (ödemesiz)

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme (Çevre Sektörü)	2024-2026	35.000.000		6.300.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.
2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme (**Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	2.900.000		1.200.000	720.000	% 60,0	Proje çalışmaları devam etmektedir. Projeye ait 1.Hakediş ödemesi yükleniciye yapılmıştır.
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	3.000.000		1.500.000	1.410.000	% 94,0	Antalya, Isparta ve Burdur İllerinde Bulunan Anıt Ağaçların ve Tescilli Ağaç Topluklarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi Hizmet Alım İşi tamamlanmış olup, hakedişi yapılmıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2024-2026			5.000.000	0	% 0,0	
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.145.218.500	183.205.000	257.504.100	164.088.079	% 63,7	
9 Proje		DÖNER SERMAYE	1.281.822.000	384.216.000	265.605.000	134.972.415	% 50,8	
		GENEL TOPLAM	2.427.040.500	567.421.000	523.109.100	299.060.494	% 57,2	
1 Proje		Belediye Katkısı	800.000.000	150.000.000	200.000.000	180.704.964	% 90,4	
		Kamu laştırma	0	0	5.000.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2025	7.899.000	5.100.000	450.000	240.000	% 53,3	YERELBİLGİ Sistemi ile her yıl 11 adet form düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç olan veriler Sistem ile toplanacaktır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	20.000.000	6.500.000	4.500.000	0	% 0,0	Söz konusu proj ile ilgili olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları beklenmiştir. Yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ancak gelinen noktada Cumhurbaşkanlığının 2024/7 Sayılı ve Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesi yayımlanmış olup yapılacak ihaleler durdurulmuştur.
2024K07-224132	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	5.000.000.000		5.000.000.000	2.500.000.000	% 50,0	2.5 Milyar TL ödenek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 28.06.2024 tarihinde İLBANK KÖYDES hesabına aktarılmıştır. Ortak alım, yönetim müşavirlik hizmetleri ile yapılan işlere ait hakediş ödemeleri İLBANK tarafından gerçekleştirilmektedir. Geriye kalan 2.5 Milyar TL ödeneğin aktarımı beklenmektedir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	5.027.899.000	11.600.000	4.950.000	240.000	% 4,8	

Dipnot: 652

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K01-225160	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2024-2024	25.870.000		25.870.000	9.000.000	% 34,8	25.600.000,00.-'e başlangıç ödeneğinden 100.000,00.-'e ödenek blokeli olup, 25.500.000,00.-'e ödenek serbest bırakılmıştır. Toplam ödenekten 9.000.000,00.-'e Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgili tertibine aktarılmış ve 500.000,00.-'e ise kurum içi ödenekten düşülmüş olup 16.000.000,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
	Harita Alımları	2024-2024	135.000		135.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2024-2024	135.000		135.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2024-2024	25.600.000		25.600.000	9.000.000	% 35,2	25.600.000,00.-'e başlangıç ödeneğinden 100.000,00.-'e ödenek blokeli olup, 25.500.000,00.-'e ödenek serbest bırakılmıştır. Toplam ödenekten 9.000.000,00.-'e Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgili tertibine aktarılmış ve 500.000,00.-'e ise kurum içi ödenekten düşülmüş olup 16.000.000,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2024-2026			250.000.000	249.281.384	% 99,7	250.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 249.281.384.-'e ödeme yapılmış olup, 718.616,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2024-2026			22.000.000	6.961.716	% 31,6	22.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 6.961.716,00.-'e ödeme yapılmış olup, 15.038.284,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	25.870.000	0	25.870.000	0	% 0,0	
Kamu laştırma			0	0	272.000.000	256.243.100	% 94,2	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormancılık Sektörü)	2023-2026	37.050.000	2.850.000	7.115.000	0	% 0,0	
	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2026	29.500.000	1.500.000	5.000.000	0	% 0,0	UASİS Yazılımı Bakım Hizmeti işi kapsamında sistemde yazılımsal hata meydana geldikçe hata tespit ve düzeltme çalışmaları yürütülmektedir. Sözleşme gereği çalışma raporu-1 kapsamındaki hizmetlerin tamamlanması şartı ile 4.160.000 TL + KDV ödeneginin 4. çeyrekte harcanması planlanmaktadır.
	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2025	1.650.000	550.000	495.000	0	% 0,0	Doğal Kaynakların İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Projesi Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) İle Web Portal Yazılım Projesi: WEB tabanlı CBS özelliklerine sahip yapılacak bir yazılım oluşturularak daha önce farklı projelerde ulusal bazda üretmiş olduğu haritaların (çölleşme, organik karbon, erozyon, oyuntu erozyonu vd.) ve bunlara ait tematik haritaların oluşturulmuş olduğu raster ve vektör verilerin CBS ortamında yayınlanması amacıyla ihale yapılmıştır.
	Toprak Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2023-2025	1.650.000	550.000	495.000	0	% 0,0	Ankara Büyükşehir Belediyesi Arıtma Çamurlarının Toprak ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi-Pursaklar Örneği Projesi ile ilgili kurum görüşmeleri devam etmektedir.
	Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası	2023-2025	750.000	250.000	225.000	0	% 0,0	Proje yılı ödeneginden 223.000 TL ödenek Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi projesine aktarılmıştır.
	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	2024-2026	3.500.000		900.000	0	% 0,0	Proje için Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası Projesi bütçesinden 223.000 TL; Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi bütçesinden 178.000 TL ödenegin aktarılması ile ilgili yatırım programı revizyonu talebi yapılmış olup söz konusu revizyon işlemlerinden Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası Projesi bütçesinden 223.000 TL aktarılması SBB tarafından uygun görülmüştür.
2023A05-196786	Bolaman ve Çekerek Nehri Havzaları Rehabilitasyonu (Ormancılık Sektörü)	2023-2028	10.000.000	1.635.000	250.000	0	% 0,0	Bolaman ve Çekerek Nehri Havzası izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2024 Yılı Yatırım Programında yer alan 248.000 TL ödenegin Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıplar İzleme Sistemi projesine aktarılması kapsamında yatırım programı revizyonu için talep yapılmış olup söz konusu talep SBB tarafından uygun görülmüştür.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormanlık Sektörü)	2024-2026	60.580.000		27.380.000	1.774.699	% 6,5	
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2024-2026	60.400.000		27.200.000	1.774.699	% 6,5	İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgar Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya (Adakale Mevkii) Örneği ve Konya-Karapınar (Hotamış Mevkii) Örneği (Bakım-Onarım ve Tamamlama Faaliyetleri): kapsamında ihaleye çıkmış, yüklenici firmaya yapılacak iş ve işlemler hakkında gerekli bilgiler verilmiş ve arazi uygulama çalışmaları başlatılmıştır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İllerine Ait Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Oluşturulması Projesi Kapsamında; Proje kapsamında yürütülen çalışmalar takip edilmekte ve gerekli kontroller sağlanmaktadır. Projede gelinen nokta hakkında firmadan brifing alınmıştır. Erozyonla Mücadele, İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi kapsamında: kapsamında ihaleye çıkmış, yüklenici firmaya yapılacak iş ve işlemler hakkında gerekli bilgiler verilmiş ve arazi uygulama çalışmaları başlatılmıştır. 1 adet Afyonkarahisar İli İhsaniye İlçesi Ayazini Köyü Havzası Sel Kontrol Revize Projesi tamamlanmıştır. 1 adet Çankırı İli Orta İlçesi Kırşakal Mah. Karbon Yutak Alan Ağaçlandırma Projesi tamamlanmıştır. 1 adet Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Karapazar Mah. Karbon Yutak Alan Ağaçlandırma Projesi tamamlanmıştır. 1 adet Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Baraklı Mah. Karbon Yutak Alan Ağaçlandırma Projesi tamamlanmıştır. 1 adet Kayseri İli Bünyan İlçesi Güllüce Mah. Karbon Yutak Alan Ağaçlandırma Projesi tamamlanmıştır. 1 adet Potansiyel Çığ Başlama Bölgeleri Haritaları Verilerin Güncellenmesi Projesi çalışması devam etmektedir. 5 adet sel kontrol, ağaçlandırma ve erozyon kontrol projelerinin çalışmaları devam etmektedir. 1 adet sel kontrol projesi uygulaması devam etmektedir. Önceki yıllarda tesis edilen Aksaray ve Ankara(Pursaklar) yutak alanlarına ait sahalarda bakım çalışmaları yapılmış olup tamamlama dikimi için fidan temini ve ihale süreçleri başlatılmıştır. Kayseri, Çankırı ve Kırşehir illerinde Yeni Karbon Yutak Alanlarına ait ihale süreçleri tamamlanmış olup Kırşehir ve Çankırı illerinde tesis edilecek Karbon Yutak Alanları için yüklenicilere arazi teslimi yapılacak ve Kayseri ilinde tesis edilecek Karbon Yutak Alanı için ise arazi çalışmaları başlamıştır.
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2024-2024	180.000		180.000		% 0,0	2024 Yılı Yatırım Programında yer alan 178.000 TL ödeneğin Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi projesine aktarılması kapsamında yatırım programı revizyonu için talep yapılmış olup söz konusu talep SBB tarafından uygun görülmemiştir.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi (Ormanlık Sektörü)	2024-2027	46.000.000		7.000.000		% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	107.630.000	4.485.000	34.745.000	1.774.699	% 5,1	
1 Proje		UNDP HİBESİ	46.000.000	0	7.000.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2024	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	
	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (**.Döner Sermaye)	2024-2025	57.629.000		20.192.000	0	% 0,0	İhalesi Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 12.06.2024 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 43.850.000 TL (KDV dahil 57.608.400 TL) üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır.
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	151.475.000		135.000.000	0	% 0,0	Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 07.02.2024 tarihli ve E-16517702-602.07.04-8696978 sayılı yazı ile ihale talimatı verilmiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği		5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		146.475.000		130.000.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-224617	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2024-2024	6.300.000		6.300.000	6.209.497	% 98,6	
	Hizmet Binası Onarımı	2024-2024	7.200.000		7.200.000	7.108.440	% 98,7	
2024G00-224585	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2024-2024	3.060.000		3.060.000	393.840	% 12,9	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	21.560.000	0	21.560.000	13.711.777	% 63,6	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	205.604.000	500.000	151.192.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	227.164.000	500.000	172.752.000	13.711.777	% 7,9	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.09.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2025	150.000.000		80.000.000	0	% 0,0	
2024G00-224585	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2024-2024	90.000		90.000	0	% 0,0	
2024K09-224617	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2024-2024	0		0			
	Hizmet Binası Onarımı	2024-2024	0		0			
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	90.000	0	90.000	0	% 0,0	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	150.000.000	0	80.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	150.090.000	0	80.090.000	0	% 0,0	
