



2024 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

4. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2024 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.510.094.000,00	12.754.369.510,94	11.769.751.194,91	% 92,3
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.503.685.000,00	1.759.132.993,12	1.547.131.589,13	% 87,9
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	725.012.000,00	1.801.807.241,43	1.267.469.380,99	% 70,3
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.268.000,00	1.705.289.485,03	1.188.165.482,63	% 69,7
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	104.744.000,00	96.517.756,40	79.303.898,36	% 82,2
05	CARİ TRANSFERLER	224.845.034.000,00	226.319.526.308,66	223.431.121.535,62	% 98,7
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	219.740.028.000,00	219.740.028.000,00	217.126.799.000,00	% 98,8
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	1.771.000.000,00	1.462.562.000,00	1.242.640.585,83	% 85,0
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	2.750.000.000,00	4.472.422.000,00	4.472.420.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	356.000.000,00	323.552.905,94	318.831.500,00	% 98,5
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	179.193.000,00	179.193.000,00	133.526.275,82	% 74,5
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	46.631.000,00	48.000.402,72	44.894.173,97	% 93,5
	İskan Uygulamaları Ödeneği	1.818.000,00	1.818.000,00	60.000,00	% 3,3
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	364.000,00	950.000,00	950.000,00	% 100,0
	Deprem Bölgesi İLBANK Projeleri KDV Ödemeleri	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	% 100,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.624.871.000,00	151.913.059.459,13	146.749.832.469,93	% 96,6
	Bakanlık Yatırım Programı	14.337.871.000,00	15.474.185.747,10	10.653.658.677,68	% 68,8
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	287.000.000,00	409.000.000,00	336.732.864,22	% 82,3
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	123.508.000.000,00	123.485.456.080,68	% 100,0
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	338.000.000,00	317.762.171,11	% 94,0
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	12.183.873.712,03	11.956.222.676,24	% 98,1
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	18.282.187.000,00	22.912.796.413,50	22.804.633.895,82	% 99,5
	Bakanlık Yatırım Programı	428.271.000,00	353.901.000,00	245.738.482,66	% 69,4
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	1.200.013.304,50	1.200.013.304,50	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	113.916.000,00	113.916.000,00	113.916.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	67.100.000,00	67.099.999,66	% 100,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	3.430.366.109,00	3.430.366.109,00	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	250.500.000,00	225.451.400,00	171.825.000,00	% 76,2
GENEL TOPLAM		271.741.383.000,00	417.686.143.326,78	407.741.765.066,40	% 97,6



BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

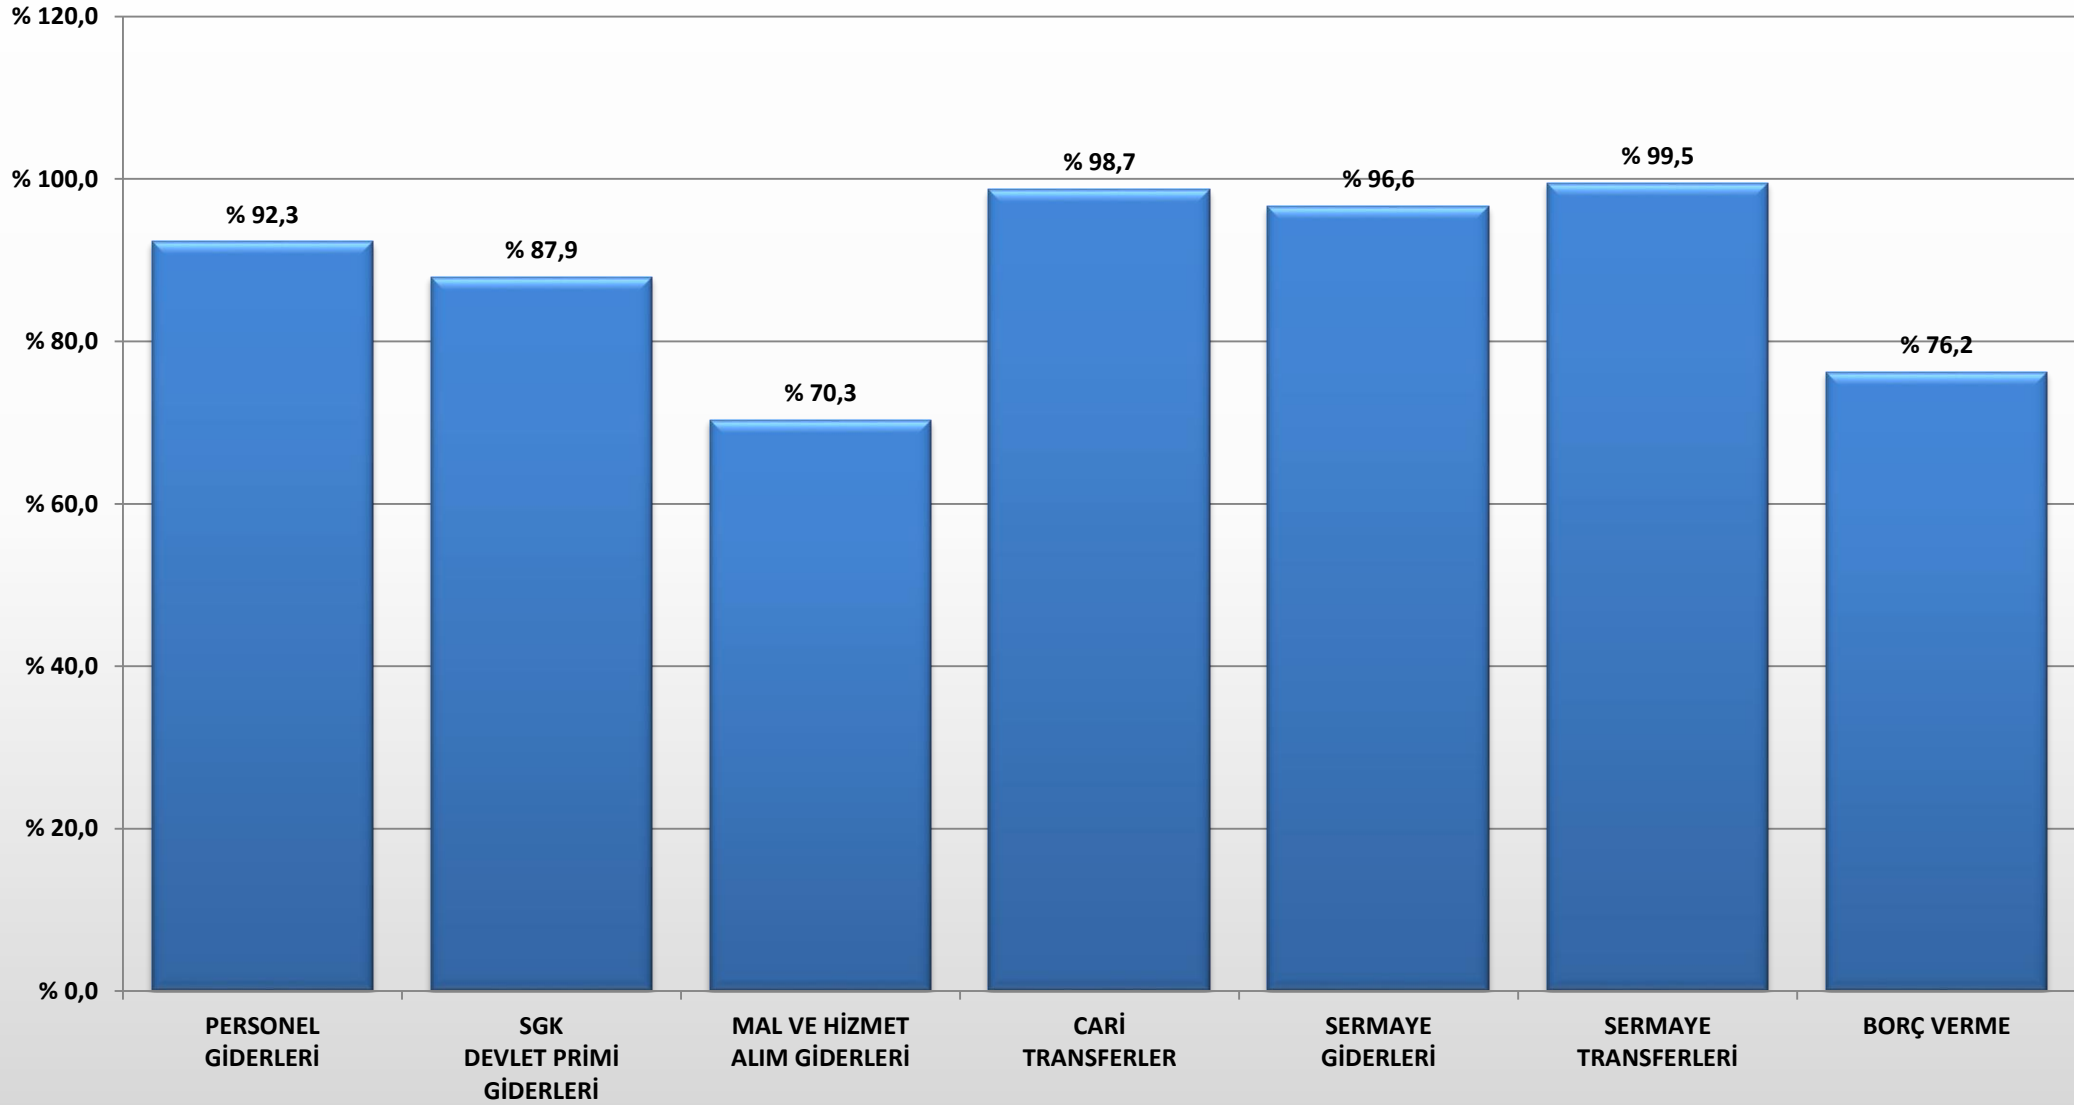




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2024 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2024 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	5	69.381.000,00	34.528.000,00	10.899.720,00	% 31,6
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	13	1.215.283.000,00	197.155.500,00	124.147.090,00	% 63,0
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	3	620.160.000,00	237.634.000,00	215.317.367,00	% 90,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	24	58.969.092.000,00	15.195.665.400,00	10.368.311.445,00	% 68,2
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	7.250.000,00	5.675.000,00	2.823.588,00	% 49,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	19	732.716.000,00	470.000.000,00	344.562.371,00	% 73,3
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	9.183.080.000,00	8.203.000,00	8.203.000,00	% 100,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	29	3.573.140.500,00	731.209.100,00	504.784.056,00	% 69,0
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	5.027.899.000,00	4.950.000,00	240.000,00	% 4,8
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	25.870.000,00	25.870.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	4	153.630.000,00	34.745.000,00	32.296.423,00	% 93,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	407.389.000,00	168.752.000,00	25.937.385,00	% 15,4
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	3	185.090.000,00	115.090.000,00	35.000.000,00	% 30,4
GENEL TOPLAM	109	80.169.980.500,00	17.229.477.000,00	11.672.522.445,00	% 67,7
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	76	77.011.643.500,00	15.875.506.000,00	10.956.368.400,00	% 69,0
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	33	3.158.337.000,00	1.353.971.000,00	716.154.045,00	% 52,9
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		409.000.000,00	336.732.864,22	% 82,3



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

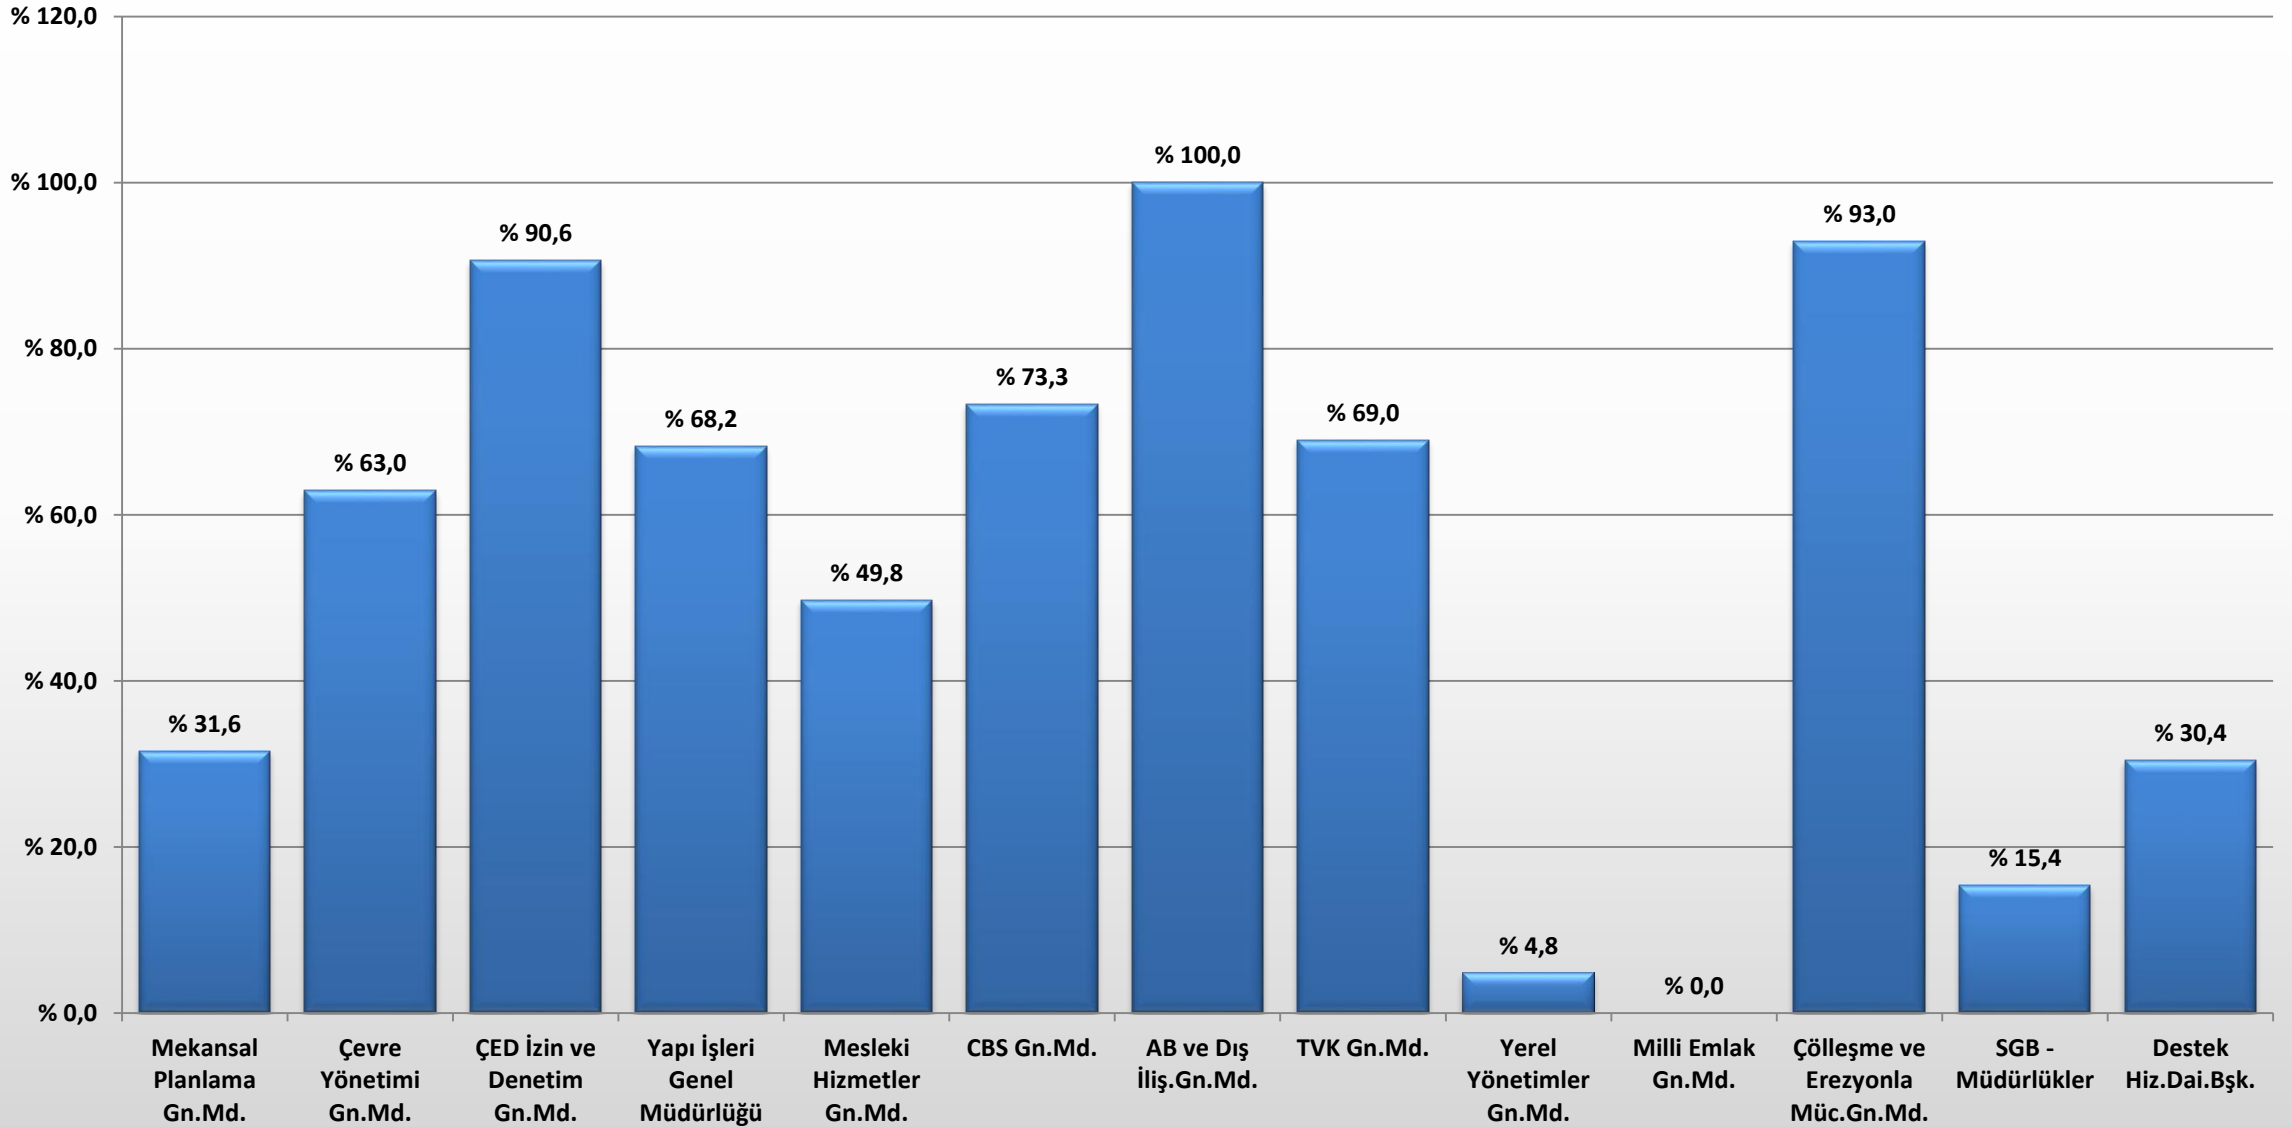



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2024 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	196.686.000,00	201.014.000,00	177.244.104,55	% 88,2
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	6.767.900.000,00	9.352.013.170,90	9.051.513.410,97	% 96,8
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	616.707.000,00	597.235.835,29	552.008.993,31	% 92,4
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	14.615.447.000,00	146.613.362.854,72	141.869.899.029,18	% 96,8
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	270.000,00	5.814.000,00	5.683.657,40	% 97,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	160.201.000,00	156.026.000,00	151.660.732,85	% 97,2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	334.306.000,00	316.656.000,00	293.806.173,89	% 92,8
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	275.611.000,00	342.447.000,00	294.164.733,26	% 85,9
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	498.614.000,00	451.328.977,40	361.755.521,76	% 80,2
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	64.031.000,00	65.681.000,00	58.877.916,40	% 89,6
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	466.763.000,00	547.833.000,00	459.659.653,57	% 83,9
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	135.579.000,00	142.860.200,00	137.899.420,68	% 96,5
Personel Genel Müdürlüğü	66.350.000,00	71.450.000,00	69.427.505,99	% 97,2
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	84.872.000,00	1.008.022.000,00	940.720.245,85	% 93,3
Özel Kalem Müdürlüğü	94.510.000,00	79.152.400,00	71.994.426,72	% 91,0
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	616.808.000,00	1.003.251.886,82	621.729.751,13	% 62,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	20.552.000,00	21.172.000,00	18.746.389,13	% 88,5
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	119.018.000,00	118.143.000,00	114.004.166,75	% 96,5
Strateji Geliştirme Başkanlığı	236.148.917.000,00	236.129.309.530,94	233.509.055.641,91	% 98,9
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	8.776.000,00	11.435.600,00	10.946.264,80	% 95,7
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	54.199.000,00	52.799.000,00	51.570.022,89	% 97,7
İl Müdürlükleri	10.360.652.000,00	20.355.008.670,71	18.881.711.893,77	% 92,8
Yurtdışı Teşkilatı	34.614.000,00	44.127.200,00	37.685.409,64	% 85,4
TOPLAM	271.741.383.000,00	417.686.143.326,78	407.741.765.066,40	% 97,6



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

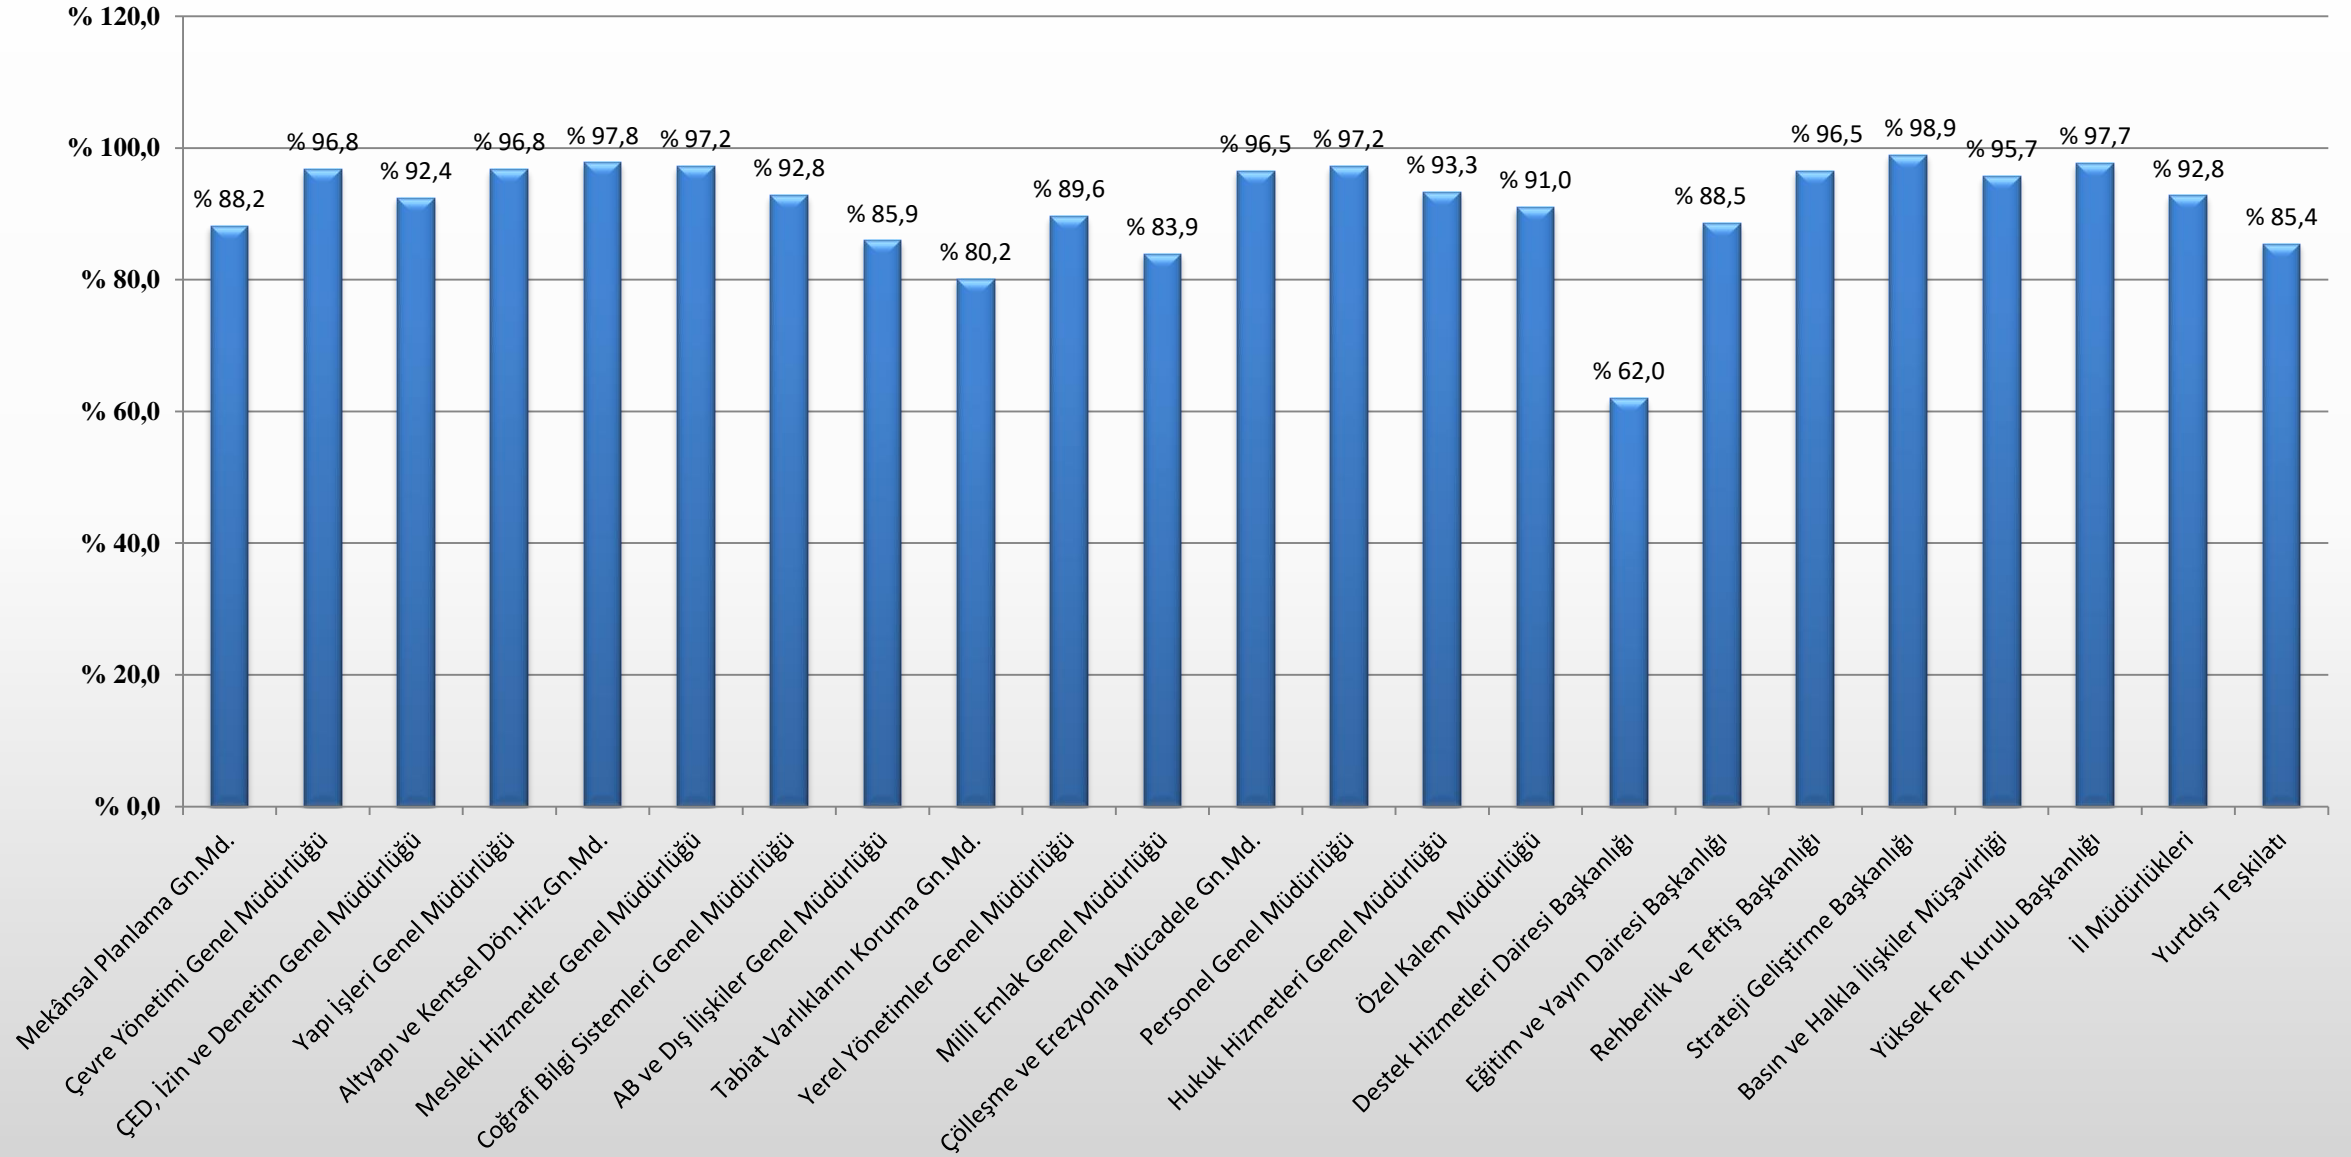

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Harcama Birimi Bazında

2024 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2025	28.456.000	9.286.000	15.327.000	9.405.000	% 61,4	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2025	19.416.000	3.486.000	12.087.000	9.405.000	% 77,8	Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması, Genel Müdürlüğümüz kontrol ve denetiminde, 1 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile 81 İl Müdürlüğümüz, Belediyeler ve Özel Sektör tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporu onay sürecine ilişkin tüm iş ve işlemler, kâğıt ortamının yanı sıra eş zamanlı olarak Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Tüm veri, harita vb. girişler ve iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı bu sistem üzerinden yürütülmekte olup etüt raporlarına ait sayısal verilerin tamamı ortak bir portal altında depolanmakta ve ilgili paydaş kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca afet tehlikelerinin belirlenmesi ve planlamada dikkate alınmasına ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda verilerin analiz edilebilmesi amacıyla "Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde Veri Analizi" projesi 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmış olup, proje çalışmalarına 11.01.2024 tarihi itibarı ile başlamıştır. 20.03.2024 tarihinde projenin iş kalemlerine göre %15'lik kısmı, 04.12.2024 tarihinde ise yine projenin iş kalemlerine göre %45'lik kısmı tamamlanmış olup, toplamda %60'lık kısmı tamamlanarak iki aşamada hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk aşamasında, - YERBİS Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı hazırlanmış - YERBİS uygulaması açık kaynak kodlu (PostgreSQL) olarak yazılmış, Projenin ikinci aşamasında, - Geliştirme, test ve devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. Yazılım geliştirme ve güncelleme çalışmaları proje takvimine uygun devam etmektedir.
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2024	9.040.000	5.800.000	3.240.000	0	% 0,0	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Projesi için yaklaşık maliyete yönelik fiyat teklifleri alınmış olup yaklaşık maliyetin projenin 2024 yılı bütçesinden fazla olması nedeniyle proje gerçekleştirilememektedir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2025	23.785.000	0	10.800.000	0	% 0,0	2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan "Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi- Etap 1" projesi ile 3 yerleşim alanında yer alan aktif fay zonları 1/1.000 ölçekte haritalanacak, fay sakınım zonları belirlenerek Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS) üzerinden ilgili kurum/kuruluşların kullanımına açılacaktır. 2023 yılında projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet belirlenebilmesi için müellif firmalardan teklif mektupları alınarak ihale süreci başlatılmış ancak bütçe yetersizliği nedeniyle ihale süreci tamamlanamamıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe talebinde bulunulmuştur. Arttırılan bütçe ile yeniden teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır, ancak bu süreçte de sarraf tedbirleri nedeniyle proje bütçesinde tekrar kesintiler meydana gelmiştir. Düzenlenen proje bütçesine uygun olacak şekilde projenin Teknik Şartnamesi tekrar revize edilerek ihale süreci başlatılmış, ancak ön yeterlilik başvurusu yapan istekli sayısı yetersizliği nedeniyle ihale gerçekleştirilememiştir. Projenin yapılabilmesi için 2024 yılı Eylül ayı içerisinde tekrar piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenmiş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan belirlenen yaklaşık maliyet doğrultusunda proje bütçesinin tekrar revize edilmesi talebinde bulunulmuştur. Yeniden arttırılan bütçe ile tekrar teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır.
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2025	6.390.000	1.000.000	4.401.000	1.494.720	% 34,0	
	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2025	6.390.000	1.000.000	4.401.000	1.494.720	% 34,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	5.250.000		2.000.000	0	% 0,0	Projeye ilişkin ihale süreci başlatılmış ancak ihale süreci sonucunda İhale komisyonunca ihale iptal kararları alınmış olup projeye yönelik 2024 yılında herhangi bir işlem başlatılmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığından projelerin sürelerinin 2026 yılına uzatılması ve bütçe artırımı yapılması talep edilmiştir.
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	5.500.000		2.000.000	0	% 0,0	Projeye ilişkin ihale süreci başlatılmış ancak ihale süreci sonucunda İhale komisyonunca ihale iptal kararları alınmış olup projeye yönelik 2024 yılında herhangi bir işlem başlatılmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığından projelerin sürelerinin 2026 yılına uzatılması ve bütçe artırımı yapılması talep edilmiştir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	58.631.000	10.286.000	30.528.000	10.899.720	% 35,7	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	10.750.000	0	4.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	69.381.000	10.286.000	34.528.000	10.899.720	% 31,6	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	25.000.000		3.000.000	3.000.000	% 100,0	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 16.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 20.226.852 TL (KDV Hariç) ve projenin toplam süresi 764 (yedi yüz altmış dört) takvim gündür. 15.11.2024 tarihinde sunulan Başlangıç Raporu uygun görüldüğünden hakediş işlemleri tamamlanarak, kamu hizmet sunucusuna 2.500.000 TL (KDV Hariç) ödeme yapılmıştır. 26.12.2024 tarihinde proje açılış toplantısı Bakanlığımız ana hizmet binasında gerçekleştirilmiştir.
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	50.000.000		15.000.000	14.186.124	% 94,6	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 15.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 39.405.901 TL + KDV olup; 15.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 29.11.2024 tarihinde Başlangıç Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş olup ilk ödeme gerçekleştirilmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde Açılış Toplantısı yapılmıştır.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2026	808.998.000	265.000.000	135.000.000	73.202.415	% 54,2	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneğinden hakediş kapsamında 49.953.569 TL, 2023 yılı ödeneğinden 157.584.504 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılı yatırım programında 150 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 2024 yılı KAP detay liste Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 28/3/2024 tarihli yazı ile onaylanmıştır. Proje bütçesi tasarruf tedbirleri kapsamında güncellenmiş olup 135 milyon TL'dir. 9/7/2024 tarihinde proje değerlendirme komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanan Proje detay listesindeki işler tamamlanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2025	4.000.000	500.000	1.800.000	0	% 0,0	Proje bütçesi dikkate alındığında artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2025 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize yapılarak başvurulmuştur.
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	10.121.000	6.721.000	3.400.000	3.150.000	% 92,6	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Projesi 2024 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olup, bakım onarım aşamasındadır. Proje kapsamında; "Üç Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Modellenmesine" yönelik 3B hava kalitesi analiz çıktı verilerinin üretimi, üretilen verilerin mevcut NEFES yazılımına entegrasyonu, mevcut NEFES yazılımında iyileştirmeye yönelik geliştirmelerin yapılması, web NEFES yazılımı için yazılım ergonomisi çalışmalarının yapılması, Üç Boyutlu Masaüstü CBS Yazılımı üzerinde çalışan Hava Kalitesi Modelleme Modülünde sağlık indeksinin hesaplanması ve web üzerinden verilerin sunulması, vatandaş odaklı hava kalitesi hizmetlerinin analiz edilmesi ve raporlanması, 81 ilin tüm ilçelerine ait 3 boyutlu ortamda hava kalitesi haritaları hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2024	12.220.000	6.110.000	6.110.000	6.000.000	% 98,2	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibariyle başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü Çalıştayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, Otomotiv, Tüketici Ürünleri İmalatı, Plastik ve Tekstil Sektörüne Yönelik ilgili paydaşların katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi taslak Raporları sunulmuş olup nihai hale getirilmesi hazırlıkları devam etmektedir. 2024 yılında protokol kapsamında 6.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 27/12/2024 tarihinde imzalanan ek protokol ile proje süresi 200 gün uzatılmasına karar verilmiştir.
2023K10-198444	Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2024	8.100.000	2.000.000	6.100.000	6.096.080	% 99,9	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) işbirliğinde yürütülmekte olan "Barcelona Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Dokümanlar Çerçevesinde Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı Projesi"nde geçen süreçte 2. ve 3. Ara Raporlar kabul edilerek, ödemeleri tamamlanmıştır. Yıl sonuna kadar Çalışma Ziyareti, Çalıştay, Rehber Dokümanların Hazırlanması çalışmaları tamamlanmış ve Final Raporunun İdare'ye sunulması proje nihailendirilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)	2018-2026	9.500.000	0	3.150.000	3.138.000	% 99,6	EKÖK Sektör Uzmanı Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile 17.10.2024 tarihinde imzalanan protokol sonrası 18.10.2024 tarihinde başlamıştır. Proje ile Proje Yönetim Planı Raporu hazırlanmış ve ilk ödemesi gerçekleşmiştir. Projede aşağıda sıralanan işlerin tamamlanması hedeflenmiştir: - Proje Başlangıç Toplantısı - Proje Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları - Proje Yönetim Planı Raporu - Sektörel Tebliğlerin Hazırlanması - Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Raporların Usul ve Esaslarının Hazırlanması - Uzmanlığa Yönelik Usul ve Esaslar ile Eğitim ve Rehber Dokümanların Hazırlanması - Sektörel Toplantılar - Final Raporu
	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2026	9.500.000	0	3.150.000	3.138.000	% 99,6	
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2025	14.466.000	5.046.000	3.922.000	3.888.900	% 99,2	
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2025	5.500.000	0	2.000	0	% 0,0	Yatırım programından çıkartılacağı bilgisi ulaştığından proje başlatılmamıştır.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.966.000	5.046.000	3.920.000	3.888.900	% 99,2	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2 Projesi 2024 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olup, bakım onarım aşamasındadır. Proje kapsamında; HEY Portalı mevcut mimarisi, mevcut yazılım geliştirme araçları analiz edilmiş olup, gerekli servis entegrasyonları yapılmıştır. Katı yakıt modülü mobil versiyonu hazırlanmıştır. "Tarım Faaliyetlerinin" hesaplanması ve "Emisyon Ücreti ve Emisyon Ticareti Tahsilatlarına yönelik ilave modüller eklenmiştir. 2021-2022-2023 ve 2024 yıllarına ait stratejik hava kalitesi haritaları hazırlanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2026	15.209.000	5.119.000	2.545.500	2.028.794	% 79,7	<p>Proje, aynı proje adı ve proje numarası altında 2 aşamalı olarak yürütülmekte olup projenin toplam bütçesi 15.210.000 ₺ (KDV Dahil)'dir. Birinci aşama (Faz-1), 08/11/2022 tarihinde TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan Sözleşme ile yürürlüğe girmiştir. Projenin birinci fazı için imzalanan Sözleşme bedeli 7.000.000,00 ₺ (KDV Dahil)'dir. Bu çerçevede 5 (beş) hakediş ödemesinin;</p> <p>Kasım 2022 tarihinde 1. hakedişi 2.975.461,84 ₺;</p> <p>Kasım 2023 tarihinde 2. hakedişi 944.082,36 ₺ ve</p> <p>Aralık 2024 tarihinde 3. hakedişi 1.071.468,00 ₺ olarak gerçekleştirilmiştir.</p> <p>4. hakediş bedeli olan 941.298,92 ₺ ve 5. hakediş bedeli 1.071.468,00₺ yüklenici kaynaklı eksik rapor teslimleri nedeniyle emanete alınmıştır.</p> <p>Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması için mevcut bütçe 8.000.000 ₺ olup ikinci fazın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken 2025 yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında 12.000.000 ₺ ilave bütçe talep edilmiştir.</p>
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (Çevre Sektörü)	2023-2025	10.646.000	3.526.000	3.560.000	3.050.711	% 85,7	<p>Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen hususlara uygun olarak; yazılım geliştirme, test ve entegrasyon çalışmaları sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür. Son olarak 27.11.2024 tarihinde 2. ilerleme raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş ve tarafımızca uygun değerlendirilmiştir.</p> <p>Diğer taraftan sistemin çalışır durumda olduğu 7 gün 24 saat esasına göre takip edilmiştir. Sistemsel konularla ilgili olarak telefon ve e-posta desteği sorunsuz bir şekilde karşılanmıştır.</p>

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2024	13.050.000	7.080.000	5.970.000	12.255	% 0,2	2024 yılı 1. çeyrekte; Proje'nin İnşaat Bileşeni iptaline yönelik paydaşlar ile ortak karar alınmış olup, ikinci zeyilname ile bu karar uygulamaya alınmıştır. Takip eden aylarda Erzincan'ın Iliç ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle, Bakanlık personelinin iş yoğunluğu ve seyahat sıklığı artmıştır. Proje faaliyetlerinin zamanında tamamlanması ve kaliteli çıktılara ulaşılması için proje paydaşlarının ortak kararı ile üçüncü Zeyilname onaylanmıştır. Proje'de 4 aylık bir süre uzatımı yapılmış olup, kapanış tarihi 8 Ağustos 2024 olarak güncellenmiştir. Projenin kalan faaliyetlerinin bu süre zarfında uygulanması hedeflenmiştir. 4-8 Mart 2024 tarihleri arasında Hollanda'ya üçüncü çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Bu ziyarette KOK'larla kirlenmiş sahaların yönetimine ve yasal çerçevelere ilişkin bilgi paylaşımı yapılmıştır. KSBS yazılımı ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Eğitimleri tamamlanmıştır. Ankara'da bir günlük Yaygınlaştırma Semineri düzenlenmiş ve farklı sektörlerden, akredite firmalardan, üniversitelerden temsilcilere mevcut durum aktarılmıştır. 9. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 04 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştır.
AB katkısı			73.950.000	40.121.000	33.829.000	80.000	% 0,2	2024 yılı 2. çeyrek döneminde projede dört Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje Bağımsız Nihai Değerlendirme Süreci tamamlanmıştır. 2024 yılı 3.çeyrek döneminde, Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi ve İzlenmesi Teknik Kılavuzu, Kirlenmiş Sahaların Risk Değerlendirmesi Teknik Kılavuzu, Entegre Kimyasal Yönetimi Raporu ve KOK'larla Kirlenmiş Sahalar için Teknik Kılavuz nihai hale getirilmiştir. Proje Kapanış Toplantısı 24 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin tüm bileşenleri tamamlanmış olup final raporunun sunulması beklenmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	24.004.000	10.351.000	7.598.000	6.393.811	% 84,2	"Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek" projesi 07.02.2022 tarihinde resmi olarak başlamıştır. "Türkiye'de End of Waste (Atık Sonu) Konseptinin Geliştirilmesi Projesi" 25.04.2023 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Söz konusu projenin sözleşme bütçesi 1.191.601,00 Avro olup, proje süresi 24 aydır. Başlangıç raporu (Inception report) Bakanlığımıza sunulmuş ve 26.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. 15.06.2023 tarihinde açılış toplantısı yapılmıştır. Saha ziyaretleri ve anketler tamamlanmıştır.
AB katkısı			136.019.000	58.657.000	43.055.000	36.250.000	% 84,2	
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	922.214.000	309.453.000	173.055.500	100.864.886	% 58,3	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	83.100.000	2.000.000	24.100.000	23.282.204	% 96,6	
		GENEL TOPLAM	1.005.314.000	311.453.000	197.155.500	124.147.090	% 63,0	
		AB KATKISI	209.969.000	98.778.000	76.884.000	36.330.000	% 47,3	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2025	466.200.000	220.000.000	109.734.000		% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği		258.200.000	133.000.000	49.734.000	48.874.574	% 98,3	Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyonu işi hakedişi ile 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne bölgesel olarak İstasyonların Bakım-Onarımı hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 2024 yılı için de Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakım, Onarım işine ait sözleşme imzalanmış olup, iş süreci devam etmektedir.
	Döner Sermaye Ödeneği		208.000.000	87.000.000	60.000.000	53.462.793	% 89,1	Sarf ve yedek malzeme alımı için 2 adet ihale yapılmış olup, söz konusu ihaleler başarıyla tamamlanmıştır.
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2024-2024	108.000.000		108.000.000	93.120.000	% 86,2	Hava kalitesi izleme istasyonlarının kurulumu için gerekli şartname hazırlanmış olup, yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile söz konusu işe ait bütçe ödeneği %10 oranında kesintiye uğradığından ihtiyaçlar bütçe olanakları çerçevesinde tekrardan gözden geçirilerek yaklaşık maliyet belirleme çalışmalarına yeniden başlanmış olup, ihale yapılmasının ardından istasyon kurulumları tamamlanmıştır.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2026	13.160.000	1.558.000	2.700.000	2.700.000	% 100,0	Bakanlığımız ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan "Türkiye Çevre Etiket Sistemi" nin (TÇES) Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yaygınlaştırılacak ürün grubunda kriter belirleme çalışmaları tamamlanmıştır.
2023K10-198443	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3 (*Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2024-2025	32.800.000		17.200.000	17.160.000	% 99,8	2024 yılında projenin faaliyetleri tamamlanmıştır. 04 Kasım 2024 tarihinde projenin açılışı gerçekleştirilmiştir. Temmuz 2024'de sefer gerçekleştirilmiştir. Aralık 2024 tarihinde final raporu çalışmaları tamamlanmıştır. 2024 yılı ödemeleri %99,8 oranında tamamlanmıştır. 2025 yılında proje çalışmaları devam etmektedir.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	379.360.000	134.558.000	160.434.000	144.694.574	% 90,2	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	240.800.000	87.000.000	77.200.000	70.622.793	% 91,5	
		GENEL TOPLAM	620.160.000	221.558.000	237.634.000	215.317.367	% 90,6	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	7.295.458.000	2.370.460.000	3.756.311.000	3.743.556.786	% 99,7	KABEV Projesi planlandığı gibi devam etmekte olup, 2025 yılı sonunda tamamlanacaktır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	7.218.198.000	2.300.000.000	3.749.511.000	3.739.041.278	% 99,7	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	77.260.000	70.460.000	6.800.000	4.515.508	% 66,4	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	9.344.660.000	19.884.000	47.719.000	820.429	% 1,7	Danışmanlık ihaleleri tamamlanmış olup, yapım ihalelerine 2025 yılında başlanacaktır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	9.197.500.000	10.400.000	4.719.000	478.800	% 10,1	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	147.160.000	9.484.000	43.000.000	341.629	% 0,8	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2028	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	2024 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2028	0	0	0			
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2028	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2 (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2024-2029	11.038.290.000		20.000	0	% 0,0	22 Ekim 2024 tarihinde İmzalanmış olup 2024 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	14.910.000.000	104.520.000	6.313.100.000	5.867.131.455	% 92,9	KADIYAP projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce belirlenen iller kapsamında Kahramanmaraş,Elazığ, Malatya illerinde ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanmış (Betonarme + Hafif Çalılık) 1800 adet kırsal konut inşaatı devam etmekte olup Fiziki seviyeleri %80-90 seviyelerinde dir.
2024G00-224663	Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA) (Konut Sektörü)	2024-2025	6.622.200.000		3.058.400.000	91.800	% 0,0	JICA keredi kapsamında müşavirliih ihalesi yapılarak değerlendirme aşamasında , yapılacak konutlar ihaleleri yapılmış, yer teslimleri yapılarak avans ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
	JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2024-2025	5.518.500.000		2.448.900.000	91.800	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği	2024-2025	1.103.700.000		609.500.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2024-2026	1.500.000.000		400.000.000	0	% 0,0	Çapa Hastanesi projesi ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.
	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı	2024-2026	1.200.000.000		390.000.000	0	% 0,0	
	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat	2024-2026	300.000.000		10.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Döner Sermaye)	2021-2024	89.874.000	61.500.000	28.374.000	28.374.000	% 100,0	Proje işi tamamlanmış olup 04.12.2024 tarihi itibarıyla geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2024	78.218.000	50.000.000	28.218.000	28.218.000	% 100,0	Proje işi tamamlanmış olup Nakdi gerçekleşmesi %78,28, fiziki gerçekleşmesi %92 seviyesindedir. Süre uzatımı dahil revize iş bitim tarih 11.04.2025 tir. Mevcut hizmet binasının yıkılmasına müteakip çevre düzenleme imatlarına başlanacaktır.
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	Proje arsa karşılığı yapımından vazgeçilmiştir.
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2024	46.476.000	26.800.000	19.676.000	14.719.381	% 74,8	Proje işi tamamlanmıştır.Hizmet binası inşaatını kapsayan 1. kısım imatları tamamlanarak hizmet binasına taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. 2. kısım imatları kapsamında eski hizmet binası yıkımı gerçekleştirilmiş olup, otopark ve çevre düzenleme imatlarının yapımına devam edilmektedir. Toplamda iş fiziki olarak %93, nakdi olarak ise %89 ilerleme seviyesine sahiptir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	Proje işi tamamlanmış olup Yapım İş ihalesi henüz yapılmamıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	5.409.500.000	51.075.000	1.057.090.000	428.255.368	% 40,5	Kadev kapsamında Tigris Hevsel inşaat tarafından yapılan kilyos kampüsü güçlendirme işi geçici kabul aşamasına gelmiştir. Hibe kapsamından çalıştay yapılmıştır. İleri Mühendislik Uygulamaları ve Kapasite Geliştirme için Teknik Yardım Danışmanlık Hizmeti 2.Hakediş Ödemesi yapılmıştır.
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	1.004.900.000	34.175.000	195.615.000	151.951.351	% 77,7	
	Hibe Ödeneği	2021-2027	19.500.000	3.900.000	15.600.000	5.998.982	% 38,5	
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2023-2026	2.560.730.000	13.000.000	245.875.000	203.667.471	% 82,8	
	Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	238.120.000		24.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
	Boğaziçi Üniv.Uçaksavar Kampüsü Superdorm Binası (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	130.250.000		68.000.000	24.792.743	% 36,5	İhale süreci tamamlandı. Avans ödemesi ve 1 nolu hakedişi ödenmiştir.
	İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	183.500.000		98.000.000	19.288.233	% 19,7	İhale süreci tamamlandı. Avans ödemesi ve 1 nolu hakedişi ödenmiştir.
	İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	285.000.000		100.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	137.500.000		50.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
	Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	140.000.000		60.000.000	6.202.861	% 10,3	İhale süreci tamamlandı. Avans ödemesi ve 1 nolu hakedişi ödenmiştir.
	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	240.000.000		90.000.000	16.353.727	% 18,2	İhale süreci tamamlandı. Avans ödemesi ve 1 nolu hakedişi ödenmiştir.
	Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci Yurtları (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	120.000.000		50.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2024-2025	350.000.000		60.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K14-224896	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	20.000.000		20.000.000	19.295.952	% 96,5	Proje gerçekleştirilmiştir.
2024K14-224923	Afet Koordinasyon Çadırı Alımı (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	2.000.000		2.000.000	442.665	% 22,1	Proje gerçekleştirilmiştir.
2024K14-224931	İnsansız Hava Araçları Modernizasyonu (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	2.995.000	% 30,0	Proje gerçekleştirilmiştir.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (*.*.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2025	145.000.000		130.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
2024K14-235229	İletişim Merkezleri İnşaatı (Singapur Kızılhaç Derneği Hibesi) (Afetler Sektörü)	2024-2024	16.188.000		16.188.000	0	% 0,0	İhale süreci tamamlanmış yer teslimleri yapılmıştır.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2024	133.084.000	110.000.000	23.084.000	23.080.479	% 100,0	İşin ihalesi 30.06.2022 tarihinde yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 20.05.2024 tarihinde işin geçici kabulü de yapılmıştır. Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 133.080.479,38 TL'yi bulmuştur.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	61.480.000	42.000.000	19.480.000	19.479.148	% 100,0	İşin ihalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmıştır. 42 konutun inşaatları tamamlanmış olup çevre düzenleme ve altyapı işleri devam etmektedir. Konut kuraları çekilmiş, borçlandırma işlemleri tamamlanmıştır..Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 61479148,39 TL'yi bulmuştur.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	127.100.000	100.000.000	27.100.000	27.086.480	% 100,0	İşin ihalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve 54 konutun inşaatları tamamlanmış olup çevre düzenleme ve altyapı işleri devam etmektedir. Konut kuraları çekilmiş ve borçlandırma işlemleri de tamamlanmıştır. Bugüne kadar toplam harcanan ödenek miktarı da 127.086.480 TL'yi bulmuştur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	444.000.000	0	124.116.000	112.554.566	% 90,7	24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Olur'u ile tahmini ödenek teminine esas revize bedeli onaylanmış olup 04.07.2024 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. Yapılan sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 16.06.2028 olarak güncellenmiştir. İş devam etmektedir.
2024K07-224135	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	816.000		816.000	816.000	% 100,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2024K07-224137	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	2.000		2.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyulduka harcama yapılmaktadır.
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	115.000.000		2.000	0	% 0,0	2024 yılında yatırım programına girmiş olup önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır.
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	55.000.000		18.000.000	0	% 0,0	2024 yılında yatırım programına girmiş olup önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır.
2016K07-2797	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (**08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2027	1.332.900.000	311.088.000	225.406.400	171.825.000	% 76,2	Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2024 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında % 10 kesinti yapılarak 225.406.400 TL olarak belirlenmiştir. 31.12.2024 tarihi itibariyle toplam harcama miktarı 171.825.000 TL olup; Aksaray, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, İzmir, K.Maraş, Muş ve Tunceli illerinde toplam da 138 konut tamamlanmıştır.
	Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	72.000.000	12.000.000	35.000.000	28.850.000	% 82,4	Aksaray ilindeki 9 uygulamada yer alan toplam 149 hak sahibi aile için 13.500.000 TL yıllık ödenek revize ile 35.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup Aralık ayı sonu itibariyle 28.850.000 TL ödenek harcanmıştır. 1 lonut tamamlanmıştır.
	Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	44.000.000	18.600.000	6.714.000	1.650.000	% 24,6	Ankara ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 44 hak sahibi aile için 6.714.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup 1.650.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	142.640.000	22.000.000	2.000.000	0	% 0,0	Batman ilindeki 4 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 9.576.000 TL yıllık ödenek miktarı 2.000.000 TL'ye düşürülmüş olup harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	954.000	950.000	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	1.804.000	1.800.000	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	33.000.000	15.000.000	1.000.000	0	% 0,0	Bolu ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 1.000.000 TL'ye düşürülmüş olup harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	25.500.000	14.000.000	7.650.000	5.850.000	% 76,5	Çankırı ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 22 hak sahibi aile için 7.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Aralık ayı sonu itibariyle 5.850.000 TL ödenek harcanmıştır.Bitlen konut yoktur.
	Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	56.000.000	11.000.000	1.000	0	% 0,0	Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için ayrılan 2.125.000 TL yıllık ödenek miktarında harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	9.000.000	6.000.000	900.000	550.000	% 61,1	Denizli ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 3 hak sahibi aile için 900.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Aralık ayı sonu itibariyle 550.000 TL ödenek harcanmıştır. 2 konut tamamlanmıştır.
	Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	59.288.000	6.500.000	9.075.000	7.680.000	% 84,6	Erzincan ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 69 hak sahibi aile için 6.750.000 TL yıllık ödenek revize ile 9.075.000 TL'ye yükseltilmiş olup Aralık ayı sonu itibariyle 7.680.000 TL ödenek harcanmıştır. Toplam da 25 konut tamamlanmıştır
	Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	211.249.000	80.000.000	62.300.000	55.775.000	% 89,5	Erzurum ilindeki 15 uygulamada yer alan toplam 291 hak sahibi aile için 44.550.000 TL yıllık ödenek miktarı revize ile 61.826.000 TL'ye yükseltilmiş olup Aralık ayı sonu itibariyle 55.775.000 TL ödenek harcanmıştır.2024 yılında toplam da 86 konut tamamlanmıştır. Ayrıca Aşkale İlçesi Akören köyünde 2023 yılından önce işleri kalan 2 adet konut da tamamlanarak haksahiplerine teslim edilmiştir.
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	İğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	19.200.000	0	137.400	0	% 0,0	İğdır ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 32 hak sahibi aile için 2.137.000 TL yıllık ödenek revize ile 137.400 TL'ye düşürülmüş olup harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	İsparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	65.000.000	14.800.000	2.885.000	2.400.000	% 83,2	İsparta ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 65 hak sahibi aile için 10.935.000 TL yıllık ödenek revize ile 2.885.000 TL'ye düşürülmüş olup 2.400.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	31.000.000	18.000.000	4.000.000	3.250.000	% 81,3	İzmir ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 33 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 4.000.000 TL'ye düşürülmüş olup, Aralık ayı sonu itibariyle 3.250.000 TL ödenek harcanmıştır. 1 konut tamamlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	14.500.000	5.500.000	5.400.000	3.350.000	% 62,0	K.Maraş ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 16 hak sahibi aile için 5.400.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup Aralık ayı sonu itibariyle 3.350.000 TL ödenek harcanmış olup 3 konut tamamlanmıştır.
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	29.438.000	5.438.000	2.700.000	400.000	% 14,8	Karaman ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 2.700.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup 400.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	34.150.000	19.000.000	985.000	0	% 0,0	Kars ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 25 hak sahibi aile için 10.935.000 TL yıllık ödenek revize ile 985.000 TL'ye düşürülmüş olup harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	35.000.000	5.000.000	860.000	0	% 0,0	Kastamonu ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 35 hak sahibi aile için 4.800.000 TL yıllık ödenek revize ile 860.000 TL'ye düşürülmüş olup harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	140.706.000	7.000.000	5.000.000	0	% 0,0	Malatya ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 5.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	73.880.000	5.000.000	5.650.000	5.050.000	% 89,4	Muş ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 75 hak sahibi aile için 7.200.000 TL yıllık ödenek revize ile 5.650.000 TL'ye düşürülmüş olup Aralık ayı sonu itibariyle 5.050.000 TL ödenek harcanmıştır ve 7 konut tamamlanmıştır.
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	19.000.000	1.000.000	400.000	0	% 0,0	Niğde ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 19 hak sahibi aile için 5.400.000 TL yıllık ödenek revize ile 400.000 TL'ye düşürülmüş olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	44.825.000	19.000.000	11.520.000	10.950.000	% 95,1	Sivas ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 11.520.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup 10.950.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	107.282.000	10.000.000	43.000.000	35.070.000	% 81,6	Tunceli ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 104 hak sahibi aile için 18.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 43.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup Aralık ayı sonu itibariyle 35.070.000 TL ödenek harcanmıştır. Toplam da 12 konut tamamlanmıştır
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	13.436.000	8.500.000	1.215.000	900.000	% 74,1	Uşak ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 14 hak sahibi aile için 1.215.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup 900.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Biten konut yoktur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Elazığ İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2023-2027	50.000.000	5.000.000	17.000.000	10.100.000	% 59,4	Elazığ ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 50 hak sahibi aile için 9.000.000 TL yıllık ödenek revize ile 17.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup 10.100.000 TL harcama gerçekleşmiş olup 1 konut tamamlanmıştır.
2024K07-224136	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*:08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	45.000		45.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2026			82.000.000	71.430.129	% 87,1	Kamulaştırma kapsamında konut ve tarım arazisi satın alımları için kullanılmaktadır. 31.12.2024 tarihi itibarıyla Adıyaman, Ankara, Çorum, İstanbul, Samsun ve Malatya illerinde, toplam 72 adet satın alma işlemi (konut ve tarım arazisi) için 71.430.129 TL ödenek illerine gönderilmiştir.
15 Proje		06 ve 07 TOPLAM	56.812.670.000	2.714.095.000	14.779.840.000	10.145.378.828	% 68,6	
2 Proje		08 TOPLAM	1.332.945.000	311.088.000	225.451.400	171.825.000	% 76,2	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	266.874.000	61.500.000	190.374.000	51.107.617	% 26,8	
		GENEL TOPLAM	58.672.597.000	3.170.527.000	15.195.665.400	10.368.311.445	% 68,2	6.866.361.000
4 Proje		HİBE	260.108.000	83.844.000	81.588.000	10.856.119	% 13,3	
1 Proje		AB KATKISI	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	194.345.000	76.800.000	104.894.000	42.937.381	% 40,9	
		Kamu laştırma	0	0	82.000.000	71.430.129	% 87,1	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2025	2.250.000	750.000	675.000	94.655	% 14,0	*Proje kapsamında öncelikle BEP-TR yazılımı ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı için gerekli iklim verilerinin güncellenmesi ve sürekli güncellemeyi mümkün kılacak yazılım için gerekli metodoloji ve algoritma için şartname ve protokol çalışmaları yapılmış olup, üniversiteler ile yapılacak protokol kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında işin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. **Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu hazırlama işlerinin gerçekleştirilmesi tamamlanmıştır.
2023K01-198902	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2024-2024	5.000.000		5.000.000	2.728.933	% 54,6	
	Genel Bütçe Ödeneği		1.000.000		1.000.000	907.487	% 90,7	Optik Emisyon Cihazı Bakım Onarım ve Kalibrasyon ücreti ile Çeşitli illerde yapılan piyasa gözetimi ve denetimlerinde alınan numunelerin değerlendirilmesi için yaptırılan deneylere ilişkin TSE faturalarının ödemeleri yapılmıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		4.000.000		4.000.000	1.821.446	% 45,5	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.250.000	750.000	1.675.000	1.002.142	% 59,8	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	4.000.000	0	4.000.000	1.821.446	% 45,5	
		GENEL TOPLAM	7.250.000	750.000	5.675.000	2.823.588	% 49,8	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2024	6.200.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	% 100,0	Söz konusu işe ait ihale süreci tamamlandı ve 4.788.000TL bedelle sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında projeye ait Proje Metodolojisi Raporu, Proje Yönetim Planı (PYP), Analiz ve Tasarım Raporları, Ulusal Veri Sözlüğü hazırlama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Raporlama Altyapı Bileşeni lisans alımı gerçekleştirildi. Müteahhitlik ve Şantiye Şefliği Bilişim Sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanarak kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı sonunda 2.394.000TL ve 2024 yılında 2.045.720,88TL Hak ediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2023K60-205399	Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	14.970.000	7.770.000	7.200.000	4.794.000	% 66,6	2024 yılı içerisinde Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu Projesi kapsamında "Atlas Uygulamasının Bakım Hizmeti Alımı ve Ek Fonksiyon Geliştirilmesi İş'i"ne ait çalışmalar 2024 tamamlanmıştır.
2023K60-205413	TUCBS Çalışabilirlik, Uyumlaştırma ve Entegrasyon (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	17.050.000	3.000.000	14.050.000	13.974.516	% 99,5	46 il özel idaresi tarafından üretilen coğrafi/sözel veri varlığı analiz edilmiş, mevcut coğrafi veri varlığının Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) standartlarına göre oluşturulan coğrafi veri servisleri ve metaverileri Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna(https://www.atlas.gov.tr) adresine aktarılmıştır. Ayrıca, https://tucbs.gov.tr/ adresi üzerinden hizmet verecek Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Akademi Eğitim Portalı (https://tucbsakademi.csb.gov.tr/) hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır."
2023K60-205704	Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	25.825.000	17.290.000	8.535.000	8.321.537	% 97,5	03.06.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanan Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu Projesi ; 02.12.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında 10 il 31 Belediye ziyaret edilmiştir. Proje kapsamında belediyelerden temin edilen; Altyapı - İçme Suyu, Atık Su, Yağmur Suyu;Mezarlık;Ulaşım Ağı;Önemli Yerler;Çevre Yönetim; Park Bahçe; Panoramik Fotoğraflar kategorilerinde üretilen veri setlerinin sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında İller bankasında farklı çalışma gruplarını içeren ve 3 gün her gün 100 kişi olmak üzere toplamda 300 kişinin katılım sağladığı konferans düzenlenmiştir. Ayrıca veri konsolidasyonuna yönelik hareketli araç verisi ve sensör temin edilmiştir.
2023K60-205743	Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	13.625.000	9.735.000	3.890.000	0	% 0,0	Herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiş ve dolayısıyla harcama yapılmamıştır.
2023K60-217018	TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, Güncelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	94.550.000	15.000.000	79.550.000	77.160.000	% 97,0	24/08/2022 tarih 2022/01 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Kararının 8 numaralı maddesinde bulunan "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının e-devlet entegrasyonu kapsamında yürütülmesi ve daha gelişmiş bir teknolojik altyapı ile sağlanması kararı neticesinde Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet Entegrasyonu, İşletme ve Güncelleme Projesi oluşturulmuştur. Bahse konu proje kapsamında geliştirilen TUCBS Platformu TÜRKSAT Bulut Sistemi üzerinden hizmet vermeye başlamıştır. Proje kapsamında; Veri Arama, Veri Talep, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi, Metaveri, Yönetimi,Kullanıcı Yönetimi, Servis Yönetimi ve Harita Görüntüleyici modülleri tamamlanmış ve https://tucbs.gov.tr adresi üzerinden e-devlet kullanıcılarının erişimine sunulmuştur."

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K60-230220	MEBİS Projesi Bakım Onarımı İşi İdamesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	8.137.000	2.927.000	5.210.000	5.210.000	% 100,0	2024 yılı sonu itibariyle proje tamamlanmıştır.
2023K60-230225	Bakanlık Uygulamaları Performans İzleme ve Yönetim (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	6.500.000	0	6.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında henüz ihale ve ödeme yapılmamıştır. HAVELSAN Liman MYS ve diğer open source ürünlerin inceleme süreci devam etmektedir.
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2025	9.768.000	0	5.400.000	0	% 0,0	Projenin ödeneği Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi Projesi ile birleştirilerek 05.08.2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ancak usul hatası nedeniyle ihale iptal edilmiştir. Proje ödeneğinin "Bilişim Personeli Hizmeti Alım" İşi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında henüz harcama yapılmamıştır.
2024K60-230216	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	213.200.000		213.200.000	122.007.630	% 57,2	
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2024-2024	149.200.000		149.200.000	94.488.409	% 63,3	Hesaplamalar KDV hariç yapılmıştır.Proje kapsamında; Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Çok Fonksiyonlu Yazıcı ve Tarayıcılar, Sunucular, Omurga ve Kenar Anahtarları, Ağ İzleme ve Yönetim Yazılımı, Veri Depolama Üniteleri (Storage), Bilgisayar ve Çevre Birimleri vb. donanımlar temin edilmiştir.Proje 2024 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olup, planlanan alımlar gerçekleştirilmiştir.
	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2024-2024	60.000.000		60.000.000	24.086.404	% 40,1	Hesaplamalar KDV hariç yapılmıştır.Proje işleri 2024 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olup, planlanan alımlar gerçekleştirilmiştir.
	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2024-2024	4.000.000		4.000.000	3.432.817	% 85,8	Proje kapsamında yer alan işlerden 2024 Yılı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Belgenet) Garanti ve Bakım Hizmeti Temini İşi için TÜRKİYE A.Ş. ile 22.03.2024 tarihinde 1.343.816,69 TL+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait HYS modülünün de Belgenete entegre edilmesi ek hizmeti için 299.000+KDV bedel belirlenmiştir. Bu işler için toplam 1.642.817 TL+ KDV ödemesi yapılmıştır. 2024 yılında web bakım hizmeti alınmamıştır. İKBS 1.790.000 TL+KDV ödemesi yapılmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K60-230223	KÖYDES Yatırım İzleme Sisteminin İdamesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	2.500.000		2.500.000	702.000	% 28,1	2024 Ağustos ayında Bakım Onarım Sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme konusu iş tamamlanmıştır.
2024K60-230229	Dijital Şehir İkizleri (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	5.616.000	% 56,2	Proje tamamlanmış olup;çeşitli 3 boyutlu veri formatlarının analizlerinin sağlanması, tematik gösterimlerin oluşturulabilmesi, entegre bir şekilde interaktif bilgi almanın sağlanması, IOT sensörlerinin eklenebilmesi-gösteriminin sağlanması ve güneşlenme süresi, önemli noktalara yakınlık, mesafe, alan ve tematik analizler gibi çeşitli analizlerin yapılması hususlarında yazılım altyapısı hazırlanmış ve kullanıcılara hizmet etmek üzere arayüz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Akıllı şehirler alanında faaliyet gösteren uygulamaların ve kent analitiğinde fayda sağlayacak ilgili servislerin platforma kolay ve hızlı bir şekilde entegre olması konusunda altyapı çalışmaları yapılmıştır. Özellikle açık veri kültürünün geliştirilmesi ve açık verilerin paylaşılmasının teşvik edilmesi amacıyla Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu ile doğrudan bağlantının sağlanması konusunda yapısal çalışmalar yapılmıştır.
2024K60-230232	Derin Öğrenme Hava Fotoğrafi İşleme ve Modelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	1.791.000		1.791.000	693.686	% 38,7	
2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000		9.000.000	7.713.756	% 85,7	Proje kapsamında 2024 yılı içerisinde e-Plan Otomasyon Sistemleri'ne yönelik bakım, idame, geliştirme ve destek masası faaliyetleri sürdürülmüştür. Bununla birlikte sistemde tüm yetkili kullanıcılara yönelik OCR aracı geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. PlanCBS Masaüstü Uygulaması'nın Semantik Planlama Yaklaşımıyla Açık Kaynak Kodlu Yapıda Yeniden Geliştirilmesi kapsamında Analiz ve Hazırlık Çalışmaları yapılmış olup bu kapsamda "PlanCBS Yazılım Analiz Raporu", "Karşılaştırma Raporu", "Gereksinim Raporu", "Yazılım Tasarım Raporu" ve "Semantik Planlama Analiz Raporu" hazırlanarak e-Plan Otomasyon Sistemleri'nde yapay zeka destekli semantik planlama aracının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmış olup, 2025 yılında proje devam etmektedir.
2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000		14.874.000	14.874.000	% 100,0	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme Projesi 2024 yılı çalışmalarını kapsamında; Donanım taşıma ve kurulum işleri, BKBS kullanıcı desteğinin ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi, BKBS İdame ve Geliştirme çalışmalarının yürütülmesi işleri tamamlanmış olup, 2025 yılında proje devam etmektedir.
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4 (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2026	230.000.000		75.000.000	73.994.612	% 98,7	Proje kapsamında 8.01.2024 tarihinde ARD Bilişim Firması ile sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir. Şu ana kadar toplam (Fiyat Farkı ve KDV dahi) 73.994.612,81 TL tutarında 5 hakediş gerçekleştirilmiştir.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	5.000.000		2.000.000	1.869.120	% 93,5	Proje kapsamında "İş Paketi 1:Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası, İş Paketi 2: 1. Altı Aylık İlerleme Raporu, İş Paketi 3: 2024 yılı Akıllı Şehir Yerel Yönetim Etki Analizi ve Vatandaş Farkındalık Anket Çalışmaları" kapsamında 2024 yılında yapılması gereken işleri tamamlanmıştır. Proje 2025 yılında devam etmektedir.
2024K09-229670	Akıllı Şehir Standartlarının Yaygınlaştırılması (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	4.500.000		4.500.000	4.431.514	% 98,5	Güncel teknoloji eğilimleri raporları hazırlanarak Teknoloji Radarı oluşturulmuştur. RUMİ, Akıllı Şehir Terminolojisi ve Akıllı Şehir Veri Sözlüğü güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Akıllı şehir standartlarının daha anlaşılabilir ve kullanılabilir kılması amacıyla RUMİ Dijital Platformu geliştirilmiştir. Proje 2024 yılı itibarıyla tamamlanmıştır.
2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	9.500.000		3.600.000	0	% 0,0	Projenin ödenği Mobil Altyapı Geliştirme Projesi ile birleştirilerek 05.08.2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Ancak usul hatası nedeniyle ihale iptal edilmiştir. Proje ödenğinin "Bilişim Personeli Hizmeti Alım" İşi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır.Proje kapsamında henüz harcama yapılmamıştır.
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	237.554.000	43.060.000	148.500.000	131.963.009	% 88,9	
9 Proje		DÖNER SERMAYE	495.162.000	15.662.000	321.500.000	212.599.362	% 66,1	
		GENEL TOPLAM	732.716.000	58.722.000	470.000.000	344.562.371	% 73,3	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	48.837.000	30.581.000	8.203.000	8.203.000	% 100,0	
AB katkısı			276.719.000	173.278.000	46.479.000	4.909.657	% 10,6	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2026	8.857.524.000	6.045.479.000	1.952.865.000	925.404.366	% 47,4	
	AB Hibesi		7.537.461.000	5.139.151.000	1.663.405.000	786.593.712	% 47,3	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		551.656.000	378.966.000	120.175.000	58.199.431	% 48,4	
	Mahalli İdare Katkısı		768.407.000	527.362.000	169.285.000	80.611.223	% 47,6	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	48.837.000	30.581.000	8.203.000	8.203.000	% 100,0	
	AB KATKISI		276.719.000	173.278.000	46.479.000	4.909.657	% 10,6	
	İçmesuyu Sektörü Projesi		8.857.524.000	6.045.479.000	1.952.865.000	925.404.366	% 47,4	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 30.06.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	Çarşamba Atıksu Tesisi	2019-2023	287.358.000	282.208.000	20.200.000	19.007.613	% 94,1	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 19.09.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. Projenin sonuna yaklaşılmıştır,
	AB Hibesi		244.078.000	239.878.000	17.000.000	16.156.471		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.432.000	16.932.000	1.200.000	1.140.457		
	Mahalli İdare Katkısı		25.848.000	25.398.000	2.000.000	1.710.685		
Alt proje-2	Bandırma Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	577.544.000	473.044.000	104.500.000	57.722.405	% 55,2	Proje kapsamında yer alan entegre su projesi 2. yapım işinin kesin kabulü 13.10.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi yapım işinin ve müşavirlik sözleşmelerinin uygulaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		490.688.000	402.088.000	88.600.000	49.064.044		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		34.882.000	28.382.000	6.500.000	3.463.344		
	Mahalli İdare Katkısı		51.974.000	42.574.000	9.400.000	5.195.016		
Alt proje-3	Bismil Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	272.545.000	270.865.000	5.880.000	5.549.972	% 94,4	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 04.01.2023 tarihinde yapılmıştır. 14.02.2024 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		231.536.000	230.236.000	5.000.000	4.717.477		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		18.533.000	18.283.000	380.000	374.623		
	Mahalli İdare Katkısı		22.476.000	22.346.000	500.000	457.873		
Alt proje-4	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	610.460.000	340.280.000	252.935.000	85.446.152	% 33,8	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		518.739.000	289.239.000	214.105.000	72.629.229		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.716.000	20.416.000	16.235.000	5.126.769		
	Mahalli İdare Katkısı		55.005.000	30.625.000	22.595.000	7.690.154		
Alt proje-5	Elbistan Atıksu Tesisi	2019-2024	531.622.000	491.372.000	40.250.000	15.004.842	% 37,3	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 30.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		451.760.000	417.660.000	34.100.000	12.754.115		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		35.925.000	33.175.000	2.750.000	1.012.827		
	Mahalli İdare Katkısı		43.937.000	40.537.000	3.400.000	1.237.900		
Alt proje-6	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2025	679.445.000	487.035.000	195.000.000	194.082.228	% 99,5	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		577.480.000	413.980.000	165.000.000	164.969.894		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		40.822.000	29.222.000	12.000.000	11.644.934		
	Mahalli İdare Katkısı		61.143.000	43.833.000	18.000.000	17.467.400		
Alt proje-7	İğdır Atıksu Tesisi	2019-2024	540.492.000	533.522.000	6.970.000	1.933.203	% 27,7	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 21.07.2022 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapım işinin kesin kabulü 21.07.2024 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		459.295.000	453.495.000	5.800.000	1.643.223		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.612.000	36.012.000	600.000	130.491		
	Mahalli İdare Katkısı		44.585.000	44.015.000	570.000	159.489		
Alt proje-8	Kastamonu Atıksu Tesisi	2019-2024	415.389.000	403.919.000	11.470.000	6.311.542	% 55,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 07.06.2022 tarihinde yapılmıştır. 04.09.2024 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		353.032.000	343.332.000	9.700.000	5.364.811		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		24.985.000	24.235.000	750.000	378.693		
	Mahalli İdare Katkısı		37.372.000	36.352.000	1.020.000	568.039		
Alt proje-9	Niksar Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	563.745.000	558.295.000	34.600.000	33.625.353	% 97,2	Proje kapsamın yer alan şebeke ve kanalizasyon hattı yapım işi olan 2. yapım işinin kesin kabulü 30.06.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi yapım işinin ise geçici kabulü 31.12.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		478.952.000	474.552.000	29.000.000	28.581.551		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		34.047.000	33.497.000	2.500.000	2.017.521		
	Mahalli İdare Katkısı		50.746.000	50.246.000	3.100.000	3.026.282		

Alt proje-10	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	647.382.000	381.897.000	258.050.000	94.871.642	% 36,8	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		550.219.000	324.614.000	219.300.000	80.640.895		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		38.868.000	22.913.000	15.500.000	5.692.299		
	Mahalli İdare Katkısı		58.295.000	34.370.000	23.250.000	8.538.448		
Alt proje-11	Sivas Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	296.108.000	296.093.000	442.270.000	58.223.425	% 13,2	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 20.12.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		251.685.000	251.680.000	378.290.000	49.489.911		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.770.000	17.765.000	27.340.000	3.493.406		
	Mahalli İdare Katkısı		26.653.000	26.648.000	36.640.000	5.240.108		
Alt proje-12	Sorgun Atıksu Tesisi	2019-2023	212.650.000	212.635.000	15.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 11.08.2023 tarihinde yapılmıştır. 18.11.2024 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		180.745.000	180.740.000	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.763.000	12.758.000	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		19.142.000	19.137.000	5.000	0		
Alt proje-13	Şırnak Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	271.506.000	271.491.000	4.000.000	3.495.132	% 87,4	Proje kapsamında yer alan yapım işinin kesin kabulü 17.11.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi de Ağustos ayı itibariyle bitmiştir. Son ödemesi yapılmıştır. Projenin nihai raporu 15.07.2024 tarihinde onaylanmıştır.
	AB Hibesi		230.773.000	230.768.000	3.000.000	2.970.862		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		18.330.000	18.325.000	500.000	235.921		
	Mahalli İdare Katkısı		22.403.000	22.398.000	500.000	288.348		
Alt proje-14	Trabzon Su Tesisi	2019-2025	547.955.000	373.805.000	115.000.000	19.424.761	% 16,9	Proje kapsamında yer alan yapım işinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		465.735.000	317.735.000	100.000.000	16.511.047		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		32.888.000	22.428.000	5.000.000	1.165.486		
	Mahalli İdare Katkısı		49.332.000	33.642.000	10.000.000	1.748.228		
Alt proje-15	Yüksekova Atıksu Tesisi	2019-2024	286.782.000	270.582.000	25.000.000	23.885.717	% 95,5	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 09.09.2023 tarihinde yapılmıştır. 31.10.2024 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		243.595.000	229.995.000	21.000.000	20.302.860		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		19.464.000	18.264.000	2.000.000	1.612.286		
	Mahalli İdare Katkısı		23.723.000	22.323.000	2.000.000	1.970.572		
Alt proje-16	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2025	594.758.000	75.878.000	365.710.000	253.862.085	% 69,4	Proje kapsamında ; Müşavirlik işi sözleşmesi 30.08.2023 tarihinde başlamıştır. 2. yapım işi olan yağmursuyu hatları yapımı işinin geçici kabulü 30.11.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapımı işi ise 22.01.2024 tarihinde başlamıştır.Uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		509.284.000	64.984.000	313.200.000	215.782.772		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.027.000	4.587.000	22.110.000	17.135.691		
	Mahalli İdare Katkısı		49.447.000	6.307.000	30.400.000	20.943.622		
Alt proje-17	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2025	411.993.000	322.558.000	71.000.000	52.958.294	% 74,6	Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu toplama hattı yapım işinin geçici kabulü 03.03.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi inşaatının uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		350.075.000	274.175.000	60.300.000	45.014.550		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		27.892.000	21.772.000	4.800.000	3.574.685		
	Mahalli İdare Katkısı		34.026.000	26.611.000	5.900.000	4.369.059		
Alt proje-18	Aksaray Entegre Su Projesi	2021-2025	1.109.790.000	0	15.000	0	% 0,0	Proje bütçe revizyonu sonucunda, Avrupa Komisyonu tarafından tekrar onaylanması gerekliliği nedeniyle, IPA II uygunluk dönemi içerisinde tamamlanamayacak olması ve revize bütçenin kısıtlı olan IPA II bütçesinin bu proje için yetersiz hale geldiği görülmeye istinaden, söz konusu proje IPA kapsamında sürece devam edilemeyeceği, 15 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen Sektörel İzleme Komitesi toplantısında karara bağlanmıştır.
	AB Hibesi		949.790.000	0	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		67.700.000	0	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		92.300.000	0	5.000	0		

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023F00-198507	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2024-2024	9.500.000		9.500.000	1.788.000	% 18,8	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2024-2024	5.000.000		5.000.000	1.788.000	% 35,8	"Seydikemer Çevre Düzenleme Projesi" için APM Tasarım Mimarlık firması ile 1.788.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle sözleşme imzalanarak proje süreçleri gerçekleştirilmiş, 2024 yılı sonu itibarıyla proje temini sağlanmıştır.
	Ayvalık Arboretum Proje Temini	2024-2024	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması beklenmektedir.
	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Proje Temini	2024-2024	1.500.000		1.500.000	0	% 0,0	Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması beklenmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2025	49.600.000	18.600.000	17.000.000	11.837.003	% 69,6	"Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme" projesi kapsamında "Dalyan (Muğla/Ortaca) Kanalı Tekne Bağlama İskelesi 2. Etap Yapım İşi" ve "Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme Projesi Kapsamında ÇED ve EDR Dosyalarının Hazırlanması İşi" mali katkı protokolleri Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Ortaca Belediye Başkanlığı arasında imza edilmiş olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 11.837.002.99.-TL ödenek aktarılmıştır.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2025	29.000.000	0	10.900.000	0	% 0,0	Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek kullanılmamıştır.
2024F00-224157	Karahayit Kırmızı Su Travertenleri Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2024-2024	7.100.000		7.100.000	0	% 0,0	Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek kullanılmamıştır.
2024F00-224162	Köyceğiz Çevre ve Sahil Düzenleme (Turizm Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek kullanılmamıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE N SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024F00-224165	Büyükada Meydan Düzenleme ve Cephe Yenileme (Turizm Sektörü)	2024-2024	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	İhale süreci devam ederken Adalar Bölgesinin Danıştay 4. Dairesinin 09.05.2024 tarihli kararıyla ÖÇK bölgesi sınırından çıkarılması ve tekrar sınırın 07.09.2024 tarihinde yeniden belirlenmesi nedeniyle, projenin teknik şartnamede belirtilen hususlar kapsamında 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasının mümkün olmadığı görüldüğünden 27.09.2024 tarih ve 10535954 sayılı yazımızla 4.000.000 TL ödeneğin Genel Müdürlüğümüzce yürütülen diğer projelerde kullanılabileceği bildirilmiştir.
2024F00-238491	Çat Barajındaki Yüzen Adaları Koruma (**.Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2024-2024	3.600.000		3.600.000	3.569.952	% 99,2	“Çat Barajı (Adıyaman/Çelikhan) Yüzen Adaları Koruma Projesi” için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Çelikhan (Adıyaman) Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 3.569.952,00.-TL ödenek aktarılmıştır.
2024F00-255349	İhlara Vadisi Karşılama Merkezinin 2. Etap Yapımı (**.Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2024-2024	9.000.000		9.000.000		% 0,0	Yıl içerisinde ilgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanmadığından ödenek kullanılamamıştır.
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (**.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2026	280.258.000	62.658.000	60.000.000	15.677.691	% 26,1	ÖÇK Bölgelerinde ve Muhtelif Korunan Alanlarda aşağıda detayları belirtilen 3 adet içmesuyu projesine toplam 15.677.691,00 TL mali katkı sağlanmıştır.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2026	179.647.000	36.647.000	40.000.000	4.410.814	% 11,0	1-) “Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif İçmesuyu Şebeke Hattı Ekipmanı Mal Alım İşi” için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 1.998.814,20.-TL ödenek aktarılmıştır. 2-) “Güneyli Köyü (Çanakkale) Sahil Kesimi İçmesuyu Şebeke Hattı Yapım İşi” için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Gelibolu (Çanakkale) Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 2.412.000,05.-TL ödenek aktarılmıştır
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2026	100.611.000	26.011.000	20.000.000	11.266.877	% 56,3	1-) “Refahiye Ormanları (Erzincan) İçmesuyu İsale Hattı Projesi Kapsamında Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşi” için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Erzincan İl Özel İdaresi arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 11.266.876,80.-TL ödenek aktarılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2026	120.264.000	33.764.000	53.500.000	26.000.000	% 48,6	ÖÇK Bölgelerinde ve Muhtelif Korunan Alanlarda aşağıda detayları belirtilen 6 adet atıksu yönetimi projesine toplam 26.000.000,00 TL mali katkı sağlanmıştır.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2026	77.264.000	21.764.000	33.500.000	19.000.000	% 56,7	1- "Cihanbeyli (Konya) Belediyesi Yağmursuyu Şebeke Hattı 1.Etap Yapım İşinin Tamamlanması" işi kapsamında KDV Dahil 7.000.000,00.-TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup protokol bedeli aktararak iş tamamlanmıştır. 2-) "Sultanhanı (Aksaray) İlçesi Muhtelif Kanalizasyon Ekipmanı Mal Alımı İşİ" için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 7.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. 3-) "Seydikemer (Muğla) Belediyesi Kumluova Mahallesi Yağmursuyu Şebeke Hattı Mal Alım İşİ" için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Seydikemer Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 5.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır.
	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2026	43.000.000	12.000.000	20.000.000	7.000.000	% 35,0	1-) "Arzularkabaköy (Gümüşhane) Korunan Alanda Yağmursuyu Drenaj Kanalı Yapım İşİ" için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Arzularkabaköy (Gümüşhane) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 3.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır. 2-) "Yenişarbademli (Isparta) Belediyesi Muhtelif Alanlarda Kanalizasyon Şebeke Hattı İçin Mal Alım İşİ" için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Yenişarbademli (Isparta) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 1.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 3-) "Çaykara (Trabzon) Belediyesi Uzungöl, Taşkırın, Köseli, Demirli, Karaçam, Köknar, Taşlıgedik ve Çambaşı Mahalleleri İçin Yağmursuyu Şebeke Hattı Mal Alım İşİ" için Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Çaykara (Trabzon) Belediye Başkanlığı arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup 2024 yılı sonu itibarıyla KDV Dahil 3.000.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2025	46.951.000	23.151.000	11.520.000	5.039.400	% 43,7	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2025	11.950.000	5.600.000	3.240.000	3.219.600	% 99,4	Yapılan sözleşmeler gereği "Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Ortofoto Harita Üretimi Ve Halihazır Harita Alımı İşine ilişkin işi ve Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Göcek ve Dalaman Koyları Ortofoto Harita Üretimi ve Halihazır Harita Alımı İşine ilişkin işler tamamlanmıştır.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2025	16.480.000	10.400.000	3.140.000	1.819.800	% 58,0	1-Datça-Bozburun ÖÇKB, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları ve Kentsel Tasarım Rehberi İş (130 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 2-Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İş (560 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 3-Muğla İli, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Arazi Kullanma Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu Hazırlanması İş (46132 Ha) (İş Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 590.000 +kdv) 4-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İş (46132 Ha) (İş Devam Ediyor 230.000 +kdv) 5-İhlarla ÖÇKB 2. Etap 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İş (6336 Ha) (İş Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 300.000 +kdv) 6-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı ÖÇKB, Balıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri "Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin" 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İş (450 Ha) (İş Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 165.000 + kdv) 7-Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yalınca-Karakusunlar Mahallesi Adalet Akademisi İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İş (26,85 Ha) (1. Aşama (İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İş) 2. Aşama İmar Planı İş Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 116.000 +kdv) 8-Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu İş (740.309 Ha) (İş Yatırım Programından Çıkarıldı) 9-İmar Planı Paftalarının Taranması Ve Koordinatlandırılması İş (İhale İşlemleri Yapılmadı) 10-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kıyı Kesimi 1.Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı vee 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu 61.000 + kdv) 11-Datça-Bozburun ÖÇKB, Muğla İli, Datça İlçesi, Emecik Mahallesi, Kızlanaltı Kesimi, Karaincir Mevkiine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İş Tamamlandı Ödemesi Yapıldı 45.500 + kdv)
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2025	6.321.000	2.151.000	1.900.000	0	% 0,0	
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2025	12.200.000	5.000.000	3.240.000	0	% 0,0	Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerden İmar Uygulamasına ilişkin talep olmadığından Harcama yapılmamıştır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K10-90489	Fethiye İç Körfezi Deniz Dibi Tarama ve Temizliği (Çevre Sektörü)	2024-2024	1.800.000		1.800.000	0	% 0,0	
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	2021-2024	53.463.000	9.544.000	11.199.100	9.438.000	% 84,3	
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	41.463.000	9.544.000	9.032.100	7.458.000	% 82,6	Proje çalışmaları devam etmekte olup;Projeye ait 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2024	12.000.000		2.167.000	1.980.000	% 91,4	Proje Sonuç Raporu Genel Müdürlüğümüze sunulmuş olup, proje tamamlanmıştır.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	1.152.000	657.000	495.000	406.156	% 82,1	
	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları	2022-2024	1.152.000	657.000	495.000	406.156	% 82,1	Projeler beklentiler doğrultusunda gerçekleştirilerek tamamlanmıştır.
2016K10-150495	İklim Değişikliğinin Ekosisteme Etkisi Araştırması (Çevre Sektörü)	2021-2024	3.377.500	2.275.000	1.102.500	732.000	% 66,4	Proje tamamlanmıştır.Son hakediş ödemesi yapılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2025	10.700.000	3.978.000	2.700.000	2.509.440	% 92,9	**."Artvin, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Erzurum, Bingöl, Bayburt, Iğdır, Siirt, Sinop, Amasya İllerinde Bulunan Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" 24.05.2023 tarihinde Online Çevre Proje İnşaat Mühendislik Danışmanlık Yazılım Bilişim ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanarak başlatılmıştır. Sözleşme bedeli 1.374.000,00 TL+KDV (1.621.320,00 TL KDV dahil) 1. Hakediş Bedeli (%40) 549.6000,00 TL + KDV (659.520,00 TL KDV dahil) 2. Hakediş Bedeli (%60) 824.400,00 TL+KDV (989.280,00 TL KDV dahil) 1. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 15.12.2023 tarihli ve 8242342 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. Proje çalışmaları 29.05.2024 tarihinde tamamlanmış olup 2. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 16.12.2024 tarihli ve 11238409 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. **."Mersin İli, Silifke İlçesi, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" çalışmaları 09.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup Hakediş ödemesi (%100) 300.000,00 TL+KDV (360.000,00 KDV dahil) 16/07/2024 tarihinde yapılmıştır. **."Antalya, Karaman, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" hizmet alımı işine ilişkin 02.08.2024 tarihinde 1.940.000,00 TL+KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir. (2024-2025) 1. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 06.12.2024 tarihli ve 11163298 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. **."Balıkesir, Bartın, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop ve Zonguldak İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" hizmet alımı işine sözleşme 27/06/2024 tarihinde 1.447.000,00 TL+KDV bedelle imzalanmıştır. 1. Hakediş Bedeli (%40) 578.800,00 TL + KDV **."1. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 11.12.2024 tarihli ve 11197357 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı	2017-2025	10.700.000	3.978.000	2.700.000	2.509.440	% 92,9	
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2025	11.500.000		3.420.000	2.285.400	% 66,8	
	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma veYönetim Planı Hazırlama	2024-2025	6.200.000		990.000	0	% 0,0	İstenilen ilave bütçe 29.11.2024 tarihinde gelmiştir. Ancak 2024 yılında kalan bir aylık süre ihale süreci için yeterli olmadığından 2024 yılı bütçesi harcanamamıştır. 2025 yılı bütçesi ile ihale hazırlıkları başlatılmıştır.
	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.500.000		1.170.000	1.085.400	% 92,8	Kasım ayında ara rapor doğrultusunda 2. hakediş ödemesi yapıldı.2024 yılında işin toplamda %45 i gerçekleştirilmiştir.
	Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.800.000		1.260.000	1.200.000	% 95,2	Projenin sözleşmesi 14.08.2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 2.000.000,00+KDV, 1. Hakediş Bedeli (%30) 600.000,00 TL+KDV, 2. Hakediş Bedeli (%20) 400.000,00 TL+KDV 1. ve 2. Hakediş ödemesine ilişkin belgeler 09.12.2024 tarihli ve 11180436 sayılı yazı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	11.000.000	7.794.000	5.000	0	% 0,0	Projeyle ilişkin arazi çalışmaları tamamlanmış olup sonuç raporu incelendikten sonra proje 2025 yılı başında tamamlanacaktır.
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2027	1.904.100.000	405.000.000	485.190.000	404.829.088	% 83,4	Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 2022-2026 yılları Yatırım Programında yer alan toplam maliyeti 2.839.100.000 TL olan Türkiye'nin en büyük çevre projesinin uygulamasına 2022 yılında başlamış olup 1. Etap çalışmaları Aralık 2024 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır. Projenin tamamlanması ile birlikte 720 hektar alanda %8 katı oranına sahip toplam 33 milyon m3 dip çamuru temizlenmiş olacaktır. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği 1. Etap çalışmaları kapsamında 2024 yılında Bakanlığımızca hakedişli olarak 404.829.087.92.-TL ödenek aktarılmıştır. Aralık 2024 tarihi itibarı ile yaklaşık 1.187.500 m² denizel alan taranmıştır. 13.381.278 m³ %8 katı madde oranına sahip malzeme deniz tabanından çekilerek susuzlaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Toplam 1130 adet geotekstil tüpte susuzlaştırma işlemi tamamlanmıştır. Geotekstil tüplerde %60 oranında susuzlaştırılan 1.017.074 m³ dip çamuru depolama sahasına nakledilmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 16.08.2024 tarihinde ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği 2. Etap" işi kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.
	<i>Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)</i>		850.000.000	125.000.000	146.090.000	146.090.000	% 100,0	
	<i>Döner Sermaye Ödeneği</i>		1.054.100.000	280.000.000	339.100.000	258.739.088	% 76,3	
	<i>Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı</i>		935.000.000	150.000.000	335.000.000	276.035.624	% 82,4	
2024K10-225388	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2024	4.000.000		4.000.000	3.516.000	% 87,9	
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	560.000		560.000	540.000	% 96,4	Proje tamamlanmıştır.
	Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	535.000		535.000	528.000	% 98,7	Proje tamamlanmıştır.
	Patara ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	1.040.000		1.040.000	720.000	% 69,2	Proje tamamlanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Belek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	800.000		800.000	720.000	% 90,0	Proje tamamlanmıştır.
	Göksu Deltası ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	1.065.000		1.065.000	1.008.000	% 94,6	Proje tamamlanmıştır.
2024K10-225397	Marmara Adası Maden Ocağı Rehabilitasyon (Çevre Sektörü)	2024-2024	40.000		40.000	0	% 0,0	2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 2024 yılı ödeneği 1.800.000 TL olarak revize edilen projenin 1.460.000 TL si "2024K10-225398 numaralı Marmara Denzinde Deniz Çayırı Alanı Tespiti Projesi"ne, 300 TL si ise "2024K10-225399 numaralı Marmara Denizi Denizanası Artışı Araştırılma FAZ-II Projesi"ne aktarılması Bakanlık Makamının 03/07/2024 tarih ve 9874522 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
2024K10-225398	Marmara Denzinde Deniz Çayırı Alanı Tespiti (Çevre Sektörü)	2024-2024	5.960.000		5.960.000	5.944.000	% 99,7	Projeye ait sonuç raporu idareye sunulmuş ve hakediş yükleniciye ödenerek proje tamamlanmıştır.
2024K10-225399	Marmara Denizi Denizanası Artışı Araştırılma FAZ-II (Çevre Sektörü)	2024-2024	3.000.000		3.000.000	3.000.000	% 100,0	Projeye ait sonuç raporu idareye sunulmuş ve hakediş yükleniciye ödenerek proje tamamlanmıştır.
2024K10-225400	Mağaraların Araştırılması (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2024	2.700.000		2.700.000	2.353.200	% 87,2	Karasal Mağaraların Araştırılması Hizmet Alım işi sözleşmesi imzalanmış olup, 17 adet mağara oluşumu çalışılmıştır.
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	8.500.000		2.677.500	1.980.720	% 74,0	1.Ara Rapor sunulmuştur. 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır.
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	6.675.000		1.800.000	1.268.006	% 70,4	1.Ara Rapor sunulmuştur. 1.Hakediş ödemesi yapılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme (Çevre Sektörü)	2024-2026	35.000.000		6.300.000	0	% 0,0	Ödeneğe ilişkin yazışmalar yapıldı işlemleri yıl içinde tamamlanamadı.
2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme (**Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	2.900.000		1.200.000	1.200.000	% 100,0	2 yıl sürecek projenin 2024 yılı çalışmaları tamamlanmış olup, 1. yıl sonuç raporu idareye sunulurak hakediş yükleniciye ödenmiştir.
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	3.000.000		1.500.000	1.410.000	% 94,0	Antalya, Isparta ve Burdur İllerinde Bulunan Anıt Ağaçların ve Tescilli Ağaç Topluklarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Projesi Hizmet Alım İşi tamamlanmış olup, hakediş yapılmıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2024-2026			5.000.000	0	% 0,0	
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.147.318.500	183.205.000	256.604.100	192.318.125	% 74,9	
10 Proje		DÖNER SERMAYE	1.490.822.000	384.216.000	474.605.000	312.465.931	% 65,8	
		GENEL TOPLAM	2.638.140.500	567.421.000	731.209.100	504.784.056	% 69,0	
1 Proje		Belediye Katkısı	935.000.000	150.000.000	335.000.000	276.035.624	% 82,4	
		Kamu laştırma	0	0	5.000.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2025	7.899.000	5.100.000	450.000	240.000	% 53,3	YERELBİLGİ Sistemi ile her yıl 11 adet form düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç olan veriler Sistem ile toplanmaktadır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	20.000.000	6.500.000	4.500.000	0	% 0,0	Söz konusu proj ile ilgili olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları beklenmişti. Yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ancak gelinen noktada Cumhurbaşkanlığının 2024/7 Sayılı ve Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesi yayımlanmış olup yapılacak ihaleler durdurulmuştur.
2024K07-224132	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	% 100,0	KÖYDES Projesi kapsamında 29.11.2024 tarihinde hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2.5 Milyar TL ödenek İLBANK köydes hesaplarına aktarılmıştır. KÖYDES Projesi kapsamındaki 51 ilimize hakediş ödemeleri ile ortak alım, yönetim müşavirlik hizmeti ödemeleri İLBANK tarafından gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu itibarıyla 51 ilimizden son aylık izlemeler istenilmiştir. Yol, İçmesuyu, atıksu ve sulama sektörlerinde yapılan işlerin bilgileri dosyalarına işlenmiştir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	5.027.899.000	11.600.000	4.950.000	240.000	% 4,8	

Dipnot: 652

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K01-225160	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2024-2024	25.870.000		25.870.000	0	% 0,0	
	Harita Alımları	2024-2024	135.000		135.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2024-2024	135.000		135.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2024-2024	25.600.000		25.600.000	9.000.000	% 35,2	25.600.000,00.-'e başlangıç ödeneğinden 100.000,00.-'e ödenek blokeli olup, 25.500.000,00.-'e ödenek serbest bırakılmıştır. Toplam ödenekten 9.000.000,00.-'e Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin ilgili tertibine aktarılmış ve 500.000,00.-'e ise kurum içi ödenekten düşülmüş olup 16.000.000,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2024-2026			300.000.000	255.295.184	% 85,1	250.000.000,00.-'e başlangıç ödeneği ve 50.000.000,00.-'e ödenek aktarması ile birlikte 300.000.000,00.-'e toplam ödeneğin tamamı serbest bırakılmış, 255.295.183,00.-'e'isi harcanmış olup, 44.704.817,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2024-2026			22.000.000	10.007.552	% 45,5	2.000.000,00.-'e başlangıç ödeneği ve 20.000.000,00.-'e ödenek aktarması ile birlikte 22.000.000,00.-'e toplam ödeneğin tamamı serbest bırakılmış, 10.007.552,00.-'e'isi harcanmış olup, 11.992.448,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	25.870.000	0	25.870.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	322.000.000	265.302.736	% 82,4	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormancılık Sektörü)	2023-2026	37.050.000	2.850.000	6.870.000	6.399.600	% 93,2	
	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2026	29.500.000	1.500.000	5.000.000	4.992.000	% 99,8	2024-2025 UASİS Yazılımı Bakım Hizmeti'nin 6 aylık çalışma raporunun ödemesi yapılmıştır.Geri kalan kısmı 2025 yılı mayıs ayında ödemesi yapılacaktır.
	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2025	1.650.000	550.000	743.000	699.600	% 94,2	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Projesi Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Web Portal Yazılım Projesi: WEB tabanlı CBS özelliklerine sahip yapılacak bir yazılım oluşturularak daha önce farklı projelerde ulusal bazda üretmiş olduğu haritaların (çölleşme, organik karbon, erozyon, oyuntu erozyonu vd.) ve bunlara ait tematik haritaların oluşturulmuş olduğu raster ve vektör verilerin CBS ortamında yayınlanmıştır.
	Toprak Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2023-2025	1.650.000	550.000	2.000	0	% 0,0	Toprak Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesinin ödeneği Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere Çölleşme ve Erozyonla Mücadele toplu projesine aktarılmıştır.
	Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası	2023-2025	750.000	250.000	2.000	0	% 0,0	Proje yılı ödeneği yıl içinde aktarılmıştır.
	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	2024-2026	3.500.000		1.123.000	708.000	% 63,0	2024 yılı içerisinde arazi örtüsü değişiminin pilot sahada yapay zeka ile çıkarılması işi için hizmet alımı yapılmıştır. 2025 yılı için ise pilot sahada atmosferik modeller için çalışmalara devam edilecektir.
2023A05-196786	Bolaman ve Çekerek Nehri Havzaları Rehabilitasyonu (Ormancılık Sektörü)	2023-2028	10.000.000	1.635.000	2.000	0	% 0,0	Proje yılı ödeneği yıl içinde aktarılmıştır.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2024-2026	60.580.000		27.873.000	25.896.823	% 92,9	
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2024-2026	60.400.000		27.693.000	25.896.823	% 93,5	<p>** 1 adet Potansiyel Çığ Başlama Bölgeleri Haritaları Verilerin Güncellenmesi Projesi tamamlanmıştır. 6 adet sel kontrol, ağaçlandırma ve erozyon kontrol projesi tanzim edilmiştir. 1 adet sel kontrol projesi uygulanmıştır. 6 adet karbon yutak alan ağaçlandırma projesi tanzim edilmiştir. 2 adet karbon yutak alan ağaçlandırma projesi uygulanmıştır. 1 adet karbon yutak alan ağaçlandırma projesi İdarece tanzim edilmiştir. 6 adet çığ tehlike değerlendirme projesi İdarece tanzim edilmiştir. 1 adet Eysel-Kentsel Arıtma Çamurlarının Marjinal ve Bozulmuş Sahaların Islahına Yönelik Kullanım İmkânlarının Değerlendirilmesi ile Toprak ve Bitki Gelişimine Etkisinin Araştırılması Projesi faaliyetleri kapsamında Faz-1 çalışması tamamlanmıştır.</p> <p>** İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgâr Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya Örneği kapsamında proje sahasında bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uyum sağlayabilen, toplamda 9.000 adet fidan dikilmiştir.</p> <p>** İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Rüzgâr Erozyonuyla Mücadele Projesi: Konya-Karapınar Örneği kapsamında proje sahasında bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uyum sağlayabilen, toplamda 20.000 adet fidan dikilmiştir.</p> <p>** Erozyonla Mücadele, İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yeni Karbon Yutak Alan Oluşturma Projesi kapsamında "Ay Yıldız Müsterek Karargâhı Yeni Karbon Yutak Alanı Oluşturulma Projesi 1. Etap" çalışmasında Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi proje sahasında bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uyum sağlayabilen, toplamda 13.400 adet fidan dikilmiştir.</p> <p>** İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İllerine Ait Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Oluşturulması Projesi; Çevreyi koruma ve doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanma çabalarımızın bir parçası olarak; Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel bitki örtüsü incelenerek, her kentlinin iklim ve ekolojik özelliklerine uygun doğal bitki türlerinin belirlenmesi ve peyzaj çalışmalarında bu bitkilerin nasıl kullanılabileceği konusunda pratik bilgiler sunulması ve sürdürülebilir kent peyzajı tasarımlarına yön vermek amacıyla "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi" İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 22 İl için hazırlanmıştır. Doğal bitkilerin kentsel peyzajda nasıl kullanılabileceğine dair detaylı bilgiler sunulduğu bu rehberlerde, her bir ilimiz için özel olarak seçilmiş bitki türleri ve uygulama stratejileri, o bölgenin özgün ekolojik yapısına ve iklim koşullarına göre belirlenmiştir. Bu sayede, kentlerimizin yeşil dokusunu güçlendirerek iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflenmektedir.</p> <p>** Çankırı Karbon Yutak Alanı Uygulama, Kırşehir Karbon Yutak Alanı Uygulama, Aksaray Karbon Yutak Alanı sonbahar bakım, Aksaray Karbon Yutak Alanı ilkbahar bakım, Aksaray, Sivas, Eskişehir, Çankırı ve Ankara fidanlılarından fidan alımı yapılmıştır.</p> <p>** Kayseri Pınarbaşı ilçesinde 1 adet entegre havza rehabilitasyon projesi hazırlanmıştır.</p>
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2024-2024	180.000		180.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi (Ormanlık Sektörü)	2024-2027	46.000.000		7.000.000	0	% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	107.630.000	4.485.000	34.745.000	32.296.423	% 93,0	
1 Proje		UNDP HİBESİ	46.000.000	0	7.000.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2024	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	
	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (**.Döner Sermaye)	2024-2025	57.629.000		20.192.000	11.076.138	% 54,9	İhalesi Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 12.06.2024 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 43.850.000 TL (KDV dahil 57.608.400 TL) üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır.
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	331.700.000		131.000.000	0	% 0,0	Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 07.02.2024 tarihli ve E-16517702-602.07.04-8696978 sayılı yazı ile ihale talimatı verilmiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği		5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		326.700.000		126.000.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-224617	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2024-2024	6.300.000		6.300.000	6.209.497	% 98,6	
	Hizmet Binası Onarımı	2024-2024	7.200.000		7.200.000	7.168.440	% 99,6	
2024G00-224585	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2024-2024	3.060.000		3.060.000	1.483.310	% 48,5	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	21.560.000	0	21.560.000	14.861.247	% 68,9	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	385.829.000	500.000	147.192.000	11.076.138	% 7,5	
		GENEL TOPLAM	407.389.000	500.000	168.752.000	25.937.385	% 15,4	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.12.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2025	150.000.000		80.000.000	0	% 0,0	
2024G00-224585	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2024-2024	90.000		90.000	0	% 0,0	
2024K09-224617	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2024-2024	0		0	0		
	Hizmet Binası Onarımı	2024-2024	0		0	0		
	Taşıt Alımı (20 adet T02-TOGG) (**.Döner Sermaye)	2024-2024	35.000.000		35.000.000	35.000.000	% 100,0	Bakanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 (yirmi) adet TOGG marka taşıt DMO'dan alınmıştır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	90.000	0	90.000	0	% 0,0	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	185.000.000	0	115.000.000	35.000.000	% 30,4	
		GENEL TOPLAM	185.090.000	0	115.090.000	35.000.000	% 30,4	
