



2020 Yılı
Bütçe ve Yatırım Programı
3. Dönem Gerçekleşme Raporu
(01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2020 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2020 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.424.992.000,00	1.451.107.119,69	1.126.274.979,95	% 77,6
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	248.449.000,00	254.943.459,28	190.295.580,44	% 74,6
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	101.138.000,00	138.554.032,58	98.139.607,61	% 70,8
05	CARİ TRANSFERLER	627.913.000,00	784.136.981,80	432.360.752,83	% 55,1
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	430.000.000,00	430.000.000,00	326.800.000,00	% 76,0
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-İmar Barışı	0,00	0,00	0,00	
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	163.000.000,00	163.000.000,00	76.609.000,00	% 47,0
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	27.750.000,00	28.992.695,88	24.162.847,79	% 83,3
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	0,00	153.118.000,00	0,00	% 0,0
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	7.163.000,00	9.026.285,92	4.788.905,04	% 53,1
06	SERMAYE GİDERLERİ	161.425.000,00	1.152.874.076,73	641.283.837,88	% 55,6
	Bakanlık Yatırım Programı	145.505.000,00	232.027.167,22	61.823.757,91	% 26,6
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	15.920.000,00	41.920.000,00	18.759.125,14	% 44,7
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	878.926.909,51	560.700.954,83	% 63,8
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	247.847.000,00	1.044.938.842,39	592.934.649,93	% 56,7
	Bakanlık Yatırım Programı	83.318.000,00	87.220.842,39	8.828.700,21	% 10,1
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	164.529.000,00	354.529.000,00	141.756.547,48	% 40,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	180.600.000,00	19.760.402,24	% 10,9
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	422.589.000,00	422.589.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	15.969.000,00	15.969.000,00	3.917.107,50	% 24,5
GENEL TOPLAM		2.827.733.000,00	4.842.523.512,47	3.085.206.516,14	% 63,7



BAKANLIĞIMIZ 2020 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

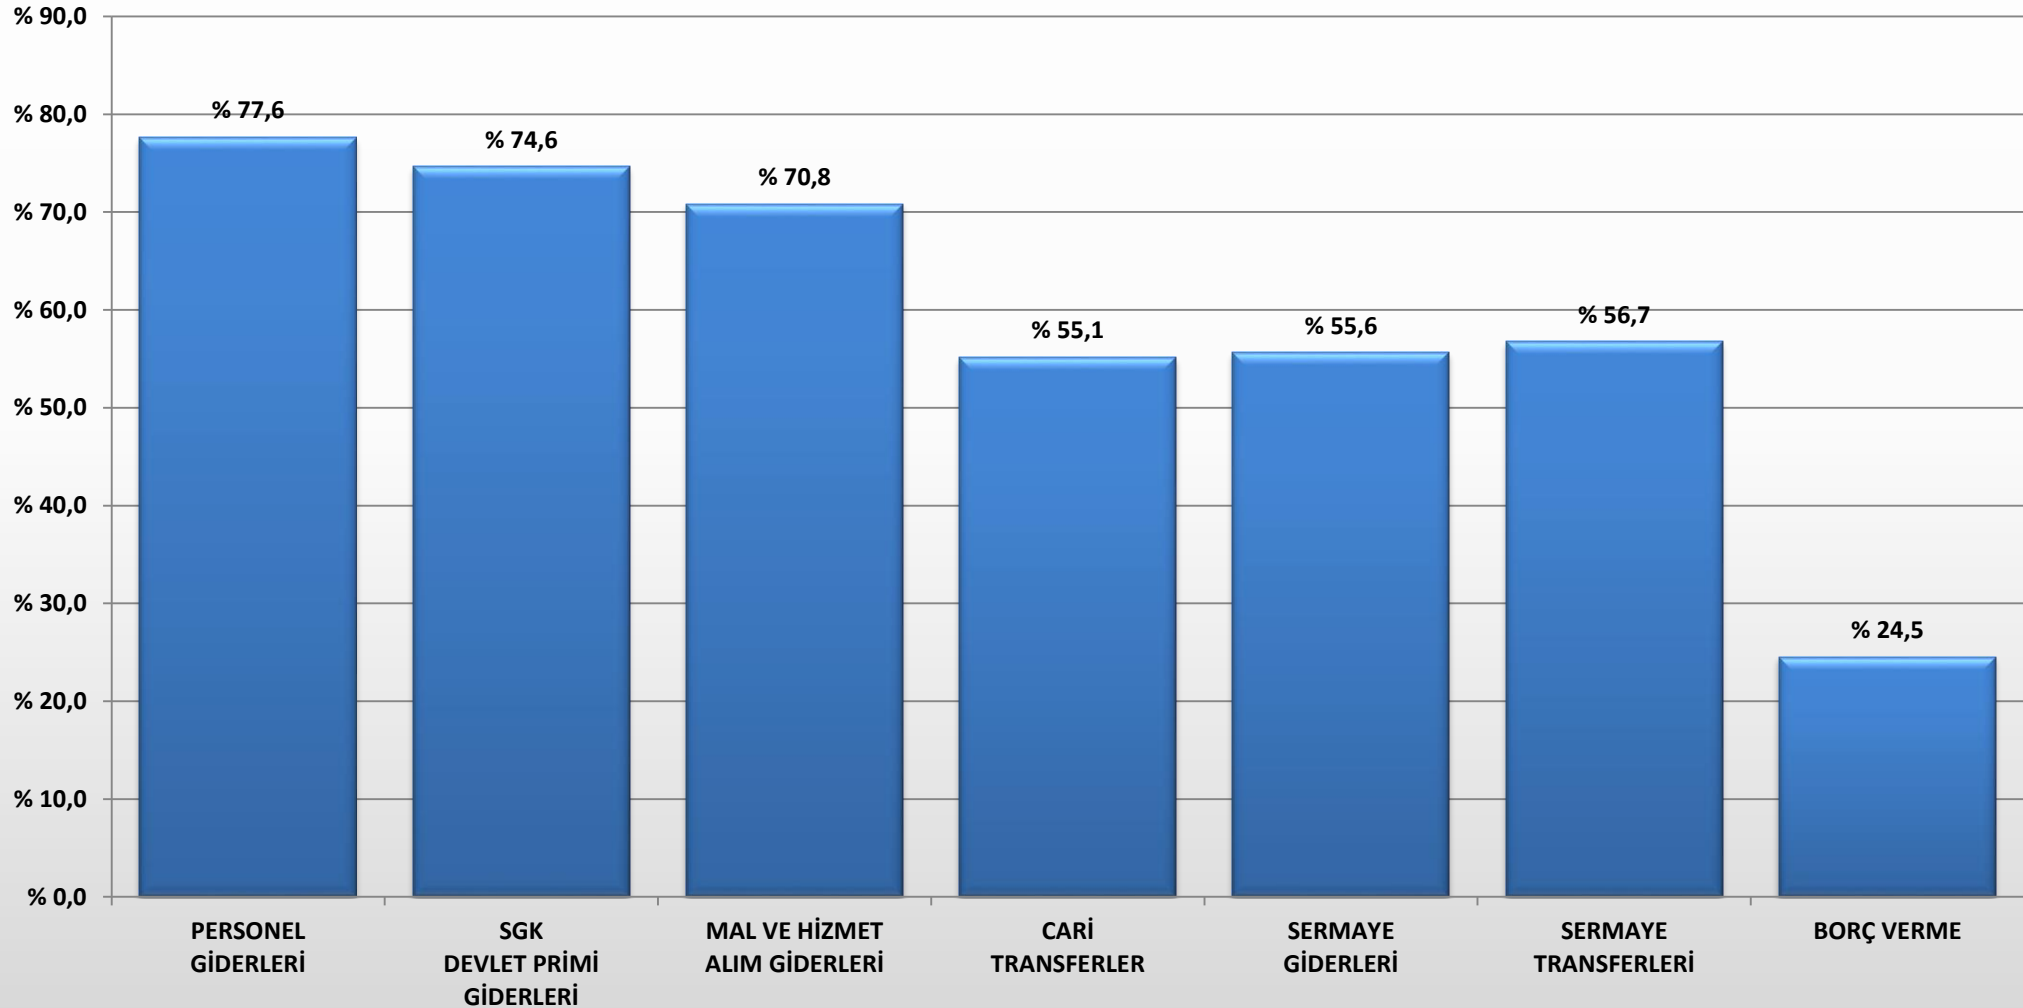




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2020 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2020 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2020 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	42.902.000,00	17.310.000,00	478.313,00	% 2,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	11	2.409.385.000,00	63.437.000,00	4.008.176,26	% 6,3
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	5	196.451.000,00	31.857.000,00	11.629.589,00	% 36,5
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	19	2.953.355.394,00	151.371.000,00	52.524.984,00	% 34,7
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	2	8.700.000,00	1.201.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	4	4.270.000,00	1.898.000,00	444.630,93	% 23,4
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	8	90.860.000,00	40.520.000,00	3.245.593,00	% 8,0
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	2.796.992.000,00	2.969.000,00	1.344.839,99	% 45,3
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	18	217.609.000,00	52.779.000,00	4.057.411,36	% 7,7
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	1.510.406.000,00	2.324.000,00	0,00	% 0,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	3	55.665.467,22	13.900.167,22	7.769.362,40	% 55,9
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	300.000,00	300.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	81	10.289.895.861,22	382.866.167,22	85.502.899,94	% 22,3
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	71	10.086.033.561,22	333.909.167,22	73.483.536,94	% 22,0
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	10	203.862.300,00	48.957.000,00	12.019.363,00	% 24,6
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		41.920.000,00	18.759.125,14	% 44,7



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2020 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

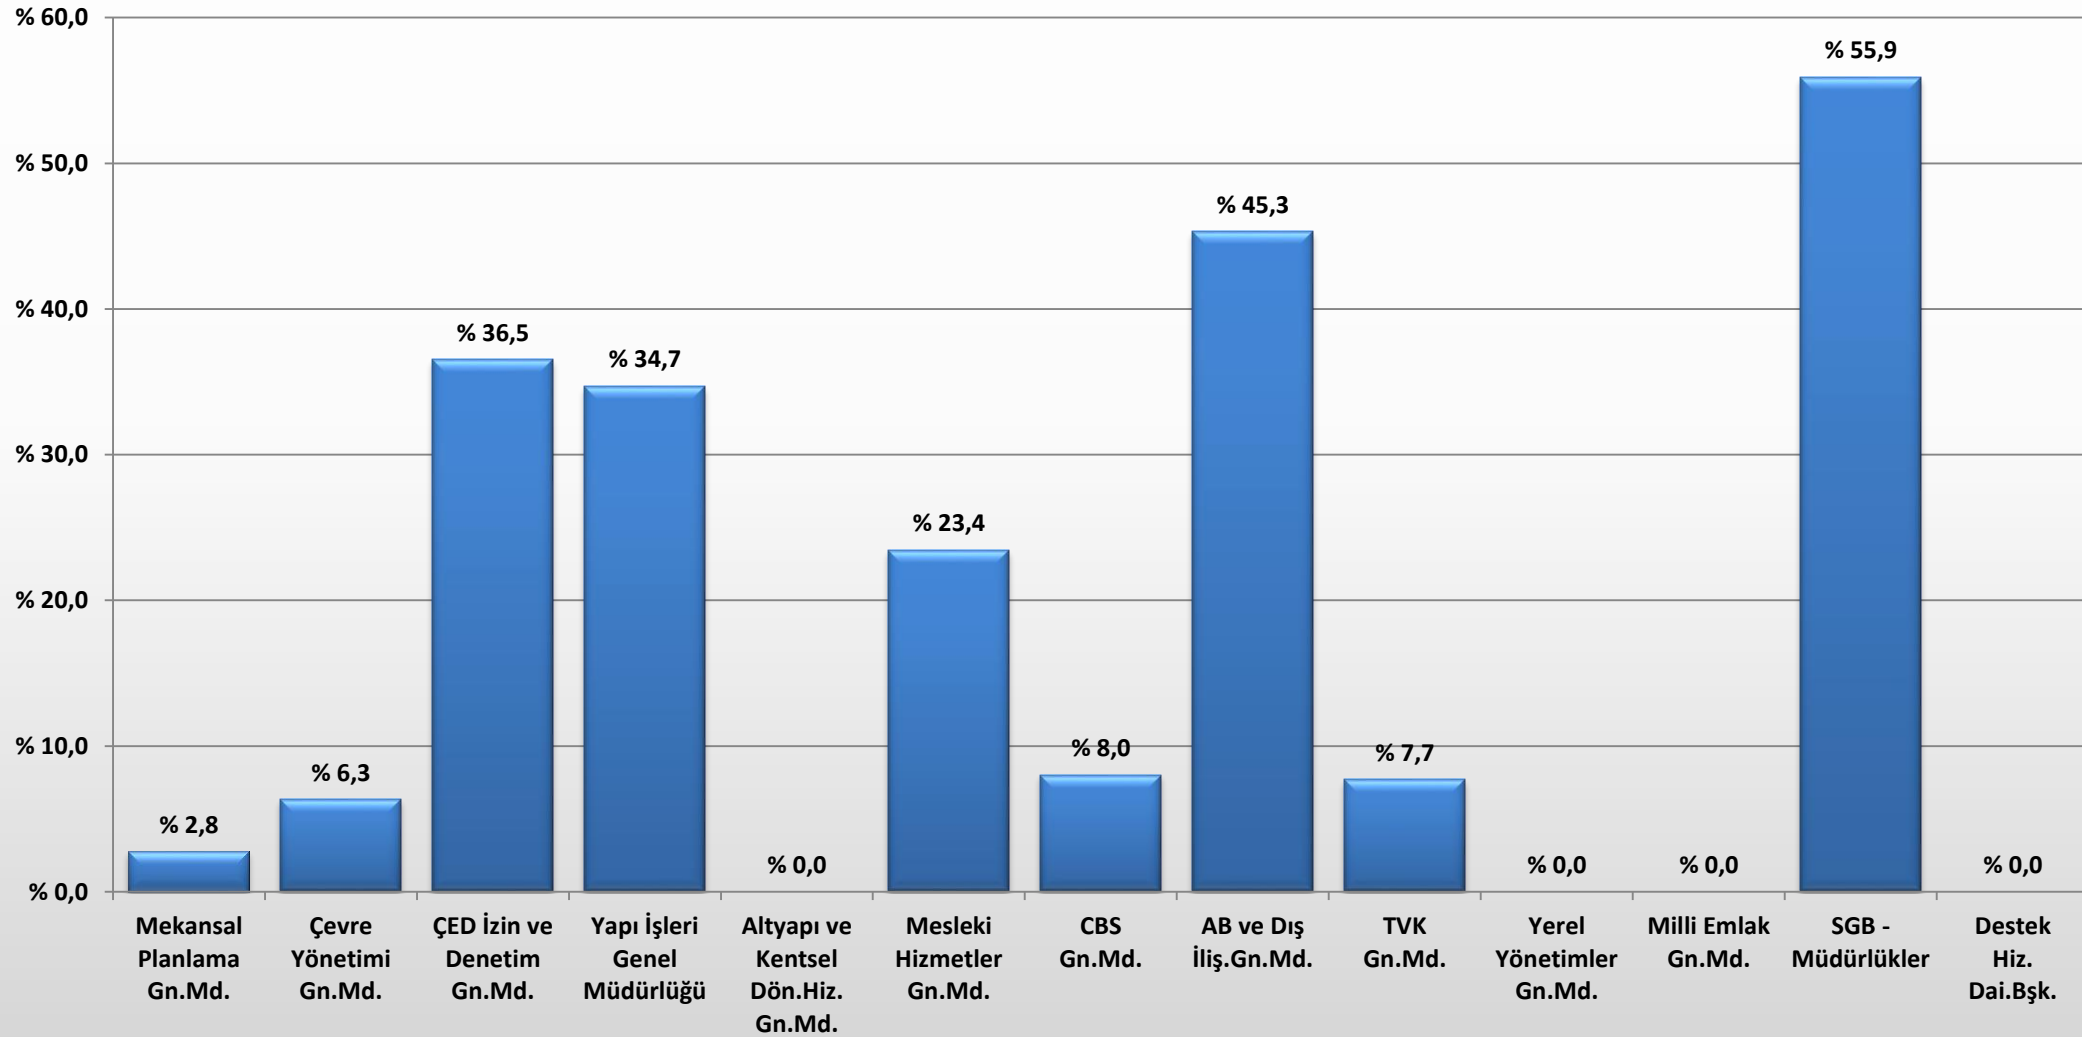




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2020 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2020 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	40.075.000,00	42.547.000,00	19.658.682,84	% 46,2
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	258.528.000,00	782.246.000,00	187.669.153,03	% 24,0
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	75.621.000,00	73.937.379,05	42.877.936,60	% 58,0
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	169.761.000,00	237.739.183,17	108.530.700,93	% 45,7
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	454.352.000,00	876.941.000,00	767.290.992,60	% 87,5
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	23.589.000,00	23.309.000,00	16.268.894,14	% 69,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	31.520.000,00	33.110.000,00	15.464.369,63	% 46,7
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	35.677.000,00	36.919.695,88	32.937.122,27	% 89,2
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	55.604.000,00	74.623.842,39	20.741.439,77	% 27,8
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	9.853.000,00	9.853.000,00	5.503.989,54	% 55,9
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	86.563.000,00	112.398.000,00	47.925.773,94	% 42,6
Personel Genel Müdürlüğü	7.558.000,00	7.558.000,00	6.845.117,07	% 90,6
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	7.448.000,00	46.327.000,00	41.662.035,17	% 89,9
Özel Kalem Müdürlüğü	36.299.000,00	36.799.000,00	6.971.448,21	% 18,9
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	53.627.000,00	57.103.255,56	43.690.069,95	% 76,5
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	3.045.000,00	3.045.000,00	1.370.694,34	% 45,0
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	12.370.000,00	12.370.000,00	10.142.124,54	% 82,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı	170.861.000,00	170.861.000,00	82.844.752,08	% 48,5
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.296.000,00	1.296.000,00	908.500,29	% 70,1
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	3.696.000,00	8.696.000,00	6.618.001,57	% 76,1
İl Müdürlükleri	1.290.390.000,00	2.194.844.156,42	1.619.284.717,63	% 73,8
TOPLAM	2.827.733.000,00	4.842.523.512,47	3.085.206.516,14	% 63,7



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2020 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

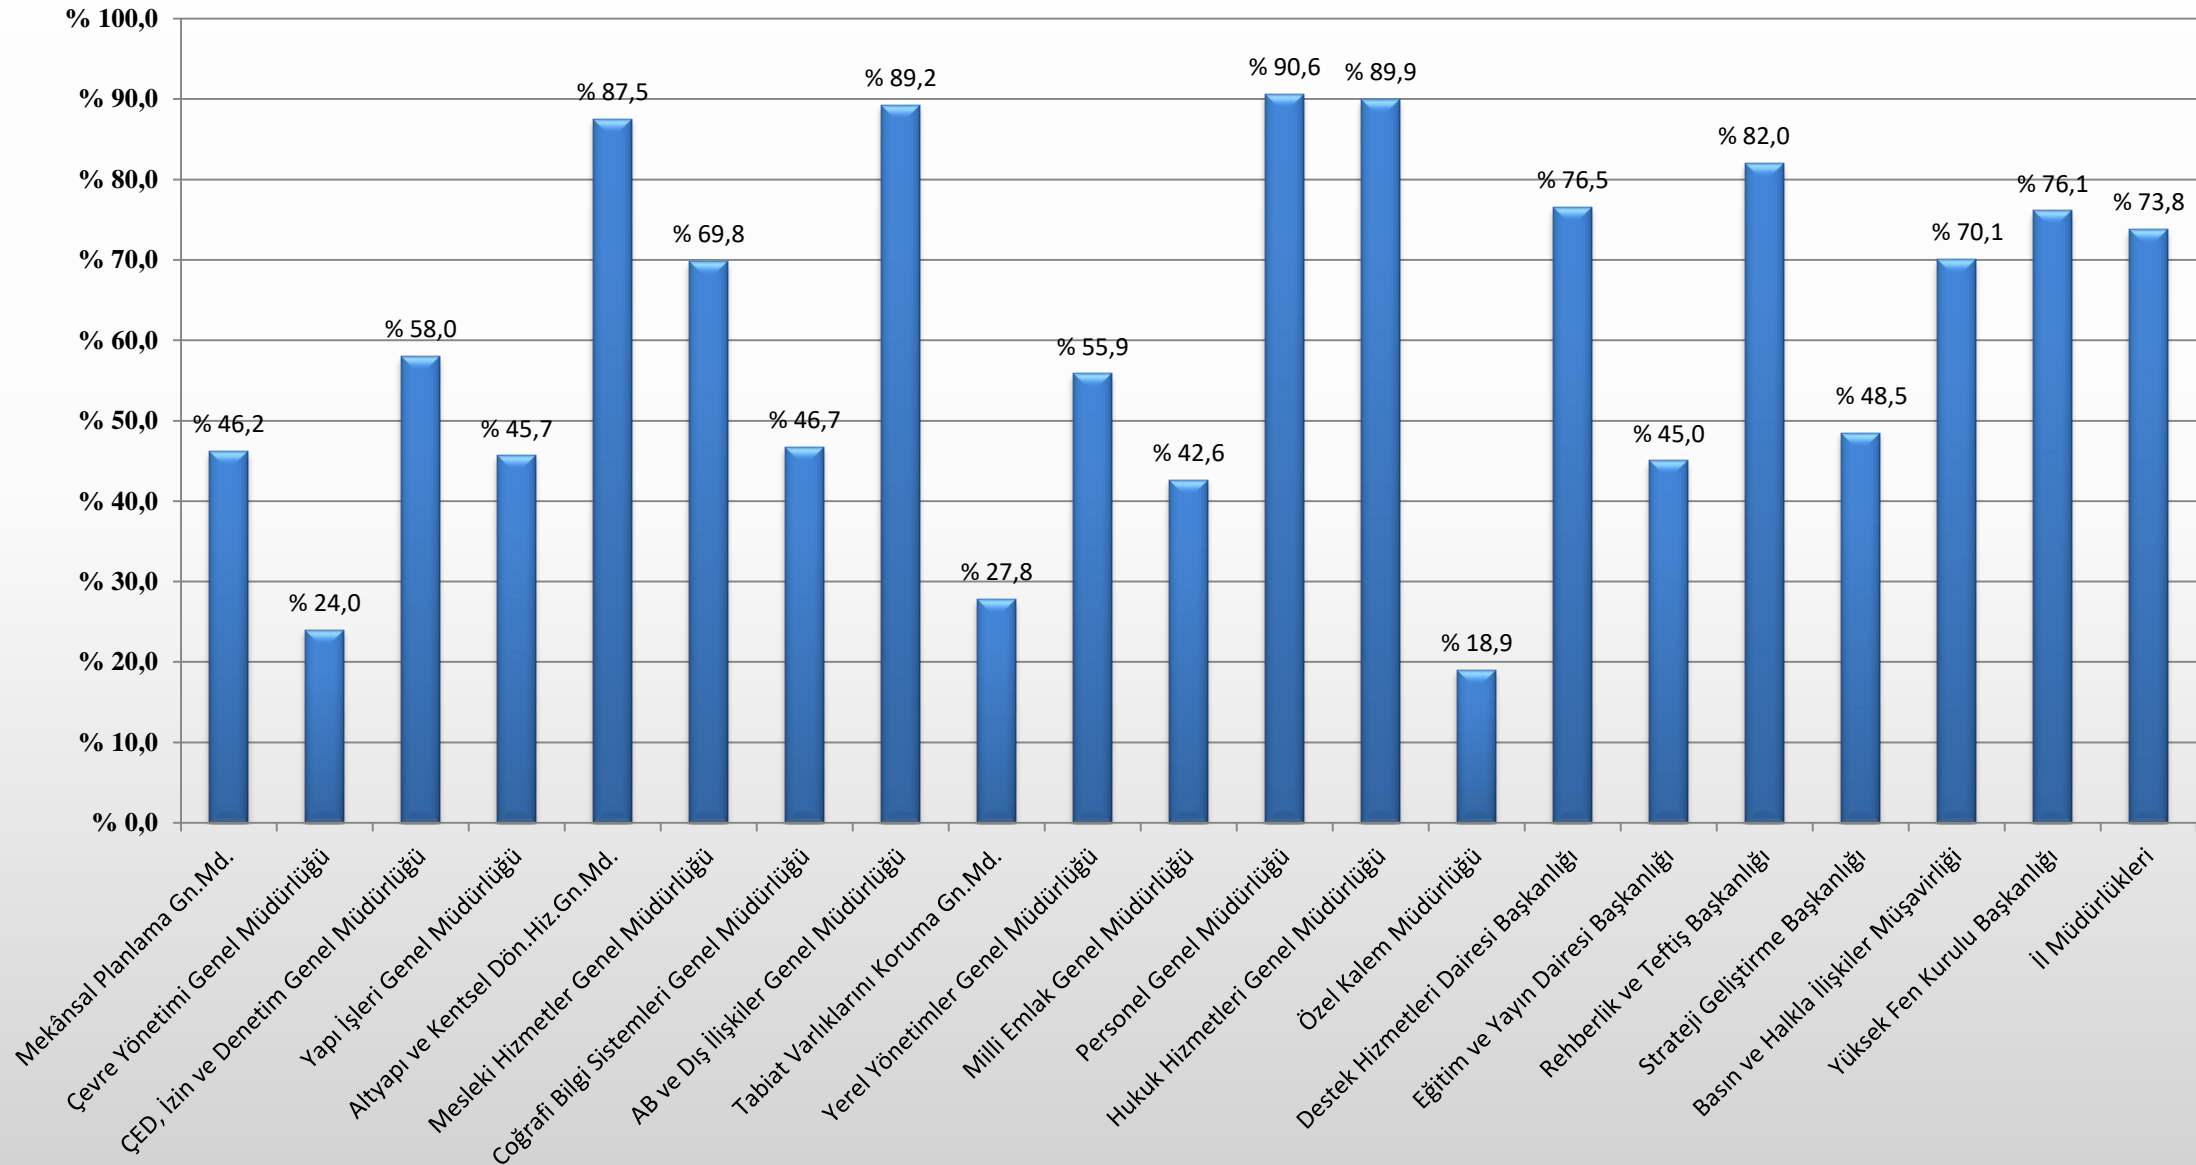

**Harcama Birimi Bazında
2020 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri**

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3798	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	7.000.000	0	4.400.000	377.600	% 8,6	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2021	4.000.000	0	2.400.000	0	% 0,0	16.03.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, henüz bir ödeme yapılmamıştır. İş devam ediyor.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama	2017-2021	3.000.000	0	2.000.000	377.600	% 18,9	Proje işi 4 aşamalı olup, 1 aşama olan 377.600,00 TL'si ödeme gerçekleştirilmiştir.
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2022	4.000.000	0	2.000	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-18078	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2021	11.342.000	1.000.000	6.838.000	29.618	% 0,4	
	Denizli İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	294.000	119.000	175.000	0	% 0,0	
	Düzce İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	154.000	16.000	138.000	0	% 0,0	
	Mardin İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	281.000	29.000	252.000	0	% 0,0	
	Samsun İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	251.000	0	251.000	29.618	% 11,8	Ödemeler dört aşamalı olup, 1. aşama ödemesi KDV dahil 29.618.100 TL tutarındadır.
	Yozgat İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	292.000	118.000	174.000	0	% 0,0	
	2. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2019-2021	10.070.000	718.000	5.848.000	0	% 0,0	7 farklı vilayet için sözleşmeler yapılarak işe başlanmış olup henüz bir ödeme yapılmamıştır. 1 vilayet için ise ihale süreci tamamlanmış olup sözleşmesi imzalanacaktır.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-3803	Bütünleşik Kıyı Alanlarının Planlaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2021	1.310.000	90.000	520.000	71.095	% 13,7	
	Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	310.000	90.000	220.000	71.095	% 32,3	Ödemeler dört aşamalı olup. 1.aşamının ödemesi 2019 yılında ödenmiş olup, 2. aşama ödemesi KDV dahil 71.095 TL lik hakediş ödemesi yapıldı.
	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2021	1.000.000	0	300.000	0	% 0,0	12.10.2020 tarihinde ihalesi yapılacaktır.
2020K09-150347	Yaşanabilir Şehirler Kriterleri Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2020-2020	850.000		850.000	0	% 0,0	
	Türkiye Yaşanabilir Kentler Endeksi ve Beratı	2020-2020	500.000		500.000	0	% 0,0	
	Yeni Planlama Modeline İlişkin Yatay Mimari Taramaları	2020-2020	350.000		350.000	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2022	14.400.000		2.700.000	0	% 0,0	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2022	5.000.000		1.000.000	0	% 0,0	22.07.2020 tarihinde KDV dahil 4.980.000,00 TL lik sözleşme imzalanmıştır. İş devam ediyor.
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2022	9.400.000		1.700.000	0	% 0,0	
2020K09-151116	Millet Bahçeleri Uygulama Projeleri Hazırlama (Şehirleşme Sektörü)	2020-2021	4.000.000		2.000.000	0	% 0,0	
7 Proje		06 ve 07 TOPLAM	42.902.000	1.090.000	17.310.000	478.313	% 2,8	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	2.145.000.000	90.000.000	50.000.000	0	% 0,0	KAP projesi kapsamında öngörülen işlerden olan aktarma istasyonu inşaatı yapım işi, entegre atık yönetimi tesisi danışmanlık işi, aktarma istasyonu uygulama projesi danışmanlık işi, düzenli depolama lotu uygulama projesi danışmanlık işi, düzenli depolama lotu yapım işi ve ön işlem tesisi danışmanlık işi ihale çalışmalarına başlanılmış olup henüz harcama yapılmamıştır. Harcama için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına proje detay listesi gönderilmiş olup onay beklenmektedir.
2017K08-3796	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	2.250.000	0	750.000	493.000	% 65,7	Proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile 07.02.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır. İş programı sunulmuş olup iş programı çerçevesinde 11 adet kılavuz ve yönetici özet kitapçığı hazırlanmış, ilk ödemeye ilişkin işlemler tamamlanmıştır.
2016K10-2820	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800.000	2.328.000	472.000	472.000	% 100,0	3 Şubat 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Dokuz Eylül Üniversitesi yürütücülüğünde başlayan proje 3 yıl sürmüştür ve Şubat ayında tamamlanmıştır. Projede 27 adet sektörel uygulama kılavuzu ve 2 adet idari uygulama kılavuzu hazırlanmış olup, 16.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan projenin kapanış toplantısında paydaşlarla paylaşılmıştır. Aynı zamanda gerek İl Müdürlüklerimiz gerekse Bakanlığımız çalışanlarına yardımcı olması amacıyla Sektörel Kontrol Listeleri ve Yönetmelik Taslağı tamamlanmıştır
2018K10-18297	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.687.000	987.000	700.000	0	% 0,0	"Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi"nin ve "Ulusal Deniz Çevresi Yönetim Eylem Planı"nın oluşturulması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda TÜBİTAK/MAM tarafından yürütülen "Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesi" 29/06/2018 tarihi itibarıyla başlamıştır. projenin sosyoekonomik analiz bileşenine ilişkin olarak pilot alan seçilen Balıkesir-Erdek'de deniz ile etkileşim halinde olan ilgili sektörler belirlenmiş ve bu sektörlerle ait veriler toplanarak, çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmalarda gelinen durum ve anılan sosyo ekonomik analiz verilerini değerlendirerek, sonuçları nihai hale getirmek amacıyla 27 Ağustos 2020 tarihinde online olarak Sosyoekonomik Analiz Çalıştayı düzenlenmiştir. Anılan çalışmanın çıktılarını içeren Raporun Bakanlığımıza iletilmesine müteakip ödeme gerçekleştirilecektir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	6.750.000	1.800.000	1.850.000	398.000	% 21,5	
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi	2018-2021	4.000.000	1.800.000	800.000	398.000	% 49,8	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmektedir. 27.06.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi kapsamında , başlangıç raporu, 1., 2. 3., 4. gelişme raporu kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hava Emisyon Konulu Çevre İzin sayısallaştırılması işlemleri proje destek elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup, HEY portalı veri tabanında, günümüz itibarıyla yaklaşık 3604 sanayi tesisine ait 12000 adet bacanın kirlenme bilgileri kayıt altındadır. Konya, Samsun, İzmir, Adana, Erzurum ve İstanbul bölgesel hava kalitesi yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi modelleme eğitimleri başlamış olup, eğitimlerden Bakanlığımız ilgili personeli, Temiz Hava Merkezleri personeli, çeşitli üniversitelerden görevlendirilen akademisyenler yararlandırılmaktadır. Proje destek elemanlarınca Hava Emisyon Konulu Çevre İzin sayısallaştırılması işlemleri Ek-2 listesindeki tesisler için devam etmektedir. Temiz Hava Merkezlerince yazılım üzerinden aktivite kodu güncelleme işlemleri yapılmıştır. Projenin modüllerine esas teknik çalışma toplantıları sürdürülmekte olup, HEY-Hava Emisyon Yönetim Portalı yazılım bakım ve geliştirme işlemleri devam etmektedir.
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi	2018-2021	1.750.000	0	750.000	0	% 0,0	Proje için yaklaşık maliyet çalışması yapılmıştır. Bundan sonraki süreçler için Bakan Onayı alınmak üzere Strateji Başkanlığına yazı yazılmış olup, onay beklenmektedir.
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2021	1.000.000	0	300.000	0	% 0,0	Projenin satın alma işlemlerine kadar olan süreçleri tamamlanmış ve hazırlanan Protokol imzalanmak üzere 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmiştir. Protokolün imzalanmasına müteakip projeye başlanacaktır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme	2016-2021	5.480.000	2.520.000	960.000	0	% 0,0	Ulusal Katkının takibinin yapılması amacıyla 2017 yılı Yatırım Programının DKH-Sosyal-Çevre Sektöründe 2016K100050 numaralı "Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi" eklenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu projenin yürütülmesi işi 06.11.2017 tarihinde imzalanan bir protokol ile Medipol Üniversitesine verilmiştir. Proje faaliyetlerine başlanılmış olup 2021 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 3. Revize ara raporla ilgili ödeme işlemleri sürecinin tamamlanması beklenmektedir. Çevrimiçi veri toplama altyapısı sistemi çalışmaları devam etmektedir. 4. Ara Rapor Bakanlığımıza ulaşılmış olup gerekli çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca hazırlanan uyum taslak bildirimini de kurumların görüşüne sunulmuştur.
Alt proje-2	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB-1)	2018-2022	11.236.000	1.521.000	2.106.000	0	% 0,0	IPA II programı kapsamında 2018K100610 proje numaralı "Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Avrupa Birliği ve Bakanlığımız eş finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmektedir. Proje 09.10.2019 tarihinde başlamış olup açılış konferansı 26.02.2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Proje yöneticisi ve hibe uzmanı istihdam edilmiştir. Proje başlangıç raporu 12.05.2020 tarihinde sunulmuştur. 30.06.2020 tarihi itibarı ile beşinci "Operasyon Koordinasyon Toplantısı" tamamlanmıştır. Proje kapsamında Muğla, Samsun, Sakarya ve Konya Büyükşehir Belediyeleri pilot belediyeler olarak seçilmiştir. Hibe Klavuzu ve proje faaliyetleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
AB katkısı			63.675.000	8.622.000	33.076.000	0	% 0,0	
Alt proje-3	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme Eğitimi (AB-1)	2020-2020	307.000		307.000	231.370	% 75,4	Proje 2 Ocak 2020 tarihi itibarı ile başlamıştır. Proje süresi 10 ay olup, 1 Kasım 2020'de tamamlanması planlanmaktadır. Proje başlangıç tarihi itibarı ile, proje kısa ismi ve logo çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Şartnamenin öngördüğü web sitesi ve "e-uyum sistemi" platformu, Kurumsal kapasite ve boşluk analizi ve eğitim ihtiyaç analizi raporu çalışmaları tamamlanmıştır. Projede görev alacak uzman kadrolarının istihdamı ve eğitimlerde katılımcılara aktarılacak eğitim dokümanları tamamlanmış olup son kontroller sonrası Türkçe ve İngilizce olarak dökümanların basım aşamasına geçilecektir.
AB katkısı			1.737.000		1.737.000	1.310.000	% 75,4	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi	2018-2020	3.000.000	2.500.000	500.000	0	% 0,0	Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi arasında 12.07.2018 tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan "EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi" ile sektörel MET Kontrol Listeleri, MET Referans Dokümanları ve MET Sonuçları Türkçe Çevirileri, sektörel envanterin güncellenmesi, tebliğ taslakları, saha ziyaretleri, çalışma ziyaretleri ve eğitimcilerin eğitimi aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. Proje takvimine göre Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. 12.07.2020 tarihi itibarıyla nihai hale getirilmesi planlanan EKÖK Metal Projesinde covid 19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen iş paketleri bulunduğundan projenin Aralık 2020 ye kadar uzatılmasına yönelik 09.07.2020 tarihinde Ek Protokol imzalanmıştır. 2018 yılı içinde; Proje Yönetim Planı Raporu onaylanarak 885.000 TL (KDV Dahil) ilk ödeme ve Saha Ziyareti Planı Raporu onaylanarak 613.600 TL (KDV Dahil) ikinci ödeme ve Eğitimcilerin Eğitimine Yönelik Rehber Doküman onaylanarak 999.460 TL (KDV Dahil) üçüncü ödeme gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı ilk altı aylık dönemde projeye ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamış olup, 2020 yılı sonunda projenin tamamlanmasına mütakip projenin son ödemesi gerçekleştirilecektir.
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Atık İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi	2020-2022	2.250.000		750.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlanmıştır. Harcama yapılmamıştır.
Alt proje-3	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	4.597.000		1.839.000	1.709.054	% 92,9	IPA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmıştır. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu projede 27.08.2020 tarihinde müşavir firmaya 1.503.264 Avro Avans ödemesi yapılmıştır. Proje başlangıç raporu sunulmuş olup onay aşamasındadır.
AB katkısı			26.049.000		10.420.000	9.650.000	% 92,6	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18333	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması (CITYAIR) (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.576.000	1.966.000	537.000	0	% 0,0	Proje 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlamıştır. Açılış toplantısı 09.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşlarının katılım sağladığı Yönlendirme Komitesi Toplantıları ile altı kez biraraya gelinmiştir. Aktivitelere göre hazırlanması beklenen raporların teslimi gerçekleştirilmiştir. Emisyon envanteri çalışmaları serisine Kahramanmaraş ilinde başlanmış, Sinop ve İzmir'de devam ettirilmiştir. Hem Millî Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı ile yürütülen işbirliği çalışmaları sürdürülmektedir. Çalışmaların gerçekleştirildiği illerde yerel medya bileşenlerinde projenin tanıtımı ve farkındalık faaliyetleri sürdürülmüştür. Mart sonu planlanan diğer envanter çalışması covid19 küresel salgınına bağlı olarak ülkemizde alınan tedbirler çerçevesinde ertelenmiş olup, 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına esas döneme ilişkin belirlenmiş faaliyetler yeniden takvimlendirilmektedir. Teknik çalışma toplantıları ve kamuoyu farkındalığı bileşenlerine ait aktivitelere ilişkin planlama toplantıları video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Projenin 3. İlerleme raporu teslim edilmiş durumdadır ve değerlendirme aşamasındadır. covid-19 tedbirleri kapsamında emisyon envanteri çalışmaları serisinin son çalışması, Güney İç Anadolu THM Müdürlüğü'ne bağlı olan Isparta ili merkezli olarak toplam 10 ilin belediye başkanlıkları ve taşra teşkilatı personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yıl ilk defa kutlanmak üzere Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 7 Eylül "Mavi Gökyüzü için Temiz Hava Günü" çerçevesinde Bakanlığımız öncülüğünde 81 ilde taşra teşkilatı, belediye başkanlıkları, Bölgesel Temiz Hava Müdürlükleri ve ilgili kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çevrimici özel oturum gerçekleştirilmiştir. Nakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığında Birleşmiş Milletler Avrupa Bölge Ofisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yüksek düzeyli temsilcilerinin konuşmacı olduğu etkinlikle ulusal çapta kamuoyu farkındalığı medya aracılığıyla sağlanmıştır. 2020 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da sosyal medya ve farkındalık etkinlikleri ile birlikte, Bakanlığımız öncülüğünde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa şekilde 28 Eylül 2020 tarihinde "Herkes İçin Sıfır Emisyon" konulu çevrimici özel oturum düzenlenmiştir. Etkinlikte 81 ilden belediyelerin temsilcileriyle ulaşımın hava kalitesi üzerindeki etkileri ile ilgili sunum ve konuşmalar yapılmıştır.
AB katkısı			20.261.000	11.141.000	3.038.000	0	% 0,0	
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2022	3.065.000	612.000	1.022.000	0	% 0,0	14.01.2020 tarihinde projenin açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı ilk çeyreğinde proje ekibinin kurulması, proje ofislerinin hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve Eğitim İhtiyacı Analiz Raporu hazırlanmıştır. Nisan ayı sonu itibarıyla Başlangıç Raporu ve 1. Faaliyet Raporları sunulmuştur. 30 Nisan tarihinde 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapılmıştır. Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi (KSBS) üzerinde güncelleme ve iyileştirme çalışmaları yapacak olan Yazılım Uzmanı 22 Mayıs itibarıyla göreve başlamıştır. Potansiyel sahalarda belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 09 Eylül 2020 tarihinde Yardım Masası İşletim Sistemi Çalışmayı Bakanlığımız, özel sektör ve İl Müdürlükleri temsilcileri katılımı ile çevrimici gerçekleştirilmiştir.
AB katkısı			17.364.000	5.788.000	5.788.000	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K10-92594	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2019-2021	1.635.000	653.000	1.000	0	% 0,0	Projenin açılış semineri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla 08 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tüzüğü ülkemizde uyumlaştıran Kimyasallar Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanması için Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşların personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin belirlenmesine yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanmıştır. Proje gelişmelerinin takibi ve bir sonraki ayın planlanmasına yönelik 7 adet (14/01/2020, 11/02/2020, 04/03/2020, 02/06/2020, 14/07/2020, 12/08/2020, 02/09/2020 tarihlerinde) Proje Yönetim Birimiyle birlikte toplantı yapılmıştır. Proje kapsamında 2020 yılında düzenlenecek beş adet eğitim programından ilki olan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi" eğitimi 24.02.2020-26.02.2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanmış olan ikinci eğitim programı dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 pandemisi sebebiyle ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Projenin başlangıcından itibaren 3 ayda bir olmak üzere 3 kere Projenin Yönlendirme Komitesi toplantıları (11/02/2020,09/06/2020, 02/09/2020) gerçekleştirilmiştir. Kimyasal Kayıt Sisteminin güncellenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
AB katkısı			9.263.000	4.086.000	1.000	0	% 0,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3829	Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilme (AB-1)	2017-2020	7.743.000	6.100.000	1.643.000	704.852	% 42,9	
AB katkısı	(Çevre Sektörü)		69.660.000	54.596.000	15.064.000	6.400.000	% 42,5	
Ülke Katkısı	Düşük Karbonlu Kalkınma Strateji ve Eylem Geliştirilmesi	2018-2019	2.635.000	1.845.000	790.000	255.852	% 32,4	Avrupa Birliği’ne Katılım Öncesi Mali Yardım Programı-1 (IPA-1) kapsamında yer alan teknik projelerden bir tanesi olan “Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” ile iklim değişikliği ile çözümsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmekle birlikte atık, bina, tarım ve ulaştırma sektörlerinde düşük karbonlu büyüme fırsatlarının değerlendirilerek, çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları ve yenilikçi yaklaşımların araştırılması amaçlanmıştır. Proje dört bileşenden oluşmuş olup projede Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (UİDEP) kapsamında yer alan atık, bina, tarım ve ulaştırma sektörlerine ilişkin eylemlerin, azaltım maliyetlerinin ve potansiyelinin belirlenmesi konuları üzerinde çalışılmıştır. Projenin kapanış toplantısı 27 Ağustos 2020 tarihinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir. Projenin final raporu ise inceleme ve onay sürecindedir.
AB katkısı			23.692.000	17.706.000	5.986.000	1.950.000	% 32,6	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülke Katkısı	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	1.362.000	953.000	409.000	200.000	% 48,9	<p>Şubat 2020’de Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin revize edilmesine ilişkin toplantılar gerçekleştirilmiştir.</p> <p>“Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” , proje kapsamında revize edilerek taslak yönetmelik hazırlanmış olup, söz konusu taslağın nihai halini alması için yürütülen çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>Nisan 2020’de “ F-Gaz Sektörlerinde F-Gazların Geri Kazanımı ve Geri Dönüşümüne İlişkin Mevcut Eğilimler Değerlendirme Çalışması” hazırlanmıştır.</p> <p>Nisan 2020’de “Soğutma, İklimlendirme ve Isı Pompaları Sektörüne Yönelik Atık Yönetimi Kılavuzu” hazırlanmıştır.</p> <p>Nisan 2020’de “Sızıntı Testi Programının Sonuçlarına İlişkin Rapor” hazırlanmıştır.</p> <p>Nisan 2020’de “SF6 Atık Yönetimi Kılavuzu” hazırlanmıştır.</p> <p>Mayıs 2020’de “Elektrik Şalt Sektörüne Yönelik Atık Yönetimi Kılavuzu” hazırlanmıştır.</p> <p>Mayıs 2020’de “Yangından Korunma Sektörü Atık Yönetimi Kılavuzu” hazırlanmıştır.</p> <p>Mayıs 2020’de Solventler ve Atık Yönetim Kuruluşları için Atık Yönetim Kılavuzu” hazırlanmıştır.</p> <p>Mayıs 2020 de Üçüncü Ara Rapor hazırlanmıştır.</p> <p>Mayıs 2020’ de F-Gaz Veri Tabanı (EKOMVET ve FARAVET) hazırlanmıştır.</p> <p>Mayıs 2020’de proje uygulama süresi 28.08.2020’ye (3 ay) uzatılmıştır.</p> <p>Temmuz 2020’de F-Gaz Veri Tabanının iyileştirilmesi ve teknik aksaklıkların giderilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.</p> <p>Eylül 2020’de F-Gaz Veri Tabanına ilişkin video rehber hazırlanmıştır.</p> <p>Eylül 2020’de Final Raporu onaylanmış ve proje tamamlanmıştır.</p>
AB katkısı			12.258.000	7.947.000	4.311.000	2.100.000	% 48,7	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	1.362.000	987.000	375.000	180.000	% 48,0	İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi kapanış konferansı 5 Şubat 2020 tarihinde yaklaşık 500 paydaşın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projenin final raporu 27.03.2020 onaylanmış ve proje tamamlanmıştır.
AB katkısı			12.258.000	8.172.000	4.086.000	2.000.000	% 48,9	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	2.384.000	2.315.000	69.000	69.000	% 100,0	Hibe programı kapsamında 37 adet hibe projesine destek sağlanmıştır. Toplam 37 projenin 36'sı tamamlanmış olup Ankara Büyükşehir Belediyesine ait hibe projesi yürütülmeye devam etmektedir.
AB katkısı			21.452.000	20.771.000	681.000	681.000	% 100,0	
11 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.201.376.000	110.987.000	63.437.000	4.008.276	% 6,3	
AB KATKISI			208.009.000	84.233.000	69.124.000	17.360.000	% 25,1	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-2117	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2023	179.309.000	97.000.000	22.753.000	8.549.600	% 37,6	
	Genel Bütçe Ödeneği		110.192.000	45.000.000	15.603.000	2.467.600	% 15,8	Merkez Laboratuvar Ölç.İzlm.Dai.Bşk.ile 7 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri tarafından 2019 yılında ihalesi yapıp 2020 yılına sarkan hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Merkezde 2020 Yılı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakım, Onarım ve Kalibrasyon HizmetAlım İşi" ihalesi Haziran ayında yapılmıştır. Ayrıca Bakım Onarım ve Sarf Malzeme İhalesi Eylül ayında yapılmış olup, henüz bir ödeme gerçekleşmemiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği		69.117.000	52.000.000	7.150.000	6.082.000	% 85,1	Ödenmeyen kısım ile ilgili olarak; arızaların giderilmesine müteakip kalan ödeme yapılacaktır.
2020K10-140875	Çevre Referans Laboratuvarı Altyapı Revizyonu (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2020-2021	7.700.000	0	3.560.000	0	% 0,0	25 Eylül 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup, değerlendirme süreci devam etmektedir.
2018K10-18384	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000.000	300.000	1.400.000	0	% 0,0	Covid-19 salgını nedeniyle Şartname gereğince yapılması gereken Çalıştay 20.08.2020 tarihinde tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 4 adet yurtiçi saha ziyareti gerçekleştirilmiş olup, bu işlemleri içeren 1. Ara Rapor Bakanlığımıza sunulmuştur. Bakanlığımızca yapılacak olan değerlendirme sonucu 1. Ara Raporun uygun bulunması durumunda 2. Hakediş düzenlenecektir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-24237	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyonu, Entegrasyonu ve Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.400.000	440.000	3.960.000	3.079.989	% 77,8	Projenin 2020 yılı çalışmaları devam etmekte olup, Protokolün 8.13-8.15 maddeleri tamamlanmış, Temmuz ayında 1.760.000 TL ödemesi yapılarak toplamda 3.079.989 TL ödenmiştir. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ve 8.12 maddelerinin tamamlanmasını müteakip projenin Aralık 2020'de tamamlanması ön görülmektedir.
2019K10-90490	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının	2019-2020	306.000	122.000	184.000	0	% 0,0	1.1. 20.08.2020 tarihinde video konferans yöntemi ile 26 kişinin katılımı ile SÇD.3.Çalışmayı yapmıştır. 1.2. 21.08.2020 tarihinde video konferans yöntemi ile 26 kişinin katılımı ile SÇD.4.Çalışmayı yapmıştır. 1.3. Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu sunulmuştur.
AB katkısı	Desteklenmesi (AB) (Çevre Sektörü)		1.736.000	694.000	1.042.000	0	% 0,0	1.4 14-15.10.2020 tarihinde video konferans yöntemi SÇD Meksansal Planlama Eğitimi gerçekleştirilecektir. 2020 yılı mevcut ödeneği yeterli olmadığından kur artışı ve dövizdeki dalgalanmalar dikkate alınarak ödenek aktarılması talep edilmiş olup aktarma işlemi yapıldığında ulusal katkı payı ödemesi gerçekleştirilecektir.
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	117.898.000	45.862.000	21.147.000	5.547.589	% 26,2	
		DÖNER SERMAYE	76.817.000	52.000.000	10.710.000	6.082.000	% 56,8	
		GENEL TOPLAM	194.715.000	97.862.000	31.857.000	11.629.589	% 36,5	
		AB KATKISI	1.736.000	694.000	1.042.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018E06-87362	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2023	750.000.000	107.800.000	7.800.000	0	% 0,0	Projesi onaylanıp ödeneği aktarılıp ihalesi yapıldıktan sonra yapım ile ilgili iş ve işlemler Başkanlığımız tarafından yapılabilecektir.
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (Enerji Sektörü)	2019-2025	1.222.000.000	0	13.261.000	0	% 0,0	
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		1.198.767.000		7.151.000	0	% 0,0	Kredi hesabından henüz ödeme gerçekleşmemiştir.
	Hibe Ödeneği		23.218.000		6.110.000	0	% 0,0	Danışman hakediş ödemeleri, video konferans ses sistemi alım bedeli ve bilgisayar alım bedeli
2019K14-146683	Afet ve Acil Durumlara Müdahale ve Hasar Tespit Merkezi Hizmet Araçlarının Temini (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2019-2020	11.400.000	10.400.000	1.000.000	1.000.000	% 100,0	İş tamamlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K14-152212	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2020-2021	10.826.000		4.863.000	2.420.594	% 49,8	55 tane ilimize Kamu Yapıları Envanter Sistemi (KAYES) kapsamında gerekli çalışmaların tamamlanması ve koordinasyonun sağlanması için söz konusu Valiliklere talimat yazısı iletilmiştir. Şuana kadar 35 tane ilimize KAYES çalışmalarında kullanılmak üzere tablet bilgisayarlar gönderilmiş olup, Envanter çalışmalarında yer alacak personele Bakanlığımız tarafından eğitim verilerek, kamu yapıları envanteri çıkarılması işine başlanılmış bulunmaktadır. Ayrıca; KAYES Sisteminde kullanılmak üzere 250 adet tablet bilgisayar alımı da gerçekleştirilmiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K01-140389	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-CBS-Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)					162.040		
	Proje Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi, CBS ile Uyumlaştırılması ve Yaygınlaştırılması	2020-2020	1.000.000		1.000.000	75.508	% 7,6	
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2020-2020	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Yeni Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılım uygulaması değişen mevzuat kapsamında dağıtım modülünü de içerecek şekilde revize edilerek 2019 yılı itibariyle 81 ilde devreye alınmış, 2020 yılı itibari ile de uygulanmakta olup, yazılıma ilişkin iyileştirme ve geliştirme süreçleri devam etmektedir.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2020-2020	400.000		400.000	86.532	% 21,6	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K07-147022	Bulanık Alparslan 1 Barajı İskânı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2020	4.557.000	4.500.000	57.000	0	% 0,0	İş tamamlanmıştır.
2011K07-140439	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	5.000.000	3.500.000	500.000	210.957	% 42,2	
2016K07-2796	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	146.963.043	75.869.565	35.000.000	10.000.000	% 28,6	2020 Yılı ödeneğinin tamamı gönderilmiş olup işin tamamlanması için toplam 61 milyon 091 bin TL ek ödenek talep edilmiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K07-149551	Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimlerin Düzenlenmesi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2017-2021	140.090.000	101.400.000	26.400.000	21.623.086	% 81,9	
	Karaman Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2021	26.100.000	15.000.000	6.400.000	6.356.654	% 99,3	İşin geçici kabulü yapılmıştır.
	Erzincan Kayı Köyü İskanı	2018-2020	43.990.000	30.000.000	13.990.000	9.487.659	% 67,8	İş devam etmektedir.
	Erzincan Kalecik ve Ulu Köyü İskanı	2018-2021	70.000.000	56.400.000	6.010.000	5.778.773	% 96,2	İş tamamlanmıştır.
2018K07-149555	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	18.000.000	13.000.000	2.000.000	485.199	% 24,3	
	İlisu Barajından Etkilenen Siirt İli Köyleri İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2020	5.000.000	4.000.000	1.000.000	485.199	% 48,5	485.000 TL ödenek gönderilmiş olup iş devam etmektedir.
	İlisu Barajından Etkilenen Batman İli Köyleri İskan Konutları Altyapı İşleri	2019-2021	13.000.000	9.000.000	1.000.000	0	% 0,0	İş devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-18498	Bozkır Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	190.750.351	59.213.000	43.925.000	12.706.000	% 28,9	Yılı ödeneğinin tamamı harcanmış olup, 156 milyon 500 bin TL ek ödenek talep edilmiştir.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	37.619.000	0	2.000	0	% 0,0	
2018K07-24212	İlisu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	30.000.000	0	2.000	0	% 0,0	
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	108.000.000	0	2.000	0	% 0,0	
2020K07-149535	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2020	300.000		300.000	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2020K07-149540	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2020	300.000		300.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyulduka harcama yapılacaktır.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2021	6.300.000		3.700.000	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlanmıştır. Projeyle ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanununa 25.05.2018 tarihinde geçici madde eklenmiş olup yıkıp yeniden yapılacak 250 adet konut belirlenmiştir. Kanun gereği 250 aileye başvuru için 6 ay süre verilmiş olup müracaatlar alınmıştır. başvuruda bulunan 16 ailede talebinden vazgeçtiği için ödenek harcanamayacaktır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE N SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797 (**)	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2023	268.800.000	30.104.000	15.919.000	3.917.108	% 24,6	Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak illerinden 92 adet köyde yaklaşık 2.140 ailenin konut yapımı işidir. Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, İzmir, Muş, Erzurum, Erzincan, Kars, Sivas ve Uşak illerine toplam da 9.106.130 TL ödenek gönderilmiş olup, bu ödeneğin 3.924.757 TL si harcanmıştır. 30.000.000 TL ek ödenek talebimiz uygun bulunmamıştır. İşler devam etmektedir.
	Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	15.219.000	660.000	1.000	0	% 0,0	
	Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	8.000.000	473.000	1.000	0	% 0,0	
	Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	21.200.000	4.200.000	8.116.000	3.401.760	% 41,9	
	Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	1.700.000	0	408.000	116.200	% 28,5	
	Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	3.500.000	725.000	5.000	0	% 0,0	
	Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	20.000.000	0	2.150.000	0	% 0,0	
	Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	11.900.000	460.000	40.000	18.648	% 46,6	
	Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	6.000.000	520.000	583.000	199.200	% 34,2	
	Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	7.000.000	420.000	1.000	0	% 0,0	
	Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	4.000.000	1.191.000	17.000	7.000	% 41,2	
	Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	71.685.000	12.848.000	1.951.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Iğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	10.000.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	5.000.000	555.000	1.000	0	% 0,0	
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	2.500.000	625.000	42.000	0	% 0,0	
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	7.000.000	373.000	1.000	0	% 0,0	
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	5.000.000	360.000	1.000	0	% 0,0	
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	20.000.000	3.921.000	1.947.000	174.300	% 9,0	
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	3.000.000	700.000	13.000	0	% 0,0	
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	1.500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	11.060.000	315.000	1.000	0	% 0,0	
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	13.000.000	35.000	606.000	0	% 0,0	
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	6.500.000	473.000	1.000	0	% 0,0	
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	2.500.000	72.000	13.000	0	% 0,0	
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	2.000.000	620.000	1.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	<i>Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2023	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2023	2.000.000	558.000	6.000	0	% 0,0	
	<i>Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2023	7.000.000		1.000	0	% 0,0	
2020K07-149545 (**)	<i>Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)</i>	2020-2020	50.000		50.000	0	% 0,0	
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2022			8.974.000	280.000	% 3,1	

19 Proje

06 ve 07 TOPLAM	2.639.046.394	365.282.565	129.539.000	45.187.282	% 34,9
08 TOPLAM	268.850.000	30.104.000	15.969.000	3.917.108	% 24,5
DÖNER SERMAYE	22.226.000	10.400.000	5.863.000	3.420.594	% 58,3
GENEL TOPLAM	2.953.355.394	405.786.565	151.371.000	52.524.984	% 34,7
Kamu laştırma	0	0	8.974.000	280.000	% 3,1

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K01-2755	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2021	6.500.000	3.750.000	1.000	0	% 0,0	"İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi" projesinde 07/03/2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden "Kamu İhale Kanunu'nun 3(f) Maddesi Kapsamında Araştırma Geliştirme Protokolü" imzalanmış olup, söz konusu protokol kapsamında tamamlanmamış bileşenler ve eksiklikler, daha evvel bitirilen iş kalemleri kapsamında değerlendirilmekte olup, gelinen tarih itibarıyla %58 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmış olup, anılan proje kapsamında yürütülen çalışmaların durdurulmasına dair 17.08.2018 tarihli ve E.140882 sayılı yazımıza istinaden anılan projeye devam edilememiştir.
2018K09-18107	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	2.200.000	1.000.000	1.200.000	0	% 0,0	10.10.2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Genelge kapsamında uygulanan tasarruf tedbirleri uyarınca Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 27/07/2018 tarihli ve 131721 sayılı yazısına binaen söz konusu "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi" projesi ertelenmiştir. 2019 yılında ise bu proje kapsamında elde edilmesi öngörülen "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına İlişkin İlke ve Esaslar" Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış ve 19.02.2019 tarihli 41958 sayılı yazımız ile 81 İl Valiliği'ne (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) dağıtımı yapılarak uygulamaya konulmuştur. Dolayısı ile yatırım programında tanımlanarak ödenek ayrılan projenin, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanması durumu nedeniyle söz konusu "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi"ne yönelik 2019 yılı ve 2020 yılı ilk dokuz aylık periyodu için ayrılan ödenek kullanılmamıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	8.700.000	4.750.000	1.201.000	0	% 0,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D00-17215	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2023	2.750.000	150.000	678.000	181.597	% 26,8	**25/06/2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan 365 gün süreli 219.000 TL bedelli Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) Uygulaması 2. Versiyon Bakım, Destek ve İyileştirme İşi Hizmet Alımının kabulü ve son ödemesinin yapılması 2020 yılı Temmuz ayı içinde tamamlanmıştır. İlk ödeme işlemi 2019 yılı Aralık ayı içinde yapılmıştır. **27/07/2020 tarihinde ihalesi yapılan Binalarda Enerji Verimliliği Uygulaması (BEP-TR) 2. Versiyon Bakım Destek ve İyileştirme Hizmet Alımı işinin sözleşmesi 05/10/2020 tarihinde imzalanmıştır. 204.400 TL bedelli işin süresi 365 gün olup, yükleniciye yapılacak ödemeler işin altıncı ayında ve sonunda olmak üzere iki sefer halinde gerçekleştirilecektir. **240 gün süreli 263.040 TL bedelli Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YES-TR) Yazılımı İşinin sözleşmesi 05/11/2019 tarihinde imzalanmıştır. 2020 yılı temmuz ayı içinde işin tasarım raporunun onaylanması ve ihale bedelinin %15'inin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. İşin kabulünün ve geri kalan %85'lik bedelin ödenmesi işlemlerinin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2019G00-90517	Konut Araştırması (Konut Sektörü)	2019-2020	900.000	300.000	600.000	194.700	% 32,5	İTÜ Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi ile imzalanmış olan sözleşmeye göre 3 aşama halinde hazırlanacak olan raporun 3. aşaması Bakanlığımıza teslim edilmiş olup inceleme aşamasındadır.
2020K01-146670	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2020-2020	500.000		500.000	49.528	% 9,9	Yapı Malzemeleri ile ilgili Piyasa Gözlem ve Denetim Faaliyeti Kapsamında TSE'ye Test ve Deney Ücreti ödemesi yapılmıştır.
2020K01-140389	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-CBS-Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncellemesi	2020-2020	120.000		120.000	18.806	% 15,7	
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	4.270.000	450.000	1.898.000	444.631	% 23,4	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K01-140389	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-CBS-Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Milli Emlak Otomasyon Projesi İdamesi	2020-2020	1.280.000		1.280.000	728.824	% 56,9	Milli Emlak Otomasyon Projesi kapsamında yazılım güncelleme ve bakım hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. İmar barışı kapsamında mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satışının MEOP üzerinden yapılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile gerekli yazılım entegrasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. MEOP-Belgenet entegrasyonu konusunda analiz çalışması yapılmıştır. MEOP-Trampa modülünün analiz çalışması yapılmıştır. MEOP CBS –WEB Uygulamasının mobil versiyonu için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
2020K01-146671	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2020-2022	8.500.000		3.500.000	70.800	% 2,0	Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde bulunan sunuculardaki verilerin Bakanlığımız Veri Merkezine taşınması gerçekleştirilmiştir. Milli Emlak Bilgi Sistemi Yazılım Geliştirme Hizmeti İhalesi 29.05.2020 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
2015K09-2462	Kent Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması (Şehirleşme Sektörü)	2015-2020	1.750.000	1.000.000	750.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 23.09.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
2018K09-17885	İmar Planları İzleme ve Denetim Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında E-plan Otomasyon Sistemi Mobil Uygulama Geliştirilmesi kapsamında hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-35701	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2021	24.170.000	11.500.000	5.000.000	0	% 0,0	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2021	11.500.000	7.500.000	1.500.000	0	% 0,0	"Atlas Ve Geoportal Uygulamalarının Bakım Hizmeti" için sözleşme imzalanmıştır. "Raster Verilerinin Damgalanması, Arşivlenmesi ve Web Tabanlı Siparişlenmesi", Coğrafi Veri Teması Oluşturma ve Yaygınlaştırma", "Enterprise Architect Lisans Temini" işleri için teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları yürütülmektedir.
	TUCBS Entegrasyonu Projesi	2018-2021	11.670.000	4.000.000	3.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 07.09.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	TUCBS Stratejisi ve Eylem Planı İzleme- Raporlama	2020-2021	1.000.000		500.000	0	% 0,0	Eylem planına yönelik dönemsel performans değerlendirmesi çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında teknik şartname hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup ihale süreci devam etmektedir.
2020K09-150397	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2020-2021	5.000.000		3.000.000	0	% 0,0	
	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı	2020-2020	500.000		500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında hizmet alımı ihale süreci tamamlanmış olup sözleşme 02.09.2020 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik	2020-2021	2.500.000		1.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Kapasite Geliştirme ve Rehberlik hizmet alımı sözleşmesi 02.09.2020 tarihinde imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme	2020-2021	2.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında teknik şartname hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup ihale süreci tamamlanmış olup sözleşme imzalanma aşamasındadır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-141024	Bilişim ve Donanım Altyapısı Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2020-2022	45.600.000		23.930.000	2.445.969	% 10,2	
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini (**.Döner Sermaye)	2020- 2021	7.000.000		4.000.000	241.555	% 6,0	"Veri Merkezinde Bulunan Klimaların Bakım ve Onarımı" gerçekleştirilmiştir. " Bingöl Deprem Felaketi için Olusturulan Kriz Merkezinin İhtiyaçları için Yazıcı" 07.07.2020 tarihinde temin edilmiştir. "Çok Fonksiyonlu Yazıcı ve Tarayıcılar"ın ihale süreci tamamlanmıştır.
	Altyapı Bileşenleri Bakım,Onarım ve Lisans Temini (**.Döner Sermaye)	2020-2021	12.000.000		8.000.000	137.948	% 1,7	Cihazı (SVC) Lisans Yenileme ve Bakım Hizmetleri" için 28.09.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. "Çevrimiçi Faaliyet ve Sunum Sistemi", "SSL Sertifika Alımı", "Merkezi Zafiyet Yönetim Sistemi (NESSUS) Lisans Temini" işleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Hazır Yazılım Temini, Uygulama Yazılımı Lisans Alımı ve Bakımı (**.Döner Sermaye)	2020-2022	17.100.000		5.800.000	360.560	% 6,2	"Belgenet Bakım ve Güncelleme", "Elektronik Sertifika ve Mini Kart Okuyucu", "Zaman Damgası", "Elektronik-Mobil İmzalama/Doğrulama Yazılımı", "Ca apigateway Web Servis Altyapısı Bakım İşi "Oska Hakediş Yazılımı", "AMP Hakediş Yazılımı", "Bakanlık Web Sayfaları" ile Milli Emlak İlan ve Kurum Tahsis Web Siteleri Bakım", "Karar Destek Sistemi Offline Raporlama Yazılımı" işleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Bakanlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümü (**.Döner Sermaye)	2020-2021	9.500.000		6.130.000	1.705.906	% 27,8	"Bakanlığımıza Ait Hizmetlerin E-Devlet Kapısına Entegrasyonu, HİSS ve EKİP Uygulamalarının Bakım ve Onarım Hizmeti" sözleşmesi imzalanmıştır. 1. ve 2. hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K10-154729	Kesin Hesap Farkı (INSPIRE Kapasite Artırımı Projesi) (Çevre Sektörü)	2020-2020	1.560.000		1.560.000	0	% 0,0	Hazine ve Maliye Bakanlığı projeye ait ödeneği serbet bırakılmadığı için ödeme gerçekleştirilememiştir.
8 Proje		06 ve 07 TOPLAM	36.760.000	14.000.000	13.090.000	728.824	% 5,6	
		DÖNER SERMAYE	54.100.000	0	27.430.000	2.516.769	% 9,2	
		GENEL TOPLAM	90.860.000	14.000.000	40.520.000	3.245.593	% 8,0	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2023	21.452.000	3.301.000	2.969.000	1.344.840	% 45,3	
<i>AB katkısı</i>			121.559.000	18.708.000	36.204.000	6.443.115	% 17,8	
2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	2.653.981.000	32.532.000	693.415.000	135.428.166	% 19,5	
	AB Hibesi		2.077.453.000	26.528.000	545.870.000	115.591.802	% 21,2	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		237.916.000	2.525.000	61.223.000	8.393.485	% 13,7	
	Mahalli İdare Katkısı		338.612.000	3.479.000	86.322.000	11.442.879	% 13,3	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	21.452.000	3.301.000	2.969.000	1.344.840	% 45,3	
	<i>AB KATKISI</i>		121.559.000	18.708.000	36.204.000	6.443.115	% 17,8	
	<i>İçmesuyu Projesi</i>		2.653.981.000	32.532.000	693.415.000	135.428.166	% 19,5	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	Çarşamba Atıksu Tesisi	2019-2023	113.690.000	0	40.328.000	7.820.111	% 19,4	
	AB Hibesi		87.612.000	0	31.077.000	6.647.095		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		10.435.000	0	3.702.000	469.207		
	Mahalli İdare Katkısı		15.643.000	0	5.549.000	703.810		
Alt proje-2	Bandırma Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	197.650.000	0	71.168.000	10.765.234	% 15,1	
	AB Hibesi		166.030.000	0	59.781.000	9.150.449		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		12.647.000	0	4.555.000	645.914		
	Mahalli İdare Katkısı		18.973.000	0	6.832.000	968.871		
Alt proje-3	Bismil Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	91.660.000	0	32.337.000	9.752.349	% 30,2	
	AB Hibesi		77.912.000	0	27.486.000	8.289.496		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		6.187.000	0	2.183.000	658.284		
	Mahalli İdare Katkısı		7.561.000	0	2.668.000	804.569		
Alt proje-4	Bozüyük Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	190.954.000	0	26.389.000	0	% 0,0	
	AB Hibesi		125.136.000	0	17.293.000	0		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		26.330.000	0	3.639.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		39.488.000	0	5.457.000	0		
Alt proje-5	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	200.334.000	0	27.686.000	0	% 0,0	
	AB Hibesi		170.288.000	0	23.533.000	0		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		12.018.000	0	1.661.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		18.028.000	0	2.492.000	0		
Alt proje-6	Elbistan Atıksu Tesisi	2019-2024	166.967.000	2.001.000	60.056.000	18.365.532	% 30,6	
	AB Hibesi		134.350.000	1.610.000	48.323.000	15.720.788		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		14.680.000	176.000	5.281.000	1.190.135		
	Mahalli İdare Katkısı		17.937.000	215.000	6.452.000	1.454.609		
Alt proje-7	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2025	180.036.000	0	29.098.000	0	% 0,0	
	AB Hibesi		141.439.000	0	22.859.000	0		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		15.446.000	0	2.497.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		23.151.000	0	3.742.000	0		
Alt proje-8	İğdır Atıksu Tesisi	2019-2024	189.243.000	0	73.609.000	20.071.199	% 27,3	
	AB Hibesi		160.858.000	0	62.567.000	17.060.519		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		12.773.000	0	4.969.000	1.354.806		
	Mahalli İdare Katkısı		15.612.000	0	6.073.000	1.655.874		
Alt proje-9	Kastamonu Atıksu Tesisi	2019-2024	109.980.000	17.034.000	33.780.000	15.348.543	% 45,4	
	AB Hibesi		93.486.000	14.479.000	28.713.000	13.046.261		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		6.597.000	1.022.000	2.027.000	920.913		
	Mahalli İdare Katkısı		9.897.000	1.533.000	3.040.000	1.381.369		

Alt proje-10	Niksar Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	197.753.000	0	75.737.000	15.917.633	% 21,0
	AB Hibesi		164.277.000	0	62.915.000	13.529.988	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		13.386.000	0	5.127.000	955.058	
	Mahalli İdare Katkısı		20.090.000	0	7.695.000	1.432.587	
Alt proje-11	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	203.707.000	0	39.424.000	0	% 0,0
	AB Hibesi		173.095.000	0	33.450.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		12.254.000	0	2.400.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		18.358.000	0	3.574.000	0	
Alt proje-12	Sivas Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	173.537.000	0	46.024.000	0	% 0,0
	AB Hibesi		106.050.000	0	28.126.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		27.001.000	0	7.161.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		40.486.000	0	10.737.000	0	
Alt proje-13	Sorgun Atıksu Tesisi	2019-2023	64.384.000	0	12.010.000	0	% 0,0
	AB Hibesi		54.728.000	0	10.208.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		3.862.000	0	721.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		5.794.000	0	1.081.000	0	
Alt proje-14	Şırnak Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	69.414.000	11.047.000	17.854.000	6.095.943	% 34,1
	AB Hibesi		56.317.000	8.962.000	14.485.000	5.549.326	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.893.000	938.000	1.516.000	245.978	
	Mahalli İdare Katkısı		7.204.000	1.147.000	1.853.000	300.639	
Alt proje-15	Trabzon Su Tesisi	2019-2025	203.709.000	2.450.000	50.470.000	21.198.990	% 42,0
	AB Hibesi		122.779.000	1.477.000	30.419.000	18.019.142	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		32.367.000	389.000	8.019.000	1.271.939	
	Mahalli İdare Katkısı		48.563.000	584.000	12.032.000	1.907.909	
Alt proje-16	Yüksekova Atıksu Tesisi	2019-2023	82.868.000	0	27.306.000	10.092.632	% 37,0
	AB Hibesi		57.707.000	0	19.015.000	8.578.738	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		11.322.000	0	3.731.000	681.253	
	Mahalli İdare Katkısı		13.839.000	0	4.560.000	832.642	
Alt proje-17	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2025	82.244.000	0	11.366.000	0	% 0,0
	AB Hibesi		69.912.000		9.662.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.550.000		767.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		6.782.000		937.000	0	
Alt proje-18	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2025	135.851.000	0	18.773.000	0	% 0,0
	AB Hibesi		115.477.000	0	15.958.000	0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		9.168.000	0	1.267.000	0	
	Mahalli İdare Katkısı		11.206.000	0	1.548.000	0	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020F00-149728	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2020-2020	319.000		319.000	105.964	% 33,2	
	Ihlara Beldesi Meydanı Koruma ve Tasarım Projesi Temini	2020-2020	107.000		107.000	105.964	% 99,0	Proje tamamlanmış olup, ödemesi yapılmıştır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Bisiklet Yolları Uygulama Projesi Temini	2020-2020	106.000		106.000	0	% 0,0	Proje tamamlanmış olup, kabul aşamasındadır.
	Uzungöl Çevre Düzenleme Projesi Temini	2020-2020	106.000		106.000	0	% 0,0	Proje tamamlanmış olup, kabul aşamasındadır.
2018F00-67925	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulamaları (Turizm Sektörü)	2018-2021	9.900.000	4.300.000	3.463.000	0	% 0,0	Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği ile Genel Müdürlüğümüz arasında Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulamaları projesi kapsamında mali katkı protokolü imzalanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020F00-147595	Köyceğiz Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2020	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Köyceğiz (Muğla) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
2020F00-147596	Selime Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2020	2.100.000		2.100.000	0	% 0,0	Selime (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
2020F00-147597	Ihlara Yol ve Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2020	2.500.000		2.500.000	0	% 0,0	Ihlara (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü çalışmaları devam etmektedir.
2020F00-147598	Fethiye Çalış Sahil Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2020	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Fethiye Çalış Sahil Düzenleme Projesi ile ilgili projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
2020F00-147599	Kınık Mahallesi Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2020	3.000.000		3.000.000	3.000.000	% 100,0	Kaş (Antalya) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup imalat çalışmaları tamamlanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020F00-147600	Uzungöl Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2020	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülecektir.
2020F00-147602	Korunan Alanlarda Bisiklet Yolu Yapımı Pilot Çalışması (Turizm Sektörü)	2020-2020	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Korunan Alanlarda Bisiklet Yolu proje çalışmaları devam etmektedir.
2020F00-155262	Tarihi Obruk Han Çevre Düzenleme (*Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2020-2021	7.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam ediyor. Protokol aşamasında.
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2022	25.012.000	6.935.000	5.647.000	530.742	% 9,4	
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2022	6.800.000	3.800.000	2.000.000	0	% 0,0	Doğal Sit Alanlarında İçmesuyu Temini kapsamında yatırım yapılacak bölgelere ait yerel yönetimlerle görüşmeler devam etmektedir.
	ÖÇK Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2022	15.077.000		3.647.000	530.742	% 14,6	*Aksaray İli Merkez İlçesi Hırkatol ve İsmailağatolu Köyleri 300 m ³ Hacimli Ayaklı Su Deposu ile Sarayhan Köyü 100 m ³ Hacimli Gömme Su Deposu Yapım İşi için 2.000.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmıştır. *Salda (Burdur) Gölü Beyaz Adalar Plajı İsale Hattı Yapım İşi için 435.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K10-1460	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2020	3.316.000	2.316.000	1.000.000	248.543	% 24,9	
	Göksu Deltası ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2020	994.000	899.000	95.000	28.143	% 29,6	Proje kapsamında 1. ön rapor sunulmuş ödemesi gerçekleştirilmiş 2. ara rapor sunulmuş kabul işlemi sürecindedir.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2020	641.000	546.000	95.000	28.249	% 29,7	Proje kapsamında 1. ön rapor sunulmuş ödemesi gerçekleştirilmiş 2. ara rapor sunulmuş kabul işlemi sürecindedir.
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2020	697.000	547.000	150.000	42.480	% 28,3	Proje kapsamında 1. ön rapor sunulmuş ödemesi gerçekleştirilmiş 2. ara rapor sunulmuş kabul işlemi sürecindedir.
	Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme	2016-2020	427.000	177.000	250.000	93.456	% 37,4	Proje kapsamında 1. ön rapor sunulmuş ödemesi gerçekleştirilmiş 2. ara rapor sunulmuş kabul işlemi sürecindedir.
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2016-2020	172.000	147.000	25.000	0	% 0,0	Doğrudan Temin Usulü ile gerçekleştirilecek olup iş başlatılmıştır.
	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2020-2020	95.000		95.000	27.966	% 29,4	Proje kapsamında 1. ön rapor sunulmuş ödemesi gerçekleştirilmiş 2. ara rapor sunulmuş kabul işlemi sürecindedir.
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2020-2020	95.000		95.000	28.249	% 29,7	Proje kapsamında 1. ön rapor sunulmuş ödemesi gerçekleştirilmiş 2. ara rapor sunulmuş kabul işlemi sürecindedir.
	Göksu Deltası, Belek ve Patara ÖÇKB Kum Zambağı Koruma ve İzleme	2020-2020	195.000		195.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 1. ön rapor sunulmuş ödenme işlemleri hazırlanmıştır..

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-2121	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi (Çevre Sektörü)	2014-2022	141.238.000	71.237.000	20.001.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile "2.Etap İşbirliği Protokolü" 15.09.2020 tarihinde imzalanmıştır. Protokol kapsamında 19.000.000 TL ödenek Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na 14.10.2020 de aktarılmıştır.
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2021	500.000	65.000	400.000	48.498	% 12,1	Projenin %20 lik ilk ödeme dilimi 2019 yılı Aralık ayında gerçekleşmiş olup, 01.01.2020-30.09.2020 tarihleri arasında 2.hakediş (2.Ara Rapor) için % 15 lik ödeme yapılarak toplamda % 35 lik ödeme gerçekleşmiştir. Proje devam etmektedir.
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2021	2.524.000	825.000	749.000	0	% 0,0	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2021	2.075.000	825.000	600.000	0	% 0,0	İhale çalışmalarına başlandı. Çalışmalar devam ediyor.
	Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2020-2021	449.000		149.000	0	% 0,0	İhale çalışmalarına başlandı. Çalışmalar devam ediyor.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K10-141583	Anıt Ağaçların Mevcut Durumlarının Tespit Edilmesi (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2020-2020	300.000		300.000	0	% 0,0	İzmir ve Manisa illerinde bulunan anıt ağaç ve tescilli ağaç topluluklarının mevcut durumlarının tespit edilmesi ihaleleri yapıldı, sözleşmeleri imzalanarak çalışmalar başladı.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2022	1.500.000		300.000	0	% 0,0	
	Karaburun-İldır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2022	950.000		200.000	0	% 0,0	14.09.2020 tarihinde yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanmış olup, 18.09.2020 tarihinde işe başlanılmıştır. Herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
	Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2022	550.000		100.000	0	% 0,0	Ödenek revizyonu 29.09.2020 tarihinde yapılmış olup; revize ödenek sonucu, İhale dokümanı hazır olup, 2020 Ekim ayı içerisinde ihlaesine çıkılacaktır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Çevre Sektörü)	2017-2021	12.400.000	3.590.000	4.000.000	123.664	% 3,1	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2021	3.300.000	990.000	1.000.000	123.664	% 12,4	**Muğla İli, Marmaris İlçesi, Okluk Koyunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Alımı işi kapsamında söz konusu iş 25.000 TL+KDV bedelle ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. **Muğla İli, Ula İlçesi, Gökova, Akçapınar ve Gökçe Mahallelerinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır harita alımı işi kapsamında ihale çalışmaları devam ediyor.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2021	6.700.000	2.000.000	2.200.000	0	% 0,0	1-Kaş- Kekova ÖÇKB 1/25.000 ölçekli nazım imar planı kurum görüşleri tamamlanıyor. 2-Fethiye Göcek ÖÇKB Günlükbaşı İmar Planı Revizyonu İhale ye çıkılacak. 3-Salda Gölü ÖÇKB Alt ölçekli imar planları kurum görüşlerine çıktı. 4-Salda Gölü ÖÇKB Alt ölçekli imar planlarına esas jeolojik- jeoteknik etüt işine başlandı. 5-Cihanbeyli Merkez 1/5000 - 1/1000 İmar Planı Revizyonu kurum görüşleri aşamasında. 6-Safranbolu imar planına esas jeolojik etüt Mekânsal Planlama Müdürlüğüne teslim edildi onayı bekleniyor. 7-Safranbolu imar planı sözleşme imzalandı. Kurum görüşleri tamamlandı Jeolojik etüdün onayı bekleniyor. 8-Tuz Gölü Aksaray- Şereflikoçhisar kesimi 1/25.000 NİP Eksik kurum görüşleri tamamlanıyor plan inceleniyor onaya hazırlanacak. 9-İhlara ÖÇKB 1/25.000ÇDP revizyon imar planı kurum görüşleri toplanıyor. 10-Belek 1/25000 ÇDP Revizyonu kurum görüşlerine çıkılacak. 11-Tuz Gölü Aksaray- Şereflikoçhisar kesimi 1/25000 jeolojik etüt iş tamamlandı ödemesi yapıldı 12-Bodrum Kızılağaç 1/5000 ve 1/1000 İmar Planı Revizyonu İhale ye çıkılacak. 13-Bodrum Kızılağaç 1/5000 ve 1/1000 İmar Planı Revizyonuna Esas Jeolojik etüt İhale işlemleri sürdürülüyor. 14-Karaburun ÖÇKB 1/25.000 ölçekli nazım imar planı kurum görüşlerine çıktı. İhale edilecek. 15-Karaman Yenidünya Göz Mağarası imar planına esas jeolojik etüt ihale işlemleri sürdürülüyor. 16-Izmir Çeşme Aya Yorgi Koyu KAİP Değişikliği ve jeolojik Etüt İhale ye çıkılacak. 17-Köyceğiz Dalyan ÖÇKB Merkez 1/5000 - 1/1000 imar planı revizyonu protokol kapsamında iş için bütçe aktarımı yapıldı ödemesi yapılacaktır. 18Çamlıhemşin jeolojik etüt işine ilişkin ek protokol imzalandı. 19-Sultanhanı 1/5000 - 1/1000 revizyon imar planına yönelik ek protokol için oturuldu. Planlama çalışmaları devam ediyor. 20-Datça Bozburun ÖÇKB Cumalı ve Karaköy İhale ye çıkılacak.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması	2019-2021	2.400.000	600.000	800.000	0	% 0,0	<p>**Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi C.67 düzenleme sahasında imar uygulaması işi kapsamında Belediyesi ile protokol imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>**Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi C.68 düzenleme sahasında imar uygulaması işi kapsamında Belediyesi ile protokol imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>**Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi, Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Taşkiran Mahallesi imar uygulaması işi kapsamında Belediyesi ile protokol imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>**Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi, Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Gölbaşı, İnceli, Merkez, Büyükköy Mahalleleri imar uygulaması işi kapsamında Belediyesi ile protokol imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>**Tuzgözü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray İli, Güzeyurt İlçesi, Selime Kasabası, Köprübaşı ve Yenimahalle Mahallesi imar uygulaması işi kapsamında Belediyesi ile protokol imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.</p>
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2020-2022			3.996.000	0	% 0,0	
18 Proje		06 ve 07 TOPLAM	210.309.000	89.268.000	49.479.000	4.057.411	% 8,2	
	DÖNER SERMAYE		7.300.000	0	3.300.000	0	% 0,0	
	GENEL TOPLAM		217.609.000	89.268.000	52.779.000	4.057.411	% 7,7	
	Kamu laştırma		0	0	3.996.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2022	7.996.000	5.100.000	754.000	0	% 0,0	
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2022	5.710.000	1.500.000	1.570.000	0	% 0,0	
2020K07-142174	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 181) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2020	1.496.700.000		1.496.700.000	506.021.112	% 33,8	Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KÖYDES ödeneğinin yarısı olan 748.350.000 TL ödenek 23.07.2020 tarihinde gönderilmiş olup kalan 748.350.000 TL nin aktarımı gerçekleştirilmemiştir. 1. dilim ödeneğinin geç gelmesi ve 2. dilim ödeneğinde hala aktarılmadığından harcama bilgisi 1. dilim ödenek üzerinden yazılmıştır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.510.406.000	6.600.000	2.324.000	0	% 0,0	

Dipnot: 181

12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K01-140379	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2020-2020	3.000.000		3.000.000		% 0,0	
	Harita Alımları	2020-2020	100.000		100.000		% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2020-2020	100.000		100.000		% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2020-2020	2.800.000		2.800.000		% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2020-2022			12.950.000	7.970.125	% 61,5	2.950.000,00.-₺ toplam ödenğin tamamı serbest bırakılmış, 10.000.000,00.-₺ ödenek eklenmiş ve 7.970.125,00.-₺ ödeme yapılmış olup, 4.979.875,00.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2020-2020			16.000.000	11.909.124	% 74,4	16.000.000,00.-₺ ödenek aktarılmış ve 11.909.124,00.-₺ ödeme yapılmış olup, 4.090.876,00.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.000.000	0	3.000.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	28.950.000	19.879.249	% 68,7	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2023	42.973.300	2.624.300	1.208.000	0	% 0,0	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2017-2023	41.769.300	2.624.300	4.000	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*Genel Bütçe Ödeneği)	2020-2020	4.000		4.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*Döner Sermaye)	2020-2020	930.000		930.000	0	% 0,0	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-136937	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2020-2020	3.150.000		3.150.000	1.811.008	% 57,5	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2020-2020	3.100.000		3.100.000	1.546.556	% 49,9	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2020-2020	720.000		720.000	0	% 0,0	3 adet "T05-Minibüs" tipi taşıtın edinilmesine ilişkin 12.05.2020 tarihli ve 2522 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı alınmıştır. DMO üzerinden alınacak taşıtların ihale süreci devam etmektedir. Taşıtlar; Denizli, Mersin ve Samsun İl Müdürlüklerine tahsis edilecektir.
2020G00-140486	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2020-2020	5.992.167		5.992.167	4.411.799	% 73,6	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır. 4.192.167,22 TL Diğer kurumlar ile ortak olarak kullanılan Çukurca Lojmanları onarım işi.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	12.246.167	0	12.246.167	7.769.363	% 63,4	
		DÖNER SERMAYE	43.419.300	2.624.300	1.654.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	55.665.467	2.624.300	13.900.167	7.769.363	% 55,9	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2020 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2020 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2020 30.09.2020 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020G00-140486	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2020-2020	100.000		100.000	0	% 0,0	
2020K09-136937	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2020-2020	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2020-2020	100.000		100.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	300.000	0	300.000	0	% 0,0	
