



# 2021 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 3. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 Dönemi)



# BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2021 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.612.347.000,00</b>	<b>1.617.809.165,77</b>	<b>1.332.442.038,69</b>	<b>% 82,4</b>
<b>02</b>	<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>274.484.000,00</b>	<b>276.161.192,10</b>	<b>225.528.245,65</b>	<b>% 81,7</b>
<b>03</b>	<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>114.221.000,00</b>	<b>234.942.890,34</b>	<b>122.252.043,04</b>	<b>% 52,0</b>
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>674.912.000,00</b>	<b>1.480.006.656,82</b>	<b>698.573.886,87</b>	<b>% 47,2</b>
	Kentsel Dönüşüm Ödeneği - Özel Ödenek	458.000.000,00	458.000.000,00	341.000.000,00	<b>% 74,5</b>
	Kentsel Dönüşüm Ödeneği - Ek Ödenek	0,00	0,00	0,00	
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	170.000.000,00	164.229.200,00	92.000.000,00	<b>% 56,0</b>
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	39.000.000,00	40.780.805,79	38.445.933,48	<b>% 94,3</b>
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	0,00	187.000.000,00	17.682.754,48	<b>% 9,5</b>
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	0,00	614.425.000,00	200.000.000,00	<b>% 32,6</b>
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	7.912.000,00	15.571.651,03	9.445.198,91	<b>% 60,7</b>
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>407.939.000,00</b>	<b>2.964.843.020,93</b>	<b>2.269.381.605,37</b>	<b>% 76,5</b>
	Bakanlık Yatırım Programı	391.835.000,00	403.017.999,33	139.320.423,07	<b>% 34,6</b>
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	16.104.000,00	76.904.000,00	58.731.295,27	<b>% 76,4</b>
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	2.484.921.021,60	2.071.329.887,03	<b>% 83,4</b>
<b>07</b>	<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>276.711.000,00</b>	<b>641.125.611,74</b>	<b>316.841.222,72</b>	<b>% 49,4</b>
	Bakanlık Yatırım Programı	96.711.000,00	96.711.000,00	10.505.668,40	<b>% 10,9</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	180.000.000,00	380.000.000,00	179.436.520,73	<b>% 47,2</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	154.614.611,74	117.099.033,68	<b>% 75,7</b>
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye-IPA	0,00	9.800.000,00	9.799.999,91	<b>% 100,0</b>
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
<b>08</b>	<b>BORÇ VERME</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>5.289.555,24</b>	<b>% 30,1</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>3.378.164.000,00</b>	<b>7.232.438.537,70</b>	<b>4.970.308.597,58</b>	<b>% 68,7</b>



# BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

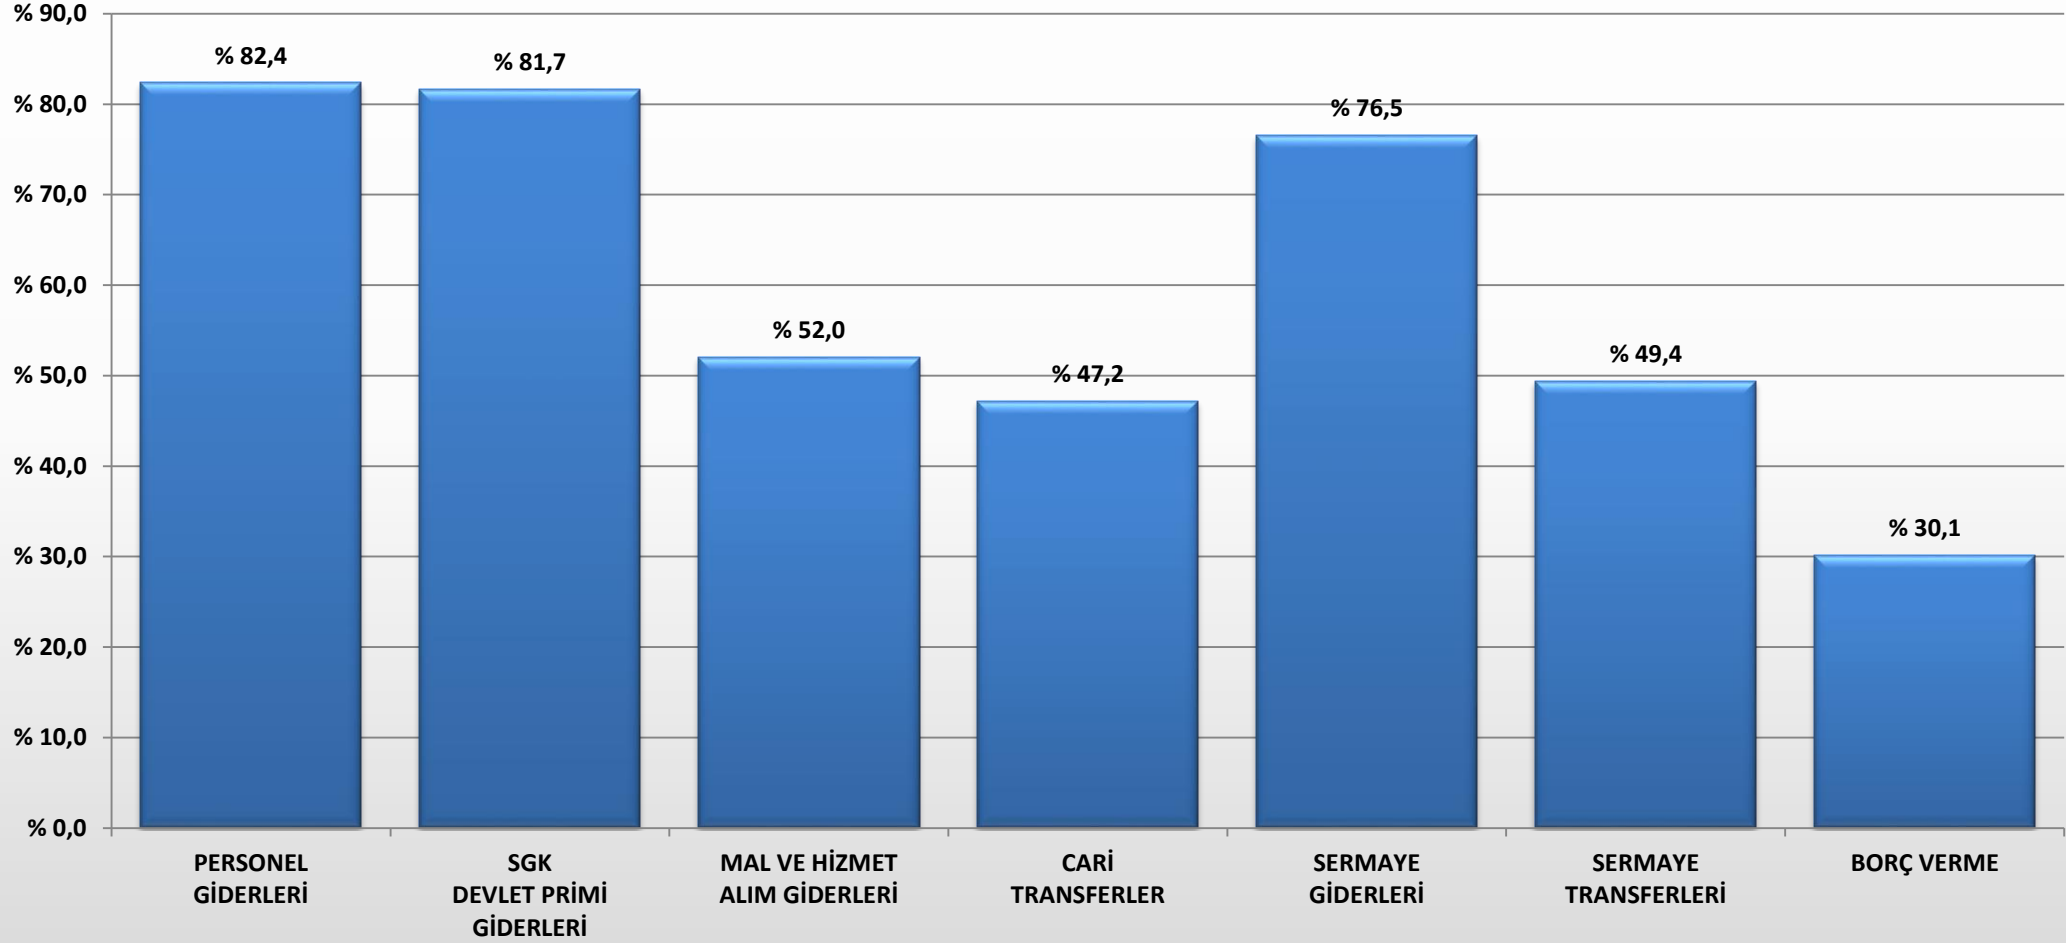




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ

## 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2021 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2021 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	45.720.000,00	19.300.000,00	2.571.196,76	% 13,3
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	10	616.367.000,00	72.536.000,00	3.774.191,00	% 5,2
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	5	211.997.000,00	32.190.000,00	4.265.862,00	% 13,3
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	21	5.131.894.111,00	326.142.000,00	145.935.430,20	% 44,7
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	2	7.500.000,00	501.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	3	3.485.000,00	1.460.000,00	253.955,00	% 17,4
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	8	119.413.000,00	48.475.000,00	6.453.475,00	% 13,3
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	3.355.191.000,00	7.767.000,00	1.714.478,26	% 22,1
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	20	261.690.000,00	69.280.000,00	16.760.098,65	% 24,2
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	1.619.177.000,00	1.500.000,00	91.568,00	% 6,1
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	172.244.000,00	20.735.000,00	6.856.038,45	% 33,1
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	390.000,00	390.000,00	63.475,62	% 16,3
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>80</b>	<b>11.548.068.111,00</b>	<b>603.276.000,00</b>	<b>188.739.768,94</b>	<b>% 31,3</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>66</b>	<b>11.197.023.111,00</b>	<b>516.596.000,00</b>	<b>160.403.480,94</b>	<b>% 31,1</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>14</b>	<b>351.045.000,00</b>	<b>86.680.000,00</b>	<b>28.336.288,00</b>	<b>% 32,7</b>
<b>"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği</b>	<b>4 adet</b>		<b>76.904.000,00</b>	<b>58.731.295,27</b>	<b>% 76,4</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

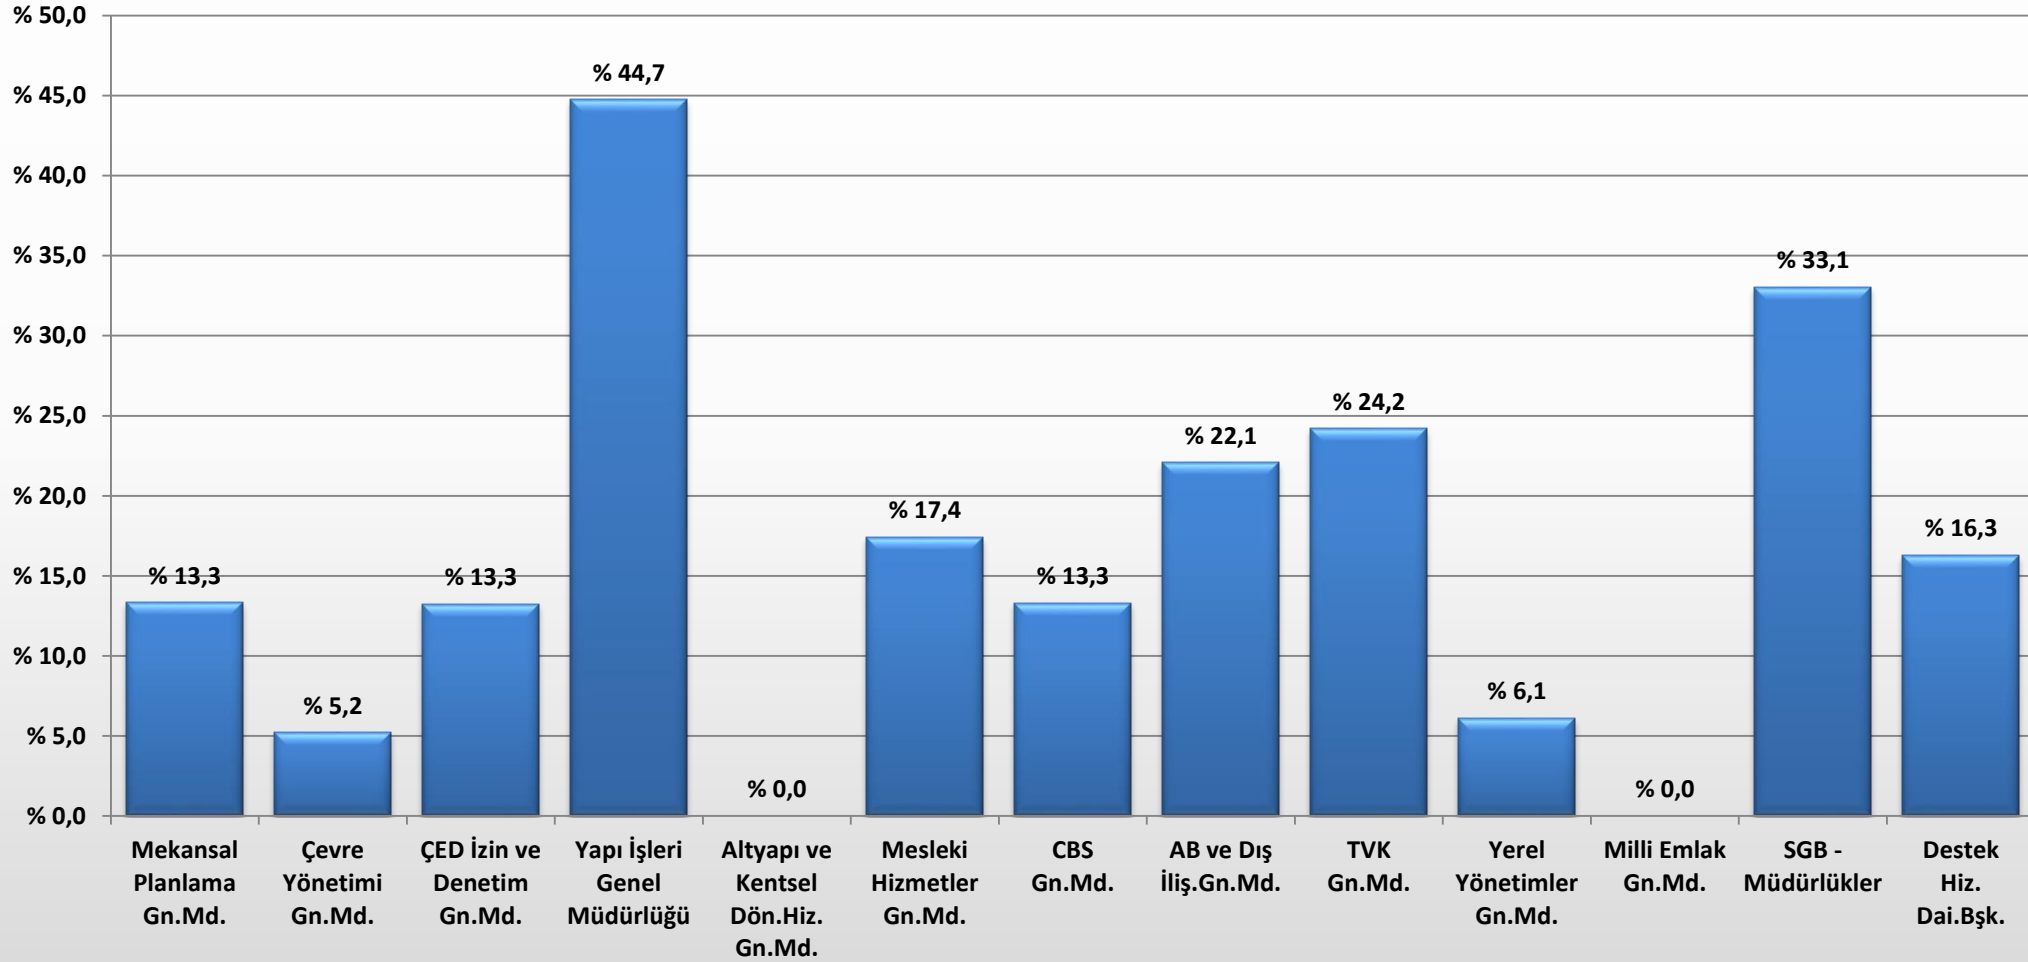




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2021 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	47.329.000,00	47.364.000,00	23.626.223,29	% 49,9
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	285.203.000,00	1.452.557.611,74	552.174.202,94	% 38,0
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	83.515.000,00	84.398.500,00	50.464.244,47	% 59,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	356.239.000,00	473.560.199,26	225.654.400,47	% 47,7
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	483.952.000,00	483.972.000,00	361.512.475,33	% 74,7
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	25.151.000,00	24.888.000,00	17.730.549,27	% 71,2
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	41.845.000,00	42.108.000,00	20.146.761,35	% 47,8
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	52.243.000,00	54.023.805,79	48.992.657,88	% 90,7
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	103.830.000,00	72.970.000,00	25.708.899,41	% 35,2
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	9.717.000,00	9.730.000,00	6.928.767,56	% 71,2
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	95.475.000,00	160.265.000,00	86.145.250,99	% 53,8
Personel Genel Müdürlüğü	8.314.000,00	8.317.000,00	8.312.176,61	% 99,9
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	8.604.000,00	126.766.000,00	70.607.405,66	% 55,7
Özel Kalem Müdürlüğü	39.504.000,00	38.959.000,00	8.364.744,67	% 21,5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	68.048.000,00	70.211.529,68	62.579.792,26	% 89,1
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	3.375.000,00	3.375.000,00	1.718.675,64	% 50,9
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	13.463.000,00	13.511.500,00	13.511.500,00	% 100,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı	184.591.000,00	175.550.200,00	98.662.264,39	% 56,2
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.473.000,00	1.473.000,00	1.091.621,50	% 74,1
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	4.182.000,00	4.189.000,00	4.189.000,00	% 100,0
İl Müdürlükleri	1.462.111.000,00	3.884.249.191,23	3.282.186.983,89	% 84,5
<b>TOPLAM</b>	<b>3.378.164.000,00</b>	<b>7.232.438.537,70</b>	<b>4.970.308.597,58</b>	<b>% 68,7</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2021 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

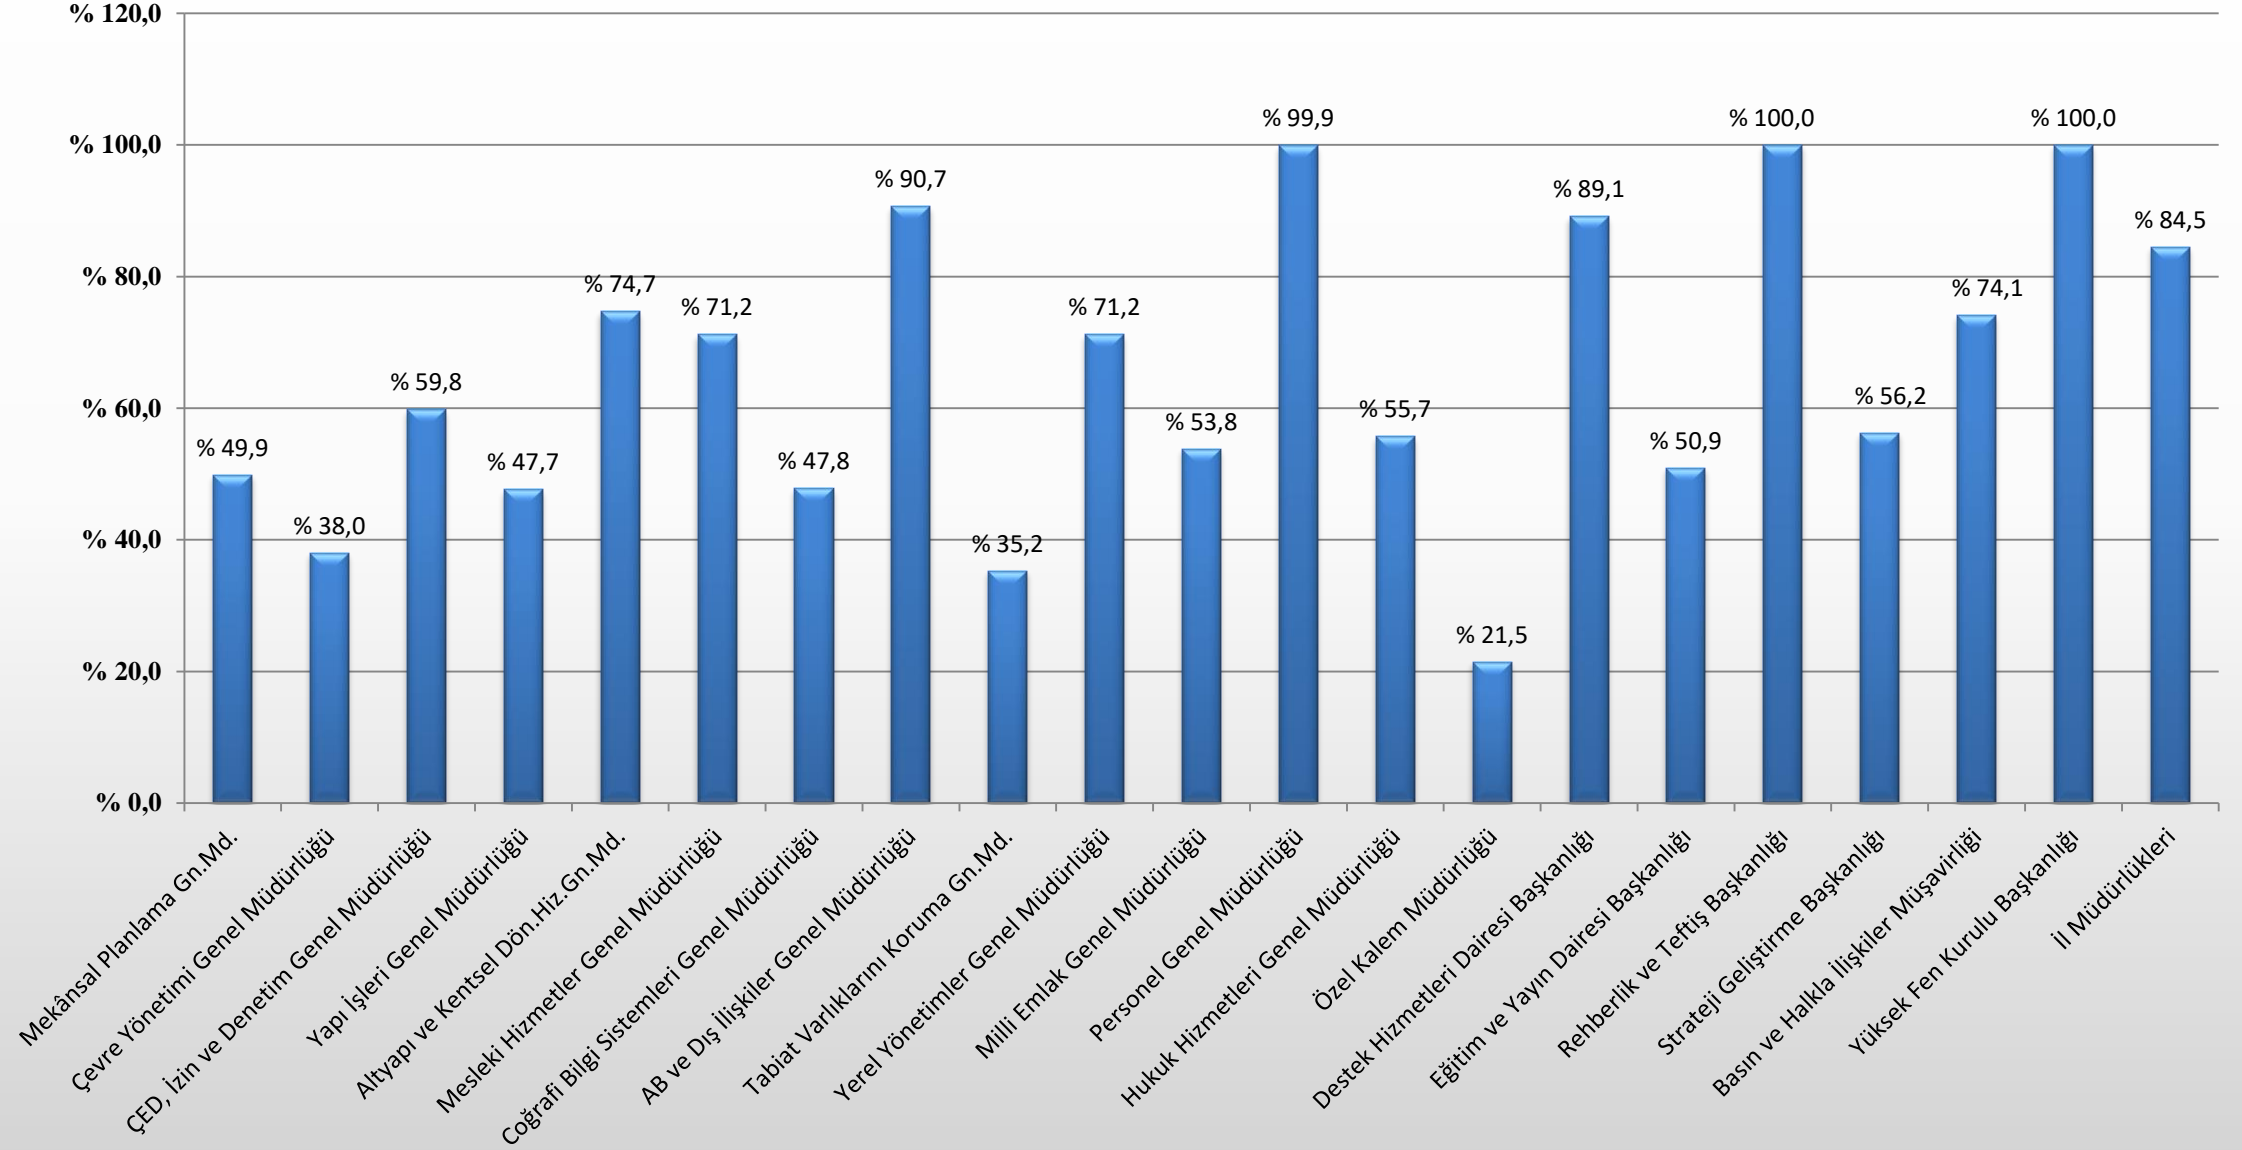

**Harcama Birimi Bazında**  
**2021 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri**  
**01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021**



## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3798	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	6.620.000	2.720.000	3.900.000	436.886	% 11,2	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2021	4.600.000	2.400.000	2.200.000	0	% 0,0	
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama	2017-2021	2.020.000	320.000	1.700.000	436.886	% 25,7	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Danışma Hizmet Alımı işi kapsamında 436.886,16 TL ödeme yapılmıştır.
2020K09-150347	Yaşanabilir Şehirler Kriterleri Geliştirilmesi (Şehirleşme Sektörü)	2020-2021	850.000	0	850.000	0	% 0,0	
	Türkiye Yaşanabilir Kentler Endeksi ve Beratı	2020-2021	500.000	0	500.000	0	% 0,0	
	Yeni Planlama Modeline İlişkin Yatay Mimari Taramaları	2020-2021	350.000	0	350.000	0	% 0,0	
2017K09-3802	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir İmar Planı Yapımı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2023	4.000.000	0	2.000.000	0	% 0,0	

## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-18078	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	13.250.000	6.000.000	3.750.000	998.185	% 26,6	2019 yılına ait olan Yozgat Sorgun İmar Uygulamaları Projesi Kapsamında 206.205,00 TL ödeme yapılmıştır. Karabük-Safranbolu Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1. Aşama 50.622,00 TL ve 2. Aşama 75.933,00 TL, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulamaları Projesi 352.772,80 TL, Denizli İli Acıpaayam İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi Kapsamında 207.160,80 TL, Amasya İli Merkez Suluova ve Gümüşhacıköy İlçeleri İmar Uygulama İşi kapsamında 105.492,00 TL olmak üzere toplam 998.185,60 TL ödeme yapılmıştır.
	2. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2019-2021	6.750.000	6.000.000	750.000	686.488	% 91,5	Karabük-Safranbolu Örnek İmar Uygulamaları Projesi 1. Aşama 50.622,00 TL ve 2. Aşama 75.933,00 TL, Mevzuat Geliştirme ve İmar Uygulamaları Projesi 352.772,80 TL, Denizli İli Acıpaayam İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi Kapsamında 207.160,80 TL, olmak üzere toplam 686.488,60 TL ödeme yapılmıştır.
	3. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2021-2022	6.500.000	0	3.000.000	311.697	% 10,4	2019 yılına ait olan Yozgat Sorgun İmar Uygulamaları Projesi Kapsamında 206.205,00 TL, Amasya İli Merkez Suluova ve Gümüşhacıköy İlçeleri İmar Uygulama İşi kapsamında 105.492,00 TL olmak üzere 311.697,00 TL ödeme yapılmıştır.
2018K09-3803	Bütünleşik Kıyı Alanlarının Planlaması (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	2.600.000	300.000	1.300.000	0	% 0,0	
	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2021	1.000.000	300.000	700.000	0	% 0,0	
	İzmit-Sakarya-Düzce Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	700.000	0	200.000	0	% 0,0	
	Zonguldak-Bartın-Kastamonu Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2021-2022	900.000	0	400.000	0	% 0,0	

**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2023	14.400.000	1.000.000	4.500.000	1.136.125	% 25,2	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2022	5.000.000	1.000.000	2.500.000	996.000	% 39,8	Yazılım Geliştirme ve Güncelleme Hizmeti İşi kapsamında 2.Aşama 647.400,00 TL ve 3.Aşama 348.600,00 TL olmak üzere 996.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2023	9.400.000		2.000.000	140.125	% 7,0	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırması projesinden tarama ve baskı makinası alımı yapılarak 140.125,00 TL ödeme yapılmıştır.
2021K09-162464	Aktif Fay Haritalama ve Sakınım Zonu Kriterleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2022	4.000.000		3.000.000	0	% 0,0	
<b>7 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>45.720.000</b>	<b>10.020.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>2.571.196</b>	<b>% 13,3</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K08-3796	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	2.250.000	750.000	1.500.000	583.000	% 38,9	Protokol ve teknik şartname çerçevesinde projeye ilişkin hazırlanan iş programı 17/02/2020 tarihli ve 73615618-145.05-E.40800 sayılı yazımız ile uygun görülmüş ve iş başlatılmıştır. Proje süresi 700 takvim günüdür. 09/12/2020 tarihinde iş programı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün revize talebi sebebiyle ek protokol imzalanmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 22.07.2020 ve 30343279-045.99-E.384026 sayılı yazısı uyarınca söz konusu projede 120 günlük süre uzatımı talebi bildirilmiş olup 01/06/2021 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Ek protokole göre işin süresi 820 (sekiz yüz yirmi) takvim günüdür. Protokol ve iş programı çerçevesinde 11 adet kılavuz ve yönetici özet kitapçığı hazırlanmış, atık karakterizasyonu kılavuzu taslağı hazırlanmış ilk iki ödemeye ilişkin işlemler tamamlanmıştır.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2024	400.000.000	140.000.000	54.950.000	0	% 0,0	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneginden henüz harcama yapılmamıştır.
2018K10-18297	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2021	1.687.000	987.000	700.000	0	% 0,0	COVID-19 nedeniyle yurtdışında yapılacak 2 adet teknik ziyaret gerçekleştirilememiştir. Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalışmaları tamamlandıktan sonra projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilecektir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2022	6.750.000	3.350.000	3.100.000		% 0,0	
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi	2018-2021	4.000.000	2.600.000	1.400.000	0	% 0,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmektedir. 27.06.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi kapsamında 5. gelişme raporu sonrasında covid-19 tedbirleri dolayısıyla ek protokol ile süre uzatımı süreci gerçekleştirilmiştir. Hava Emisyon Konulu Çevre izin sayısallaştırılması işlemlerine devam edilmektedir. HEY portalı veri tabanında, günümüz itibarıyla yaklaşık 5000 sanayi tesisine ait 15000 adet bacanın kirletici bilgileri kayıt altındadır. Konya, Samsun, İzmir, Adana, Erzurum ve İstanbul bölgesel hava kalitesi yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi modelleme eğitimleri başlamış olup, eğitimlerden Bakanlığımız ilgili personeli, Temiz Hava Merkezleri personeli, çeşitli üniversitelerden görevlendirilen akademisyenler yararlandırılmaktadır. Temiz Hava Merkezlerince yazılım üzerinden aktivite kodu güncelleme işlemleri yapılmıştır. 2020/25 sayılı Bakanlığımız Genelgesi kapsamında Katı Yakıt Modülü devreye alınmış olup e-imza ile belgelendirme süreci başlatılmıştır. Kullanıma açılmasından bu yana 8310 adet elektronik belge düzenlenmiş olup sistemde aktif 1743 kullanıcı kayıtlıdır. Projenin modüllerine esas teknik çalışma toplantıları ile birlikte idari toplantılar gerçekleştirilmekte olup, Hava Emisyon Yönetim-HEY Portalı yazılım bakım ve geliştirme işlemleri devam etmektedir.
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi	2018-2022	1.750.000	750.000	900.000	0	% 0,0	Proje; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında, Ege Üniversitesi ile yapılan Protokol çerçevesinde, 1 Aralık 2020 yılında başlamış olup, 21.04.2021 tarihinde ek protokol düzenlenerek proje bitiş tarihi 11 Kasım 2022 tarihine uzatılmıştır. Projede; kamu, özel sektör ve yerel yönetimlere yönelik anket çalışmaları, mevcut durum analizi, proje açılış toplantısı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Saha ziyaretleri gerçekleştirilecek yerler belirlenerek programlanmıştır. 29 Eylül 2021 tarihinde ara rapor sunulmuş olup değerlendirme aşamasındadır.
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2022	1.000.000	0	800.000	0	% 0,0	Proje henüz başlamamış olup, 2022 yılında başlaması planlanmaktadır.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2023	7.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Projenin teknik şartnamesi hazırlanmış olup, ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Yönetimi-TVK Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme	2016-2021	5.480.000	3.480.000	2.000.000	0	% 0,0	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında 4. Ara Rapor ve Sonuç Raporu ile birlikte proje çıktıları iletilmiştir. Proje kapsamında yürütülen çevrimiçi veri toplama sistemi çalışmaları devam etmektedir. 5.10.2021 tarihinde çevrimiçi Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Alt proje-2	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB-1)	2018-2022	13.340.000	8.691.000	3.400.000	181.126	% 5,3	IPA II programı kapsamında 2018K100610 proje numaralı "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" Avrupa Birliği ve Bakanlığımız eş finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmektedir. Proje 09.10.2019 tarihinde başlamıştır. Projenin ilk ilerleme raporu 17.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. Proje kapsamında Muğla, Samsun, Sakarya ve Konya Büyükşehir Belediyeleri pilot belediyeler olarak seçilmiş olup belediyelerin eylem planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Hibe başvuruları toplanmış ön başvuruların incelenmesi tamamlanarak proje bileşenleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ulusal Uyum Platformunun teknik arka plan ve kullanıcı arayüzünü içeren tasarım süreci çalışmaları ayrıca sürdürülmektedir.
AB katkısı			75.591.000	49.502.000	19.265.000	1.000.000	% 5,2	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-150237	Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	EKÖK Kapsamında Atık İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi	2020-2022	2.250.000	400.000	750.000	400.000	% 53,3	Protokol Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında 16.11.2020 tarihinde imzalanmış, proje başlatılmıştır.Sektörel Envanterin Güncellenmesi Nihai Raporu idareye sunulmuştur. Bu kalemlere esas ödeme Ağustos 2021'de yapılmıştır. Proje kapsamında eğitim ve saha ziyaretleri devam etmektedir.
Alt proje-2	EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (AB-1)	2020-2023	5.458.000	2.182.000	1.092.000	1.092.000	% 100,0	IPA II Çevre ve İklim Eylemi altında yer alan EKÖK Kapsamında Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi'nin 03.07.2020 tarihinde finansman anlaşması imzalanmıştır. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu projede 27.08.2020 tarihinde müşavir firmaya 1.503.264 Avro Avans ödemesi yapılmıştır.
AB katkısı			30.924.000	12.372.000	6.184.000	6.184.000	% 100,0	Proje kapsamında 2021 yılı 3. döneminde envanter oluşturulması ve ulusal eylem planı hazırlanmasına yönelik 11 adet çalıştay çevrimiçi platformda düzenlenmiş, eğitimcilerin eğitiminin ilki Ankara'da gerçekleştirilmiş, 4 tesise saha ziyareti yapılmıştır. Metodoloji, Envanter Metodolojisi, Envanter Veritabanı Kullanıcı Kılavuzu ve EKÖK Sertifikasyon raporları hazırlanmıştır. Ayrıca, saha ziyareti öncesi çevrimiçi proses eğitimleri düzenlenmiştir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18333	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Arttırılması (CITYAIR) (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2021	4.244.000	2.971.000	1.273.000	198.065	% 15,6	Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Arttırılması (CITYAIR) Projesi; 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlamıştır. Açılış toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşlarının katılım sağladığı Yönlendirme Komitesi Toplantıları ile yedi kez bir araya gelinmiştir. Aktivitelere göre hazırlanması beklenen raporların teslimi gerçekleştirilmiştir. Emisyon envanteri çalışmaları serisine Kahramanmaraş ilinde başlanmış, Sinop ve İzmir’de devam edilmiştir. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı ile yürütülen işbirliği çalışmaları sürdürülmektedir. Çalışmaların gerçekleştirildiği illerde yerel medya bileşenlerinde projenin tanıtımı ve farkındalık faaliyetleri sürdürülmüştür. 2020 yılı Mart sonu planlanan diğer envanter çalışmaları covid19 küresel salgınına bağlı olarak ülkemizde alınan tedbirler çerçevesinde ertelenmiş ve 2020 yılı Aralık ayında çevrimiçi şekilde, Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olan Isparta ili merkezli olarak toplam 10 ilin belediye başkanlıkları ve taşra teşkilatı personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Teknik çalışma toplantıları ve kamuoyu farkındalığı bileşenlerine ait aktivitelere ilişkin planlama toplantıları video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. covid-19 tedbirleri kapsamında 2020 yılında ilk defa kutlanmak üzere Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 7 Eylül "Mavi Göküztü için Temiz Hava Günü" çerçevesinde Bakanlığımız öncülüğünde 81 ilde taşra teşkilatı, belediye başkanlıkları, Bölgesel Temiz Hava Müdürlükleri ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi özel oturum gerçekleştirilmiştir. Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar başkanlığında Birleşmiş Milletler Avrupa Bölge Ofisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yüksek düzeyli temsilcilerinin konuşmacı olduğu etkinlikle ulusal çapta kamuoyu farkındalığı medya aracılığıyla sağlanmıştır. 2020 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da sosyal medya ve farkındalık etkinlikleri ile birlikte, Bakanlığımız öncülüğünde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa şekilde 28 Eylül 2020 tarihinde "Herkes İçin Sıfır Emisyon" konulu çevrimiçi özel oturum düzenlenmiştir. Etkinlikte 81 ilde belediyelerin temsilcileriyle ulaşımın hava kalitesi üzerindeki etkileri ile ilgili sunum ve konuşmalar yapılmıştır. 2021 yılında modelleme ve senaryolaştırma çalışmaları devam etmektedir. Projenin 5. İlerleme raporu teslim edilmiş durumdadır ve onaylanmıştır. 2021 yılı başından itibaren aylık koordinasyon toplantıları ve 10. yönlendirme komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Emisyon yönetim stratejilerine yönelik olan teknik çalışmalar 31 ilin Temiz Hava Eylem Planlarının güncellenmesi amacıyla sürdürülmektedir. Üniversitelerde farkındalık seminerleri ile öğrencilere yönelik 3 seminer çevrimiçi şekilde gerçekleştirilmiştir. Son seminer planlaması Ekim-Kasım 2021 dönemi için yapılmıştır. Teknik çalıştaylar serisinin; hava kirliliğinin önlenmesi başlığında ilk 2 tanesi çevrimiçi şekilde gerçekleştirilmiştir. Ekim ayında kalan 2'sinin de planlaması yapılmıştır. Teknik aktiviteler ve kamuoyu farkındalığı için planlanan aktiviteler için çalışmalar sürdürülmektedir. Dünya Temiz Hava Günü anısına Ankara'da bir okul seçilerek, öğrenciler için hava kalitesi farkındalık faaliyetleri, kamu spotu tanıtımı ve boyama etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Gaziantep'te Avrupa Hareketlilik Haftası için düzenlenen ve Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyete proje nezdinde katılım sağlanmıştır. Kamu spotu ve görsel iletişim amaçlı hazırlanacak materyal ve içerik çalışmaları tamamlanmış ve dağıtım, paylaşılması ve işbirliği için kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Online kurs platformu içerisinde hava kalitesine esas ders içerikleri hazırlanmış, video-seslendirme çekimleri düzenlenmektedir.
AB katkısı			24.048.000	16.836.000	7.212.000	1.100.000	% 15,3	



**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2022	3.639.000	1.977.000	451.000	0	% 0,0	Ocak - Nisan 2021 tarihleri arasında merkez ve il müdürlüklerinin katıldığı 4 adet eğitim çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İnşaat bileşeni kapsamında iyileştirme çalışması yürütülecek pilot sahaların tespiti için Şubat-Temmuz 2021 tarihleri arasında 5 adet teknik saha ziyareti düzenlendi. Yapılan analizler ve 20.05.2021 tarihli karar alma toplantısı (16. OKB Toplantısı) sonucunda Kesikköprü Hidroelektrik Santrali ve Hopa Termik Santrali pilot saha olarak belirlendi. TEİAŞ ve EÜAŞ uhdesinde bulunan bu sahalar için resmi onay yazıları alındı. Bu kapsamda, Toprak Kirliliği Danışmanı ve FIDIC&PRAG Uzmanı tarafından hazırlanan Teknik Şartname, Operasyonel Plan, Süpervizyon ve İzleme Planı 24.08.2021 tarihinde onaylandı ve ilana çıkılmadan önce IPA Biriminin onayına sunuldu. 01.01.2021-30.09.2021 tarihleri arasında 7 adet OKB toplantısı gerçekleştirildi. Faaliyet Raporu No:3 29.04.2021 tarihinde onaylandı ve Faaliyet Raporu No:4 20.09.2021 tarihinde taslak olarak sunuldu. Kirlenmiş Sahaların Yönetimi Uzmanı (KE3) 09.07.2021 tarihinde, KOK Uzmanı 28.05.2021 tarihinde ve Yazılım Geliştirme Uzmanı (KE2) 27.09.2021 tarihinde göreve başladı. KSBS yazılımı güncellendi ve Bakanlık yazılım altyapısı daha uzun ömürlü olması için PostGreSql altyapısına geçirildi.
AB katkısı			20.615.000	11.201.000	3.436.000	0	% 0,0	
2019K10-92594	Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2019-2021	2.096.000	776.000	1.320.000	1.320.000	% 100,0	Sanayiciler için Kimyasal Kayıt Sistemi'nin (KKS) kullanımına yönelik beş rehber video ile tüketiciler için kimyasalların güvenli kullanımına yönelik bir adet rehber video hazırlanmıştır. Proje kapsamında ayrıca kimyasalların güvenli kullanımına ilişkin bir kamu spotu ile sanayicilerin kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkındaki farkındalıklarının artırılmasına yönelik diğer bir kamu spotu hazırlanmıştır. Projedeki paydaşların ve hedef grupların katılımıyla projenin 7. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 12/08/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kovid pandemisi sebebiyle gerçekleştirilemeyecek iki çalışma ziyareti ve beş ilde düzenlenmesi planlanan bilgilendirme seminerleri iptal edildiği bir zeyilname kabul edilmiştir. Söz konusu aktivitelerin yerine Kimyasal Kayıt Sisteminin proje sonrasında bakım ve destek süresinin bir yıl daha uzatılmasına, KKS'deki kayıt ve zararlı kimyasallara ilişkin sınıflandırma ve etiketleme bilgilerinin halka açılmasına, Bakanlık personeli için AB'de kimyasal güvenlik değerlendirilmesine ilişkin süreçler hakkında 2 günlük çevrimiçi çalıştay gerçekleştirilmesine, İzmir ve İstanbul'da kısıtlı sayıda katılımcı ile hibrit (hem uzaktan, hem fiziki katılımlı) iki bilgilendirme semineri düzenlenmesine karar verilmiştir.
AB katkısı			10.995.000	4.398.000	6.597.000	6.597.000	% 100,0	
<b>10 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>454.194.000</b>	<b>165.564.000</b>	<b>72.536.000</b>	<b>3.774.191</b>	<b>% 5,2</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>162.173.000</b>	<b>94.309.000</b>	<b>42.694.000</b>	<b>14.881.000</b>	<b>% 34,9</b>	

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)	2014-2023						
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2023	192.127.000	119.753.000	22.675.000	3.918.942	% 17,3	
	Genel Bütçe Ödeneği		125.052.000	60.603.000	19.425.000	3.918.942	% 20,2	Hava kalitesi izleme istasyonları için sarf yedek malzeme ihtiyacına yönelik ihale gerçekleştirilmiştir. Muayene Kabul Süreci devam etmektedir. Merkezden ve 8 adet Bölgesel Temiz Hava Merkezi Müdürlüklerine bağlı illerde bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarının bakım onarımları ile ilgili yapılan hakediş ödemeleridir. 3 adet Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarına ait bakım onarım ve kalibrasyon sözleşmesi imzalanmış olup bakım onarım kalibrasyon çalışmaları başlatılmıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		67.075.000	59.150.000	3.250.000	0	% 0,0	Ulusal hava kalitesi izleme ağına ilave edilmek üzere 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurulumu için ihale işlemi 3.009.000 TL bedel ile gerçekleştirilmiş olup, yıl sonuna kadar kurulum işlemleri tamamlanacaktır.
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2021-2023	3.500.000		1.000.000	0	% 0,0	Ulusal hava kalitesi ağı'nda yenilenmesi gereken istasyonlara ait tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu tespitler ışığında teknik şartname hazırlanmış olup, piyasa fiyat araştırması çalışmaları devam etmektedir.
Alt proje-3	Güneydoğu THMM Hava Kalitesi Ön Değerlendirme	2021-2022	2.750.000		1.250.000	0	% 0,0	Teknik Şartname Hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
2020K10-140875	Çevre Referans Laboratuvarı Altyapı Revizyonu (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2020-2022	8.470.000	0	4.140.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Yakıt Analizleri Ön İşlem Bölümü, Yakıt Analiz Laboratuvarı ile Numune Kabul ve Raporlama Biriminde revizyon çalışmaları başlamış olup, elektrik ve mekanik tesisat yapımına devam edilmektedir.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18384	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000.000	750.000	2.250.000	0	% 0,0	Şartname kapsamında en az 8 İl olmak üzere farklı bölgelerde faaliyet gösteren, farklı sektör ve alt sektörlerde seçilmiş 20 (yirmi) adet yurtiçi saha ziyaretleri tamamlanmıştır. Bolu İlinde saha ziyaretleri ve proje ile ilgili Bakanlığımız personellerinin de katılım sağladığı 2 günlük değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2023	1.550.000		575.000	169.920	% 29,6	Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen Türkiye Çevre EtiketSisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Kriter Belirleme Çalışmalarına Yönelik HizmetAlımı İşİ kapsamında Protokol bedelinin %20'lik kısmına tekabül eden 1. hakediş ödememiz KDV dahil 169.920TL gerçekleşmiş olup bu yıl sonuna kadar bir hakediş ödemesi daha yapılacağı ve Projenin tanıtım işleri için ödeme yapılması planlanmaktadır.
2021K10-169535	Hava Kirliliği Kaynakları ve Önlemlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2021-2022	600.000		300.000	177.000	% 59,0	İş Termin Planı ve İhtiyaç Tespit Raporu hazırlanarak saha örnekleme personelinin eğitimi tamalandı. 1. Hakediş ödendi.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>136.452.000</b>	<b>61.353.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>4.265.862</b>	<b>% 17,2</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>75.545.000</b>	<b>59.150.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>211.997.000</b>	<b>120.503.000</b>	<b>32.190.000</b>	<b>4.265.862</b>	<b>% 13,3</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018E06-87362	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2024	750.000.000	115.600.000	3.572.000	0	% 0,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünce söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL, Genel Müdürlüğümüze Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmalarının kapsamının belirlenmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli ön proje doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlandığı bilinmektedir. İhale süreçleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu aşamada, Başkanlığımıza iletilen başkaca bir husus bulunmamaktadır.
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	1.534.000.000	11.213.000	131.593.000	15.252.468	% 11,6	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi Kapsamında; - Ankara, Karabük ve Bursa İllerinde bulunan Kamu Binalarının Enerji Verimliliği Uygulama İşine ait inşaat sürecinin yıl sonunda bitirilmesi hedeflenmiştir. - İstanbul ilinde bulunan Kamu Binalarının Enerji Verimliliği Uygulama İşine ait inşaat süreci 2022 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanacaktır. - Toplamda 16 İlimizde bulunan kamu binalarının "Enerji Verimliliği Etüdü, Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği" için Danışmanlık Hizmeti ihaleleri devam etmektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		1.504.854.000	7.094.000	122.997.000	14.184.131	% 11,5	
	Hibe Ödeneği		29.146.000	4.119.000	8.596.000	1.068.337	% 12,4	
2020K14-152212	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2020-2021	9.826.000	4.863.000	4.963.000	4.861.819	% 98,0	Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi kapsamında geliştirilen yöntem ve yazılım yardımı ile 2020-2023 yılları arasında 81 ilden kamu binalarının envanter bilgilerinin toplanmasına başlanacak ve deprem riskine ilişkin olarak, kamu binalarının deprem performansının belirlenmesi için bir önceliklendirme yapılacaktır. Toplam Kamu Binası adedinin 480.000 civarında olduğu öngörülmektedir (KAYSIS bilgilerine göre). Bina envanter bilgileri bir yazılım kapsamında puanlanacak olup, puanlama sonrasında renk kodları kırmızı (1.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-164341	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2021-2021	11.480.000		11.480.000	2.823.000	% 24,6	Lazer tarama özellikli izleme sistemi (Total Station ve Multi Station) alımı yapılmıştır.
2021K14-170327	Afet Müdahale Teknik Analiz Yöntemi Geliştirme (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2021-2021	6.000.000		6.000.000	6.000.000	% 100,0	Sensörlü yapı izleme istasyonu alımı yapılmıştır.
2021K14-170333	Afet Müdahale Ekipleri Yaşam ve Çalışma Mekanı (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2021-2021	1.650.000		1.650.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	2.038.303.000	0	500.000	0	% 0,0	
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)		293.378.000		500.000	0	% 0,0	Proje İhalelerine henüz çıkılmamıştır.
	Hibe Ödeneği		5.752.000		0	0		
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)		1.739.173.000		0	0		Proje İhalelerine henüz çıkılmamıştır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024						
	Siiirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2021-2023	15.335.000	0	1.000.000	0	% 0,0	Proje aşaması tamamlandı. Yaklaşık maliyet aşamasında, maliyetler inceleniyor.
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	33.630.000		12.000.000	0	% 0,0	Projeleri tamamlandı.
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	21.712.000		8.000.000	0	% 0,0	Kesin projeler Genel Müdürlüğümüzce, Uygulama projeleri İl Müdürlüğü'nce temin edilmiştir.
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	16.396.000		6.000.000	0	% 0,0	Kesin projeler Genel Müdürlüğümüzce, Uygulama projeleri İl Müdürlüğü'nce temin edilmiştir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Arsa Karşılığı)	2021-2023	23.468.000		9.000.000	0	% 0,0	Proje aşaması devam ediyor.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K01-161831	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-CBS-Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Proje Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi, CBS ile Uyumlaştırılması ve Yaygınlaştırılması	2021-2021	900.000		900.000	318.919	% 35,4	Proje Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi projesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2021-2021	800.000		800.000	342.943	% 42,9	Yeni Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılım uygulaması değişen mevzuat kapsamında dağıtım modülünü de içerecek şekilde revize edilerek 2019 yılı itibarıyla 81 ilde devreye alınmış, 2021 yılı itibarı ile de uygulanmakta olup, yazılıma ilişkin iyileştirme ve geliştirme süreçleri devam etmektedir.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2021-2021	300.000		300.000	137.411	% 45,8	Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki yazılımların bakım onarım ve iyileştirme işlemlerinde ve donanım ihtiyaçlarının sağlanmasında proje ödeneği kullanılmaktadır.
2011K07-140439	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2021	5.500.000	4.000.000	1.500.000	237.853	% 15,9	14 ilde (Kastamonu, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Samsun, Ordu, Giresun, Sinop, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir) işe yeni başlanmış olup henüz hakediş düzenlenmemiştir. 4 ilde (Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari) işe başlanmış olup ikinci hakediş ödemesi yapılmıştır. 4 ilde (Bitlis, Muş, Van, Ağrı) işe başlanmış olup birinci hakediş ödemesi yapılmıştır.
2018K07-149555	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	18.000.000	13.000.000	5.000.000		% 0,0	
	İlisu Barajından Etkilenen Siirt İli Köyleri İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2021	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	% 0,0	Ödenek başka işe aktarılacaktır. Cumhurbaşkanlığı SGB'dan cevap beklenmektedir.
	İlisu Barajından Etkilenen Batman İli Köyleri İskan Konutları Altyapı İşleri	2019-2021	13.000.000	9.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Ödenek başka işe aktarılacaktır. Cumhurbaşkanlığı SGB'dan cevap beklenmektedir.
2018K07-18498	Bozkır Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2021	213.817.408	113.395.408	100.422.000	83.273.451	% 82,9	Konut yapım işi bitti. Geçici kabulü yapıldı, Konut kuraları çekildi. Peyzaj yapım işi devam etmektedir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	40.744.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K07-24212	İlisu Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	32.490.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K07-24213	Yusufeli Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2023	116.964.000	0	2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2022	6.823.000		2.000	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2021K07-160010	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	1.000.000		1.000.000	92.040	% 9,2	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2021K07-169789	Tamamlama ve Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	47.500.000		47.500.000	28.169.558	% 59,3	
	Kesin Hesap	2021-2021	10.500.000		10.500.000	890.668	% 8,5	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılacaktır.
	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli Tamamlama	2021-2021	37.000.000		37.000.000	27.278.890	% 73,7	2021 Yılında işin tamamlanması planlanmaktadır. İş geçici kabul aşamasındadır.



## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2024	295.746.703	50.383.703	17.500.000	5.494.305	% 31,4	Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak illerinden 96 adet köyde yaklaşık 2.100 ailenin konut yapımı işidir. Batman, Çorum, Erzurum ve Kars illerinde toplam da Eylül ayı sonu itibarıyla 5.494.305 TL ödenek harcanmıştır. 30.09.2021 tarihi itibarıyla Batman, Bilecik, Çankırı, Çorum, Erzurum, Denizli, Kars, Malatya, Aksaray ve Uşak illerinde toplamda 72 adet konut tamamlanarak haksahiplerine teslim edilmiştir.
	Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	17.362.700	803.700	1.000.000	0	% 0,0	
	Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	8.047.041	520.041	1.000	0	% 0,0	
	Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2023	24.740.866	13.540.866	5.000.000	2.316.350	% 46,3	
	Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	1.750.614	450.614	307.100	131.250	% 42,7	
	Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	3.577.000	802.000	1.020	0	% 0,0	
	Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	23.021.643	1.521.643	500.000	0	% 0,0	
	Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	13.099.000	549.000	1.500.002	38.455	% 2,6	
	Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	6.296.000	1.396.000	1.082.000	257.250	% 23,8	
	Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	7.775.000	495.000	1.000.000	703.500	% 70,4	
	Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	4.137.000	1.328.000	329.001	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	<i>Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	81.706.000	16.820.000	3.227.720	1.438.500	% 44,6	
	<i>Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Iğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	10.000.000	0	1.000	0	% 0,0	
	<i>Isparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	5.555.000	610.000	250.002	63.000	% 25,2	
	<i>İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	2.608.000	733.000	600.002	0	% 0,0	
	<i>Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	7.700.000	373.000	1.000	0	% 0,0	
	<i>Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	5.000.000	360.000	1.000	0	% 0,0	
	<i>Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	22.083.590	6.451.590	1.826.093	546.000	% 29,9	
	<i>Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	3.070.000	770.000	8.302	0	% 0,0	
	<i>Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	<i>Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	1.500.000	0	1.000	0	% 0,0	
	<i>Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	12.060.000	315.000	212.150	0	% 0,0	
	<i>Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	<i>Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	14.004.749	704.749	57.754	0	% 0,0	
	<i>Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2016-2024	6.500.000	473.000	1.002	0	% 0,0	
	<i>Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım</i>	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.500.000	72.000	500.000	0	% 0,0	
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.061.000	681.000	1.000	0	% 0,0	
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	4.000		1.000	0	% 0,0	
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2024	2.055.500	613.500	80.852	0	% 0,0	
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2024	7.000.000		1.000	0	% 0,0	
2021K07-160012	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	50.000		50.000	0	% 0,0	
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2023			9.862.000	4.915.037	% 49,8	
<b>12 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>4.772.243.408</b>	<b>253.089.408</b>	<b>284.499.000</b>	<b>126.756.306</b>	<b>% 44,6</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>08 TOPLAM</b>	<b>295.796.703</b>	<b>50.383.703</b>	<b>17.550.000</b>	<b>5.494.305</b>	<b>% 31,3</b>	
<b>4 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>28.956.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>24.093.000</b>	<b>13.684.819</b>	<b>% 56,8</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>HİBE</b>	<b>34.898.000</b>	<b>4.119.000</b>	<b>8.596.000</b>	<b>1.068.337</b>	<b>% 12,4</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>5.131.894.111</b>	<b>312.455.111</b>	<b>326.142.000</b>	<b>145.935.430</b>	<b>% 44,7</b>	
<b>1 Proje</b>		<b>ARSA KARŞILIĞI</b>	<b>95.206.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.862.000</b>	<b>4.915.037</b>	<b>% 49,8</b>	

**ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K01-2755	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2022	6.500.000	3.750.000	1.000	0	% 0,0	"İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi" projesi gelinen tarih itibariyle %58 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmış olup, anılan proje kapsamında yürütülen çalışmaların durdurulmasına dair 17.08.2018 tarihli ve E.140882 sayılı yazımıza istinaden projeye devam edilememiştir.
2021K09-162458	Doğu Karadeniz Dere Yatakları Islah ve İyileştirme (Şehirleşme Sektörü)	2021-2022	1.000.000		500.000	0	% 0,0	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>7.500.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D00-17215	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2023	3.025.000	600.000	1.000.000	118.944	% 11,9	<p>*263.040 TL bedelli Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YES-TR) Yazılımı İşinin sözleşmesi 05/11/2019 tarihinde imzalanmıştır. 2020 yılı temmuz ayı içinde işin tasarım raporunun onaylanması ve ihale bedelinin %15'inin ödenmesi gerçekleştirilmiştir. İşin kabulü ve geri kalan %85'lik bedelin ödenmesi işlemleri 2020 yılı aralık ayı içinde tamamlanmıştır. Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı için 18/12/2022 tarihine kadar yüklenici tarafından ücretsiz garanti ve bakım hizmeti verilecektir. 2022 yılı içinde 2023 yılında yürütülecek Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı Bakım, Destek ve İyileştirme Hizmet Alımı işi için ihaleye çıkılması planlanmaktadır.</p> <p>*27/07/2020 tarihinde ihalesi yapılan Binalarda Enerji Verimliliği Uygulaması (BEP-TR) 2. Versiyon Bakım Destek ve İyileştirme Hizmet Alımı işinin sözleşmesi 05/10/2020 tarihinde imzalanmıştır. 204.400 TL bedelli işin süresi 365 gün olup, yükleniciye yapılacak ödemelerin ilk bölümü işin altıncı ayında (Nisan 2021) yapılmıştır. Kalan ödeme işin sonunda (Ekim 2021) kabul faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini müteakip yapılacaktır. Bir sonraki bakım onarım faaliyetlerinin Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p> <p>*Genel Müdürlüğümüzce IPA III kapsamında hazırlanan Eylem Fişi'nde; "Çevreyle Bütünleşik Binalarda Enerji Tüketiminin Azaltılması Projesi" tarafımızdan teklif edilmiştir. Bu nedenle söz konusu faaliyetin danışmanlık giderleri için 2021 proje bütçesinde revize yapılmıştır. Ancak proje kabul edilmediği için bu konuda ödeme yapılmayacaktır.</p>
2021K01-161844	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Mesleki+CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2021-2021	360.000		360.000	90.774	% 25,2	<p>Labortuar Cihaz Bakım Onarımı, TSE'ye Test Deney ücreti ödemesi yapılmıştır.</p>

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K01-161831	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-Mesleki+CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Yapı Mütcahhtlığı Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncellemesi	2021-2021	100.000		100.000	44.237	% 44,2	Kalan Revize 100.000 TL den, 44.227,20 TL Harcama yapılmıştır. Not: 06.04.2021 tarih ve 719483 sayılı yazımızla proje ödeniğinden 123.000 TL nin Coğrafi Bilgi Sstemleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi Strateji Başkanlığından talep edildi.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.485.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>253.955</b>	<b>% 17,4</b>	

## COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021E06-164350	Trafik Sorununun Çözümü için Akıllı Şehirler (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2021-2022	9.500.000		5.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında pilot projelerin yapılmasına yönelik proje davet ve yarışma başlatılmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilmeye yönelik Revizyon proje fişi hazırlanmıştır.
2021K01-164342	Milli Emlak Otomasyon Projesi İdamesi (Genel İdare Sektörü)	2021-2022	4.900.000		2.300.000	691.716	% 30,1	Proje kapsamında Ocak/2021 tarihinde 2 yıllık 2.344.800-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. 3. hakediş ödenmiştir. Proje takvimine göre hakediş ödemeleri yapılacaktır.
2020K01-146671	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**.Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2020-2022	8.500.000	3.500.000	3.847.000	381.966	% 9,9	Proje kapsamında Temmuz/2020 tarihinde 3.884.400TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede belirtilen ödeme proje takvimine göre hakediş ödemeleri şeklinde yapılacaktır.
2021K01-161831	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri-Mesleki+CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)					0		
	Yapı Mütahhithliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncellemesi	2021-2021	123.000		123.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet ve teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2021K01-161844	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Mesleki+CBS Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2021-2021	140.000		140.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet ve teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2020K09-150397	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme (Şehirleşme Sektörü)	2020-2021	5.500.000	3.000.000	2.500.000	0	% 0,0	
	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı	2020-2020	1.000.000	500.000	500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilecektir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik	2020-2021	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Eylül/2020 tarihinde 1.919.000TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme	2020-2021	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında Ekim/2020 tarihinde 610.000+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Diğer hizmetlere ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.



**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K09-35701	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2022	34.000.000	16.500.000	10.000.000	0	% 0,0	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2021	11.500.000	9.000.000	2.500.000	0	% 0,0	"Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi (4. Faz)" için hizmet temini gerçekleştirilmiş olup 2.415.000,00 TL+KDV ile sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	TUCBS Entegrasyonu	2018-2022	11.000.000	7.000.000	1.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında 15 yerel yönetim ve 20 Kamu Kurumu Merkez Teşkilatı ile entegrasyon çalışmaları kapsamında 07.09.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	TUCBS Stratejisi ve Eylem Planı İzleme-Raporlama	2020-2021	1.000.000	500.000	500.000	0	% 0,0	" Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama Faaliyetleri Kapsamında Olgunluk Modelinin Uygulanması Projesi için hizmet temini gerçekleştirilmiş olup 600.000,00 TL+KDV ile sözleşme imzalanmıştır.Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Coğrafi Veri ve Metaverilerinin Güvenli Paylaşımı	2021-2022	2.000.000		1.000.000	0	% 0,0	" TUCBS Altyapısında Bulunan Coğrafi Veri Servislerinin Standartlara Uyumluluğunun İzlenmesi ve Raporlanması Bakım Hizmeti Alımı Ve Ek Fonksiyon Geliştirilmesi İşi " hizmet temini gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Mart/2021 tarihinde 112.500+TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Diğer hizmetlere ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir.
	Coğrafi Bilgi Platformu Modernizasyonu	2021-2021	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	" Bakanlık Atlas Ve Geoportal Uygulamalarının Bakım Hizmeti Alımı Ve Ek Fonksiyon Geliştirilmesi İşi " hizmet temini gerçekleştirilmiş olup 660.000,00 TL+KDV ile sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Coğrafi Veri Güncelleme Çalışmaları	2021-2021	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	İnsansız Hava Aracı ile Amasya Merkezde Elde Edilecek Oblik Görüntülerden 3 Boyutlu Bina Modelleri Üretimi, Mobil Haritalama Verileri ve Sokak Görüntülerinin Elde Edilmesi ile Verilerin Güncellenerek Harita Tabanlı 3 Boyutlu Görüntüleme Web Yazılımına Aktarılması işinde teknik şartname uyarınca, İHA ile uçuş ve panoramik çekim çalışmaları yürütülmektedir.
	TUCBS Coğrafi Veri Uyumlaştırma Çalışmaları	2021-2022	6.500.000		2.500.000	0	% 0,0	Proje kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-141024	Bilişim ve Donanım Altyapısı Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2020-2023	56.750.000	23.930.000	24.565.000	5.379.793	% 21,9	
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2020-2021	7.000.000	4.000.000	3.000.000	134.673	% 4,5	Sözleşmeli Bilişim Personeli Donanım Talebi Monitör İş İstasyonu alımı için LN BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. firmasına 77.400 TL + KDV ödeme gerçekleştirilmiştir. 1 Dizüstü Bilgisayar alımı için DESTEK BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZ.TİC.A.Ş. firmasına 15.230 TL + KDV ödeme gerçekleştirilmiştir. Yüksek Çözünürlüklü Kamera alımı için TRUSTNET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. firmasına 21.500 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	Altyapı Bileşenleri Bakım,Onarım ve Lisans Temini	2020-2021	12.000.000	8.000.000	4.000.000	783.520	% 19,6	32Ceph Object Storage Depolama Yazılımının Entegrasyonu ve Bakımı için SOLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ firmasına 120.000 TL + KDV ödeme gerçekleştirilmiştir. Sunucu Sistemleri Yedekleme Yazılımı için CSIT BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ firmasına 664.000 TL + KDV ödeme gerçekleştirilmiştir.
	Hazır Yazılım Temini, Uygulama Yazılımı Lisans Alımı ve Bakımı	2020-2023	18.800.000	5.800.000	8.245.000	141.600	% 1,7	32Ceph Object Storage Depolama Yazılımının Entegrasyonu ve Bakımı için SOLUS BİLİŞİM TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ firmasına 120.000 TL + KDV ödeme gerçekleştirilmiştir.Proje kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir
	Bakanlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümü	2020-2021	10.450.000	6.130.000	4.320.000	4.320.000	% 100,0	Proje kapsamında ödeme takvimine göre ödemeler tamamlanmıştır..

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Oracle'dan PostgreSQL'e Göç	2021-2021	1.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında toplam 16 uygulama yer almakta olup bunlardan Finansman Bilgi Sistemi ve Büyük Yakma Tesisleri uygulamalarının veri tabanına aktarımı tamamlanarak teslim edilmiş ve tutanağı hazırlanmıştır. Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) uygulamasının veri tabanına aktarımı tamamlanarak teslim edilmiş olup tutanaklar hazırlanacaktır. Diğer uygulamalar için işlemler devam etmektedir.
	Çevre ve Şehircilik Veri Sözlüğü Geliştirilmesi	2021-2022	3.500.000		2.000.000	0	% 0,0	06/07/2021 tarihinde 1.945.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
	E-Belediye Uygulamaları Bakım-Onarım	2021-2022	4.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Ödemeler proje takvimine göre gerçekleşecektir.
<b>6 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>54.163.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.063.000</b>	<b>691.716</b>	<b>% 3,4</b>	
<b>2 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>65.250.000</b>	<b>27.430.000</b>	<b>28.412.000</b>	<b>5.761.759</b>	<b>% 20,3</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>119.413.000</b>	<b>46.930.000</b>	<b>48.475.000</b>	<b>6.453.475</b>	<b>% 13,3</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2025	25.466.000	5.730.000	7.767.000	1.714.478	% 22,1	
<i>AB katkısı</i>			144.312.000	32.470.000	44.015.000	9.541.944	% 21,7	
2019K05-93010	IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2025	3.185.413.000	480.850.000	1.205.860.000	337.111.389	% 28,0	
	AB Hibesi		2.611.144.000	408.775.000	988.712.000	286.544.686	% 29,0	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		236.494.000	30.448.000	90.869.000	21.241.664	% 23,4	
	Mahalli İdare Katkısı		337.775.000	41.627.000	126.279.000	29.325.039	% 23,2	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>25.466.000</b>	<b>5.730.000</b>	<b>7.767.000</b>	<b>1.714.478</b>	<b>% 22,1</b>	
	<i>AB KATKISI</i>		<b>144.312.000</b>	<b>32.470.000</b>	<b>44.015.000</b>	<b>9.541.944</b>	<b>% 21,7</b>	
	<i>İçmesuyu Projesi</i>		<b>3.185.413.000</b>	<b>480.850.000</b>	<b>1.205.860.000</b>	<b>337.111.389</b>	<b>% 28,0</b>	

**2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	<b>Çarşamba Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>85.060.000</b>	<b>27.136.000</b>	<b>36.360.000</b>	<b>17.701.158</b>	<b>% 48,7</b>	
	AB Hibesi		72.296.000	23.064.000	30.905.000	15.045.984		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.106.000	1.629.000	2.182.000	1.062.069		
	Mahalli İdare Katkısı		7.658.000	2.443.000	3.273.000	1.593.104		
Alt proje-2	<b>Bandırma Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>186.349.000</b>	<b>20.737.000</b>	<b>72.492.000</b>	<b>37.041.869</b>	<b>% 51,1</b>	
	AB Hibesi		158.391.000	17.625.000	61.617.000	31.485.588		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		11.184.000	1.245.000	4.350.000	2.222.512		
	Mahalli İdare Katkısı		16.774.000	1.867.000	6.525.000	3.333.768		
Alt proje-3	<b>Bismil Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2023	<b>83.136.000</b>	<b>42.045.000</b>	<b>26.088.000</b>	<b>23.199.528</b>	<b>% 88,9</b>	
	AB Hibesi		70.663.000	35.738.000	22.174.000	19.719.599		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.613.000	2.838.000	1.761.000	1.565.968		
	Mahalli İdare Katkısı		6.860.000	3.469.000	2.153.000	1.913.961		
Alt proje-4	<b>Bozüyük Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>252.569.000</b>	<b>0</b>	<b>103.465.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		165.506.000	0	67.800.000			
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		34.830.000	0	14.268.000			
	Mahalli İdare Katkısı		52.233.000	0	21.397.000			
Alt proje-5	<b>Çankırı Su ve Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>264.973.000</b>	<b>0</b>	<b>93.866.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		225.223.000	0	79.786.000			
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		15.900.000	0	5.632.000			
	Mahalli İdare Katkısı		23.850.000	0	8.448.000			
Alt proje-6	<b>Elbistan Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>151.706.000</b>	<b>74.589.000</b>	<b>36.702.000</b>	<b>35.116.684</b>	<b>% 95,7</b>	
	AB Hibesi		128.962.000	63.415.000	31.196.000	29.849.181		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		10.235.000	5.028.000	2.478.000	2.370.376		
	Mahalli İdare Katkısı		12.509.000	6.146.000	3.028.000	2.897.126		
Alt proje-7	<b>Giresun Atıksu Tesisi</b>	2019-2025	<b>237.352.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>83.309.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
	AB Hibesi		201.746.000	3.144.000	70.812.000			
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		14.243.000	222.000	4.999.000			
	Mahalli İdare Katkısı		21.363.000	333.000	7.498.000			
Alt proje-8	<b>İğdır Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>174.189.000</b>	<b>43.980.000</b>	<b>78.107.000</b>	<b>50.461.946</b>	<b>% 64,6</b>	
	AB Hibesi		148.056.000	37.382.000	66.390.000	42.892.655		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		11.760.000	2.969.000	5.273.000	3.406.181		
	Mahalli İdare Katkısı		14.373.000	3.629.000	6.444.000	4.163.111		
Alt proje-9	<b>Kastamonu Atıksu Tesisi</b>	2019-2024	<b>122.507.000</b>	<b>40.369.000</b>	<b>53.182.000</b>	<b>28.324.046</b>	<b>% 53,3</b>	
	AB Hibesi		104.127.000	34.312.000	45.204.000	24.075.439		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		7.352.000	2.423.000	3.191.000	1.699.443		
	Mahalli İdare Katkısı		11.028.000	3.634.000	4.787.000	2.549.164		

Alt proje-10	<b>Niksar Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2024</b>	<b>164.767.000</b>	<b>45.939.000</b>	<b>57.573.000</b>	<b>43.874.876</b>	<b>% 76,2</b>
	AB Hibesi		140.047.000	39.047.000	48.936.000	37.293.645	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		9.889.000	2.757.000	3.455.000	2.632.493	
	Mahalli İdare Katkısı		14.831.000	4.135.000	5.182.000	3.948.739	
Alt proje-11	<b>Rize Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>264.204.000</b>	<b>36.222.000</b>	<b>75.514.000</b>	<b>21.432.104</b>	<b>% 28,4</b>
	AB Hibesi		224.570.000	30.788.000	64.186.000	18.217.288	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		15.854.000	2.174.000	4.531.000	1.285.926	
	Mahalli İdare Katkısı		23.780.000	3.260.000	6.797.000	1.928.889	
Alt proje-12	<b>Sivas Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>223.094.000</b>	<b>44.969.000</b>	<b>100.771.000</b>	<b>21.818.020</b>	<b>% 21,7</b>
	AB Hibesi		189.625.000	38.222.000	85.654.000	18.545.317	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		13.388.000	2.699.000	6.047.000	1.309.081	
	Mahalli İdare Katkısı		20.081.000	4.048.000	9.070.000	1.963.622	
Alt proje-13	<b>Sorgun Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>83.490.000</b>	<b>11.794.000</b>	<b>58.341.000</b>	<b>14.144.661</b>	<b>% 24,2</b>
	AB Hibesi		70.963.000	10.024.000	49.589.000	12.022.961	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.011.000	708.000	3.501.000	848.680	
	Mahalli İdare Katkısı		7.516.000	1.062.000	5.251.000	1.273.019	
Alt proje-14	<b>Şırnak Su ve Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>77.471.000</b>	<b>38.756.000</b>	<b>20.931.000</b>	<b>25.385.497</b>	<b>% 121,3</b>
	AB Hibesi		65.898.000	32.992.000	17.791.000	21.577.673	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.208.000	2.594.000	1.413.000	1.713.521	
	Mahalli İdare Katkısı		6.365.000	3.170.000	1.727.000	2.094.304	
Alt proje-15	<b>Trabzon Su Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>151.283.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>44.120.000</b>	<b>17.443.908</b>	<b>% 39,5</b>
	AB Hibesi		128.587.000	28.900.000	37.501.000	14.827.322	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		9.079.000	2.040.000	2.648.000	1.046.634	
	Mahalli İdare Katkısı		13.617.000	3.060.000	3.971.000	1.569.952	
Alt proje-16	<b>Yüksekova Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2023</b>	<b>85.459.000</b>	<b>16.615.000</b>	<b>32.174.000</b>	<b>1.167.092</b>	<b>% 3,6</b>
	AB Hibesi		72.636.000	14.122.000	27.347.000	992.033	
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		5.771.000	1.122.000	2.172.000	78.779	
	Mahalli İdare Katkısı		7.052.000	1.371.000	2.655.000	96.279	
Alt proje-17	<b>Suluova Entegre Su Tesisi</b>	<b>2020-2025</b>	<b>118.132.000</b>	<b>0</b>	<b>44.560.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		92.457.000	0	37.875.000		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		7.344.000	0	3.008.000		
	Mahalli İdare Katkısı		18.331.000	0	3.677.000		
Alt proje-18	<b>Doğubayazıt Atıksu Tesisi</b>	<b>2019-2025</b>	<b>197.522.000</b>	<b>0</b>	<b>80.915.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		167.890.000	0	68.777.000		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		13.335.000	0	5.462.000		
	Mahalli İdare Katkısı		16.297.000	0	6.676.000		
Alt proje-19	<b>Aksaray Entegre Su Projesi</b>	<b>2021-2025</b>	<b>262.150.000</b>	<b>0</b>	<b>107.390.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>
	AB Hibesi		183.501.000	0	75.172.000		
	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hibesi		35.392.000	0	14.498.000		
	Mahalli İdare Katkısı		43.257.000	0	17.720.000		

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021F00-164396	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2021-2021	351.000		351.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2021-2021	1.000		1.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Uzungöl ÖÇKB Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme Projesi Temini	2021-2021	180.000		180.000	0	% 0,0	Projeye ait sözleşme imzalanmış olup iş kabul aşamasındadır.
	Salsala Koyu Çevre Düzenleme Projesi Temini	2021-2021	170.000		170.000	0	% 0,0	Projeye ait sözleşme imzalanmış olup iş devam etmektedir.
2018F00-67925	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulamaları (Turizm Sektörü)	2018-2021	9.900.000	5.800.000	4.100.000	2.000.000	% 48,8	*Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (Ayazini Etabı-Afyonkarahisar) Yapım İş (Karşılama Merkezi) işine ait 2021 yılı ödeneği olan 1.000.000,00 TL ödenek Afyonkarahisar İl Özel İdaresine aktarılmıştır. * Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi Ayazini Mevki (Afyonkarahisar/İhsaniye) Karşılama Merkezi Çevre Düzenleme Projesi için Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ile 1.000.000,00 TL ödenek Afyonkarahisar İl Özel İdaresine aktarılmıştır.
2020F00-147602	Korunan Alanlarda Bisiklet Yolu Yapımı Pilot Çalışması (Turizm Sektörü)	2020-2021	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	% 0,0	Kaş (Ova-Kınık Mahalleleri Arası) Bisiklet Yolu 2.Etap Yapım İş için Kaş Belediye Başkanlığı ile 3.000.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci Kaş Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.
2020F00-155262	Tarihi Obruk Han Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2020-2021	7.000.000	3.000.000	4.000.000	0	% 0,0	Karatay Belediye Başkanlığı ile imzalanan mali katkı protokolü çerçevesinde 2020 yılında Tarihi Obruk Han Çevre Düzenleme projesi için Döner Sermaye İşletmesi ödeneğinden 3.000.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 2021 yılı için 4.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2021F00-172684	Ihlara Vadisi Karşılama Merkezi Yapımı (**.Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2021-2021	9.000.000		9.000.000	0	% 0,0	Protokol Çalışmaları Devam Etmekte.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021F00-161769	Akyaka ve Gökova Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2021	400.000		400.000	0	% 0,0	Akyaka ve Gökova Çevre Düzenlemesi Yapım İşleri için Ula Belediye Başkanlığı ile 400.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup ihale süreci Ula Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.
2021F00-161772	Hafik Gölü Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2022	5.000.000		1.252.000	0	% 0,0	Sivas İl Özel İdaresi Hafik Gölü Çevre Düzenleme Projesi için 2021-2022 yıllarını kapsayan mali katkı protokolü imzalanmıştır. Sivas İl Özel İdaresince yürütülen işin ihale süreci devam etmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2022	9.000.000		6.000.000	0	% 0,0	Ortaca (Muğla) Belediye Başkanlığı ile Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme Projesi için 2021-2022 yıllarını kapsayan mali katkı protokolü imzalanmıştır. Ortaca Belediye Başkanlığı yürütülen işin ihale süreci devam etmektedir.
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2023	28.000.000	12.582.000	6.206.000	4.000.000	% 64,5	
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2023	14.838.000	5.800.000	3.206.000	1.000.000	% 31,2	*Çamlıhemşin (Rize) Belediye Başkanlığı ile Çamlıhemşin (Rize) Belediyesi Kavak ve Sırt Mahalleleri İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Yapım İşleri için 1.500.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmıştır. Çamlıhemşin Belediye Başkanlığınca işin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir. *Budur İl Özel İdaresi ile Salda ÖÇKB Köyleri (Burdur) Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşleri için 1.000.000,00 TL'si bu kalemden (toplamda 4.000.000,00 TL) mali katkı protokolü imzalanarak ödenek aktarılmıştır. *Yeşilova (Burdur) Belediye Başkanlığı ile Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşleri için 300.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmıştır. Yeşilova Belediye Başkanlığı yürütülen işin ihale süreci devam etmektedir.
	ÖÇK Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2023	10.027.000	3.647.000	3.000.000	3.000.000	% 100,0	*Budur İl Özel İdaresi ile Salda ÖÇKB Köyleri (Burdur) Muhtelif İçmesuyu Ekipmanı Mal Alımı İşleri için 3.000.000,00 TL'si bu kalemden (toplamda 4.000.000,00 TL) mali katkı protokolü imzalanarak ödenek aktarılmıştır.



**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (*.*.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2022	15.000.000		12.000.000	8.337.129	% 69,5	
	Cihanbeyli ve Kulu İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisleri	2021-2022	14.999.000		11.999.000	8.337.129	% 69,5	Konya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Konya İli Cihanbeyli İlçesi Merkez ve Gölyazı Mahalleleri İle Kulu İlçesi Ömeranlı ve Tuzyaka Mahallelerinde 4 Adet Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi için 2021 yılı mali katkı protokolü imzalanmıştır. İmalat çalışmaları devam etmektedir.
	Marmaris Kanalizasyon Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	2021-2021	1.000		1.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	11.300.000	6.800.000	4.500.000	1.322.442	% 29,4	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2021	2.500.000	1.500.000	1.000.000	421.850	% 42,2	Muğla ili, Marmaris İlçesi Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Hisarönü, Bayır ve Taşlıca Mahalleleri ile Datça İlçesi Kızlan Mahallesi, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı Hakedişi yapılmıştır. 217.120,00 TL (KDV Dahil) Konya ili, Cihanbeyli İlçesi Pınarbaşı/Kulmaç, İnsuyu/Uzuncayayla, Taşpınar/Aydınlık2 ve Taşpınar/Çandır Mahallelerinde, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı ihalesi hakedişi yapılmıştır. 70.800,00 TL (KDV Dahil) Salda Gölü Bisiklet Yolu Halihazır Harita Yapım İşİ için 133.930,00 TL (KDV Dahil) Aksaray ili, Sultanhanı İlçesinde Bakanlığımızca yapılacak planlama çalışmalarına altlık teşkil edecek 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Halihazır Harita Alımı işi Hakediş yapılmış olup Ekim ayında 97.350,00 TL (KDV Dahil) ödeme gerçekleştirilmiştir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2021	5.965.000	3.965.000	2.000.000	468.224	% 23,4	Proje kapsamında 20 adet iş devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*: 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2021	735.000	235.000	500.000	82.368	% 16,5	Proje kapsamında 5 adet iş devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*: 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2021	2.100.000	1.100.000	1.000.000	350.000	% 35,0	Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi C.65 düzenleme sınırı olarak ilan edilen yaklaşık 155 ha.'lık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre İmar Uygulaması yapımı işine ait 385.000 TL mali katkı protokolü imzalanmıştır. 350.000 TL Ödeme Gerçekleştirildi.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulamaları	2021-2023	3.000.000		2.500.000	0	% 0,0	
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2021	800.000		800.000	0	% 0,0	Proje ODTÜ ile yapılacak protokol kapsamında gerçekleştirilecek olup hazırlık çalışması devam etmektedir.
	Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2021	800.000		800.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlık çalışması devam etmektedir.
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yaşayan Sürüngenlerin Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması, İzlenmesi	2021-2023	1.400.000		900.000	0	% 0,0	İhale sürecindedir
2011K10-1460	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (Çevre Sektörü)	2011-2021	4.196.000	3.121.000	1.075.000	456.778	% 42,5	
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	1.111.000	994.000	117.000	80.122	% 68,5	Ön rapor ödeme sürecindedir
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	758.000	641.000	117.000	79.296	% 67,8	Ön rapor ödeme sürecindedir
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2021	814.000	697.000	117.000	78.470	% 67,1	Ön rapor ödeme sürecindedir

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2016-2021	827.000	427.000	400.000	0	% 0,0	Ön rapor ödeme sürecindedir
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2016-2021	262.000	172.000	90.000	59.472	% 66,1	Proje başladı devam etmektedir.
	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2020-2021	212.000	95.000	117.000	80.122	% 68,5	Ön rapor ödeme sürecindedir
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2020-2021	212.000	95.000	117.000	79.296	% 67,8	Ön rapor ödeme sürecindedir
2014K10-2121	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi (Çevre Sektörü)	2014-2022	141.238.000	91.238.000	40.000.000	15.000.000	% 37,5	15.000.000,00 ödenek aktarılmıştır.
2016K10-150495	İklim Değişikliği Kapasite Geliştirme ve Uyum (Çevre Yönetimi-TVK Ortak Proje) (Çevre Sektörü)							2 proje birleştirilmiştir. İHALE AŞAMASINDA.
Alt proje-1	İklim Değişikliğinin Ekosistem Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması	2021-2023	3.500.000		1.225.000	0	% 0,0	Projenin Açık ihale ile yapılması hususunda Genel Müdürlük OLUR'u alınmış olup teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır. İhale süreci başlatılmıştır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2022	2.524.000	825.000	950.000	128.502	% 13,5	
	Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme	2017-2022	2.075.000	825.000	650.000	0	% 0,0	Projelerle ilgili ihaleler gerçekleştirilmekte olup süreç devam etmektedir.
	Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İlleri Değerlendirme	2020-2022	449.000	0	300.000	128.502	% 42,8	Projeye ait ilk ödeme yapılmış olup (%30) kalan kısım proje bitiminde ödenecektir.
2019K10-90489	Kızılırmak Deltası Araştırma (Çevre Sektörü)	2019-2023	924.000	162.000	338.000	64.664	% 19,1	Projenin 4.Ara Raporu teslim edilmiş olup, işin % 70 lik kısmı tamamlanmıştır. Yıl sonu itibariyle Projenin % 100 ü tamamlanmış olacak. 600.000,00 TL bütçeli OTLATMA PROJESİ kısmı için ihale yapıldı, sözleşme imzalanma aşamasında.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2023	5.007.000	92.000	1.628.000	146.143	% 9,0	
	Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel ve Karasal Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2023	4.007.000	92.000	1.348.000	68.499	% 5,1	Projenin KARASAL Biyolojik Çeşitlilik Araştırma kısmı için 2.Ara Rapor teslim edilmiş olup % 35 lik kısmı tamamlanmıştır. 3.550.000. TL Bütçeli DENİZEL Kısmı için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile 4734 sayılı K.İ.K. 3-f maddesi gereği 2.800.000 TL+KDV PROTOKOL imzalanmış olup; 29.10.2021 tarihi itibariyle proje çalışmalarına başlanılmıştır.
	Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırması	2020-2022	400.000	0	160.000	77.644	% 48,5	Projede 1.Ara Rapor sunulmuş olup % 20 lik ilk ödeme dilimi yapılmıştır.
	Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırması	2021-2023	600.000		120.000	0	% 0,0	Sözleşmesi 2021 Haziran ayında imzalanmış ve işe başlanılmıştır.

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161740	Anıt Ağaçların Budanması ve Rehabilitasyonu (** Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2021-2021	350.000		350.000	304.440	% 87,0	Proje tamamlanmış ödemesi yapılmıştır.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2022	1.000.000		405.000	0	% 0,0	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2022	650.000		300.000	0	% 0,0	İhalesi yapıldı.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2021-2022	350.000		105.000	0	% 0,0	İhale sürecindedir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2021-2023			3.000.000	0	% 0,0	
<b>17 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>237.340.000</b>	<b>125.620.000</b>	<b>47.930.000</b>	<b>8.118.529</b>	<b>% 16,9</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>24.350.000</b>	<b>0</b>	<b>21.350.000</b>	<b>8.641.569</b>	<b>% 40,5</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>261.690.000</b>	<b>125.620.000</b>	<b>69.280.000</b>	<b>16.760.098</b>	<b>% 24,2</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2021	5.530.000	5.100.000	430.000	0	% 0,0	
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	9.339.000	2.000.000	1.070.000	91.568	% 8,6	Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile imzalanan 388.000,00-TL + KDV değerindeki protokol kapsamında " Belediyeler İçin Hizmet Önceliklendirme Rehberi Geliştirme Projesi işinin %20 oranındaki ödemesi.
2021K07-160009	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 199) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2021-2021	1.604.308.000		1.604.308.000	514.464.938	% 32,1	1.604.308.000 TL Ödeneğin ilk yarısı olan 802.154.000 TL 31 Mayıs 2021 tarihinde İLBANK KÖYDES hesaplarına aktarılmış olup kalan 802.154.000 TL'nin aktarılması beklenmektedir.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.619.177.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>91.568</b>	<b>% 6,1</b>	

Dipnot: 199

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

## MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K01-140379	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2021-2021	3.000.000		3.000.000		% 0,0	
	Harita Alımları	2021-2021	100.000		100.000		% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2021-2021	100.000		100.000		% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2021-2021	2.800.000		2.800.000		% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2021-2021			54.742.000	53.636.397	% 98,0	3.242.000,00.-'e toplam ödenğin tamamı serbest bırakılmış, 51.500.000,00.-'e ödenek eklenmiş toplam 54.742.000,00.-'e ödenekten 53.636.397,32.-'si gönderilmiş olup, 1.105.602,68.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2021-2021			9.300.000	9.300.000	% 100,0	9.300.000,00.-'i ödenek eklenmiş ödenğin tamamı harcanmıştır.
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.042.000</b>	<b>62.936.397</b>	<b>% 98,3</b>	



## STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2024	153.514.000	203.000	2.005.000	248.141	% 12,4	
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2017-2024	41.770.000	0	5.000	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*Döner Sermaye)	2020-2021	1.203.000	203.000	1.000.000	248.141	% 24,8	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*Döner Sermaye)	2021-2023	15.335.000	0	1.000.000	0	% 0,0	İhaleye ilişkin işlemler il müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
2021K09-161848	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2021-2021	4.400.000		4.400.000	3.276.000	% 74,5	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Hizmet Binası Onarımı	2021-2021	4.600.000		4.600.000	2.840.000	% 61,7	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
	Taşıt Alımı (**.Döner Sermaye)	2021-2021	1.200.000		1.200.000	0	% 0,0	3 adet "T05-Minibüs" tipi taşıtın edinilmesine ilişkin 09.03.2021 tarihli ve 3594 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı alınmıştır. DMO üzerinden alım işlemleri devam etmektedir. Taşıtlar; Eskişehir, İstanbul ve Van İl Müdürlüklerine tahsis edilecektir.

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K09-165747	Şehircilik Hizmetleri (Şehirleşme Sektörü)	2021-2021	6.230.000	0	6.230.000	0	% 0,0	Bakanlık tarafından yürütülen diğer projelerde ödeneye ihtiyaç duyulması durumunda bu projeden karşılanacaktır.
	Genel Bütçe Ödeneği	2021-2021	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	
	Döner Sermaye Ödeneği	2021-2021	2.230.000		2.230.000	0	% 0,0	
2021G00-161814	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2021-2021	2.300.000		2.300.000	491.898	% 21,4	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>15.300.000</b>	<b>0</b>	<b>15.300.000</b>	<b>6.607.898</b>	<b>% 43,2</b>	
<b>3 Proje</b>		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>156.944.000</b>	<b>203.000</b>	<b>5.435.000</b>	<b>248.141</b>	<b>% 4,6</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>172.244.000</b>	<b>203.000</b>	<b>20.735.000</b>	<b>6.856.038</b>	<b>% 33,1</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2021 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2021 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2021 30.09.2021 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021G00-161814	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2021-2021	190.000		190.000		% 0,0	
2021K09-161848	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2021-2021	100.000		100.000	63.476	% 63,5	
	Hizmet Binası Onarımı	2021-2021	100.000		100.000		% 0,0	
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>63.476</b>	<b>% 16,3</b>	
