



2024 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

1. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2024 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	11.510.094.000,00	11.740.831.710,94	2.945.224.862,06	% 25,1
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.503.685.000,00	1.551.344.193,12	375.553.856,85	% 24,2
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	725.012.000,00	1.167.268.574,48	196.742.760,75	% 16,9
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	620.268.000,00	1.062.959.574,48	194.925.661,85	% 18,3
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	104.744.000,00	104.309.000,00	1.817.098,90	% 1,7
05	CARİ TRANSFERLER	224.845.034.000,00	224.834.248.402,72	40.246.396.844,70	% 17,9
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	219.740.028.000,00	219.740.028.000,00	39.408.326.000,00	% 17,9
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	1.771.000.000,00	1.771.000.000,00	0,00	% 0,0
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	767.604.000,00	% 27,9
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	356.000.000,00	344.259.000,00	59.343.000,00	% 17,2
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	179.193.000,00	179.193.000,00	0,00	% 0,0
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	46.631.000,00	47.000.402,72	10.163.844,70	% 21,6
	İskan Uygulamaları Ödeneği	1.818.000,00	1.818.000,00	10.000,00	% 0,6
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	364.000,00	950.000,00	950.000,00	% 100,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	14.624.871.000,00	32.245.498.401,59	15.297.710.921,51	% 47,4
	Bakanlık Yatırım Programı	14.337.871.000,00	14.515.129.147,10	884.658.940,65	% 6,1
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	287.000.000,00	287.000.000,00	194.988.493,10	% 67,9
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	16.145.000.000,00	13.457.489.720,56	% 83,4
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	153.000.000,00	80.566.552,29	% 52,7
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	1.145.369.254,49	680.007.214,91	% 59,4
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	18.282.187.000,00	18.282.200.304,50	33.858.222,49	% 0,2
	Bakanlık Yatırım Programı	428.271.000,00	428.271.000,00	6.185.071,01	% 1,4
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	27.673.151,48	% 1,9
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	13.304,50	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	113.916.000,00	113.916.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	0,00	0,00	
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	0,00	0,00	
08	BORÇ VERME	250.500.000,00	250.500.000,00	1.450.000,00	% 0,6
GENEL TOPLAM		271.741.383.000,00	290.071.891.587,35	59.096.937.468,36	% 20,4



BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

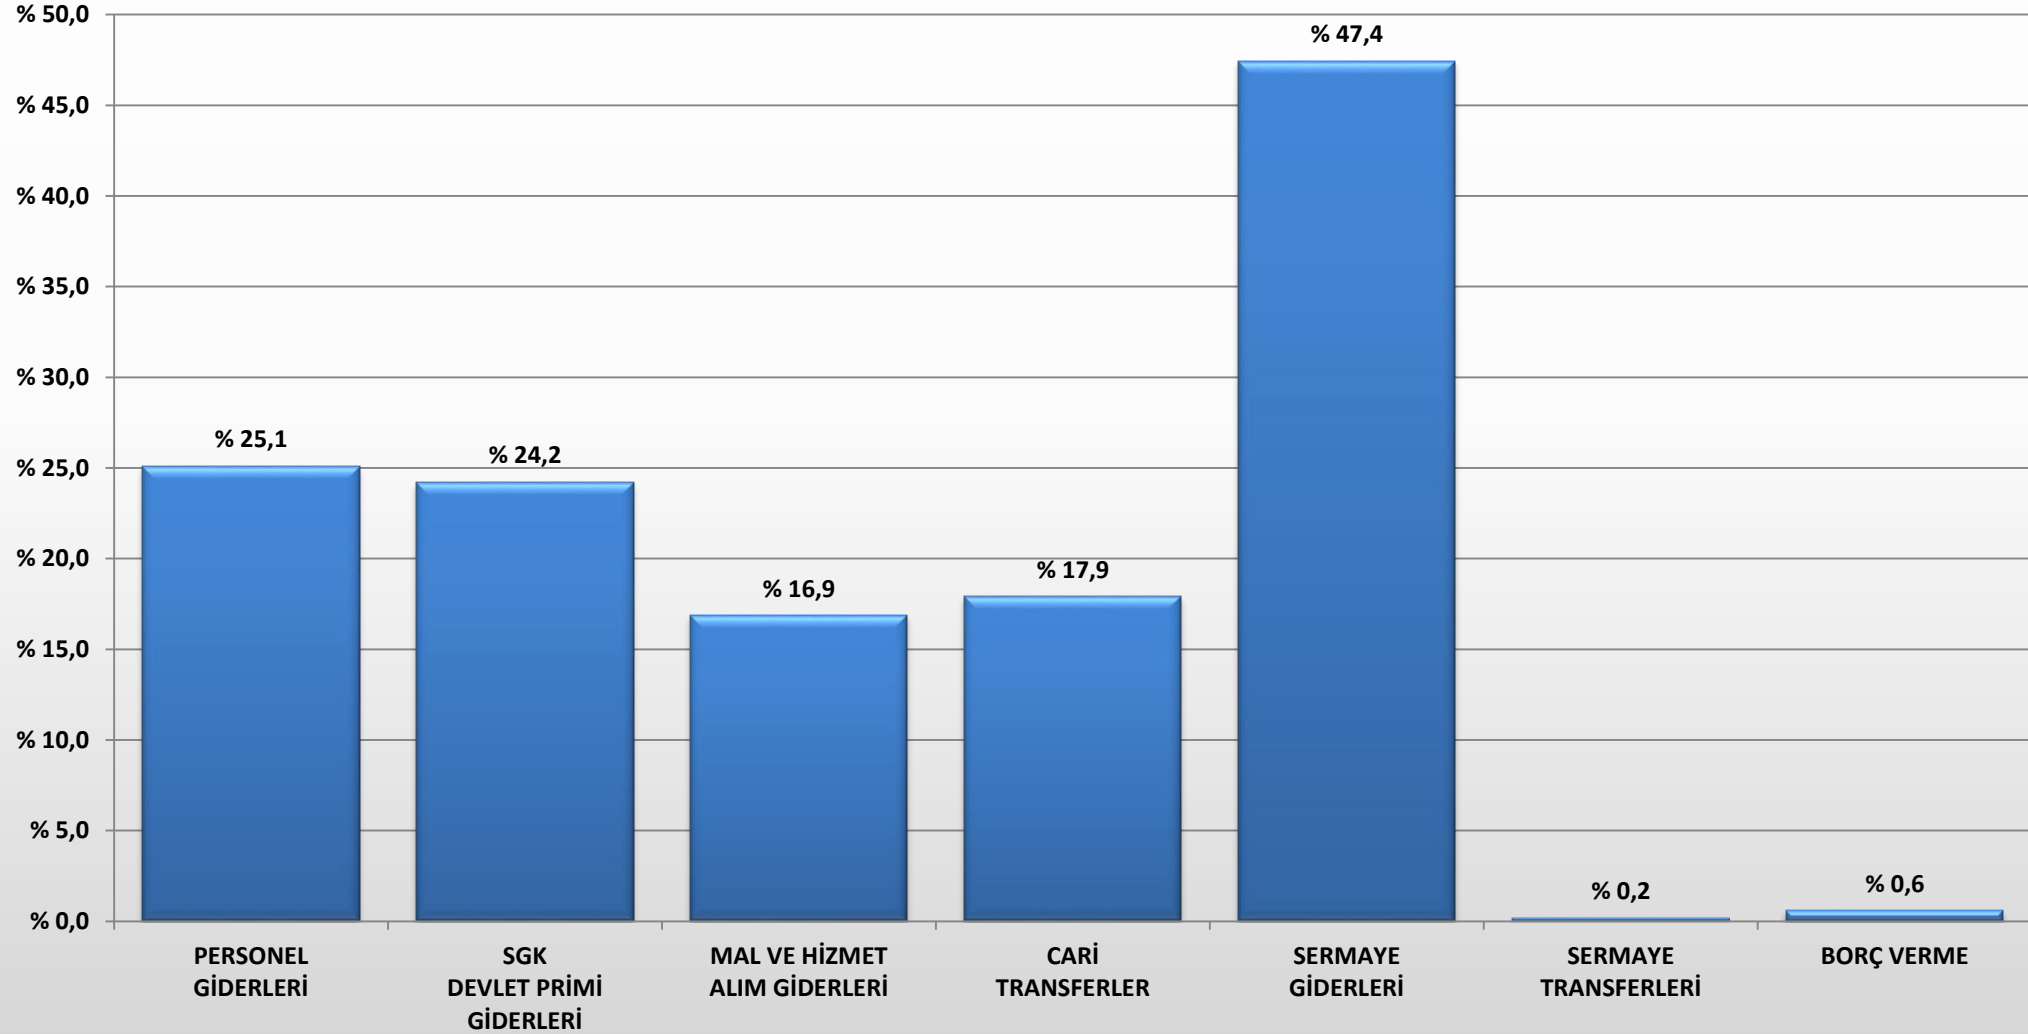




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2024 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2024 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	5	58.206.000,00	36.420.000,00	1.583.990,00	% 4,3
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	13	1.211.183.000,00	210.603.000,00	0,00	% 0,0
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	3	632.160.000,00	262.300.000,00	4.103.973,33	% 1,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	23	51.699.553.000,00	14.189.240.000,00	877.413.998,00	% 6,2
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	7.250.000,00	5.750.000,00	743.655,00	% 12,9
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	19	717.090.000,00	456.500.000,00	12.465.438,00	% 2,7
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	9.183.080.000,00	8.203.000,00	0,00	% 0,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	27	3.228.318.000,00	586.531.000,00	6.185.071,00	% 1,1
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	6.934.646.000,00	5.500.000,00	0,00	% 0,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	29.300.000,00	29.300.000,00	9.000.000,00	% 30,7
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	4	153.650.000,00	37.500.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	196.175.000,00	174.392.000,00	5.597.257,00	% 3,2
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	3	150.300.000,00	80.300.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	97	74.200.911.000,00	16.082.539.000,00	917.093.382,33	% 5,7
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	66	71.555.752.000,00	15.020.642.000,00	893.226.255,33	% 5,9
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	31	2.645.159.000,00	1.061.897.000,00	23.867.127,00	% 2,2
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		287.000.000,00	194.988.493,10	% 67,9



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

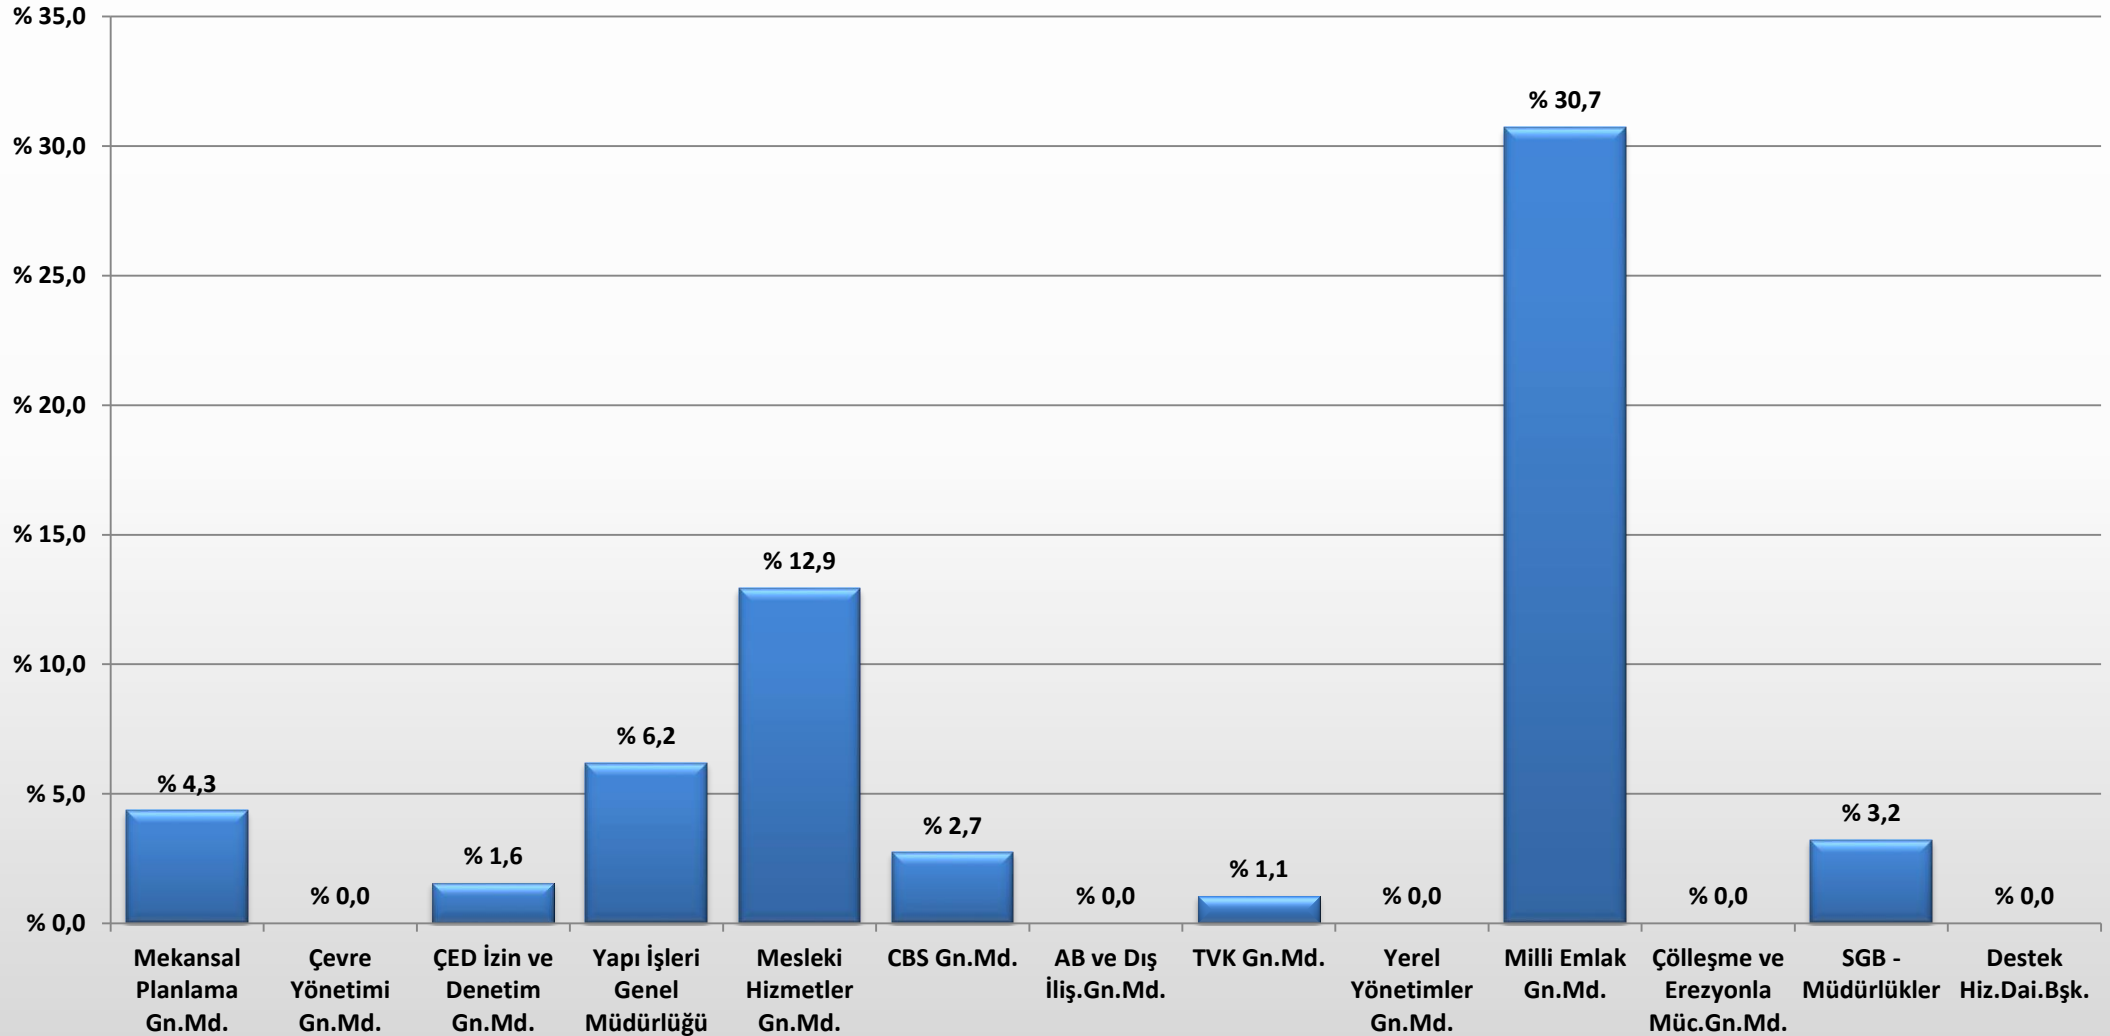



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2024 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	196.686.000,00	196.686.000,00	42.852.935,87	% 21,8
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	6.767.900.000,00	6.767.913.304,50	842.850.773,92	% 12,5
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	616.707.000,00	624.176.045,29	99.256.951,89	% 15,9
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	14.615.447.000,00	31.017.962.030,00	14.706.812.503,67	% 47,4
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	270.000,00	5.814.000,00	5.683.657,40	% 97,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	160.201.000,00	160.201.000,00	40.489.135,51	% 25,3
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	334.306.000,00	334.306.000,00	41.026.178,04	% 12,3
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	275.611.000,00	275.611.000,00	22.485.783,74	% 8,2
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	498.614.000,00	513.090.877,40	48.706.572,66	% 9,5
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	64.031.000,00	64.031.000,00	15.363.285,60	% 24,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	466.763.000,00	472.063.000,00	243.552.530,00	% 51,6
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	135.579.000,00	135.579.000,00	28.133.611,05	% 20,8
Personel Genel Müdürlüğü	66.350.000,00	66.350.000,00	18.181.775,56	% 27,4
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	84.872.000,00	470.872.000,00	173.346.090,70	% 36,8
Özel Kalem Müdürlüğü	94.510.000,00	93.821.000,00	16.299.959,22	% 17,4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	616.808.000,00	687.340.086,82	110.018.270,89	% 16,0
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	20.552.000,00	20.552.000,00	4.995.825,55	% 24,3
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	119.018.000,00	119.053.000,00	30.981.855,39	% 26,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı	236.148.917.000,00	236.137.762.000,00	39.483.429.924,44	% 16,7
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	8.776.000,00	8.776.000,00	2.644.036,36	% 30,1
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	54.199.000,00	54.199.000,00	14.140.450,40	% 26,1
İl Müdürlükleri	10.360.652.000,00	11.811.119.243,34	3.095.637.012,66	% 26,2
Yurtdışı Teşkilatı	34.614.000,00	34.614.000,00	10.048.347,84	% 29,0
TOPLAM	271.741.383.000,00	290.071.891.587,35	59.096.937.468,36	% 20,4



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2024 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

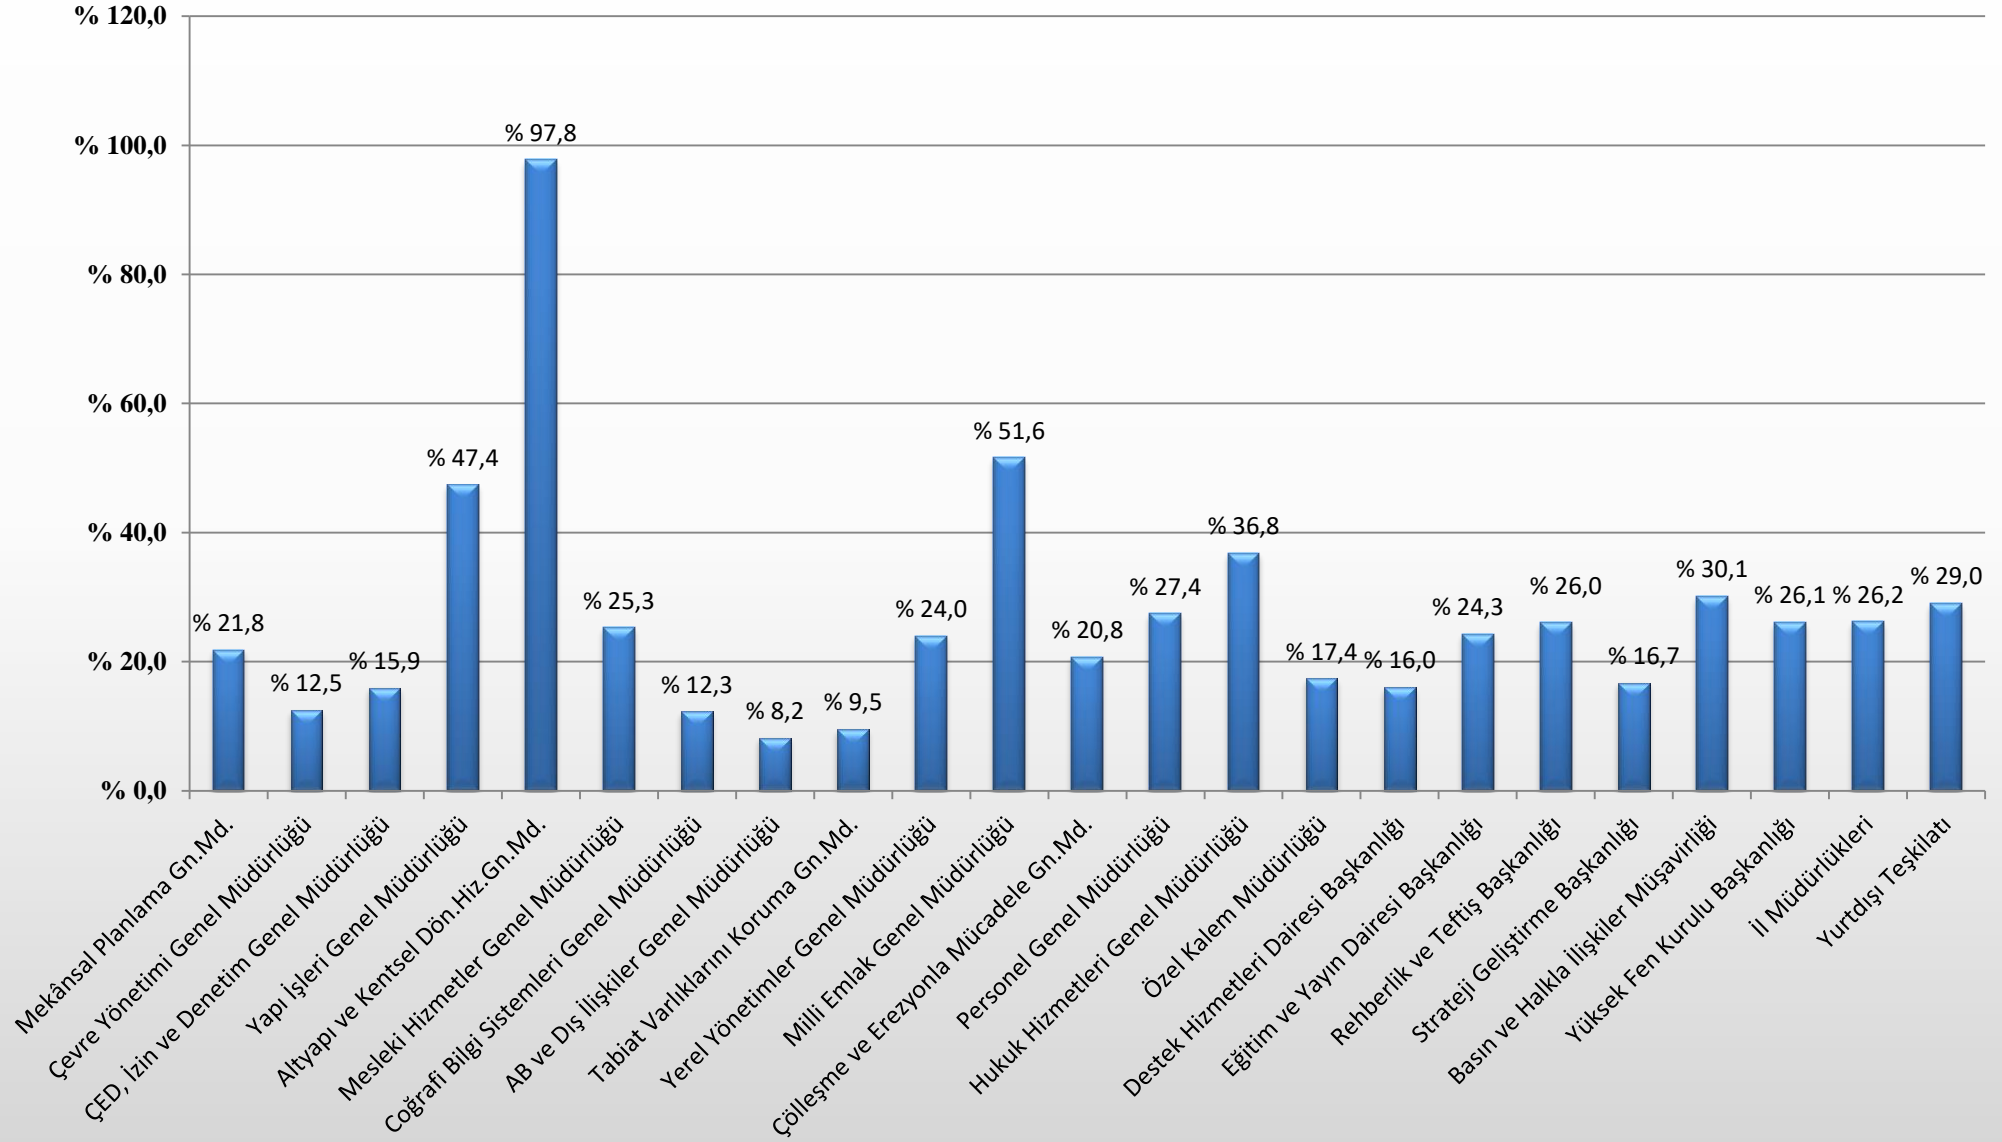

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Harcama Birimi Bazında

2024 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

01 Ocak 2024 – 31 Mart 2024

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2025	28.816.000	9.286.000	17.030.000	1.583.990	% 9,3	
	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2025	19.416.000	3.486.000	13.430.000	1.583.990	% 11,8	<p>Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması, Genel Müdürlüğümüz kontrol ve denetiminde, 1 Mayıs 2018 tarihi itibari ile 81 İl Müdürlüğümüz, Belediyeler ve Özel Sektör tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.</p> <p>İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporu onay sürecine ilişkin tüm iş ve işlemler, kâğıt ortamının yanı sıra eş zamanlı olarak Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması üzerinden de gerçekleştirilmektedir.</p> <p>Tüm veri, harita vb. girişler ve iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı bu sistem üzerinden yürütülmekte olup etüt raporlarına ait sayısal verilerin tamamı ortak bir portal altında depolanmakta ve ilgili paydaş kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.</p> <p>Ayrıca afet tehlikelerinin belirlenmesi ve planlamada dikkate alınmasına ilişkin ihtiyaçlar doğrultusunda verilerin analiz edilebilmesi amacıyla "Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin (YERBİS) Geliştirilmesi ve Afet Tehlikesi Belirleme Sürecinde Veri Analizi" projesi 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmış olup, proje çalışmalarına 11.01.2024 tarihi itibari ile başlamıştır.</p> <p>20.03.2024 tarihinde projenin iş kalemlerine göre %15'lik kısmı tamamlanmış olup, ilk hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Bu kapsamda,</p> <ul style="list-style-type: none">- YERBİS Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Dokümanı hazırlanmış ve- YERBİS uygulaması açık kaynak kodlu (PostgreSQL) olarak yazılmıştır.
	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2024	9.400.000	5.800.000	3.600.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlıklarında son noktaya gelinmiş olup piyasa araştırmasına çıkılacaktır.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2025	18.000.000	1.000.000	12.000.000	0	% 0,0	2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan "Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi- Etap 1" projesi ile 3 yerleşim alanında/bölgede yer alan aktif fay zonları 1/1.000 ölçekte haritalanacak, fay sakınım zonları belirlenerek Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS) üzerinden ilgili kurum/kuruluşların kullanımına açılacaktır. 2023 yılında projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet belirlenebilmesi için müellif firmalardan teklif mektupları alınarak ihale süreci başlatılmış ancak bütçe yetersizliği nedeniyle ihale süreci tamamlanamamıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe talebinde bulunulmuştur. Arttırılan bütçe ile yeniden teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır.
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2025	6.390.000	1.000.000	4.890.000	0	% 0,0	Projeye ilişkin yılın 3 ayında herhangi bir harcama yapılmamış olup, örnek imar uygulamalarının yapıldığı Adana, Trabzon, Çankırı ve Ardahan İllerinde dosya kontrolü işlemi devam etmektedir.Bolu İlinde ise askı işreci devam etmektedir.
	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2025	6.390.000	1.000.000	4.890.000	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	3.000.000		1.500.000	0	% 0,0	Proje'ye ilişkin şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Proje maliyetlerinde artışlara bağlı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığından ek bütçe istenmiş olmasından dolayı ek bütçe verilmesi durumunda ihale sürecine 2024 yılının ikinci yarısında başlanılması öngörülmektedir.
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	2.000.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje'ye ilişkin şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Proje maliyetlerinde artışlara bağlı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığından ek bütçe istenmiş olmasından dolayı ek bütçe verilmesi durumunda ihale sürecine 2024 yılının ikinci yarısında başlanılması öngörülmektedir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	53.206.000	11.286.000	33.920.000	1.583.990	% 4,7	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	5.000.000	0	2.500.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	58.206.000	11.286.000	36.420.000	1.583.990	% 4,3	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	25.000.000		3.000.000	0	% 0,0	2024 yılı Yatırım Programında yer alan Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Ulusal Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	50.000.000		15.000.000	0	% 0,0	2024 yılı Yatırım Programında yer alan Türkiye'nin Endüstriyel Atıksu Profiline Belirlenmesi Projesinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2026	808.998.000	265.000.000	150.000.000	0	% 0,0	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 17/05/2017 tarihinde yatırım programına alınan projenin 40 Milyon TL tutarındaki 2018 yılı, 50 milyon TL olan 2019 yılı, 50 milyon TL olan 2020 yılı ödenekleri İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne aktarılmış 2021 yılı ödeneğinden harcama yapılmamıştır. 2022 yılı ödeneğinden hakediş kapsamında 49.953.569 TL, 2023 yılı ödeneğinden 157.584.504 TL harcama yapılmıştır. 2024 yılı yatırım programında 150 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 2024 yılı KAP detay liste Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 28/3/2024 tarihli yazı ile onaylanmıştır. Bu nedenle yılın ilk çeyreğinde herhangi bir harcama gerçekleştirilememiştir.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2025	4.000.000	500.000	2.000.000	0	% 0,0	Proje bütçesi dikkate alındığında 2022 yılı içerisinde artan maliyetler nedeniyle proje gerçekleştirilememiş olup 2023 yılı yatırım programına proje bütçesinde revize yapılarak başvurulmuştur. Bütçe 4milyon TL olarak süresi 2023-2025 olarak revize edilmiştir. Teknik şartname çalışmaları devam etmektedir.
2022K10-181860	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti (Çevre Sektörü)	2022-2024	10.121.000	6.721.000	3.400.000	0	% 0,0	TURKSAT ile yürütülmekte olan proje kapsamında, şehirlerin 3 boyutlu hava kalitesi haritalarına esas veri işleme, veri üretimi, analiz ve geliştirme çalışmalarını, web arayüzünün işlemleri ve şartname kapsamında belirlenen iş paketlerine ait faaliyetler iş planı çerçevesinde sürdürülmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2024	12.220.000	6.110.000	6.110.000	0	% 0,0	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında 07.09.2023 tarihinde İstanbul'da kamu kurum temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile Proje Açılış Toplantısı düzenlenmiştir. 2023 yılında protokol kapsamında 3.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü Çalıştayı, 1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da kamu, akademi, dernek ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Çalıştayı 05.01.2024 tarihinde Ankara'da kamu, akademi, dernek ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 07.03.2024 tarihinde Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Raporları sunulmuş olup revizyon için Bakanlık tarafından görüşler iletilmiştir.
2023K10-198444	Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2024	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	% 0,0	Proje çalışmaları kapsamında 06-08 Mart 2024 tarihleri arasında Mavi Ekonomi ve Deniz Saha Planlaması Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir. 95. Büro Toplantısına hazırlık çalışmaları ile İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezinin aktif hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)	2018-2026	9.500.000	0	3.500.000			
	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2026	9.500.000	0	3.500.000	0	% 0,0	Mâli nedenlerden dolayı Kamu Hizmet Sunucusu olarak üniversite (ODTÜ) ile protokol imzalanamamış olup, bahse konu Ar-Ge projesinin 10/05/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 2014/6228 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında belirlenecek yeni yüklenici ile protokol imzalanacaktır. Projeye ilişkin protokolün nihai hali çalışılmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2025	14.466.000	5.046.000	5.920.000		% 0,0	
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2025	5.500.000	0	2.000.000	0	% 0,0	Projenin 3f kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmış olup, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden teklif istenmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi bütçenin üstünde 4.500.000 tl fiyat teklifinde bulunmuştur. Proje bütçesinin arttırılması talep edilmiştir. 2024 yılı bütçe teklifinde proje tutarı 5.500.000 tl olarak yer almaktadır. Projenin TÜBİTAK ile gerçekleştirilmesi için görüşmeler devam etmektedir. Projenin 2024 yılında başlatılması planlanmaktadır.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-2	2022-2024	8.966.000	5.046.000	3.920.000	0	% 0,0	İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmekte olan projede şartname kapsamında yazılıma esas geliştirme, iyileştirme analizleri, emisyon envanteri ve veri işleme, güncelleme, raporlama, modelleme, tahminleme ile birlikte araştırma-geliştirme süreçlerine esas faaliyetler iş planı çerçevesinde sürdürülmektedir.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2026	15.209.000	5.119.000	2.545.000	0	% 0,0	8/11/2022 tarihinde, Bakanlığımız ile TÜRKSAT Uydular Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında yapılan sözleşme ile başlayan projenin ilk hakedişi 2022 yılı 4. çeyreğinde yapılmıştır. Projenin 2023 yılı 3. döneminde, Teknik Şartname kapsamında hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan Kıyı Tesisleri ve Plan Analizleri Raporuna ilişkin 793.000 ₺ olan (KDV hariç) 2. hakediş ödemesi yapılmış olup 900.000 ₺ (KDV hariç) olan 3. Hakediş ödemesi ise yüklenici kaynaklı rapor teslimlerinde yaşanan gecikme nedeniyle emanete alınmıştır.2024 yılı birinci çeyreğinde zarar tespit ve tazmine ilişkin çalışmalarına ilişkin klavuz dokümanların hazırlanmasına başlamış olup, bu çalışmaya devam edilecektir. Diğer taraftan; Projenin güncel yazılım teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla ikinci fazı olarak coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulması planlanmakta olup, bu kapsamda devam eden proje bütçesine ilave edilen 8.000.000 ₺'lik bütçe ile toplam proje bütçesi 15.000.000 ₺'ye yükseltilmiştir. Söz konusu projenin ikinci fazı için alınan yaklaşık maliyet teklifi proje bütçesinden fazla olduğundan CBS tabanlı bir bilgi sisteminin oluşturulmasına ilişkin ihale süreci tamamlanamamış ve ilave edilen 8.000.000 ₺'lik bütçenin 2023 yılı içinde kullanılması gereken 5.000.000 ₺'lik miktarı kullanılamamıştır.Bu kapsamda söz konusu ikinci fazın gerçekleştirilmesine yönelik yeniden yaklaşık maliyet teklifi alınmasına ilişkin çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (Çevre Sektörü)	2023-2025	10.646.000	3.526.000	3.560.000	0	% 0,0	Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon Projesi TÜRKSAT ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında 07.04.2023 tarihinde imzalanmıştır. Proje süresi 27 ay olup 30.06.2025 tarihinde sona erecektir. Sözleşme çerçevesinde yazılım destek ve yazılım modernizasyon çalışmalarını yürütmek için gereken planlamaları, kullanılacak yöntemleri, her bir faaliyet için takip edilecek yolları, proje takvimi yönetimi, organizasyonu ve kaynakları içeren Proje Yönetim Planı hazırlanmış olup, planda belirtilen takvime göre çalışmalar yürütülmektedir. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyonu Yazılım Geliştirme Çalışmalarının 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
2018K10-18341	Kalıcı Organik Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi (AB-1) (Çevre Sektörü)	2018-2024	13.050.000	7.080.000	5.970.000	0	% 0,0	2024 yılı 1. çeyrekte; Proje'nin İnşaat Bileşeni iptaline yönelik paydaşlar ile ortak karar alınmış olup, ikinci zeyilname ile bu karar uygulamaya alınmıştır. Takip eden aylarda Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle, Bakanlık personelinin iş yoğunluğu ve seyahat sıklığı artmıştır. Proje faaliyetlerinin zamanında tamamlanması ve kaliteli çıktılara ulaşılması için proje paydaşlarının ortak kararı ile üçüncü Zeyilname onaylanmıştır. Proje'de 4 aylık bir süre uzatımı yapılmış olup, kapanış tarihi 8 Ağustos 2024 olarak güncellenmiştir. Projenin kalan faaliyetlerinin bu süre zarfında uygulanması hedeflenmiştir. Üçüncü zeyilname ile KSBS yazılımına yeni bir modül entegre edilecektir. Bu sayede yazılımın KOK'ların daha iyi yönetilmesi için ihtiyaçlara cevap vermesi hedeflenmiştir. 4-8 Mart 2024 tarihleri arasında Hollanda'ya üçüncü çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Bu ziyarette KOK'larla kirlenmiş sahaların yönetimine ve yasal çerçevelere ilişkin bilgi paylaşımı yapılmıştır. KSBS yazılımı ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Eğitimleri tamamlanmıştır. Ankara'da bir günlük Yaygınlaştırma Semineri düzenlenmiş ve farklı sektörlerden, akredite firmalardan, üniversitelerden temsilcilere mevcut durum aktarılmıştır.
AB katkısı			73.950.000	40.121.000	33.829.000	0	% 0,0	
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	24.004.000	10.351.000	7.598.000	0	% 0,0	Proje kapsamında; "Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek" projesi 07.02.2022 tarihinde resmi olarak başlamıştır. "Türkiye'de End of Waste (Atık Sonu) Konseptinin Geliştirilmesi Projesi" 25.04.2023 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
AB katkısı			136.019.000	58.657.000	43.055.000	0	% 0,0	
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	922.214.000	309.453.000	190.603.000	0	% 0,0	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	79.000.000	2.000.000	20.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	1.001.214.000	311.453.000	210.603.000	0	% 0,0	
		AB KATRISI	209.969.000	98.778.000	76.884.000	0	% 0,0	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)							
Alt proje-1	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2025	466.200.000	220.000.000	122.100.000	4.103.973	% 3,4	Merkezde, 3 adet Mobil hava kalitesi ölçüm aracı ve Ulusal Hava Kalitesi Kalibrasyon Laboratuvarının bakım, onarım ve kalibrasyon işi hakedişi ile 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce bölgesel olarak İstasyonların Bakım-Onarımı hakediş ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 2024 yılı için de Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakım, Onarım işine ait ihale süreci başlamıştır.
	Genel Bütçe Ödeneği		258.200.000	133.000.000	62.100.000	4.103.973	% 6,6	İhale süreci başlamıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		208.000.000	87.000.000	60.000.000	0	% 0,0	Hava kalitesi izleme istasyonlarının kurulumu için gerekli şartname hazırlanmış olup, yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları devam etmektedir. İhale yapılmasının ardından istasyon kurulumları gerçekleştirilecektir.
Alt proje-2	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi	2024-2024	120.000.000		120.000.000	0	% 0,0	Piyasa fiyat araştırması çalışmaları devam etmektedir.
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2026	13.160.000	1.558.000	3.000.000	0	% 0,0	Projemiz dipnotlu olarak onaylanmıştır. Ancak onaylanan bütçe belirlenen tutar altında kaldığından fizibilite raporu gerektirmediğine dair dipnotun kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın yazısı beklenmektedir.
2023K10-198443	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3 (*Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2024-2025	32.800.000		17.200.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	391.360.000	134.558.000	185.100.000	4.103.973	% 2,2	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	240.800.000	87.000.000	77.200.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	632.160.000	221.558.000	262.300.000	4.103.973	% 1,6	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2025	7.295.458.000	4.139.147.000	1.916.311.000	609.159.976	% 31,8	İhale Süreçleri devam etmektedir. İlk çeyrek harcaması toplamı 609.159.976,20 TL olarak gerçekleşmiştir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2025	7.218.198.000	4.068.687.000	1.909.511.000	608.410.953	% 31,9	
	Hibe Ödeneği	2019-2025	77.260.000	70.460.000	6.800.000	749.023	% 11,0	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	9.344.660.000	19.884.000	1.037.719.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	9.197.500.000	10.400.000	994.719.000	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	147.160.000	9.484.000	43.000.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2028	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2028	0	0	0	0		
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2028	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2 (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2024-2029	11.038.290.000		20.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	7.709.000.000	104.520.000	5.963.100.000	191.595.516	% 3,2	Danışmanlık ödemeleri ve mal alımı yapılmıştır.
2024G00-224663	Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA) (Konut Sektörü)	2024-2025	6.622.200.000		3.658.400.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
	JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2024-2025	5.518.500.000		3.048.900.000	0		
	Genel Bütçe Ödeneği	2024-2025	1.103.700.000		609.500.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2024-2026	1.500.000.000		500.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı	2024-2026	1.200.000.000		490.000.000	0		
	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat	2024-2026	300.000.000		10.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
	Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Döner Sermaye)	2021-2024	77.000.000	61.500.000	15.500.000	11.401.689	% 73,6	Bina kaba inşaatı tamamlandı. İnce inşaatı için iç duvar boyaları, asma tavan kaplamaları ve çevre duvarı yapımı devam etmektedir. İç mekana ait doğramalar kısmen bitmiştir.
	Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2024	78.218.000	50.000.000	28.218.000	12.268.235	% 43,5	Betonarme imalatlar tamamlandı. Çelik çatı imalatları ve bodrum, zemin ve 1. kata ait iç sıva imalatları devam etmektedir.
	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	İhale talimatı Bakanlıktan istendi. Bina yapımı arsa karşılığı olarak yapılmasından vazgeçildiği İl Müdürlüğü tarafından bildirildi..
	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2024	46.476.000	26.800.000	19.676.000	0	% 0,0	Bina kaba inşaatı tamamlandı. İnce inşaatı için iç ve dış kaplamalar, tesisat işleri tamamlandı. Çevre düzenlemesi devam etmektedir.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	Projesi tamamlandı. Henüz inşaatı başlanmadı.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	5.409.500.000	51.075.000	457.090.000	34.811.681	% 7,6	Saha malzemesi ve danışmanlık ödemesi yapılmıştır.
	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	1.004.900.000	34.175.000	195.615.000	34.811.681	% 17,8	
	Hibe Ödeneği	2021-2027	19.500.000	3.900.000	15.600.000	0	% 0,0	
	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2023-2026	4.385.100.000	13.000.000	245.875.000	0	% 0,0	
2024K14-224896	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	20.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
2024K14-224923	Afet Koordinasyon Çadırı Alımı (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K14-224931	İnsansız Hava Araçları Modernizasyonu (*Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (*Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2024-2025	145.000.000		130.000.000	0	% 0,0	Herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.
2020K07-149550	Bismil-Beritanlı Göçebeleri Dicle-Batman Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2020-2024	165.000.000	110.000.000	55.000.000	9.987.046	% 18,2	İşin ihalesi yapılmış olup, 03.08.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır. İş devam etmektedir.
2022K07-184849	Boyabat Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	80.000.000	42.000.000	38.000.000	11.607.728	% 30,5	İşin ihalesi yapılmış olup, 28.07.2022 tarihinde imzalanmıştır. Konut inşaatları sıratle devam etmekte olup işin geçici kabulü önümüzdeki aylarda yapılacaktır.
2022K07-184853	Soma Maden Rezervi İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2022-2024	134.000.000	100.000.000	34.000.000	7.400.362	% 21,8	İşin ihalesi yapılmış olup, 21.10.2022 tarihinde imzalanmış ve konut inşaatlarına başlanmıştır.İş devam etmektedir.
2018K07-18500	Sarıkçılı Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2024	340.000.000	0	100.000.000	0	% 0,0	İş ihaleye çıkmış ancak aşırı yüksek teklif verildiğinden iptal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığından proje tutarının güncellenmesi geldikten sonra yeniden ihale çalışmalarına başlanacaktır.
2024K07-224135	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2024K07-224137	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyulduka harcama yapılmaktadır.
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	115.000.000		39.000.000	0	% 0,0	Bu sene yatırım programına girmiş olup önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır.
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	55.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Bu sene yatırım programına girmiş olup önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacaktır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K07-2797	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2027	1.332.900.000	311.088.000	250.450.000	1.450.000	% 0,6	Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 2.000 ailenin konut yapım işidir. 2024 yılı itibarıyla bu iş için ayrılan ödenek miktarı 250.450.000 TL olarak belirlenmiştir.
	Aksaray İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	72.000.000	12.000.000	15.000.000	0	% 0,0	Aksaray ilindeki 9 uygulamada yer alan toplam 149 hak sahibi aile için 15.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Amasya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Ankara İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	44.000.000	18.600.000	7.460.000	0	% 0,0	Ankara ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 44 hak sahibi aile için 7.460.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Artvin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bartın İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Batman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	142.640.000	22.000.000	10.640.000	0	% 0,0	Batman ilindeki 4 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 10.640.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Bilecik İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	954.000	950.000	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bingöl İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	1.804.000	1.800.000	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Bolu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	33.000.000	15.000.000	10.000.000	0	% 0,0	Bolu ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 10.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Çankırı İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	25.500.000	14.000.000	8.500.000	0	% 0,0	Çankırı ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 22 hak sahibi aile için 8.500.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Çorum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	56.000.000	11.000.000	11.250.000	0	% 0,0	Çorum ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 11.250.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Denizli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	9.000.000	6.000.000	1.000.000	0	% 0,0	Denizli ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 3 hak sahibi aile için 1.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Erzincan İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	59.288.000	6.500.000	6.750.000	0	% 0,0	Erzincan ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 69 hak sahibi aile için 6.750.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Erzurum İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	211.249.000	80.000.000	49.500.000	0	% 0,0	Erzurum ilindeki 15 uygulamada yer alan toplam 291 hak sahibi aile için 49.500.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Aşkale İlçesi Akören köyünde 2023 yılında inceleme işleri kalan 2 adet konut tamamlanarak haksahiplerine teslim edilmiştir.
	Gaziantep İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Giresun İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	İğdır İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	19.200.000	0	13.486.000	0	% 0,0	İğdır ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 32 hak sahibi aile için 13.486.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	İsparta İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	65.000.000	14.800.000	12.150.000	0	% 0,0	İsparta ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 65 hak sahibi aile için 12.150.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	İzmir İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	31.000.000	18.000.000	10.000.000	1.450.000	% 14,5	İzmir ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 33 hak sahibi aile için 10.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup, iline toplam 1.450.000 TL ödenek gönderilmiş ve harcanmıştır..Biten konut yoktur.
	Kahramanmaraş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	14.500.000	5.500.000	6.000.000	0	% 0,0	K.Maraş ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 16 hak sahibi aile için 6.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup iline 450.000 TL ödenek iline gönderilmiştir. Biten konut yoktur.
	Karaman İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	29.438.000	5.438.000	3.000.000	0	% 0,0	Karaman ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 55 hak sahibi aile için 3.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kars İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	34.150.000	19.000.000	12.150.000	0	% 0,0	Kars ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 25 hak sahibi aile için 12.150.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kastamonu İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	35.000.000	5.000.000	5.400.000	0	% 0,0	Kastamonu ilindeki 2 uygulamada yer alan toplam 35 hak sahibi aile için 5.400.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Kayseri İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Kırıkkale İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Kütahya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Malatya İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	140.706.000	7.000.000	10.000.000	0	% 0,0	Malatya ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 150 hak sahibi aile için 10.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Mardin İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Muş İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	73.880.000	5.000.000	8.000.000	0	% 0,0	Muş ilindeki 5 uygulamada yer alan toplam 75 hak sahibi aile için 8.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Niğde İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	19.000.000	1.000.000	6.000.000	0	% 0,0	Niğde ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 19 hak sahibi aile için 6.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.
	Sinop İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımlarımız bulunmamaktadır.
	Sivas İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	44.825.000	19.000.000	12.800.000	0	% 0,0	Sivas ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 45 hak sahibi aile için 12.800.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleştirilmemiştir. Biten konut yoktur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Şırnak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Tunceli İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	107.282.000	10.000.000	20.000.000	0	% 0,0	Tunceli ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 104 hak sahibi aile için 20.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Uşak İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2016-2027	13.436.000	8.500.000	1.350.000	0	% 0,0	Uşak ilindeki 3 uygulamada yer alan toplam 14 hak sahibi aile için 1.350.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
	Van İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2020-2027	4.000	0	1.000	0	% 0,0	2024 Yılında bu ilde yatırımımız bulunmamaktadır.
	Elazığ İlinde Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım	2023-2027	50.000.000	5.000.000	10.000.000	0	% 0,0	Elazığ ilindeki 1 uygulamada yer alan toplam 50 hak sahibi aile için 10.000.000 TL yıllık ödenek ayrılmış olup henüz harcama gerçekleşmemiştir. Biten konut yoktur.
2024K07-224136	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (**08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2026			30.000.000	0	% 0,0	Kamulaştırma ve konut ile arazi satın alımları için kullanılmaktadır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla Adıyaman ilinde, 1 adet satın alma işlemi (Arazi) için 995.128,80 TL ödenek iline gönderilmiştir.
15 Proje		06 ve 07 TOPLAM	49.572.188.000	4.482.782.000	13.761.240.000	863.813.286	% 6,3	
2 Proje		08 TOPLAM	1.332.950.000	311.088.000	250.500.000	1.450.000	% 0,6	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	254.000.000	61.500.000	177.500.000	11.401.689	% 6,4	
		GENEL TOPLAM	51.403.058.000	4.939.214.000	14.189.240.000	877.413.998	% 6,2	
3 Proje		HİBE	243.920.000	83.844.000	65.400.000	749.023	% 1,1	
1 Proje		AB KATKISI	102.150.000	4.086.000	45.968.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	194.345.000	76.800.000	104.894.000	12.268.235	% 11,7	
		Kamu İlaştırma	0	0	30.000.000	0	% 0,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2025	2.250.000	750.000	750.000	1.940	% 0,3	*Proje kapsamında öncelikle BEP-TR yazılımı ve TS-825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı için gerekli iklim verilerinin güncellenmesi ve sürekli güncellemeyi mümkün kılabacak yazılım için gerekli metodoloji ve algoritma için şartname ve protokol çalışmaları devam etmekte olup, üniversiteler ile yapılacak protokol kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında işin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. **Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme kılavuzu hazırlama işlerinin gerçekleştirilmesi devam etmektedir. *- 27-29/02/2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 23. Ozon paneline katılım sağlanmıştır.
2023K01-198902	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2024-2024	5.000.000		5.000.000	741.715	% 14,8	Çeşitli illerde yapılan piyasa gözetimi ve denetimlerinde alınan numunelerin değerlendirilmesi için yaptırılan deneylere ilişkin TSE faturalarının ödemeleri yapılmıştır.
	Genel Bütçe Ödeneği		1.000.000		1.000.000	741.715	% 74,2	
	Döner Sermaye Ödeneği		4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	3.250.000	750.000	1.750.000	743.655	% 42,5	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	4.000.000	0	4.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	7.250.000	750.000	5.750.000	743.655	% 12,9	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K01-181762	Müteahhitlik Bilgi Sistemleri Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2024	6.200.000	3.000.000	3.200.000	0	% 0,0	Sözleşme kapsamında projeye ait Proje Metodolojisi Raporu, Proje Yönetim Planı (PYP), Analiz ve Tasarım Raporları, Ulusal Veri Sözlüğü hazırlama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Raporlama Altyapı Bileşeni lisans alımı gerçekleştirildi. Garanti kapsamında bakım hizmetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.
2023K60-205399	Bütünleşik Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	15.770.000	7.770.000	8.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan Atlas Uygulaması Bakım, idame ve yeni fonksiyon geliştirilmesi işine ilişkin sözleşme 2023 yılında yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2023K60-205413	TUCBS Çalışabilirlik, Uyumlaştırma ve Entegrasyon (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	17.000.000	3.000.000	14.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan il özel idareleri ile entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.
2023K60-205704	Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	25.290.000	17.290.000	8.000.000	0	% 0,0	Hareketli araç verisi konsolidasyonu veri teminine yönelik sözleşme yapılmış olup henüz harcama yapılmamıştır.
2023K60-205743	Merkezi Orta Katman Yaygınlaştırma Projesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	13.735.000	9.735.000	4.000.000	0	% 0,0	Proje idare tarafından iptal edildi.
2023K60-217018	TUCBS E-Devlet Enteg., İşletme, Bakım, Güncelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	105.000.000	15.000.000	90.000.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanmış olup; proje çalışmaları devam etmektedir.
2023K60-230220	MEBİS Projesi Bakım Onarımı İş İdamesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	8.027.000	2.927.000	5.100.000	0	% 0,0	Sözleşme ve teknik şartname doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.
2023K60-230225	Bakanlık Uygulamaları Performans İzleme ve Yönetim (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2024	6.500.000	0	6.500.000	0	% 0,0	Ürün belirleme aşamasındadır.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2025	9.768.000	0	6.000.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet aşamasındadır.
2024K60-230216	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	213.200.000		213.200.000	0	% 0,0	
	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2024-2024	149.200.000		149.200.000	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none">Fiziksel Sunucu temin işi için yaklaşık maliyet ve teknik şartname çalışmaları tamamlanmış olup ihale tarihi için makam onayı beklenmektedir.Nesne Tabanlı Veri Depolama ünitesi alımı için şartname çalışmaları devam etmektedir.PC alımı (100NB+1000AIO) İhale Aşamasında (İhale tarihi 29.04.2024)Yazıcı ve tarayıcı alımı Teknik Şartname hazırlık aşamasında“Veri Merkezi Ağ Altyapısı Modernizasyonu” işine ilişkin Teknik Şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2024-2024	60.000.000		60.000.000	0	% 0,0	<ul style="list-style-type: none">Yedekleme Yazılım Lisansı temin edilmiştir. (3.200.000,00 TL)“Ağ Erişim Kontrol Yazılımı” ürününün lisansı yıl sonunda biteceği için Teknik Şartname hazırlık süreci yılın 2. yarısında başlatılacaktır.Yönetilen Tespit ve Müdahale (MDR) Hizmeti Temini Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama çalışmasına başlandı.Siber Tehdit İstihbarat Hizmeti Temini Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama çalışmasına başlandı.Sızma Testleri Temini Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama çalışmasına başlandı.
	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2024-2024	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında; 2024 Yılı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Belgenet) Garanti ve Bakım Hizmeti Temini işi için TÜRSAT A.Ş. ile 22.03.2024 tarihinde 1.343.816,69 TL+KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS) Bakım ve Destek Hizmeti işi için Prometus ile 28.03.2024 tarihinde 1.790.000 TL+KDV bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
2024K60-230223	KÖYDES Yatırım İzleme Sisteminin İdamesi (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	2.500.000		2.500.000	0	% 0,0	Teknik şartname hazırlandı. Hizmet alımı yapılacak.
2024K60-230229	Dijital Şehir İkizleri (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	İhaleler gerçekleştirilecek olup proje kapsamında henüz harcama yapılmamıştır.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K60-230232	Derin Öğrenme Hava Fotoğrafi İşleme ve Modelleme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	
2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000		10.000.000	0	% 0,0	İhaleler gerçekleştirilecek olup proje kapsamında henüz harcama yapılmamıştır.
2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	29.800.000		15.000.000	0	% 0,0	İhaleler gerçekleştirilecek olup proje kapsamında henüz harcama yapılmamıştır.
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4 (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2026	200.000.000		45.000.000	12.465.438	% 27,7	08.01.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Şu ana kadar 1 hakediş gerçekleştirilmiş olup yüklenici firmaya 12.465.437,33 TL ödeme yapılmıştır.
2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	5.000.000		2.000.000	0	% 0,0	İhaleler gerçekleştirilecek olup proje kapsamında henüz harcama yapılmamıştır.
2024K09-229670	Akıllı Şehir Standartlarının Yaygınlaştırılması (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2024	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	İhaleler gerçekleştirilecek olup proje kapsamında henüz harcama yapılmamıştır.
2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Ekleneşi (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	9.500.000		4.000.000	0	% 0,0	Yaklaşık maliyet aşamasındadır.
10 Proje		06 ve 07 TOPLAM	251.928.000	43.060.000	165.000.000	0	% 0,0	
9 Proje		DÖNER SERMAYE	465.162.000	15.662.000	291.500.000	12.465.438	% 4,3	
		GENEL TOPLAM	717.090.000	58.722.000	456.500.000	12.465.438	% 2,7	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	48.837.000	30.581.000	8.203.000	0	% 0,0	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibariyle sona ermiştir. Geri kalan 3 bileşenin uygulaması devam etmektedir.
<i>AB katkısı</i>			276.719.000	173.278.000	46.479.000	0	% 0,0	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2026	8.857.524.000	6.045.479.000	1.952.865.000	163.532.297	% 8,4	
	AB Hibesi		7.537.461.000	5.139.151.000	1.663.405.000	139.002.453	% 8,4	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		551.656.000	378.966.000	120.175.000	10.216.369	% 8,5	
	Mahalli İdare Katkısı		768.407.000	527.362.000	169.285.000	14.313.475	% 8,5	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	48.837.000	30.581.000	8.203.000	0	% 0,0	
	<i>AB KATKISI</i>		276.719.000	173.278.000	46.479.000	0	% 0,0	
	<i>İçmesuyu Sektörü Projesi</i>		8.857.524.000	6.045.479.000	1.952.865.000	163.532.297	% 8,4	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Alt proje-1	Çarşamba Atıksu Tesisi	2019-2023	287.358.000	282.208.000	5.150.000	145.508	% 2,8	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 19.09.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		244.078.000	239.878.000	4.200.000	123.682		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.432.000	16.932.000	500.000	8.730		
	Mahalli İdare Katkısı		25.848.000	25.398.000	450.000	13.096		
Alt proje-2	Bandırma Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	577.544.000	473.044.000	104.500.000	9.420.825	% 9,0	Proje kapsamında yer alan entegre su projesi 2. yapım işinin kesin kabulü 13.10.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi yapım işinin ve müşavirlik sözleşmelerinin uygulaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		490.688.000	402.088.000	88.600.000	8.007.702		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		34.882.000	28.382.000	6.500.000	565.249		
	Mahalli İdare Katkısı		51.974.000	42.574.000	9.400.000	847.874		
Alt proje-3	Bismil Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	272.545.000	270.865.000	1.680.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 04.01.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		231.536.000	230.236.000	1.300.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		18.533.000	18.283.000	250.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		22.476.000	22.346.000	130.000	0		
Alt proje-4	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	610.460.000	340.280.000	263.900.000	29.228.702	% 11,1	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		518.739.000	289.239.000	224.200.000	24.844.397		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.716.000	20.416.000	15.900.000	1.753.722		
	Mahalli İdare Katkısı		55.005.000	30.625.000	23.800.000	2.630.583		
Alt proje-5	Elbistan Atıksu Tesisi	2019-2024	531.622.000	491.372.000	40.250.000	14.350.217	% 35,7	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 30.09.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		451.760.000	417.660.000	34.100.000	12.197.684		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		35.925.000	33.175.000	2.750.000	968.640		
	Mahalli İdare Katkısı		43.937.000	40.537.000	3.400.000	1.183.893		
Alt proje-6	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2025	679.445.000	487.035.000	182.250.000	22.046.741	% 12,1	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		577.480.000	413.980.000	154.900.000	18.739.730		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		40.822.000	29.222.000	10.950.000	1.322.804		
	Mahalli İdare Katkısı		61.143.000	43.833.000	16.400.000	1.984.207		
Alt proje-7	İğdır Atıksu Tesisi	2019-2024	540.492.000	533.522.000	6.970.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin geçici kabulü 21.07.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		459.295.000	453.495.000	5.800.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.612.000	36.012.000	600.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		44.585.000	44.015.000	570.000	0		
Alt proje-8	Kastamonu Atıksu Tesisi	2019-2024	415.389.000	403.919.000	11.470.000	961.830	% 8,4	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 30.06.2022 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		353.032.000	343.332.000	9.700.000	817.555		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		24.985.000	24.235.000	750.000	57.710		
	Mahalli İdare Katkısı		37.372.000	36.352.000	1.020.000	86.565		

Alt proje-9	Niksar Su ve Atıksu Tesisi	2019-2024	563.745.000	558.295.000	20.120.000	20.085.227	% 99,8	Proje kapsamında yer alan şebeke ve kanalizasyon hattı yapım işi olan 2. yapım işinin kesin kabulü 30.06.2023 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su artıma tesisi yapım işinin ise geçici kabulü 31.12.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir. Projenin sonuna
	AB Hibesi		478.952.000	474.552.000	17.100.000	17.072.443		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		34.047.000	33.497.000	1.210.000	1.205.114		
	Mahalli İdare Katkısı		50.746.000	50.246.000	1.810.000	1.807.670		
Alt proje-10	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2025	647.382.000	381.897.000	258.050.000	21.748.239	% 8,4	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		550.219.000	324.614.000	219.300.000	18.486.003		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		38.868.000	22.913.000	15.500.000	1.304.894		
	Mahalli İdare Katkısı		58.295.000	34.370.000	23.250.000	1.957.342		
Alt proje-11	Sivas Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	296.108.000	296.093.000	15.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 06.03.2024 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		251.685.000	251.680.000	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		17.770.000	17.765.000	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		26.653.000	26.648.000	5.000	0		
Alt proje-12	Sorgun Atıksu Tesisi	2019-2023	212.650.000	212.635.000	15.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 11.08.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		180.745.000	180.740.000	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		12.763.000	12.758.000	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		19.142.000	19.137.000	5.000	0		
Alt proje-13	Şırnak Su ve Atıksu Tesisi	2019-2023	271.506.000	271.491.000	15.000	0	% 0,0	Proje kapsamında yer alan yapım işinin kesin kabulü 17.11.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		230.773.000	230.768.000	5.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		18.330.000	18.325.000	5.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		22.403.000	22.398.000	5.000	0		
Alt proje-14	Trabzon Su Tesisi	2019-2025	547.955.000	373.805.000	163.300.000	5.971.054	% 3,7	Proje kapsamında yer alan yapım işinin uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		465.735.000	317.735.000	138.800.000	5.075.396		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		32.888.000	22.428.000	9.800.000	358.263		
	Mahalli İdare Katkısı		49.332.000	33.642.000	14.700.000	537.395		
Alt proje-15	Yüksekova Atıksu Tesisi	2019-2024	286.782.000	270.582.000	16.200.000	15.538.558	% 95,9	Proje kapsamında yer alan yapım işinin geçici kabulü 09.09.2023 tarihinde yapılmıştır. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		243.595.000	229.995.000	13.600.000	13.207.774		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		19.464.000	18.264.000	1.200.000	1.048.853		
	Mahalli İdare Katkısı		23.723.000	22.323.000	1.400.000	1.281.931		
Alt proje-16	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2025	594.758.000	75.878.000	365.710.000	7.842.412	% 2,1	Proje kapsamında yer alan yapım işi 16.10.2023 tarihinde başlamıştır. Müşavirlik işi sözleşmesi de 30.08.2023 tarihinde başlamıştır.
	AB Hibesi		509.284.000	64.984.000	313.200.000	6.666.050		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		36.027.000	4.587.000	22.110.000	529.363		
	Mahalli İdare Katkısı		49.447.000	6.307.000	30.400.000	646.999		
Alt proje-17	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2025	411.993.000	322.558.000	71.000.000	16.192.986	% 22,8	Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu toplama hattı yapım işinin geçici kabulü 03.03.2024 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su artıma tesisi inşaatının uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		350.075.000	274.175.000	60.300.000	13.764.038		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		27.892.000	21.772.000	4.800.000	1.093.027		
	Mahalli İdare Katkısı		34.026.000	26.611.000	5.900.000	1.335.921		
Alt proje-18	Aksaray Entegre Su Projesi	2021-2025	1.109.790.000	0	442.270.000	0	% 0,0	Henüz uygulamaya başlamamıştır.
	AB Hibesi		949.790.000	0	378.290.000	0		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		67.700.000	0	27.340.000	0		
	Mahalli İdare Katkısı		92.300.000	0	36.640.000	0		

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023F00-198507	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2024-2024	11.000.000		11.000.000	0	% 0,0	
	Muhtelif Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2024-2024	6.000.000		6.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Ayvalık Arboretum Proje Temini	2024-2024	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Proje Temini	2024-2024	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2025	49.600.000	18.600.000	17.000.000	6.185.071	% 36,4	6.185.071 TL. Ödemesi yapılmıştır. 2024 yılı içerisinde iş tamamlanacaktır.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2025	29.000.000	0	14.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2024F00-224157	Karahayit Kırmızı Su Travertenleri Çevre Düzenleme (Turizm Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2024F00-224162	Köyceğiz Çevre ve Sahil Düzenleme (Turizm Sektörü)	2024-2024	10.000.000		10.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2024F00-224165	Büyükada Meydan Düzenleme ve Cephe Yenileme (Turizm Sektörü)	2024-2024	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (*.*.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2026	280.258.000	62.658.000	60.000.000	0	% 0,0	
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2026	179.647.000	36.647.000	40.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2026	100.611.000	26.011.000	20.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (*.*.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2026	120.264.000	33.764.000	53.500.000	0	% 0,0	
	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2026	77.264.000	21.764.000	33.500.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.
	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2026	43.000.000	12.000.000	20.000.000	0	% 0,0	Çalışmalar devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2025	46.951.000	23.151.000	12.800.000	0	% 0,0	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2025	11.950.000	5.600.000	3.600.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2025	16.480.000	10.400.000	3.700.000	0	% 0,0	1-Datça-Bozburun ÖÇKB, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları ve Kentsel Tasarım Rehberi İşi (130 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 2-Bodrum Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu İşi (560 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 3-Muğla İli, Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Arazi Kullanıma Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu Hazırlanması İşi (46132 Ha) (İş İhale Edildi Devam Ediyor) 4-Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İşi (46132 Ha) (İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor) 5-İhlara ÖÇKB 2. Etap 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı İşi (6336 Ha) (İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor) 6-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbaşı ÖÇKB, Ballıkpınar Ve Yavrucuk Mahalleleri "Ankara Üniversitesi Yeni Veterinerlik Fakültesi Çiftliği Kurulmasına İlişkin" 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı İşi (450 Ha) (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş Durduruldu) 7-Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yalıncağ-Karakusunlar Mahallesi Adalet Akademisi İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi (26,85 Ha) (1. Aşama (İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt İşi) Tamamlandı İmar Planı İşi Devam Ediyor) 8-Tuz Gölü ÖÇKB 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu İşi (740.309 Ha) (İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor) 9-İmar Planı Paftalarının Taranması Ve Koordinatlandırılması İşi (İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor) 10-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kıyı Kesimi 1.Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (İhale Öncesi Çalışmalar Devam Ediyor)
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2025	6.321.000	2.151.000	1.900.000	0	% 0,0	
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2025	12.200.000	5.000.000	3.600.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K10-90489	Fethiye İç Körfezi Deniz Dibi Tarama ve Temizliği (Çevre Sektörü)	2024-2024	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	2021-2024	53.463.000	9.544.000	13.176.000	0	% 0,0	
	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2021-2023	49.963.000	9.544.000	12.126.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2022-2024	3.500.000		1.050.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır.
2020K10-152855	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Çevre Sektörü)	2020-2024	1.207.000	657.000	550.000	0	% 0,0	
	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları	2022-2024	1.207.000	657.000	550.000	0	% 0,0	Projede; % 70 lik gerçekleşme sağlanmış olup, kalan kısmının cari yıl içerisinde tamamlanması beklenilmektedir. (136.875.60 TL ödeme Alt proje olan ve 2023 yılında tamamlanan Foça ÖÇK Bölgesi Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi Kesin Hakediş Tutarıdır.)
2016K10-150495	İklim Değişikliğinin Ekosisteme Etkisi Araştırması (Çevre Sektörü)	2021-2024	3.500.000	2.275.000	1.225.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmekte olup 2024 yılı içinde ödemeleri tamamlanacaktır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE N SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2025	10.700.000	3.978.000	3.000.000	0	% 0,0	
	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı	2017-2025	10.700.000	3.978.000	3.000.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2025	8.500.000		3.800.000	0	% 0,0	
	Belek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2024-2025	3.200.000		1.100.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlanması ve Yaklaşık Maliyetin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ve ihale hazırlık aşaması devam etmektedir.
	Patara ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2024-2025	2.500.000		1.300.000	0	% 0,0	Teknik Şartname hazırlanması ve Yaklaşık Maliyetin belirlenmesine ilişkin çalışmalar ve ihale hazırlık aşaması devam etmektedir.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2024-2025	2.800.000		1.400.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır.
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	11.000.000	7.794.000	5.000	0	% 0,0	2022K10-188090 proje nolu Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (Kara-Kıyı ve Denizel Alanda) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında Ön rapor, 1. Ara Rapor ve 2. Ara Rapor'un idareye teslimi sonrasında proje için ayrılan bütçenin %60'lık dilimi yükleneciye ödenmiştir. Projenin arazi çalışmaları devam etmekte olup projenin 2025 yılının başında bitmesi öngörülmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2027	1.704.100.000	405.000.000	339.100.000	0	% 0,0	İş devam etmekte olup yıl içerisinde Protokol doğrultusunda Hakediş Ödemeleri yapılacaktır.
	<i>Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)</i>		850.000.000	125.000.000	200.000.000	0	% 0,0	
	<i>Döner Sermaye Ödeneği</i>		854.100.000	280.000.000	139.100.000	0	% 0,0	
	<i>Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı</i>		800.000.000	150.000.000	200.000.000	0	% 0,0	
2024K10-225388	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (*Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2024	4.000.000		4.000.000	0	% 0,0	
	Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	800.000		800.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır. 04.04.2024 tarih ve 9222980 sayılı Bakan Oluru ile Ödenek revize edildi.
	Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	800.000		800.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır. 17.04.2024 tarih ve 9266377 sayılı Bakan Oluru ile Ödenek revize edildi.
	Patara ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	800.000		800.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır. 04.04.2024 tarih ve 9222980 sayılı Bakan Oluru ile Ödenek revize edildi.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Belek ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	800.000		800.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup ihale aşamasındadır.
	Göksu Deltası ÖÇK Bölgesinde Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2024-2024	800.000		800.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup ihale aşamasındadır. 17.04.2024 tarih ve 9266377 sayılı Bakan Oluru ile Ödenek revize edildi.
2024K10-225397	Marmara Adası Maden Ocağı Rehabilitasyon (Çevre Sektörü)	2024-2024	2.000.000		2.000.000	0	% 0,0	Enerji Bakanlığının olumsuz geldiğinden Rehabilitasyon işi yapılamamıştır.
2024K10-225398	Marmara Denzinde Deniz Çayırı Alanı Tespiti (Çevre Sektörü)	2024-2024	5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (f) bendi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Projenin Protokol ve Teknik Şartname hazırlıkları yapılmış olup, gerekli kurum içi yazışmalar tamamlanmıştır.
2024K10-225399	Marmara Denizi Denizanası Artışı Araştırılma FAZ-II (Çevre Sektörü)	2024-2024	3.000.000		3.000.000	0	% 0,0	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (f) bendi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Projenin Protokol ve Teknik Şartname hazırlıkları yapılmış olup, gerekli kurum içi yazışmalar tamamlanmıştır.
2024K10-225400	Mağaraların Araştırılması (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2024	2.700.000		2.700.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup ihale aşamasındadır.
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgözü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	8.500.000		2.975.000	0	% 0,0	29.02.2024 tarih ve 8827032 sayılı OLUR ile teknik şartname ve yaklaşık maliyet hesaplama komisyonu belirlenmiş olup ihale hazırlık aşaması devam etmektedir.
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	6.675.000		2.000.000	0	% 0,0	29.02.2024 tarih ve 8826970 sayılı OLUR ile teknik şartname ve yaklaşık maliyet hesaplama komisyonu belirlenmiş olup ihale hazırlık aşaması devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme (Çevre Sektörü)	2024-2026	35.000.000		7.000.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları Devam Etmektedir.
2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	2.900.000		1.200.000	0	% 0,0	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (f) bendi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Projenin Protokol ve Teknik Şartname hazırlıkları yapılmış olup, gerekli kurum içi yazışmalar tamamlanmıştır.
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	3.000.000		1.500.000	0	% 0,0	Proje Çalışmaları devam etmekte olup İhale aşamasındadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2024-2026			5.000.000	0	% 0,0	
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.150.096.000	183.205.000	324.526.000	6.185.071	% 1,9	
8 Proje		DÖNER SERMAYE	1.278.222.000	384.216.000	262.005.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	2.428.318.000	567.421.000	586.531.000	6.185.071	% 1,1	
1 Proje		Belediye Katkısı	800.000.000	150.000.000	200.000.000	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	0	0	5.000.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2025	7.899.000	5.100.000	500.000	0	% 0,0	YERELBİLGİ Sistemi ile her yıl 11 adet form düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç olan veriler Sistem ile toplanacaktır. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2025	20.000.000	6.500.000	5.000.000	0	% 0,0	Proje ile ilgili henüz çalışmalara başlanmamış olup 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim Sonuçları beklenilmiştir. Herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2024K07-224132	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2024	6.906.747.000		6.906.747.000	0	% 0,0	2024 Yılı KÖYDES Projei Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkmadığı için herhangi bir harcama yapılmamıştır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	6.934.646.000	11.600.000	5.500.000	0	% 0,0	

Dipnot: 652

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K01-225160	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2024-2024	29.300.000		29.300.000	9.000.000	% 30,7	
	Harita Alımları	2024-2024	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2024-2024	150.000		150.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2024-2024	29.000.000		29.000.000	9.000.000	% 31,0	29.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin 10.500.000,00.-₺'si serbest bırakılmış olup, 9.000.000.-₺ ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. 1.500.000.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2024-2026			250.000.000	192.988.498	% 77,2	250.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 195.068.317.-₺ ödeme yapılmış olup, 54.931.683.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2024-2026			2.000.000	2.000.000	% 100,0	2.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 2.000.000,00.-₺ ödeme yapılmış olup, kullanılabilir ödeneği bulunmamaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	29.300.000	0	29.300.000	9.000.000	% 30,7	
Kamu laştırma			0	0	252.000.000	194.988.498	% 77,4	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormançılık Sektörü)	2023-2026	37.050.000	2.850.000	7.350.000	0	% 0,0	
	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2026	29.500.000	1.500.000	5.000.000	0	% 0,0	UASİS yazılım bakım hizmet alımı işi kapsamında ihale işlemleri tamamlanmış olup Strateji Geliştirme Başkanlığına sunulmuştur. (HAVZA DAİRESİ)
	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2025	1.650.000	550.000	550.000	0	% 0,0	Sistemle ilgili çalışmalara henüz başlanmamış olup 1. çeyrekte herhangi bir harcama yapılmamıştır. (EROZYON DAİRESİ)
	Toprak Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi	2023-2025	1.650.000	550.000	550.000	0	% 0,0	Proje alanı inceleme ve değerlendirme aşaması devam etmektedir. (ETÜT VE PROJE DAİRESİ)
	Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası	2023-2025	750.000	250.000	250.000	0	% 0,0	Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanan "Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası Güncellenmesi" çalışmalarını kapsamındaki araştırmalar ve mevcut veri analizleri hakkında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü ile görüşmeler ve teknik toplantılar yapılmıştır. (ÇÖLLEŞME DAİRESİ)
	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	2024-2026	3.500.000		1.000.000	0	% 0,0	Proje ile ilgili büro çalışmaları devam etmekte olup 1. çeyrekte herhangi bir harcama yapılmamıştır. (ÇÖLLEŞME DAİRESİ)
2023A05-196786	Bolaman ve Çekerek Nehri Havzaları Rehabilitasyonu (Ormançılık Sektörü)	2023-2028	10.000.000	1.635.000	1.250.000	0	% 0,0	Yıl içerisinde yapılacak projeler hakkında potansiyel alan çalışmaları devam etmektedir. (HAVZA DAİRESİ)

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2024-2026	60.600.000		28.900.000	0	% 0,0	
	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2024-2026	60.400.000		28.700.000	0	% 0,0	Kent içi bitkilendirme/ağaçlandırma çalışmalarında uygulayıcılara yol göstermek, doğal bitki türlerimizin kullanımını arttırmak, kent kimliğini yansıtacak ve karbon depolama potansiyeli yüksek doğal taksonların kullanımı imkanlarının artırılması amacıyla "İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İllerine Ait Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Oluşturulması Hizmet Alımı" işi sözleşmesi KDV Hariç 596.500,00 TL (beşyüzdoksanaltıbinbeşyüztürklirası) olarak imzalanmıştır. (EROZYON DAİRESİ) İdare tarafından yapılacak çığ haritaları projelerin tanzimine başlanmıştır. Erozyon, sel, çığ, kaya yuvarlanması ve heyelanla mücadele projelerinin ise arazi çalışmaları ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. (ETÜT VE PROJE DAİRESİ) Yıl içinde yapılacak entegere mikrohavza rehabilitasyon projeleri hakkında potansiyel alan çalışmaları devam etmektedir. (HAVZA DAİRESİ) Aksaray Gülağaç Demirci Beldesi Karbon Yutak Alanı bakım çalışmaları için ihale hazırlıkları yapılmaktadır. Kayseri, Kırşehir ve Çankırı'da yapılacak yeni karbon yutak alan çalışmaları için arazi ön etütleri tamamlanmıştır. 2024 yılı ilk 3 ayında herhangi bir harcama yapılmamıştır. (YUTAK ALANLAR DAİRESİ)
	Arazi Tahribatının Dengelenmesi	2024-2024	200.000		200.000	0	% 0,0	ÇMUSEP'in güncellenmesi kapsamında ÇMUSEP IDR Sistem ihtiyaçları tespit edilmiş ve durum değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. (ÇÖLLEŞME DAİRESİ)
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi (Ormancılık Sektörü)	2024-2027	46.000.000		7.000.000	0	% 0,0	Proje ile ilgili Proje Değerlendirme Komitesi Toplantısı yapılmıştır. UNDP tarafından ilgili paydaşlara görüş sorulmuştur. Proje başlangıç çalışmaları için hazırlıklar devam etmektedir. 1. çeyrekte herhangi bir harcama yapılmamıştır. (YUTAK ALANLAR DAİRESİ)
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	107.650.000	4.485.000	37.500.000	0	% 0,0	
1 Proje		UNDP HİBESİ	46.000.000	0	7.000.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2024	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	
	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (**.Döner Sermaye)	2024-2025	25.000.000		20.192.000	0	% 0,0	
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2025	151.475.000		135.000.000	0	% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği		5.000.000		5.000.000	0	% 0,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		146.475.000		130.000.000	0	% 0,0	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-224617	Muhtelif İşler (SGB-Destek-Mekansal Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2024-2024	6.900.000		6.900.000	3.462.865	% 50,2	
	Hizmet Binası Onarımı	2024-2024	7.900.000		7.900.000	2.134.392	% 27,0	
2024G00-224585	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2024-2024	3.400.000		3.400.000	0	% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	23.200.000	0	23.200.000	5.597.257	% 24,1	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	172.975.000	500.000	151.192.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	196.175.000	500.000	174.392.000	5.597.257	% 3,2	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2023 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2024 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2024 31.03.2024 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2025	150.000.000		80.000.000	0	% 0,0	
2024G00-224585	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2024-2024	100.000		100.000	0	% 0,0	
2024K09-224617	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2024-2024	100.000		100.000	0	% 0,0	
	Hizmet Binası Onarımı	2024-2024	100.000		100.000	0	% 0,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	300.000	0	300.000	0	% 0,0	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	150.000.000	0	80.000.000	0	% 0,0	
		GENEL TOPLAM	150.300.000	0	80.300.000	0	% 0,0	
