



# 2019 Yılı

## Bütçe ve Yatırım Programı

### 3. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 Dönemi)



# BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ


## 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2019 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.264.444.000,00	1.295.857.148,45	1.003.867.097,97	% 77,5
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	220.900.000,00	228.161.530,69	169.515.470,28	% 74,3
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	93.052.000,00	187.234.624,43	100.676.348,30	% 53,8
05	CARİ TRANSFERLER	572.867.000,00	2.619.010.320,57	2.467.116.900,68	% 94,2
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	393.384.000,00	433.918.000,00	336.703.000,00	% 77,6
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-İmar Barışı	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	150.000.000,00	150.000.000,00	107.000.000,00	% 71,3
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	22.665.000,00	23.907.695,88	17.771.974,34	% 74,3
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği				
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	6.818.000,00	11.184.624,69	5.641.926,34	% 50,4
06	SERMAYE GİDERLERİ	177.331.000,00	1.581.539.750,94	1.125.522.667,82	% 71,2
	Bakanlık Yatırım Programı	158.154.000,00	313.259.187,35	105.043.220,99	% 33,5
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.177.000,00	455.177.000,00	399.560.856,41	% 87,8
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	813.103.563,59	620.918.590,42	% 76,4
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	230.000.000,00	1.145.070.788,04	1.007.710.171,38	% 88,0
	Bakanlık Yatırım Programı	78.625.000,00	100.695.788,04	27.897.171,38	% 27,7
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	151.375.000,00	186.375.000,00	121.813.000,00	% 65,4
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	858.000.000,00	858.000.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	14.692.000,00	14.692.000,00	4.087.150,07	% 27,8
GENEL TOPLAM		2.573.286.000,00	7.071.566.163,12	5.878.495.806,50	% 83,1



# BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

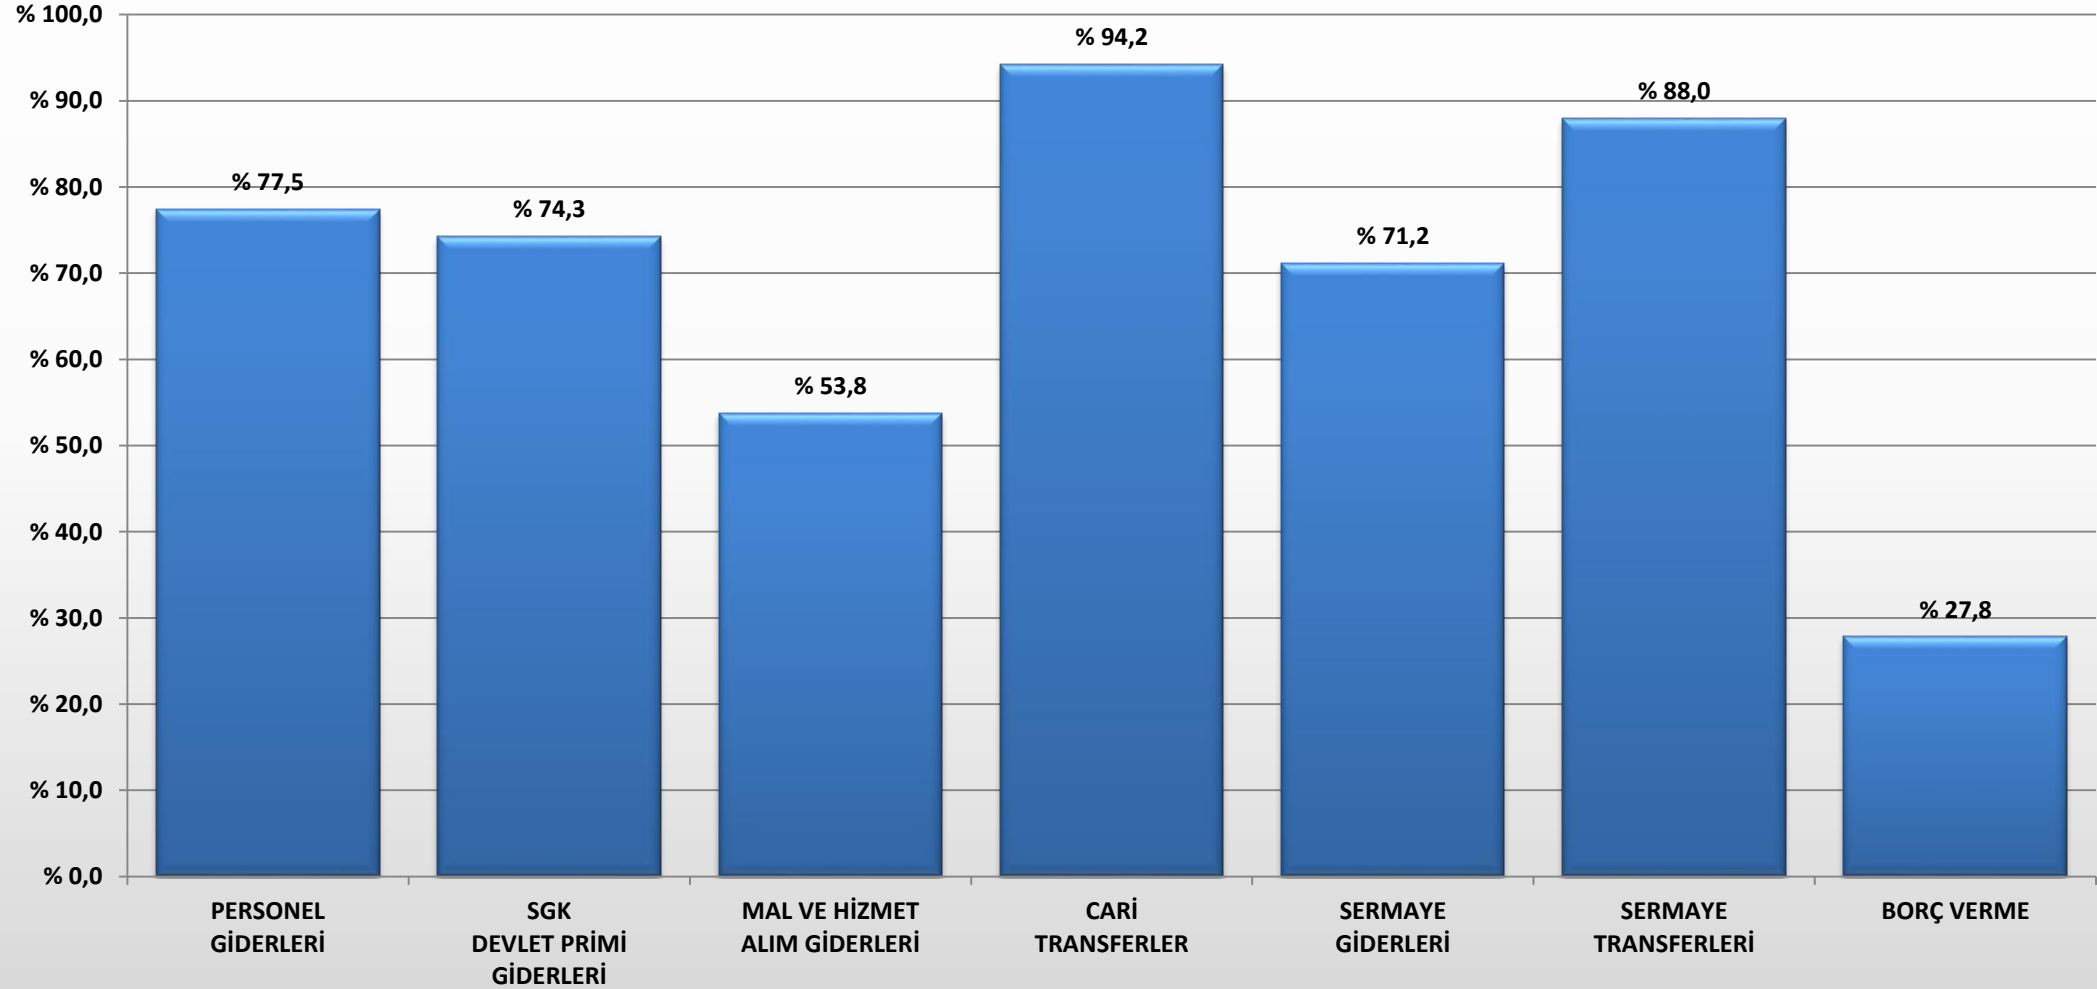




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ

## 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2019 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2019 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	4	14.300.000,00	6.750.000,00	0,00	% 0,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	17	177.480.000,00	64.904.000,00	9.229.303,14	% 14,2
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	5	132.046.000,00	19.847.000,00	3.230.188,93	% 16,3
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	19	3.223.327.000,00	228.371.000,00	105.766.843,52	% 46,3
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	2	8.700.000,00	1.550.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	5	8.208.000,00	2.483.000,00	175.415,35	% 7,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	6	77.690.000,00	25.780.000,00	3.890.523,00	% 15,1
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	1	20.475.000,00	2.200.000,00	1.089.892,64	% 49,5
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	12	145.875.000,00	41.984.000,00	9.494.995,33	% 22,6
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	1.510.410.000,00	2.570.000,00	155.605,26	% 6,1
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	3.792.000,00	3.792.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	3	160.443.000,00	42.497.000,00	32.142.599,10	% 75,6
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	600.000,00	600.000,00	314.176,17	% 52,4
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>76</b>	<b>5.483.346.000,00</b>	<b>443.328.000,00</b>	<b>165.489.542,44</b>	<b>% 37,3</b>
<b>GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER</b>	<b>73</b>	<b>5.301.502.000,00</b>	<b>404.433.000,00</b>	<b>139.540.542,44</b>	<b>% 34,5</b>
<b>DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER</b>	<b>3</b>	<b>181.844.000,00</b>	<b>38.895.000,00</b>	<b>25.949.000,00</b>	<b>% 66,7</b>
<b>"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği</b>	<b>4 adet</b>	<b>493.531.000,00</b>	<b>455.177.000,00</b>	<b>399.560.856,41</b>	<b>% 87,8</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

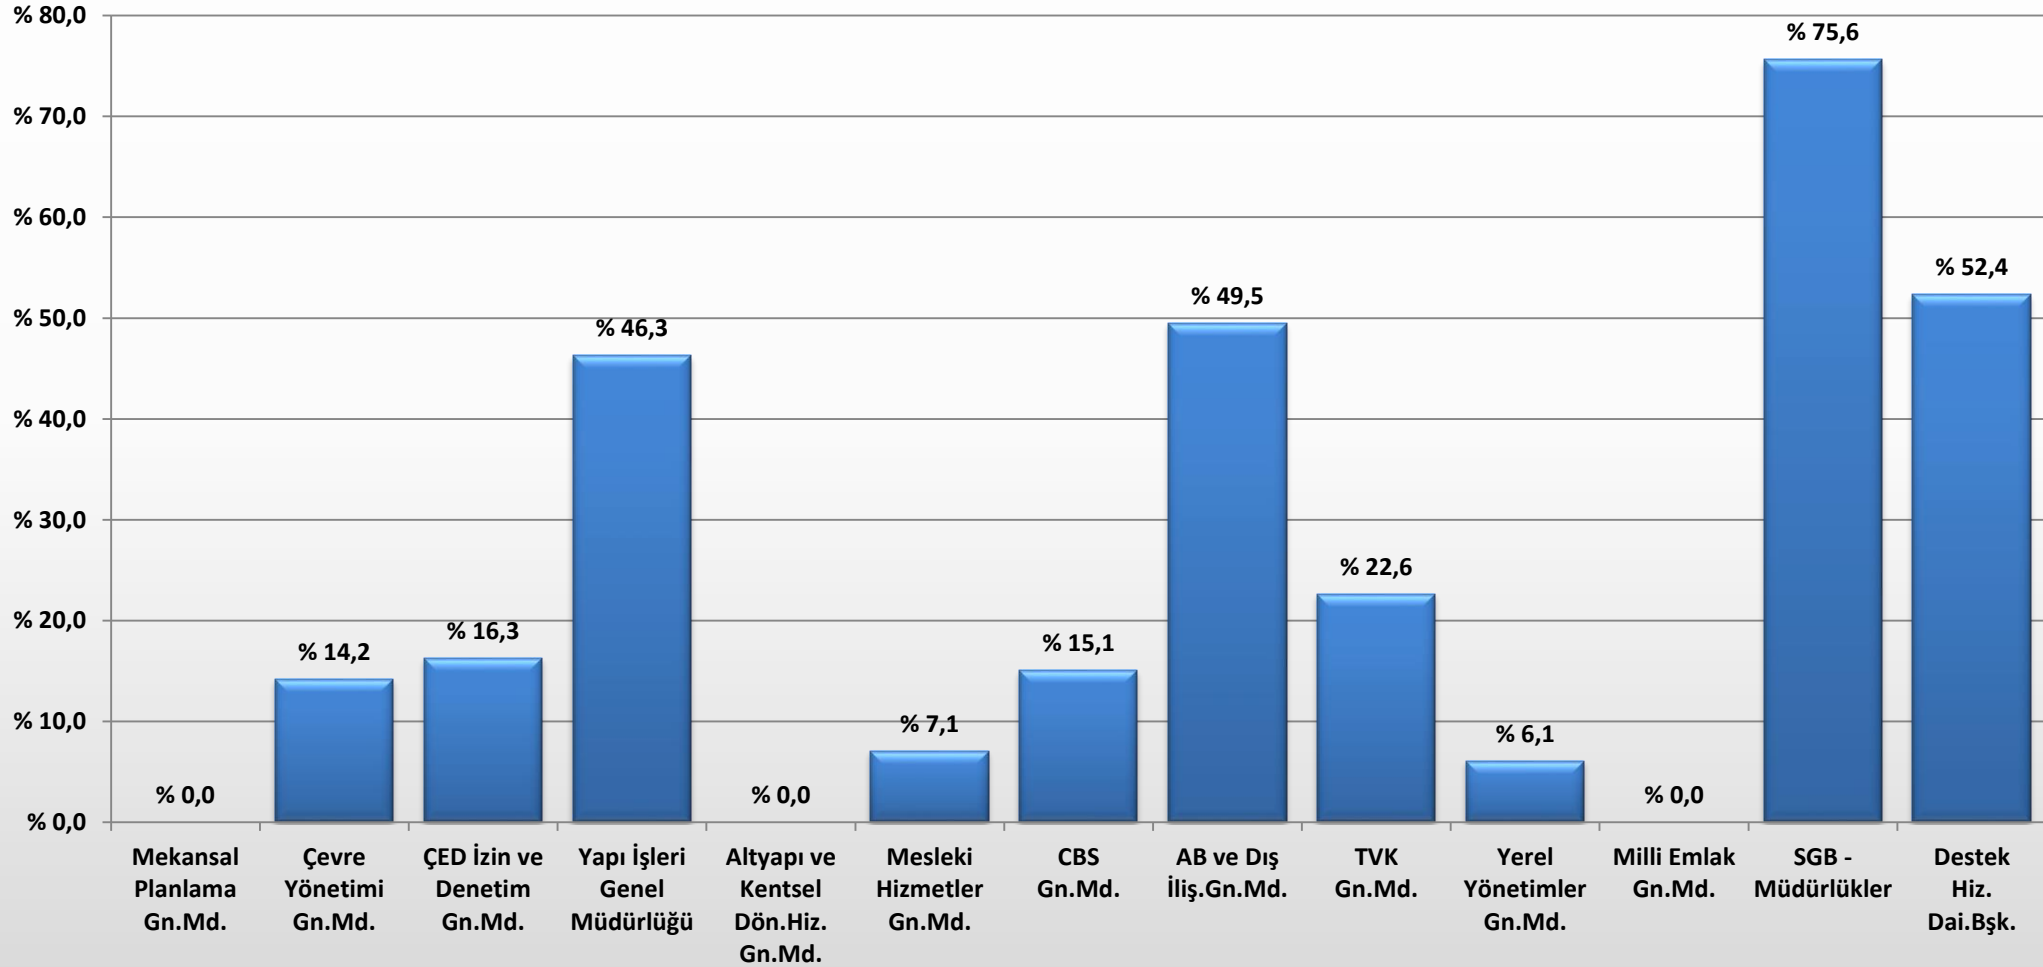




# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ

## 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 REVİZE ÖDENEĞİ	30.09.2019 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	32.656.000,00	32.466.000,00	17.940.190,12	% 55,3
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	247.420.000,00	282.486.624,69	152.336.689,17	% 53,9
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	67.778.000,00	69.431.582,08	36.442.448,10	% 52,5
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	167.602.000,00	346.264.942,10	163.563.962,76	% 47,2
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	420.846.000,00	3.319.380.000,00	3.213.981.711,01	% 96,8
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	24.949.000,00	24.649.000,00	15.485.564,30	% 62,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	44.632.000,00	43.932.000,00	16.904.481,30	% 38,5
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	33.198.000,00	34.450.695,88	23.720.809,46	% 68,9
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	55.215.000,00	63.841.600,49	23.448.296,58	% 36,7
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	8.987.000,00	8.997.000,00	4.049.825,09	% 45,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	81.772.000,00	521.429.000,00	416.720.940,76	% 79,9
Personel Genel Müdürlüğü	7.416.000,00	7.416.000,00	4.885.204,53	% 65,9
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	6.180.000,00	57.150.000,00	37.323.997,09	% 65,3
Özel Kalem Müdürlüğü	33.395.000,00	33.395.000,00	5.526.527,11	% 16,5
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	86.634.000,00	93.344.018,76	40.528.792,13	% 43,4
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	2.878.000,00	4.378.000,00	1.736.969,38	% 39,7
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	10.897.000,00	10.938.400,00	8.836.986,33	% 80,8
Strateji Geliştirme Başkanlığı	157.937.000,00	157.836.490,00	112.650.467,68	% 71,4
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.106.000,00	1.106.000,00	778.921,54	% 70,4
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	3.430.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	% 100,0
İl Müdürlükleri	1.078.358.000,00	1.955.183.809,12	1.578.143.022,06	% 80,7
<b>TOPLAM</b>	<b>2.573.286.000,00</b>	<b>7.071.566.163,12</b>	<b>5.878.495.806,50</b>	<b>% 83,1</b>



# HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

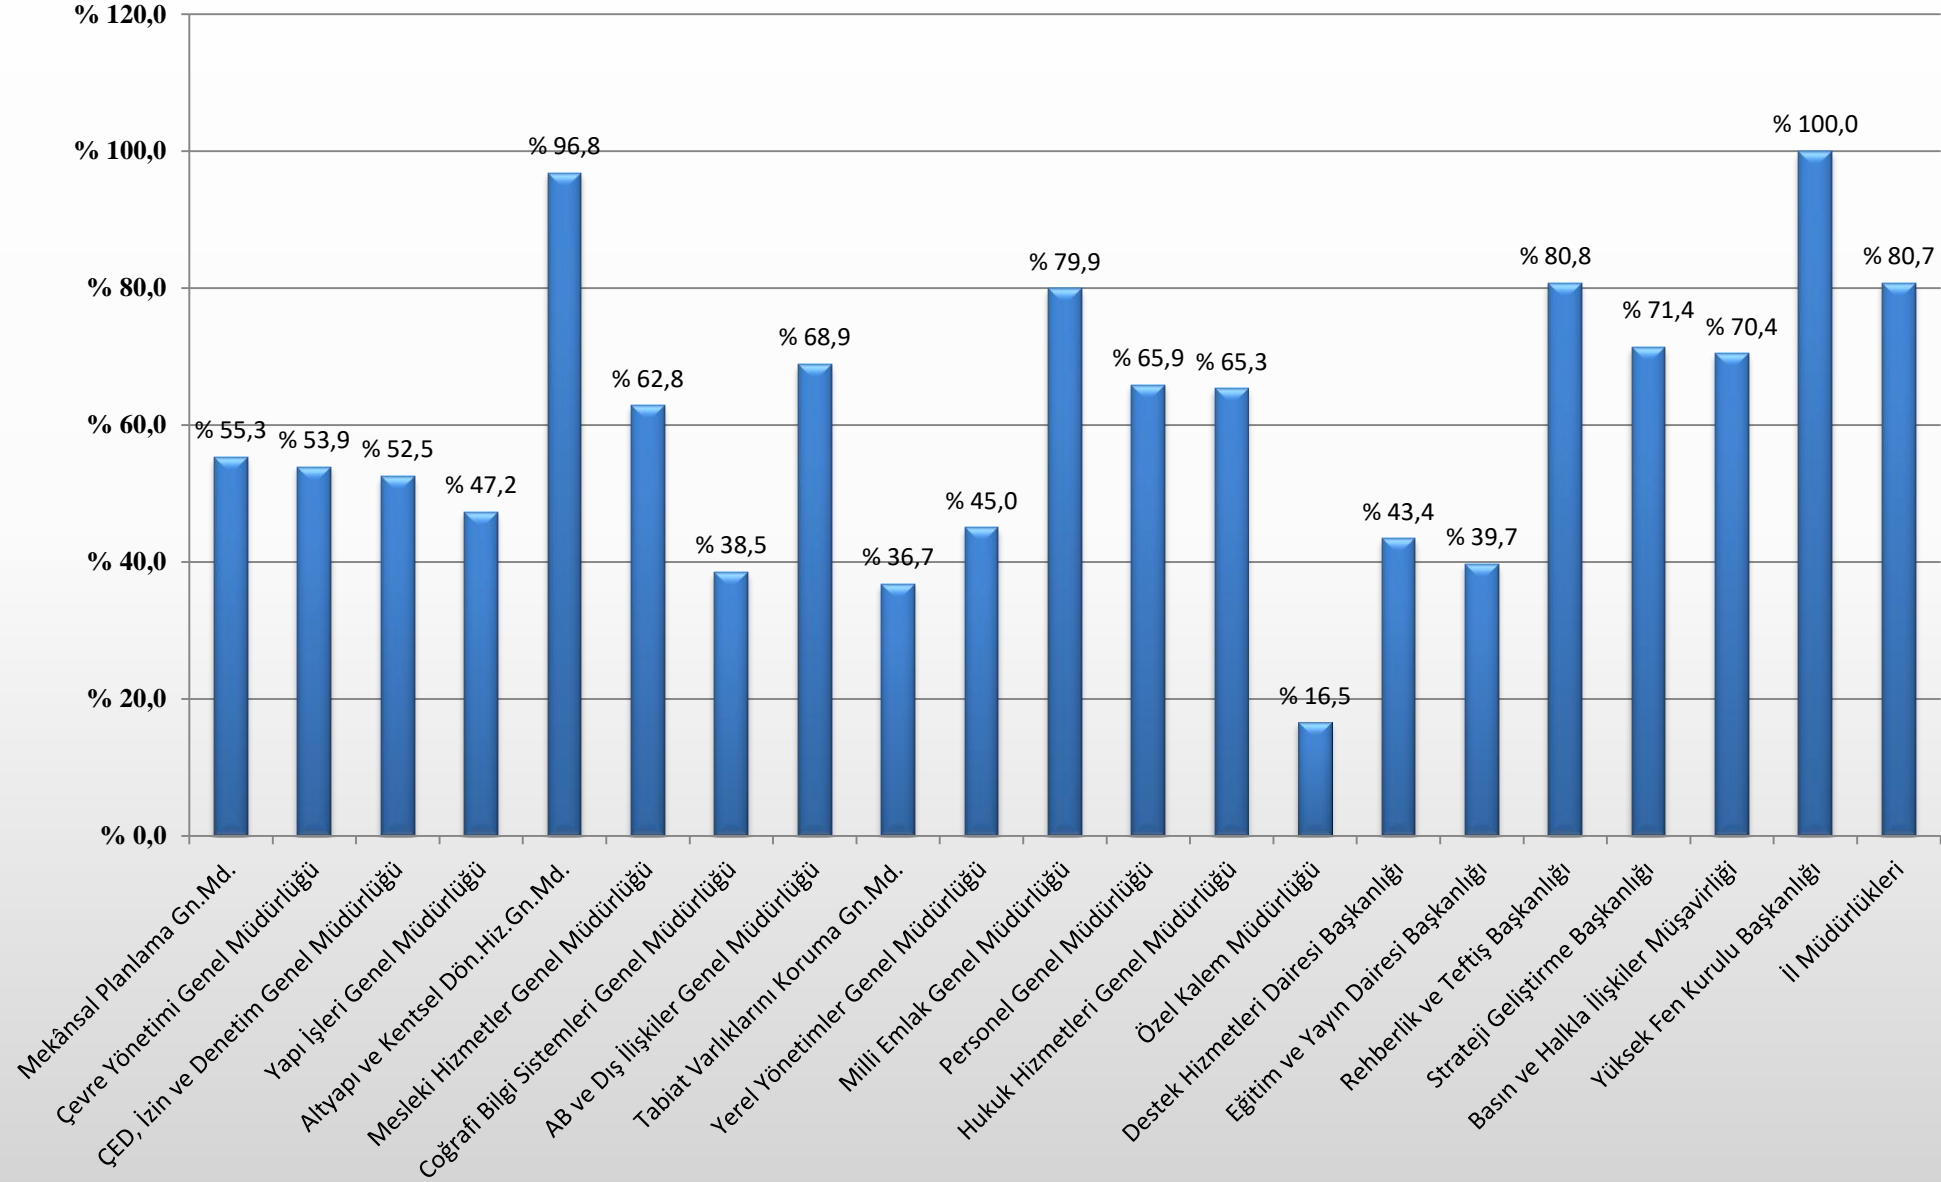

**Arz Ederim...**





## MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2020	7.800	0	2.600	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2020	4.000	0	1.600	0	% 0,0	01.10.2019 tarihinde ihalesi yapıldı.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2020	3.800	0	1.000	0	% 0,0	10.10.2019 tarihinde ihalesi yapılacak.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2020	4.000	0	2.650	0	% 0,0	
2018K090220	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	1.500	0	1.000	0	% 0,0	5 tane ilde işe başlandı.Sözleşme Bedelleri Yozgat İli için 291.250, Denizli İli için 292.600, Samsun İli için 251.000, Düzce ili için 152.500, Mardin İli için 280.000'dir. Henüz harcama Yapılmamıştır
	Samsun İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	251.000 TL bedelle ihale edilmiştir. İşe başlanmıştır.
	Yozgat İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	291.250 TL bedelle ihale edilmiştir. İşe başlanmıştır.
	Nevşehir İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	Bu alt projeden vazgeçilmiş olup, yerine denizli ve düzce illeri eklenmiştir.
	Denizli İlinde Örnek İmar Uygulaması	2019-2020				0	% 0,0	292.600 TL bedelle ihale edilmiştir. İşe başlanmıştır.
	Düzce İlinde Örnek İmar Uygulaması	2019-2020				0	% 0,0	152.500 TL bedelle ihale edilmiştir. İşe başlanmıştır.
	Mardin İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	280.000 TL bedelle ihale edilmiştir. İşe başlanmıştır.

**MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090600	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (DOKAP) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	1.000	0	500	0	% 0,0	
	Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	400	0	200	0	% 0,0	KDV hariç 241.000 TL (KDV dahil 284.380 TL) bedelle ihale edilmiştir. 30.09.2019 tarihinde işe başlanmıştır.
	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	600	0	300	0	% 0,0	Proje 2019 yılı için iptal edilmiş olup, 2020-2021 yılları için tekrar ödenek talep edilmiştir.
<b>4 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K060290	Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri (Kanalizasyon Sektörü)	2018-2022	9.986	0	1.576	0	% 0,0	
	Muhtelif Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri	2018-2022	9.536	0	1.126	0	% 0,0	Söz konusu proje, şemsiye proje niteliğinde olup; bu kalem altında bir proje çalışması yürütülmektedir.
	Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması	2019-2019	450	0	450	0	% 0,0	26 Temmuz 2019 tarihinde projenin Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Ekim ayı içinde projenin son ödemesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2022	1.000	0	500	0	% 0,0	Herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	109.904	40.000	50.000	3.625	% 7,3	KAP projesi Bakanlığımız ilk 100 gün, ikinci 100 gün ve üçüncü 100 gün eylem planında yer almıştır. Üçüncü 100 gün eylem planı 30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanmış olup bu süreçte öngörülen işlerden olan aktarma istasyonu inşaatı yapım işi, entegre atık yönetimi tesisi danışmanlık işi, aktarma istasyonu uygulama projesi danışmanlık işi, düzenli depolama lotu uygulama projesi danışmanlık işi, düzenli depolama lotu yapım işi ve ön işlem tesisi danışmanlık işi ihale çalışmalarına başlanılmıştır.
2018K080010	İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2018-2020	1.000	0	4	0	% 0,0	Herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
2018K100290	Tersanelerin Deniz Etkilerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.487	697	790	0	% 0,0	Söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında TUBİTAK/MAM ile yürütülmektedir. Proje kapsamında 11-14 Haziran 2019 tarihlerinde, Ekosistem Temelli İzleme Programının geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile İzleme Programı Çalışmayı düzenlenmiştir. 2019 yılı proje ödemesi sadece yılın son çeyreğinde yapılacak olup, üçüncü çeyrekte herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.480	2.520	2.000	0	% 0,0	Projede 3. Ara Rapor sunulmuş, bu rapora yönelik belirlenen eksikliklerin tamamlanma süreci devam etmektedir. Sektör çalışma grubu toplantıları ve ana çalışma grubu toplantıları devam ederken, modelleme çalışmalarına ilişkin eksik verilerin temin edilmesi ve olmayan verilerin ikamesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	2.000	328	301	% 91,8	Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Belirlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Uygulamanın Kolaylaştırılmasının Sağlanması Projesi 3 Şubat 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Dokuz Eylül Üniversitesi yürütücülüğünde başlamıştır. Demir çelik üretimi, demir dışı metal üretimi, tekstil, şeker üretimi, büyük yakma tesisleri, çimento üretimi, cam üretimi tesisleri, tuğla ve kiremit üretimi, beyaz eşya üretimi, seramik üretimi, gıda üretimi, petrokimya üretimi tesisleri yerinde ziyaret edilmiştir. Entegre Demir Çelik Üretimi, Demir Dışı Metal Üretimi, Şeker Üretimi, Tekstil Üretimi, Cam Üretimi, Tuğla ve Kiremit Üretimi, Boya Üretimi, Maya Üretimi, Bitkisel Yağ Üretimi ile ilgili kılavuzlar hazırlanmıştır. 2019 yılı Haziran ayında II. Sektörel Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 23.05.2019 tarihinde Proje IV. Ara raporu sunulmuş olup, onaylanmıştır. Proje kapsamında sektörel kontrol listeleri, uygulama kılavuzları ve mevzuat değişikliği çalışmalarına devam edilmektedir. 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 301bin TL ödeme yapılmıştır. Projenin eğitim faaliyetleri devam etmektedir.
2018K100020	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	8.000	1.200	1.104	747	% 67,7	
	Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespiti	2018-2019	500	200	300	150	% 50,0	Ana amaç çevre ve iklim dostu ulaşımın desteklenmesidir. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi ile yürütülen Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespiti Projesi ile ülke araç filosu yaş, motor tipleri ve yakıt türüne göre analiz edilmiştir. Seçilen senaryolar kapsamında hava kalitesi modelleme çalışmaları devam etmekte olup, sonucuna müteakip sağlık etkileri de hesaplanarak hurda teşvik mekanizmasına yönelik detaylı değerlendirme raporu iletilecektir.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi	2018-2021	4.000	1.000	800	597	% 74,6	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmektedir. 27.06.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi kapsamında , başlangıç raporu ve 1. ve 2. gelişme raporu kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. Projede HEY- Hava Emisyon Yönetim Portalı yazılım bakım ve geliştirme işlemleri devam etmektedir. Hava Emisyon Konulu Çevre İzin sayısallaştırılması işlemleri proje destek elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup, 755 Ek-1 tesisine ait 11.139 bacaya ait veriler veri tabanına kaydedilmiştir. Konya, Samsun, İzmir, Adana, Erzurum ve İstanbul bölgesel hava kalitesi yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi modelleme eğitimleri başlamış olup, eğitimlerden Bakanlığımız ilgili personeli, Temiz Hava Merkezleri personeli, çeşitli üniversitelerden görevlendirilen akademisyenler yararlandırılmaktadır.
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi	2018-2021	2.000	0	2	0	% 0,0	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesinin protokol taslağı hazırlanmış olup Bakanlık Makamına onaya sunulmuştur. 2020 yılı yatırım programı sürecinde başlatılması planlanmaktadır.
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2021	1.500	0	2	0	% 0,0	Koku Oluşturan Emisyonların Yönetimi Projesi protokol taslağı hazırlanmış olup Bakanlık Makamına onaya sunulmuştur. 2020 yılı yatırım programı sürecinde başlatılması planlanmaktadır.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100300	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.687	287	700	0	% 0,0	Söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında TÜBİTAK/MAM ile yürütülmektedir. Proje kapsamında TÜBİTAK tarafından hazırlanan II.Ara Rapor 23/08/2019 tarihinde teslim edilmiştir. Projeye ilişkin olarak, 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da Önlemler Programı Çalıştayı düzenlenecektir. Önlemler Çalıştayı takiben hazırlanacak III.Ara Raporun Bakanlığımızca onaylanmasını müteakip 2019 yılı son çeyreğinde 700.000TL (KDV Dahil) ödeme gerçekleştirilecektir.
2018K100310	Deniz Çöplerinin Önlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	2.360	0	2	0	% 0,0	Proje kapsamında 2019 yılında 2.000 TL. iz bedel konus olup , bu yıl içerisinde herhangi bir ihale çalışması yapılmayacaktır. Söz konusu çalışmalara 2020 yılında başlanması ön görülmektedir.
2018K100410	EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000	1.500	1.000	0	% 0,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Karabük Üniversitesi ile yürütülmektedir. 12.07.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. MET kontrol listelerinde verileri toplamak için oluşturulan yazılım ile firmalardan veri girişi sağlanmıştır. Her alt sektör için 5 adet MET Kontrol listesi hazırlanmıştır. MET Referans Dokümanları ve MET Sonuçlarının Türkçe çevirisi tamamlanarak web sitesinde yayımlanmıştır. Proje tanım videosu, proje tanıtım broşürü hazırlanmış ve 2 Kasım 2018 tarihinde proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık ofisinde 2 adet proje asistanı çalışmaya başlamıştır. 7 adet Proje Yönetim Planı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık personeline yönelik 2 adet Eğitim Programı ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 1. Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 2 adet yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Envanter güncelleme çalışmaları ile belirlenmiş tesislere saha ziyaretleri tamamlanmak üzere. 2018 yılı içinde; Proje Yönetim Planı Raporu onaylanarak 885.000 TL (KDV Dahil) ilk ödeme ve Saha Ziyareti Planı Raporu onaylanarak 613.600 TL (KDV Dahil) ikinci ödeme gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ilk üç çeyreğinde ödeme bulunmamaktadır. Proje takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir.

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100670	Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000	0	300	0	% 0,0	
	Sulu Sistem Atık Depolama Alanı Bertarafı	2018-2021	2.000	0	200	0	% 0,0	Proje ile sulu sistem atık depolama faaliyetlerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin ortadan kaldırılması, çok geniş alanları kapsayan bu sahaların yeniden kazanımı, sulu sitem depolama yapılan atık barajlarının işletme esaslarının belirlenmesi (sızıntı suyu yönetimi, atık suyun proseste yeniden kullanılması vb), kapasitesi dolmuş atık barajlarının/depolama sahalarının kapatılması/rehabilitasyonu ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu toplulaştırılmış Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi Projesinin teknik şartname yazım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
	Termik Santral Taban Küllerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi	2018-2021	1.000	0	100	0	% 0,0	Proje ile ithal ve yerli kömür kullanan termik santrallerin faaliyeti sonucu oluşan küllerinin karakteristiğinin çıkarılması, karakteristiği belirlenen küllerin farklı kullanım olanaklarına yönelik literatür araştırması yapılması, örnek uygulama çalışmalarının incelenmesi, deneme üretimi yapılabilmesi için gerekli olan ön işlemlerin belirlenmesi, yapılan araştırmalar ve karakteristik kapsamında farklı kullanım olanağı bulunan sektörlerde deneme üretimi çalışması yapılması, farklı sektörlerde kullanımına yönelik kılavuz çalışması yapılması hedeflenmektedir. Söz konusu toplulaştırılmış Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi Projesinin teknik şartname yazım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2018K100390	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.451	1.365	550	492	% 89,5	Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CITYAIR) Projesi 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlamıştır. Açılış toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşlarının katılım sağladığı Yönlendirme Komitesi Toplantılarından üçü gerçekleştirilmiştir. Aktivitelere göre hazırlanması beklenen raporların teslimi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyu farkındalığı çalışmaları çerçevesinde; hem proje tanıtımı etkinliği hem de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, ilköğretim öğrencilerine temiz hava konulu seminer verilmiştir. Uçurtma, boyama etkinlikleri, "Gökyüzüne Mesajını Yaz" temalı etkinlik, sosyal medya yarışması düzenlenmiştir. Broşür ve görsel malzemeler hazırlanmıştır. Projenin 1. İlerleme Raporu hazırlanmış ve teslim edilmiştir.
AB katkısı			19.340	7.735	2.900	2.600	% 89,7	
2018K100400	KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2022	2.938	0	600	600	% 100,0	Proje henüz başlamamıştır.
AB katkısı			16.577	0	5.525	5.525	% 100,0	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100610	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2022	10.721	0	1.500	1.211	% 80,7	Projeye ilişkin Avrupa Birliği Delegasyonundan talep edilen bilgiler ve düzeltmeler hazırlanarak iletilmiş olup Delegasyondan görüş beklenmektedir.
AB katkısı	59.395		0	15.190	12.000	% 79,0		
2019K100030	REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2019-2021	1.588		650	616	% 94,8	Projenin ihale süreci devam etmektedir.
AB katkısı	8.842			3.900	3.700	% 94,9		
2017K100040	Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2020	9.078	4.820	3.300	1.637	% 49,6	
AB katkısı	78.194		42.560	25.806	12.900	% 50,0		
Ülke Katkısı	Düşük Karbonlu Kalkınma Strateji ve Eylem Geliştirilmesi	2018-2019	2.753	1.000	1.250	627	% 50,2	Projede 3. Ara Rapor sunulmuş, bu rapora yönelik belirlenen eksikliklerin tamamlanma süreci devam etmektedir. Bunun yanında ulaşım ve atık sektörlerine ilişkin sera gazı hesaplama araçları eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Projenin 4. bileşeni ile ilgili paydaş kurum temsilcileri ile 17-18 ekim tarihlerinde değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
AB katkısı			22.613	8.450	8.450	4.250	% 50,3	
Ülke Katkısı	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	1.345	390	500	240	% 48,0	Soğutma Sektörü eğitici eğitimleri; 21-22-23-24 Ocak 2019’da İstanbul’da, 7-8 Mart’ta İzmir’de gerçekleştirildi. A.3.1 taslak Raporu sunuldu. A.4 F-Gaz alternatiflerine ilişkin halkın farkındalığını artırılması çalışmaları hazırlığına başlandı ve A.4.1 raporu sunuldu. Web sayfası geliştirilerek web sayfası menüsü ve içerik yenilendi.27-28 Şubat 2019 tarihlerinde A.4. ve A.6. faaliyetlerine ilişkin toplantılar yapılmıştır. A.7. faaliyeti altında atık geri kazanım/berteraf tesisleri ziyaret edildi. 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul İlinde Soğutma-İklimlendirme-Isı Pompaları Sektörü için Sektörel Bilinçlendirme Çalıştayı gerçekleştirildi. 02 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da "Türkiye’de Yalıtım Köpüğü/Solvent ve Yangından Korunma Sektöründe F-gaz Alternatiflerinin Kullanımı Çalıştayı yapıldı. 3 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da "Türkiye’de Elektrikli Şalt Sektöründe F-gaz Alternatiflerinin Kullanımı Çalıştayı yapıldı.18-21 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul ve Ankarada Çevre Denetçileri Eğitimi gerçekleşti. 2-3 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da F-Gazlar ve F-Gaz İçeren Ekipman ve Sistemlere Yönelik Atık Yönetimi" çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 30 Eylül-2 Ekim 2019 tarihleri arasında Bakanlığımız toplantı salonunda F-Gaz Envanteri yazılımına ve F-Gaz Veri Tabanının hazırlanmasında gelinen durumun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirilmiştir.
AB katkısı			11.701	3.471	4.115	1.990	% 48,4	

**ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülke Katkısı	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	1.350	850	500	240	% 48,0	Proje Temmuz ayı itibari ile tamamlanmıştır.
AB katkısı			11.700	7.592	4.108	2.000	% 48,7	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	1.350	850	500	240	% 48,0	Projenin eğitim modülü hazırlığı onaylanmış Eğitim İhtiyaç Analizi temelinde başlatılmıştır. 17 eğitim modülü hazırlanmış ve eğitim programı buna istinaden planlanmıştır. Toplamda 20 eğitim oturumundan 14 ü tamamlanmıştır. 10 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da bir iletişim kampanyası açılış etkinliği düzenlenmiştir. Temmuz – Ağustos 2019 aylarında ise sergiler tamamlanmıştır. 14 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla, iletişim kampanyası faaliyeti tamamlanmış bulunmaktadır.
AB katkısı			11.700	7.592	4.108	2.000	% 48,7	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	2.280	1.730	550	290	% 52,7	Hibe programı bileşeni kapsamında, 37 hibe projesinin uygulama süresi tamamlanmıştır. Hibe programları izlemesi sürecinde, soruların yanıtlanması ve değişikliklerin işlenmesi adına Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System - MIS) temel araç olarak kullanılmıştır.
AB katkısı			20.480	15.455	5.025	2.650	% 52,7	
<b>17 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>177.480</b>	<b>54.389</b>	<b>64.904</b>	<b>9.229</b>	<b>% 14,2</b>	
			<b>AB KATKISI</b>	<b>182.348</b>	<b>50.295</b>	<b>53.321</b>	<b>36.725</b>	<b>% 68,9</b>



**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2020	122.598	80.347	18.147		% 0,0	
	Genel Bütçe Ödeneği		62.598	34.498	11.000	2.322	% 21,1	*Projenin Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kısmı ile ilgili, 2019 yılı Güneydoğu Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı illerdeki hava kalitesi izleme istasyonlarının bakım onarım ve kalibrasyonu için toplam 246.620 -TL harcama gerçekleştirilmiştir. *Söz konusu projenin yılı hizmet alımı 7 adet Bölgesel Temiz Hava Merkezleri tarafından Bölgesel olarak yapılmaya başlanmış olup; proje kapsamında bölgelerinde bulunan istasyonlar için talep edilen ve aktarma yoluyla gerçekleştirilen toplam 5.405.000 TL. ödenekten 2.067.095 TL. harcama yapıldığı e-bütçe sisteminde görülmektedir. *Öte yandan, gelen talep yazıları çerçevesinde; Hava Kirliliğinin İzlenmesi amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının taşıma gideri, enerji ihtiyacının temini, elektrik bağlantıları vb. iş ve işlemlere için talep edilen ve aktarma yoluyla gerçekleştirilen 61.100,00-TL ödenekten 7.999,22 TL harcama yapıldığı e-bütçe sisteminde görülmektedir.
	Döner Sermaye Ödeneği		60.000	45.849	7.147	0	% 0,0	Projenin Akdeniz THM Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmı ile ilgili, 08.08.2019 tarihinde 11.464.200,00 TL bedelle ihale yapılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar mevcut 7.147.000,00 TL ödenegin kullanılması planlanmaktadır.
2018K100470	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000	0	300	0	% 0,0	Projenin Başlangıç Raporunun içeriğinin belirlendiği çalışma toplantısı yapılmıştır. Başlangıç Raporu ve Proje Tanıtım Videosu hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme aşamasındadır.
2018K100620	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyonu, Entegrasyonu ve Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.400	0	440	0	% 0,0	Projenin İş Termin Planı ve Analiz Tasarım Raporu İncelenmiştir. İş Termin Planı onaylanmış, revize edilen Analiz Tasarım Raporunu incelenmektedir. Analiz Tasarım Raporunun onaylanmasına müteakip 2019 yılı ödemesi yapılacaktır.

**ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100120	E-PRTR Kapasite Geliştirme (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.742	912	830	797	% 96,0	Projenin Genel Bütçe Ödeneğinden 120.600 euro karşılığı 796.611,24 TL (1€=6.6054 TL) ödeme gerçekleştirilmiştir. Projeyle ait tüm faaliyetler tamamlanmıştır. Proje Başlangıç- Bitiş tarihleri: 25 Mayıs 2017 – 25 Mayıs 2019 Toplam proje bütçesi:2.410.000 € (AB Katkısı: 2.149.000 € - Ulusal Katkı: 261.000 €)'dir. Projeyle 2017 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 1.195.000 TL proje tutarı ve 641.000 TL 2017 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 9.822.000 TL, 2017 yılı ödeneği 5.924.000 TL olup proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100,00 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. Projeyle 2018 yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe yer verilmemiştir. 2019 yılı için AB Katkısı 852.678 €, Ulusal katkı ise 120.600 € dur.
AB KATKISI			13.969	8.427	5.542	5.350	% 96,5	
2019K100010	SÇD Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	306		130	112	% 86,0	IPA III. Bileşen Çevre ve İklim Eylem Programı Finansman Anlaşması "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi" kapsamında yer alan "2019K100010 nolu Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi (SÇD) Projesi için, 17.940,00 euro karşılığı 111.863,08 TL (1€=6.2354 TL) üzerinden 03.04.2019 tarihinde ödeme gerçekleştirilmiştir. SÇD Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 11.07.2019 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. •Kurum/kuruluşlardan SÇD Yönetmeliğinin etkin uygulanmasının sağlanması amacıyla SÇD odak noktaları belirlenmiştir. • 26.09.2019 tarihinde SÇD Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi'ne ilişkin "Yerinde Kontrol Ziyareti" AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilmiş olup projenin son durumu, sürdürülebilirliği, dosyalama ve arşiv sistemi ile Avrupa Birliği görünürlük faaliyetleri hakkında incelemelerde bulunulmuştur. • 03.10.2019 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile "Kırklareli-Tekirdağ-Edirne Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı" SÇD Pilot uygulaması ile ilgili toplantı gerçekleştirilmiştir.
AB KATKISI			1.658		663	580	% 87,5	
<b>5 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>72.046</b>	<b>35.410</b>	<b>12.700</b>	<b>3.230</b>	<b>% 25,4</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>60.000</b>	<b>45.849</b>	<b>7.147</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>132.046</b>	<b>81.259</b>	<b>19.847</b>	<b>3.230</b>	<b>% 16,3</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>15.627</b>	<b>8.427</b>	<b>6.205</b>	<b>5.930</b>	<b>% 95,6</b>	

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	16.500	8.500	2.000	0	% 0,0	İlk ihale olan Bakanlık Hizmet Binası işine ilişkin kesin hesap işlemleri tamamlanmıştır. İkinci ihale olan CBS Veri Merkezi ve İlave İşler İnşaatı işinin kesin kabulü yapılmış ve 10.07.2017 tarihinde onaylanmış olup işe ait kesin hesap çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
2018E050290	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2023	750.000	100.000	7.800	7.800	% 100,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünce söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL Genel Müdürlüğümüze Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmalarının kapsamının belirlenmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli ön proje doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlandığı bilinmektedir. İhale süreçleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
2019D000290	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (Enerji Sektörü)	2019-2024	1.120.000	0	27.000	0	% 0,0	Dünya Bankası ile kredi ve hibe anlaşması öncesi teknik dokümanların hazırlanması tamamlanmıştır. Finans anlaşması öncesi müzakere tutanağı imzalanmıştır. Finans anlaşması Dünya Bankası Kurulunda 24 Ekim 2019 tarihinde görüşülerek imzalanacaktır. Kamu binalarının enerji etüdlerinin yapılması, uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ihalelerinin yapılması için teknik şartnameler hazırlanmaktadır. 2019 yılı sonu kredi ve hibenin aktif olması sonucu kredi ve hibe ödeneği kullanılacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2014 yılında enerji etüdüleri yaptırılan toplam 938 adet bina için 14 adet kurumdan gelen bilgiler kurum kurum toplanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında yer alan binaların uygunluk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiş, proje ve fatura bilgilerinin arşivlenmesi işlemleri ve envanter çalışması tamamlanmıştır. Dünya Bankası proje kapsamına alınacak ilave binaların tespiti için tüm Bakanlıklar ve Başkanlıklara proje kapsamına alınmasını istedikleri binalarının bilgilerinin gönderilmesi istenilmiş, kurumlardan gelen bilgileri toplanmaktadır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		1.092.000		22.000	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği		28.000		5.000	0	% 0,0	

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Çevrimiçi Proje Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması (CADD Uyumlu) ve Yaygınlaştırılması	2019-2019	1.150		1.150	280	% 24,3	Yıl sonu hedefine uygun ilerlemenin sağlanması planlanmaktadır.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2019-2019	760		760	91	% 12,0	Ulusal Yapı Denetim Sistemi uygulama yazılımı üzerinde ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri ile güncelleme taleplerinin gerçekleştirilmesi ve yazılımın 7/24 kesintisiz bir şekilde sağlıklı işletilebilmesi için uygulama yazılımı bakım işinin yenilenmesi gerçekleştirilmiştir.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2019-2019	500		500	52	% 10,4	Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki yazılımların bakım onarım ve iyileştirme işlemlerinde ve donanım ihtiyaçlarının sağlanmasında proje ödeneği kullanılmaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNERİN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070120	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	5.700	300	1.100	267	% 24,3	
	Muhtelif İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri	2018-2022	5.100	300	500	14	% 2,8	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir.Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması	2019-2019	600		600	253	% 42,2	Hatay, Mersin, Adana, Osmaniye, Kilis, illerine ait yöresel konut mimari avan projeleri tamamlanmıştır.Mimari açıklama raporları hazırlanmıştır.Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerine ait yöresel konut mimari avan projeleri incelenmektedir.İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Bilecik illerine ait yöresel konut mimari avan projeleri hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2020	30.850	11.966	6	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2020	9.379	3.513	2	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlanmıştır. Projeye ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanununa 25.05.2018 tarihinde geçici madde eklenmiş olup yıkıp yeniden yapılacak 250 adet konut belirlenmiştir. Kanun gereği 250 aileye başvuru için 6 ay süre verilmiş olup müracaatlar alınmıştır. Proje çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2020	11.970	3.389	2	0	% 0,0	131 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkemedan Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2020	9.501	5.064	2	0	% 0,0	152 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkemedan Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2022	33.600	5.000	13.004	9.354	% 71,9	
	Muhtelif İskan Konutları Altyapı İşleri	2010-2022	20.600	5.000	4	0	% 0,0	Ödeneği bulunmamaktadır.
	Ilisu Barajı İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2019	13.000	0	13.000	9.354	% 72,0	17.05.2019 tarihi itibarıyla 2019 Yılı revize ödeneği 13 milyon 4 bin TL'ye çıkarılmıştır.
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	4.277	1.826	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	221.885	57.304	62.845	53.507	% 85,1	Toplaştırılmış proje (detayı alttakiler)
	Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2020	26.100	3.500	16.000	6.667	% 41,7	17.05.2019 tarihi itibarıyla 2019 Yılı revize ödeneği 16 milyon TL'ye çıkarılmıştır.
	Muhtelif İskan İşleri	2011-2022	195.785	53.804	46.845	46.840	% 100,0	İşlerin yapım çalışmaları devam etmektedir. (Samsun-Vezirköprü-Susuz köyü tamamlanmış olup konut kuraları çekilmiştir. Erzincan İli Uluköy-Kayı-Kalecik köyleri yapım işleri ise devam etmektedir). 11 milyon 493 bin ek ödenek gerekmektedir.
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2022	220.414	167.660	4	0	% 0,0	
	Anamur-Alaköprü Barajı İskanı	2013-2022	211.477	158.725	2	0	% 0,0	Alaköprü Barajı İskanı alt projesinin yılı ödeneği 5543 sayılı İskan Kanununun 33 üncü maddesi gereğince DSİ Genel Müdürlüğü bütçesinden transfer edilmektedir. 2019 yılında 23.923.000 TL ödeme yapılmıştır. Ödenek tahsis edilmediğinden iş devam edememektedir. 40 milyon 840 bin ek ödenek gerekmektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2019	8.937	8.935	2	0	% 0,0	İş Bitti.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2022	3.620	1.400	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.



**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	135.206	40.000	10.000	18.206	% 182,1	Ödeneğini harcadığından iş devam edememektedir. 82 milyon 768 bin ek ödenek gerekmektedir.
2018K070020	Bozkır Barajı İskanı (KOP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	170.164	0	83.000	12.121	% 14,6	17.05.2019 tarihinde ödenek tahsis edilerek ödeneği 83 milyon TL'ye çıkarılmıştır. İş süratle devam etmektedir.
2018K070030	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (KOP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	37.619	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K070130	İlisu Barajı İskanı (GAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	76.287	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K070140	Yusufeli Barajı İskanı (DOKAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	115.488	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2019K07- 147022	Bulanık Alparslan 1 Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2020	4.557	0	4.500	0	% 0,0	Yatırım programına Eylül ayının sonunda alınmış olup ihale talimatı verilmiştir.

## YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	5.950	2.800	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2016K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	268.800	53.849	14.690	4.088	% 27,8	İşler devam etmektedir. Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak illerinden yaklaşık 93 adet köyde yaklaşık 2.140 ailenin konut yapımı işidir. 6.467.496 TL ödenek illere gönderilmiş olup bu ödenğin 2.354.000 TL'si harcanmıştır. Öncelik, yarım kalan işlerin tamamlanmasına yöneliktir. Tüm işlerin tamamlanması için 56 milyon 960 bin ek ödenek gerekmektedir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2021	33.681		11.227	6.042	% 53,8	kamulaştırma ve satın alımlar için kullanılmaktadır.
<b>19 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>2.932.077</b>	<b>385.456</b>	<b>211.679</b>	<b>101.678</b>	<b>% 48,0</b>	
		<b>08 TOPLAM</b>	<b>274.750</b>	<b>56.649</b>	<b>14.692</b>	<b>4.088</b>	<b>% 27,8</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>16.500</b>	<b>8.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3.223.327</b>	<b>450.605</b>	<b>228.371</b>	<b>105.766</b>	<b>% 46,3</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>33.681</b>	<b>0</b>	<b>11.227</b>	<b>6.042</b>	<b>% 53,8</b>	

(\*\*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

## ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2020	6.500	3.750	550	0	% 0,0	07/03/2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden "Kamu İhale Kanunu'nun 3(f) Maddesi Kapsamında Araştırma Geliştirme Protokolü" imzalanmış olup, söz konusu protokol kapsamında tamamlanmamış bileşenler ve eksiklikler, daha evvel bitirilen iş kalemleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 2019 yılında projeye yapılacak harcamaya ilişkin ayrıca değerlendirme yapılacaktır.
2018K090320	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	2.200	0	1.000	0	% 0,0	Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla, kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup, bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek olan "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik Stratejilerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2019-2021	12.000		4.000	2.887	% 72,2	6306 sayılı kanun kapsamında Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına ilişkin projede çalışmalar devam etmektedir.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>8.700</b>	<b>3.750</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.887</b>	<b>% 72,2</b>	

**MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D000070	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2022	3.950	125	683	7	% 1,0	*Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-TR) Uygulaması 2. Versiyon Bakım, Destek ve iyileştirme İşi Hizmet Alımına ait 219.000 TL bedelli, 365 gün süreli sözleşme 25/06/2019 tarihinde imzalanmıştır. Yükleniciye ödemeler 6 şar aylık dönemler halinde iki seferde yapılacaktır.  *Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı İşinin ihalesi 17/07/2019 tarihinde yapılmış ancak iptal olmuştur. 2019 yılı Ekim ayında ihalenin tekrarlanması planlanmaktadır. Sözleşme süresi 240 gün olarak belirlenen işte, oluşacak ihale bedelinin tasarım raporu onaylandıktan sonra %15'inin, işin tamamlanmasından sonra kalan %85'inin ödemesi planlanmaktadır.
2019G000370	Konut Araştırması (Konut Sektörü)	2019-2020	1.000		300	0	% 0,0	Üniversite ile sözleşme imzalanmış, Proje ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	2.458	1.758	700	0	% 0,0	Proje kapsamında ODTÜ ile 02.09.2019 tarihinde Binalarda Betonarme Kalıpları Ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Yapım Esaslarının Belirlenmesi Protokolü imzalanmış olup çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Proje kapsamında Bisiklet Yolları Yönetmeliğinin revize edilmesi, Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzunun güncellenmesi, Güvenli Bisiklet Sürüş Teknikleri El Kitabı ve Broşürünün hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Tüm bu çalışmalar kapsamında Ocak - Eylül dönemi içerisinde Proje bütçesinden herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2019-2019						
	YAMBİS ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncelleme	2019-2019	300		300	36	% 12,1	19.03.2019 tarih ve 63900 sayılı olur ile; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne 300.000,00 ödenek aktarıldı. Kalan ödenekten İlan giderleri olarak 19.315,00 TL harcandı. 17.04.2019 tarih ve 91644 sayılı olurâ istinaden yapılan İibankta yapılan eğitime 17.000,00 TL harcandı. Toplam harcama 36.315,00TL
2019K010820	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2019-2019	500		500	132	% 26,3	İhale ilan bedeli ve TSE Deney Hizmeti Ücreti ödemesi yapılmıştır. Tablet ve Mobil yazıcı ihalesine ilişkin ödeme gerçekleştirilmiştir
<b>5 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>8.208</b>	<b>1.883</b>	<b>2.483</b>	<b>175</b>	<b>% 7,0</b>	

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2019-2019						
	YAMBİS ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncelleme	2019-2019	300		300	0	% 0,0	YAMBİS ve MYS Uygulamaları Bakım Onarım Sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilecektir. MYS uygulaması ile YAMBİS uygulamasının entegrasyon çalışmaları, MYS hesaplaması ve veri alışverişine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır
	Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sistemlerine Entegrasyonu	2019-2019	1.120		1.120	1.012	% 90,4	2 adet ihale yapılmış olup; "Milli Emlak İlan" ve Kurum Tahsis" İnternet sitelerinin yeniden yazılması hizmeti alımı % 70'i ödenmiştir. Sybase Veritabanı ve SAP İş Zekası lisans alımı tamamı ödenmiştir.
	Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme	2019-2019	1.960		1.960	529	% 27,0	Oracle Weblogic Uygulama Sunucuları idame bakım hizmeti alımı sve Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) yazılım geliştirme hizmeti alımı sözleşmeleri imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre , yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	3.500	500	0	% 0,0	2020-2023 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup Onbirinci Kalkınma Planı doğrultusunda güncelleme ve revizyon çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin tanıtımına yönelik toplantıların 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2017K090360	Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000	21.600	8.400	2.269	% 27,0	1) İhale Yapılmış ve Nesus Zafiyet tarama Programı Lisansı alımı ile ilgili olarak sözleşme imzalanmıştır. 2) Java Yazılım Lisansı Temini işi gerçekleştirilmiştir.
	Bilgi Sistemleri Güvenlik Yazılımı Temini	2017-2019	8.600	6.000	2.600	0	% 0,0	1) Aktif Dizin Yükseltme Destek Hizm. İşi gerçekleştirilmiştir.
	Bilgi Sistemleri Sistem Yazılımı Temini	2017-2019	19.000	14.000	5.000	0	% 0,0	Vmware lisans alımı ve firewall alımı için şartnameler hazırlanarak Devlet Malzeme Ofisi'ne gönderilmiş, satın alma süreçleri başlatılmıştır.
	Bilgi Sistemleri Uygulama Yazılımı Temini	2017-2019	2.400	1.600	800	0	% 0,0	1) 2019 yılı Belgenet bakım ve güncelleme işi ile Nitelikli Elektronik Sertifika ve Minikart koyucu ödemesi tamamlanmıştır.

**COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090630	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	24.000	13.000	11.000	79	% 0,7	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2019	7.500	4.000	3.500	0	% 0,0	2019 yılı itibarıyla 19 adet veri temasından 11 tanesi tamamlanmış olup 8 adet veri temasına ait standart geliştirme çalışmaları ise devam etmektedir.
	Coğrafi Bilgi Platformunun Kurulumu	2018-2019	6.000	3.000	3.000	79	% 2,6	Dizüstü bilgisayar alımı yapılmıştır.
	Coğrafi Veri Uyumlaştırma Projesi	2018-2019	6.500	3.500	3.000	0	% 0,0	Sözleşme imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 12 ilin kent atlası tamamlanmıştır. Yaklaşık 7.000.000 adet binanın 3 boyutlu verisi üretilmiştir. Satın alma süreci başlatılmıştır.
	TUCBS Entegrasyonu Projesi	2018-2019	4.000	2.500	1.500	0	% 0,0	2019 yılı itibarıyla 32 adet kamu kurum ve kuruluşu ile 30 Büyükşehir Belediyesi ile ilgili entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Satın alma süreci başlatılmıştır.
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2020	13.310	2.000	1.000	0	% 0,0	Projeye 2019 Yılı Yatırım programının Şehirleşme Sektöründe 13.310.000 TL toplam proje tutarı olmak üzere 1.000.000 TL 2019 yılı ödeneği ile yer verilmiş olup harcama yapılmamıştır. Kent Bilgi Sistemi Altyapısının yaygınlaştırma faaliyetlerine başlanmıştır. İçişleri Bakanlığı e-Belediye Projesi ile entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir.
2018K090040	İmar Planları İzleme ve Denetim Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	3.000		1.500	0	% 0,0	İmar planları İzleme ve Denetim Modeli Projesi kapsamında satınalma süreçleri başlatılmıştır.
<b>6 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>77.690</b>	<b>40.100</b>	<b>25.780</b>	<b>3.889</b>	<b>% 15,1</b>	

**AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100500	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	20.475	1.441	2.200	1.089	% 49,5	
AB KATKISI			116.025	8.169	11.106	8.900	% 80,1	
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>20.475</b>	<b>1.441</b>	<b>2.200</b>	<b>1.089</b>	<b>% 49,5</b>	
		<b>AB KATKISI</b>	<b>116.025</b>	<b>8.169</b>	<b>11.106</b>	<b>8.900</b>	<b>% 80,1</b>	

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000630	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2018-2021	1.412	455	319	0	% 0,0	*Ihlara Vadisi Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzenleme Projesi sözleşmesi imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 103.604,00 TL(KDV dahil) olup, inceleme ve onay aşamasındadır. *Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova ve Patara ÖÇKB Bisiklet Yolları Uygulama Projesi işi tamamlanmış, işin kontrol süreci devam etmektedir. Sözleşme bedeli 100.300,00 TL (KDV dahil) olup henüz ödeme yapılmamıştır.
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP) (Turizm Sektörü)	2017-2019	18.620	8.900	9.720	4.358	% 44,8	
	Genel Bütçe Ödeneği		10.950	8.900	2.050	2.050		Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yıllara sari olarak yürütülen projede 2017 yılında 2.900.000,00TL, 2018 yılında 5.942.526,06 TL. 2019 yılında 2.050.000,00TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği		7.670	0	7.670	2.308		İmalat çalışmaları devam etmektedir.
2018F000200	Gökçeada Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	2.500	0	2.500	0	% 0,0	2019 yılı yatırım programında Gökçeada Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi Projesi için ayrılan 2.500.000,TL ödenek FRİGKÜM (Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği)'ne aktarılmıştır. 2019 yılı için 5.500.000 TL ödenek yatırım programında resmi olarak yayınlanmıştır. 2018 yılı bütçesi ile ihalesi yapılan iş 15.07.2019 tarihinde teslim edilecektir. Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi için Genel Müdürlüğümüz ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği arasında 2019 yılı için mali katkı protokolü imzalama çalışmaları devam etmektedir.
2018F000240	Tortum Gölü Yarım Ada Çevre Düzenlemesi (DAP) (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.500	4.500	5.000	0	% 0,0	2018 yılı içerisinde, Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçesinden Mülga Kalkınma Bakanlığı onayı ile 3.000.000 TL ödenek FRİGKÜM (Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği)'ne aktarılmıştır. 2019 yılı için 5.500.000 TL ödenek yatırım programında resmi olarak yayınlanmıştır. 2018 yılı bütçesi ile ihalesi yapılan iş 15.07.2019 tarihinde teslim edilecektir. Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi için Genel Müdürlüğümüz ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği arasında 2019 yılı için mali katkı protokolü imzalama çalışmaları devam etmektedir.
2018F000740	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	8.500	3.000	5.500	0	% 0,0	2018 yılı içerisinde, Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçesinden Mülga Kalkınma Bakanlığı onayı ile 3.000.000 TL ödenek FRİGKÜM (Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği)'ne aktarılmıştır. 2019 yılı için 5.500.000 TL ödenek yatırım programında resmi olarak yayınlanmıştır. 2018 yılı bütçesi ile ihalesi yapılan iş 15.07.2019 tarihinde teslim edilecektir. Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi için Genel Müdürlüğümüz ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği arasında 2019 yılı için mali katkı protokolü imzalama çalışmaları devam etmektedir.



**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K050050	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2021	16.514	3.800	3.815	497	% 13,0	
	Saros ÖÇKB Köyleri İçmesuyu Temini	2019-2019	1.500		1.500	0	% 0,0	Gelibolu Kaymakamlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup Gelibolu Kaymakamlığı ile yüklenici arasında proje için sözleşme imzalanmış olup, imalat çalışmaları devam etmektedir.
	Habilli Mahallesi İçmesuyu Temini	2019-2019	1.250		1.250	0	% 0,0	Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup SASKİ tarafından yürütülen proje sözleşme aşamasındadır.
	Çamlıhemşin İçmesuyu Temini	2019-2019	385		385	383	% 99,5	Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı ek protokolü imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2021	13.379	3.800	680	114	% 16,8	*Aksaray Sultanhanı İçmesuyu Temini Projesi için 114.200,00TL ödenek kullanılarak imalatlar tamamlanmıştır. *Aksaray İhlara İçmesuyu Mal Alım İşi için 26/07/2019 tarihinde İhlara Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	71.237	61.386	9.851	4.707	% 47,8	2019 yılı ödeneği olan 9.851.000 TL nin 4.707.314,19 TL'lik kısmının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma arasındaimzalan sözleşme gereğince yüklenici firmaya ödemesi için aktarılmıştır. Kalan kısmı gölde rihtımda atıl halde bekleyen vasıtaların geri mobilizasyonunda kullanılacaktır.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (KOP) (Çevre Sektörü)	2011-2019	2.532	2.101	431	181	% 42,0	Sahadaki çalışmalar ve hakediş ile ilgili işlemler devam etmektedir.
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	899	829	70	21	% 30,0	1. hakedişler yapıldı. Ara rapor teslim edildi 2. hakediş çalışmaları devam etmektedir.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	546	476	70	21	% 30,0	1. hakedişler yapıldı. Ara rapor teslim edildi 2. hakediş çalışmaları devam etmektedir.
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	547	477	70	21	% 30,0	1. hakedişler yapıldı. Ara rapor teslim edildi 2. hakediş çalışmaları devam etmektedir.
	Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme	2016-2019	177	137	40	10	% 25,0	1. hakedişler yapıldı. Ara rapor teslim edildi 2. hakediş çalışmaları devam etmektedir.
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2016-2019	147	107	40	11	% 27,5	1. hakedişler yapıldı. Çalışmalar devam etmektedir.
	Pamukkale ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2017-2019	216	75	141	97	% 68,8	Pamukkale ÖÇKB yönetim planı hazırlama ve uygulama projesi 2018-2019 yıllarını kapsamaktadır. 2018 yılı projenin % 35 i gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise (2018 yılından itibaren) bugüne kadar projenin %80 i gerçekleşmiştir..

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	825	209	616	0	% 0,0	Değerlendirme dosyaları ilgili şirket tarafından teslim edilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından teslim edilen dosyalar inceleme aşamasındadır. Yatırım Programının Çevre Sektöründe 694.000,00 TL+KDV bedel ile ihale edilmiştir 2018 yılı içerisinde % 30u ödenmiş olup, % 70 lik kısım 2019 yılı içerisinde ödenecektir. Ödeme çalışmalarına dair hakediş işlemleri imza aşamasındadır.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (KOP) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.335	797	538	149	% 27,7	
	Belek ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	270	135	135	0	% 0,0	Proje sonuçlanma şamasına gelmiş olup, kabule ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra son hakediş ödemesi yapılacaktır.
	Kaş-Kekova ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	285	156	129	0	% 0,0	Proje sonuçlanma şamasına gelmiş olup, kabule ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra son hakediş ödemesi yapılacaktır.
	Patara ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	450	325	125	0	% 0,0	Proje sonuçlanma şamasına gelmiş olup, kabule ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra son hakediş ödemesi yapılacaktır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	330	181	149	149	% 100,0	Proje sonuçlanmıştır.
2019K100040	Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi (DOKAP) (Çevre Sektörü)	2019-2020	500		100	0	% 0,0	

**TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090270	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	12.400		3.594	102	% 2,8	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2021	3.300		994	102	% 10,3	*Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı tamamlanmış olup, hakediş işlemleri tamamlanmıştır. *Muğla İli Ula İlçesi, Akyaka 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi devam etmektedir. *Kırşehir İli, Seyfe gölü 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi devam etmektedir. *Karaman İli, Merkez İlçesi, Kurucabel Köyü Yenidünya (Göz) Mağarası 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi devam etmektedir. *Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Salda, Doğanbaba, Kayadibi Köyleri 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi devam etmektedir.
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2021	6.700		2.000	0	% 0,0	1-Fethiye Göcek ÖÇKB Fethiye Kentsel Rehberinin Hazırlanması projesi hazırlık aşamasında. 2-Köyceğiz Dalyan ÖÇKB Dalyan Tasarım Rehberinin Hazırlanması çalışmalarına başlanacak. 3-İzmir Balçova İnciraltı Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı kurum görüşleri toplanıyor. 4-Aksaray (Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray ve Ankara İli Şereflikoçhisar kısmı) 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ihalesi yapıldı sözleşme imzalandı. 5-Aksaray (Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray ve Ankara İli Şereflikoçhisar kısmı)1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına esas jeolojik etüt ihalesi yapıldı sözleşme imzalandı. 6-Ihlara ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Kurum görüşüne çıktı. 7-Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl Mahallesi İmar Planına Esas Jeolojik etüt 2006 yılında yapılmış mevcut Etüt için Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda kullanılacağı için etüt iptal oldu. 8-Kaş-Kekova ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kurum görüşlerine çıktı. 9-Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Tasarım Rehberinin Hazırlanması ihalesine katılmadığı için ihale iptal oldu. 10-Köyceğiz Dalyan ÖÇKB Köyceğiz İlçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu protokolü 04.07.2019 tarih ve 156050 sayılı Dağıtım yazısı ile başladı. 11-Belek ÖÇKB Antalya İli Manavgat İlçesi Yavrudoğan, Büklüce, Denizyaka, Denizkent, Parekende, Kısalar Mahalleleri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Belediyeden Tarım görüşü bilgisi bekleniyor. 12- Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray İli Sultanhamı İlçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı protokolü 28.05.2019 tarih ve 125451 sayılı Dağıtım yazısı ile başladı.Devam ediyor. 13-Rize Çamlıhemşin İmar Planına Esas Jeolojik etüt protokolü 29.07.2019 tarih ve 175320 sayılı Dağıtım yazısı ile başladı.Devam ediyor. 14-Fethiye Göcek ÖÇKB İnce Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmaları kadastro kanununun 22 a maddesi gereği uygulama yapıldığı için başlatılmadı.

**TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması	2019-2021	2.400		600	0	% 0,0	Konya İli, Cihanbeyli İlçesi Karatepe, Gölyazı, Günyüzü Mahallelerinde İmar uygulaması işine ilişkin Belediyesi ile protokol imzalanmış olup, Belediyesince ihaleleri yapılarak sözleşmeleri gönderilmiştir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2019-2021	3.000		1.000	0	% 0,0	
<b>12 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>138.205</b>	<b>85.148</b>	<b>34.314</b>	<b>7.686</b>	<b>% 22,4</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>7.670</b>	<b>0</b>	<b>7.670</b>	<b>2.308</b>	<b>% 30,1</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>145.875</b>	<b>85.148</b>	<b>41.984</b>	<b>9.994</b>	<b>% 23,8</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	

**YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K080080	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Dipnot: 121) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2021	8.000	5.000	1.000	71	% 7,1	
2017K080030	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Dipnot: 121) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	5.710	500	1.570	85	% 5,4	
2019K070020	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi (Dipnot: 118) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2019	1.496.700		1.496.700	531.315	% 35,5	KÖYDES Projesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenekler 2 dilim olarak ayrılmış olup 1. dilim tutarı olan 748.350.000 TL 17.07.2019 tarihinde İLBANK KÖYDES hesaplarına aktarılarak kullanımı sağlanmıştır. 1. dilim ödeneğinden bakiyesi kalmamış ancak ödeme bekleyen il ve ilçelerimiz olduğu için ve 2. dilim ödenekleri aktarılmadığından harcama miktarı 1. dilim tutarı üzerinden hesaplanmalıdır.
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>1.510.410</b>	<b>5.500</b>	<b>2.570</b>	<b>156</b>	<b>% 6,1</b>	

Dipnot: 121 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Dipnot: 118 12.01.32.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

**MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010070	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2019-2019	3.792		3.792	0	% 0,0	
	Harita Alımları	2019-2019	250		250	0	% 0,0	
	Plan, Proje Alımları	2019-2019	250		250	0	% 0,0	
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2019-2019	3.292		3.292	0	% 0,0	Proje ödeneğinden 708.000 TL ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2019-2021	444.850		438.950	390.634	% 89,0	Başlangıç ödeneği 2.950.000,00 TL dir. Yıl içerisinde yedek ödenekten 436.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam 438.950.000,00 TL revize ödenekten 390.633.532,19 TL ödeme yapılmış olup, 48.316.467,81 TL kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
<b>1 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>3.792</b>	<b>0</b>	<b>3.792</b>	<b>0</b>	<b>% 0,0</b>	
		<b>Kamu laştırma</b>	<b>444.850</b>	<b>0</b>	<b>438.950</b>	<b>390.634</b>	<b>% 89,0</b>	

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2020	153.744	41.500	34.798	29.077	% 83,6	
	<b>Genel Bütçe Ödeneği</b>		<b>48.400</b>	<b>15.000</b>	<b>5.050</b>	<b>3.128</b>	<b>% 61,9</b>	
	<b>Döner Sermaye Ödeneği</b>		<b>105.344</b>	<b>26.500</b>	<b>29.748</b>	<b>25.949</b>	<b>% 87,2</b>	



**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	14.000	7.000	3.900	2.577	% 66,1	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde <b>KDV dahil 9.770.400,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. <b>KDV dahil 410.586 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 10.180.986 TL dir. 17.05.2019 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2021	13.000	0	200	178	% 89,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	9.900	8.000	900	373	% 41,4	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde <b>KDV dahil 6.652.840,00 TL</b> 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. <b>KDV dahil 665.275 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 7.318.115 TL dir. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2021	11.500	0	50	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	21.500	11.000	9.000	8.818	% 98,0	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde <b>KDV dahil 17.039.200 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.01.2018 tarihinde imzalandı. <b>Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %98' dir.</b> 2018 yılında Genel Bütçeden 5.481.473,52 TL ve Döner Sermayeden 7.672.889,69 TL ödeme yapılmıştır. <b>2019 yılı Ekim ayı içerisinde hizmete açılacaktır.</b>
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	13.000	5.500	6.000	5.273	% 87,9	Hizmet binası yapım işi 15.01.2018 tarihinde <b>KDV dahil 8.782.740 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.02.2018 tarihinde imzalandı. <b>KDV dahil 673.522 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 9.456.262 TL dir. 14.05.2019 tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır.</b> 2018 yılında Genel Bütçeden 4.992.315,98 TL ve Döner Sermayeden 1.710.848,36 TL ödeme yapılmıştır. <b>2019 yılı Eylül ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	15.000	7.000	7.980	6.762	% 84,7	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde <b>KDV dahil 10.924.440 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 28.02.2018 tarihinde imzalandı. <b>KDV dahil 1.069.374 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 11.993.814 TL dir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %95' dir.</b> 2018 yılında Genel Bütçeden 5.214.443,56 TL ve Döner Sermayeden 2.051.930,62 TL ödeme yapılmıştır. <b>2019 yılı Ekim ayı içerisinde hizmete açılacaktır.</b>
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2022	35.320	0	210	204	% 97,1	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2022	8.000	0	50	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	11.000	3.000	6.000	4.799	% 80,0	Hizmet binası yapım işi 08.02.2018 tarihinde <b>KDV dahil 6.629.240 TL'</b> ye ihale edilmiştir. Sözleşme 10.04.2018 tarihinde imzalandı. <b>KDV dahil 662.924 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 7.292.164 TL dir. Geçici kabulü yapılmıştır. 2019 yılı Eylül ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.</b>
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*.Döner Sermaye)	2019-2021	1.524		508	93	% 18,3	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu kapsamda; Hakkari İl Müdürlüğü hizmet binası kesin hesabı, İzmir THM Müdürlüğü Binası ve Konya THM Müdürlüğü Binası kesin hesapları ödenmiştir.

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K090050	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2019-2019	1.250		2.250	1.145	% 50,9	
	Hizmet Binası Onarımı	2019-2019	1.250		1.250	1.100	% 88,0	
2019G000060	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2019-2019	4.199		4.199	820	% 19,5	
<b>3 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>55.099</b>	<b>15.000</b>	<b>12.749</b>	<b>6.193</b>	<b>% 48,6</b>	
		<b>DÖNER SERMAYE</b>	<b>105.344</b>	<b>26.500</b>	<b>29.748</b>	<b>25.949</b>	<b>% 87,2</b>	
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>160.443</b>	<b>41.500</b>	<b>42.497</b>	<b>32.142</b>	<b>% 75,6</b>	

**DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 30.09.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019G000060	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2019-2019	100		100	27	% 27,0	Batkent Mesa Batı Sitesi 1/3 Blok 10 Nolu Kamu Konutunun Bakım ve Onarımı Yapılmıştır.
2019K090050	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2019-2019	250		250	159	% 63,6	Merkez Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere çeşitli Mefruşat ve Makine-Techizat Alımları yapılmıştır.
	Hizmet Binası Onarımı	2019-2019	250		250	128	% 51,2	Merkez Hizmet Binasında çeşitli onarım işlemleri yapılmıştır.
<b>2 Proje</b>		<b>06 ve 07 TOPLAM</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>314</b>	<b>% 52,3</b>	
