



2019 Yılı

Bütçe ve Yatırım Programı

4. Dönem Gerçekleşme Raporu

(01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Dönemi)



BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2019 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.264.444.000,00	1.312.107.148,45	1.298.520.868,41	% 99,0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	220.900.000,00	226.871.530,69	219.899.831,12	% 96,9
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	93.052.000,00	190.316.051,80	168.516.415,85	% 88,5
05	CARİ TRANSFERLER	572.867.000,00	2.720.750.320,57	2.714.346.506,78	% 99,8
	Kentsel Dönüşüm Özel Ödeneği	393.384.000,00	433.918.000,00	433.918.000,00	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-İmar Barışı	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	% 100,0
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	22.665.000,00	21.447.695,88	18.232.283,37	% 85,0
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	0,00	104.200.000,00	103.710.345,13	% 99,5
	Diğer Cari Transfer Ödenekleri	6.818.000,00	11.184.624,69	8.485.878,28	% 75,9
06	SERMAYE GİDERLERİ	177.331.000,00	1.919.511.146,18	1.610.267.219,38	% 83,9
	Bakanlık Yatırım Programı	158.154.000,00	322.891.732,87	254.423.995,94	% 78,8
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	19.177.000,00	453.577.000,00	402.602.252,18	% 88,8
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	1.143.042.413,31	953.240.971,26	% 83,4
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	230.000.000,00	1.330.295.788,04	1.292.511.531,25	% 97,2
	Bakanlık Yatırım Programı	78.625.000,00	100.920.788,04	88.224.711,05	% 87,4
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	151.375.000,00	371.375.000,00	346.286.820,20	% 93,2
	Kentsel Dönüşüm Ek Ödeneği-TOKİ ödemesi	0,00	858.000.000,00	858.000.000,00	% 100,0
08	BORÇ VERME	14.692.000,00	9.892.000,00	8.655.459,07	% 87,5
GENEL TOPLAM		2.573.286.000,00	7.709.743.985,73	7.312.717.831,86	% 94,9



BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

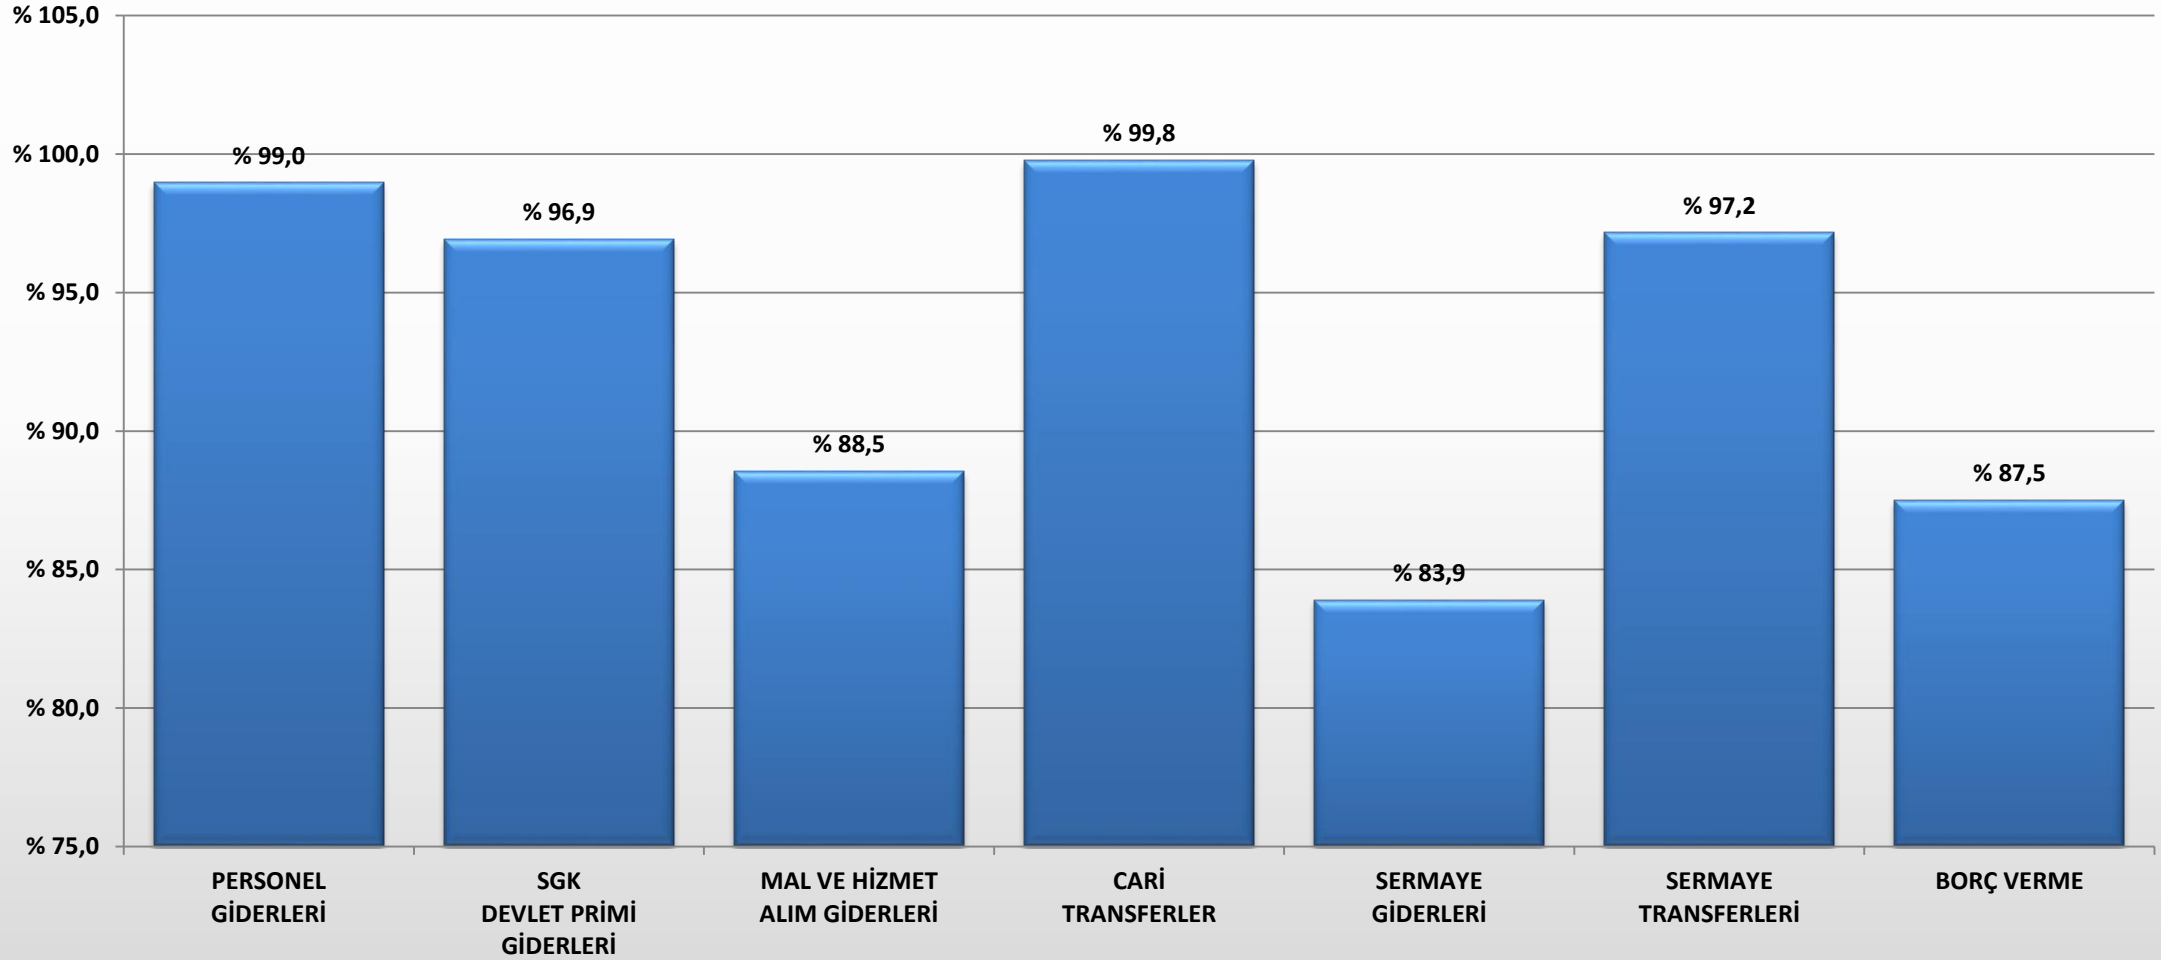




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2019 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2019 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	4	14.300.000,00	2.750.000,00	426.145,20	% 15,5
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	17	177.480.000,00	65.344.000,00	61.136.081,86	% 93,6
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	5	132.046.000,00	19.407.000,00	14.965.197,16	% 77,1
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	20	3.234.727.000,00	245.971.000,00	201.205.642,05	% 81,8
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	2	8.700.000,00	1.550.000,00	0,00	% 0,0
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	5	8.208.000,00	2.483.000,00	988.093,20	% 39,8
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	6	77.690.000,00	25.780.000,00	24.137.262,71	% 93,6
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	1	20.475.000,00	2.200.000,00	1.734.187,39	% 78,8
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	12	145.875.000,00	41.984.000,00	22.811.000,00	% 54,3
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	1.510.410.000,00	2.570.000,00	155.605,26	% 6,1
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	% 87,5
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	3	165.238.000,00	46.792.000,00	41.041.000,00	% 87,7
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	2	600.000,00	600.000,00	565.274,43	% 94,2
GENEL TOPLAM	77	5.499.749.000,00	461.431.000,00	372.665.489,26	% 80,8
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	74	5.307.710.000,00	411.241.000,00	325.210.489,26	% 79,1
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	3	192.039.000,00	50.190.000,00	47.455.000,00	% 94,6
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		453.577.000,00	402.602.252,18	% 88,8



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2019 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

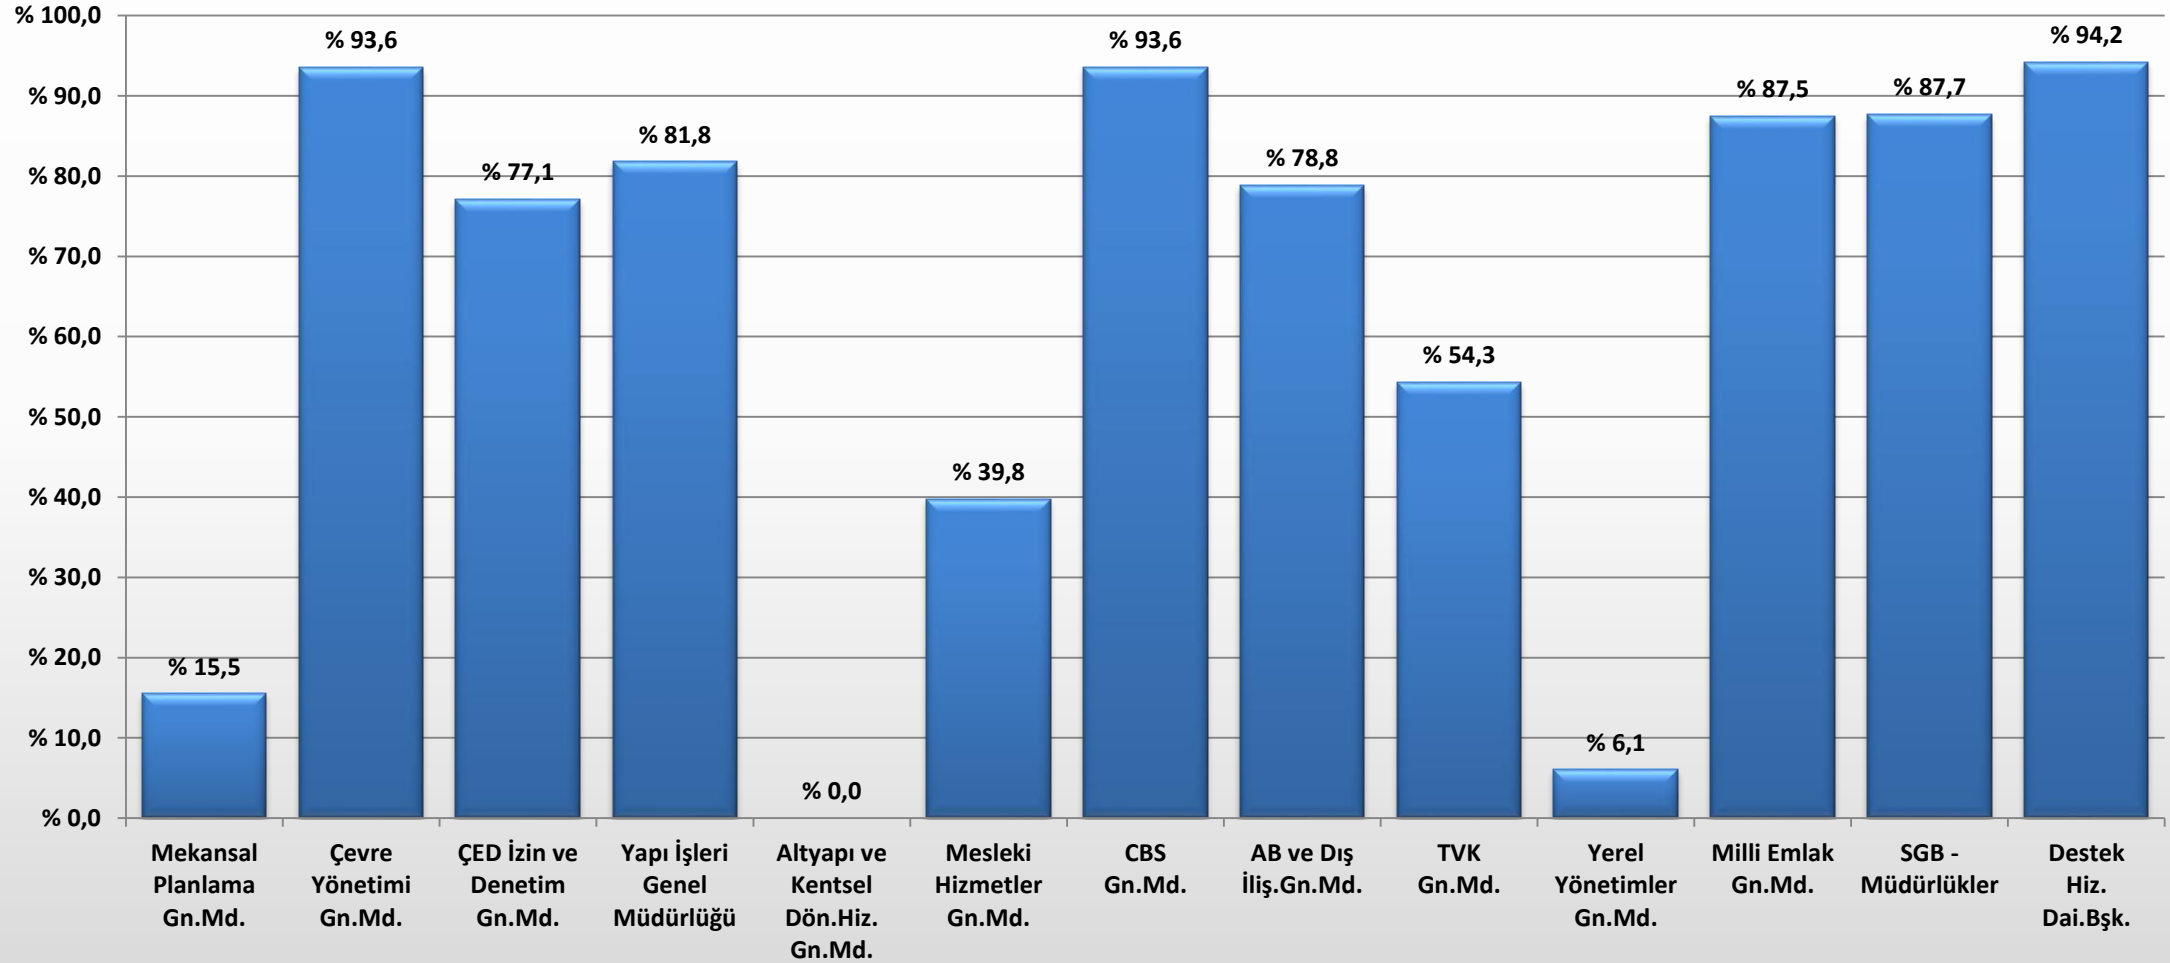




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2019 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	32.656.000,00	26.013.700,00	23.551.380,22	% 90,5
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	247.420.000,00	569.826.624,69	539.126.899,74	% 94,6
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	67.778.000,00	64.066.182,08	58.057.259,23	% 90,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	167.602.000,00	354.866.814,70	310.521.180,17	% 87,5
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü	420.846.000,00	3.318.898.200,00	3.317.012.866,59	% 99,9
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	24.949.000,00	21.919.000,00	20.287.921,77	% 92,6
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	44.632.000,00	41.967.000,00	39.982.725,70	% 95,3
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	33.198.000,00	30.596.595,88	26.789.685,95	% 87,6
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	55.215.000,00	62.591.600,49	41.053.980,03	% 65,6
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	8.987.000,00	8.292.000,00	5.464.740,81	% 65,9
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	81.772.000,00	479.187.000,00	426.087.353,94	% 88,9
Personel Genel Müdürlüğü	7.416.000,00	6.716.000,00	6.539.480,35	% 97,4
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	6.180.000,00	57.000.000,00	56.322.441,50	% 98,8
Özel Kalem Müdürlüğü	33.395.000,00	7.945.000,00	7.275.266,54	% 91,6
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	86.634.000,00	59.739.118,76	55.712.174,03	% 93,3
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	2.878.000,00	4.378.000,00	4.153.116,88	% 94,9
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	10.897.000,00	11.938.400,00	11.669.585,85	% 97,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı	157.937.000,00	157.309.490,00	157.144.911,12	% 99,9
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1.106.000,00	1.151.000,00	1.045.957,24	% 90,9
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	3.430.000,00	7.591.000,00	7.484.684,13	% 98,6
İl Müdürlükleri	1.078.358.000,00	2.417.751.259,13	2.197.434.220,07	% 90,9
TOPLAM	2.573.286.000,00	7.709.743.985,73	7.312.717.831,86	% 94,9



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2019 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

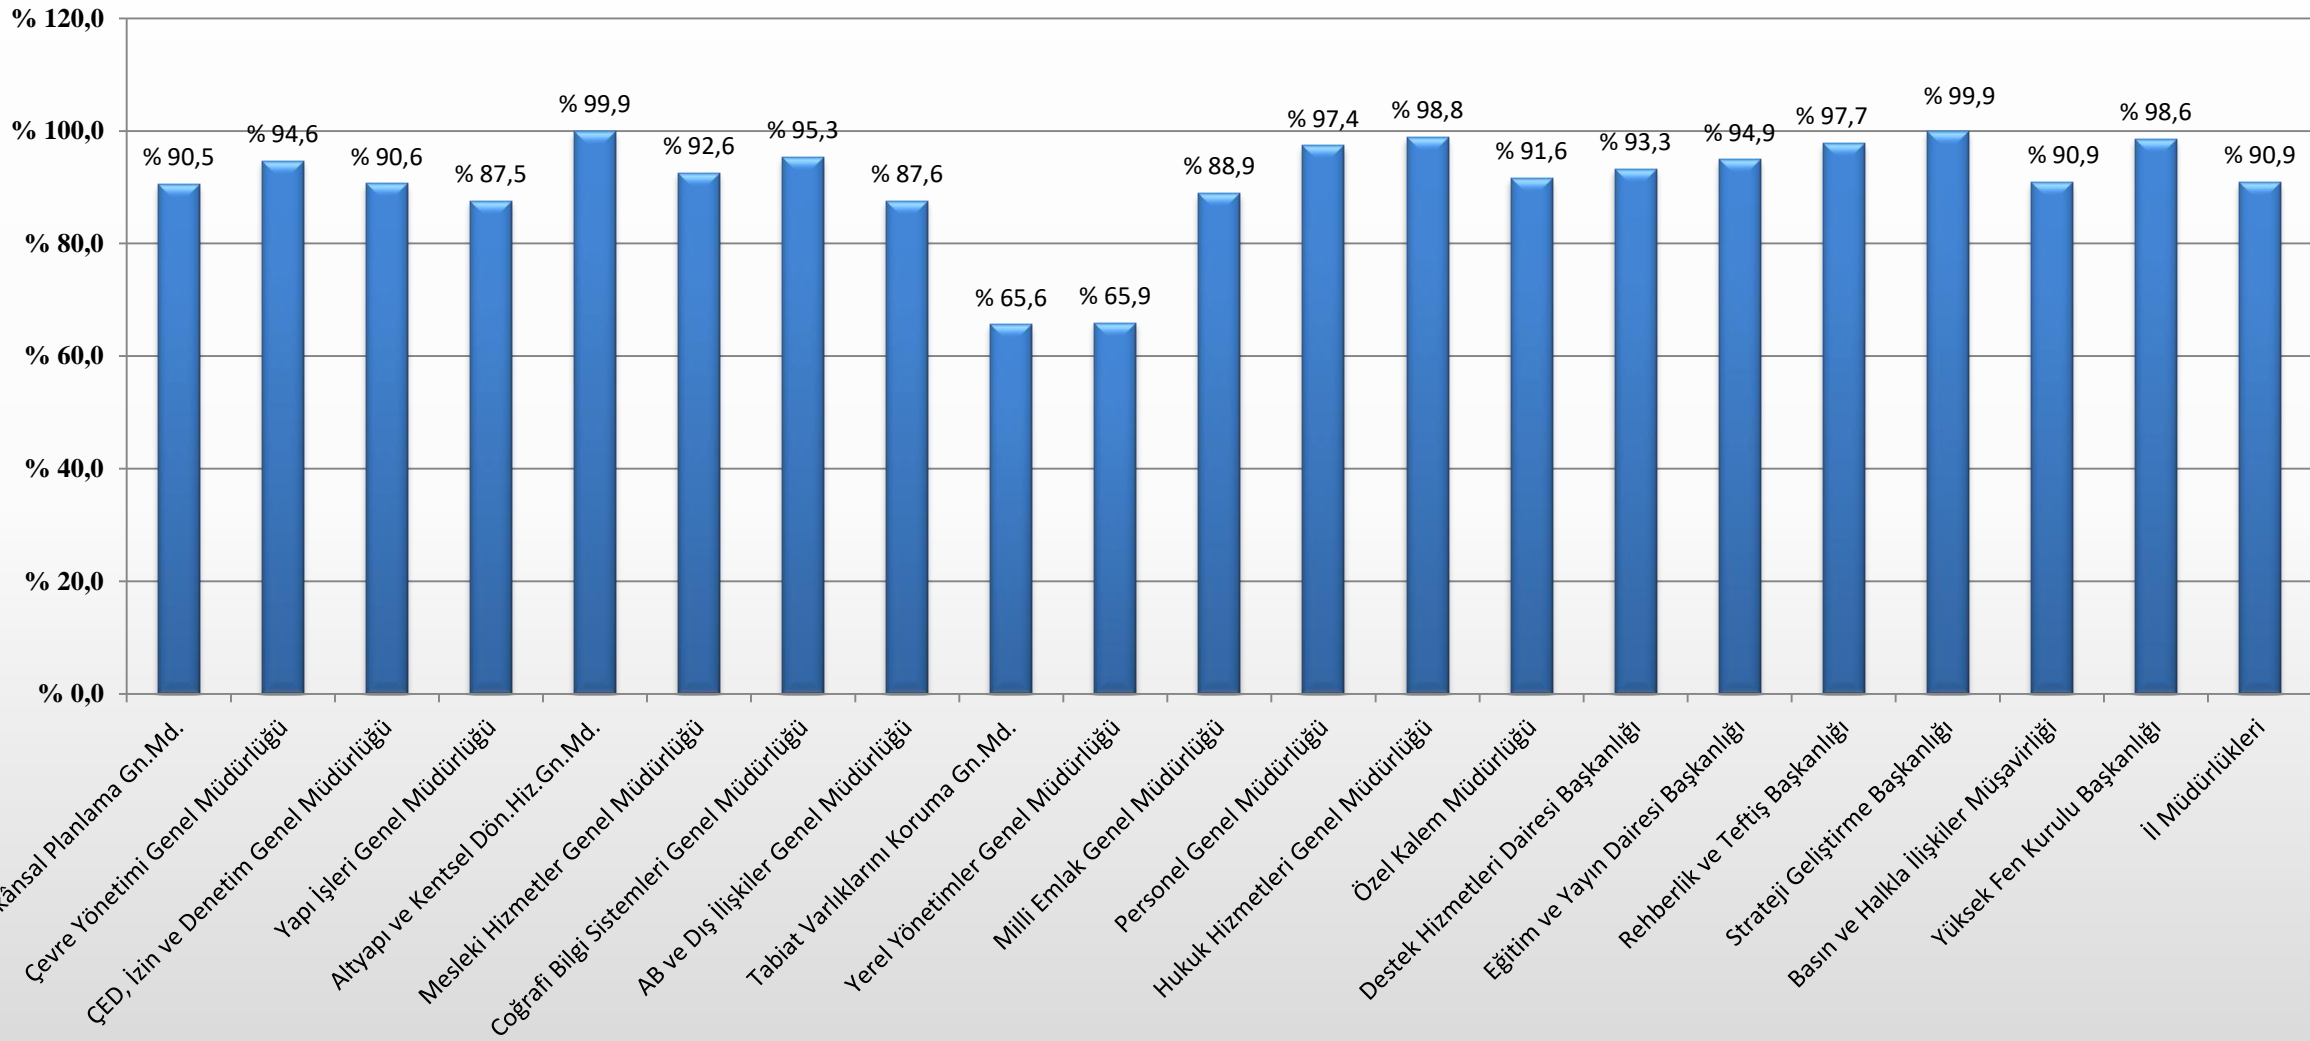

Arz Ederim...



MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090010	Plan Yapımında ve Uygulamasında Dikkate Alınacak Usul ve Esasların Belirlenmesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2020	7.800	0	100	0	% 0,0	
	Mekânsal Planlarda Esas Alınacak Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin Geliştirilmesi	2017-2020	4.000	0	50	0	% 0,0	Proje ilk olarak 2017 yılı için yatırım programına alınmış, bütçenin yetersiz olması ve bütçe artırımını gereğiyle 2018 yılı için tekrar sunulmuş ve yeni bütçesiyle kabul görmüştür. "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20. Maddesi" ne göre; 06.06.2018 tarihinde ihaleye çıkılmış ve (belli istekliler arası ihale usulü yapılarak) teklifler alınmıştır. Ancak Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın yayınladığı Tasarruf Tedbirleri gereği; daha sonra değerlendirilmek üzere proje ihalesi iptal edilmiştir. 2019 yılında yeni bütçesi ile tekrar teklif edilen projemiz yatırım programına alınmış ve ihale süreci başlatılmıştır. İhale çalışmaları 2019 yılı ikinci yarısında başlatılabildiğinden, 2020 yılı yatırım programı için projemiz tekrar revize edilip sunulmuş ve kabul görmüştür. İhale sürecinin ilk iki aşaması 2019 yılında tamamlanmış olup, son aşaması 2020 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle projenin 2020 yılında başlaması ve 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.
	Kentsel Tasarım Rehberleri Uygulama Projesi	2017-2020	3.800	0	50	0	% 0,0	17.07.2019 tarihinde danışmanlık ihalesinin ön yeterlik aşaması gerçekleştirilmiştir. Ön yeterlik aşamasını geçerek ihalenin 2. Aşamasına katılmaya hak kazanan adaylarla birlikte 10.10.2019 tarihinde ihalenin 2. Aşaması gerçekleştirilmiş olup teknik değerlendirmenin tamamlanmasından sonra 09.12.2019 tarihinde teknik puanlar açıklanarak mali teklif zarfları açılmıştır. İhale sonucu Genel Müdürlük Oluru ile de kesinleşmiş olup Ocak 2020'de sözleşme imzalanarak işe başlanacaktır.
2017K090020	İstanbul Avrupa Yakası Yenişehir Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2020	4.000	0	1.150	0	% 0,0	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090220	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	1.500	0	1.000	326	% 32,6	
	Samsun İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	0	% 0,0	Projeje yuklenici tarafından tamamlanarak, geçici askı süreci başlamıştır.
	Yozgat İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	138	% 55,2	Projeler yuklenici tarafından tammlanarak, geçici askıya çıkarılmış ve yasal askı sürec devam etmektedir.
	Denizli ve Düzce İllerinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	156	% 62,4	Projeler yuklenici tarafından tammlanarak, geçici askıya çıkarılmış ve yasal askı süreci başlamıştır.
	Mardin İlinde Örnek İmar Uygulaması	2018-2020	375	0	250	32	% 12,8	Projeje yuklenici tarafından tammlanarak, geçici askıya çıkarılmış ve yasal askı süreci başlamıştır.
2018K090600	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama Projesi (DOKAP) (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	1.000	0	500	100	% 20,0	
	Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	400	0	200	100	% 50,0	Projenin I. Etap-Hazırlık Aşaması tamamlanmış olup bu etabın ödemesi yapılmıştır.
	Ordu-Giresun-Trabzon Bütünleşik Kıyı Alanları Plan Yapımı	2018-2020	600	0	300	0	% 0,0	Projenin ihale süreci başlatılmış ancak süreç tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde gelmesi nedeniyle iptal edilmiştir.
4 Proje		06 ve 07 TOPLAM	14.300	0	2.750	426	% 15,5	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K060290	Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri (Kanalizasyon Sektörü)	2018-2022	9.986	0	1.576	413	% 26,2	
	Muhtelif Atıksu Yönetimi Araştırma Projeleri	2018-2022	9.536	0	1.126	0	% 0,0	Söz konusu proje, şemsiye proje niteliğinde olup; bu kalem altında bir proje çalışması yürütülmektedir.
	Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması	2019-2019	450	0	450	413	% 91,8	Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi kapsamında Türkiye Arıtma Çamuru Eylem Planı hazırlanmıştır. Proje kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş olup, projeye ait son ödeme yapılarak tamamlanmıştır.
2017K080020	Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması Projesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2022	1.000	0	500	0	% 0,0	2019 Yılı Yatırım Programının DKH-Sosyal-Belediye Sektöründe yer alan 2018K080010 numaralı "İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi" projesinin 2019 yılı ödeneğinden 496.000 TL nin düşürülerek, 2017K080020 numaralı "Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması" projesine aktarılmasına ilişkin revizyon işlemi 13/09/2019 tarihli ve 16517702-602.07.02-E.209964 sayılı Makam Olur'u ile onaylanmıştır. Buna göre proje bütçesi 2.250.000 TL olup projenin yapılmasına ilişkin teknik şartname ve protokol hazırlanmış, protokole ilişkin Bakan Olur'u alınmıştır.
2017K080040	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2023	109.904	40.000	50.000	50.000	% 100,0	KAP projesi Bakanlığımız ilk 100 gün, ikinci 100 gün, üçüncü 100 gün ve ilk 180 gün eylem planında yer almıştır. Bu süreçte öngörülen işlerden olan aktarma istasyonu inşaatı yapım işi, entegre atık yönetimi tesisi danışmanlık işi, aktarma istasyonu uygulama projesi danışmanlık işi, düzenli depolama lotu uygulama projesi danışmanlık işi, düzenli depolama lotu yapım işi ve ön işlem tesisi danışmanlık işi ihale çalışmalarına başlanmıştır.
2018K080010	İçecek Ambalaj Atıklarının Yönetimi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2018-2020	1.000	0	4	0	% 0,0	Projeden vazgeçilmiş olup, 2020 yılı yatırım programından çıkartılacaktır.
2018K100290	Tersanelerin Deniz Etkilerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2019	1.487	697	790	790	% 100,0	Söz konusu projeye ait Sonuç Raporu 02 Aralık 2019 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiş olup, 2019 yılı son çeyreğinde ödenmesi planlanan 790.600 TL (KDV Dahil) tutarındaki ödeme Raporda geliştirilmesi gereken hususların bulunması nedeni ile emanete alınmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K100050	Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefi İzleme Projesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	5.480	2.520	2.000	0	% 0,0	Projede 3. ve 4. Ara Rapor sunulmuş, bu raporlara yönelik belirlenen eksikliklerin tamamlanma süreci devam etmektedir. Sektör çalışma grubu toplantıları ve ana çalışma grubu toplantıları devam ederken, modelleme çalışmalarına ilişkin eksik verilerin temin edilmesi ve olmayan verilerin ikamesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca senaryoların belirlenebilmesi için sektör temsilcileri ile toplantılar devam etmektedir.
2016K100070	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Limitlerinin Belirlenmesi (Çevre Sektörü)	2016-2020	2.800	2.000	328	301	% 91,8	Proje Final Raporu 12 Aralık 2019 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuştur. Proje kapanış toplantısı 16 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da ilgili paydaşların katılımı ile düzenlenecek olup, 3 Şubat 2020 tarihinde ise Proje nihailenmiş olacak ve bu tarihten sonra 472.000 TL (KDV Dahil) ödemesi yapılacaktır.
2018K100020	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	8.000	1.200	1.544	1.530	% 99,1	
	Karayolu Taşıtlarının Kirlenme Tespiti	2018-2019	500	200	300	299	% 99,7	Söz konusu proje başarıyla tamamlanmış olup, kapanış toplantısı ilgili kurumların katılımıyla 26/11/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi	2018-2021	4.000	1.000	1.240	1.231	% 99,3	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülmektedir. 27.06.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi kapsamında , başlangıç raporu, 1., 2. ve 3. gelişme raporu kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. Projede HEY-Hava Emisyon Yönetim Portalı yazılım bakım ve geliştirme işlemleri devam etmektedir. Hava Emisyon Konulu Çevre İzin sayısallaştırılması işlemleri proje destek elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup, 1018 Ek-1 tesisine ait 14.845 bacaya ait veriler veri tabanına kaydedilmiştir. Konya, Samsun, İzmir, Adana, Erzurum ve İstanbul bölgesel hava kalitesi yönetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi modelleme eğitimleri başlamış olup, eğitimlerden Bakanlığımız ilgili personeli, Temiz Hava Merkezleri personeli, çeşitli üniversitelerden görevlendirilen akademisyenler yararlanılmaktadır.
	Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi	2018-2021	2.000	0	2	0	% 0,0	Projenin 2020 yılında başlaması hedeflenmektedir.
	Koku Emisyonlarının Yönetimi	2018-2021	1.500	0	2	0	% 0,0	Projenin 2020 yılında başlaması hedeflenmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100300	Türkiye Deniz Çevresi Stratejisi Oluşturulması (Çevre Sektörü)	2018-2020	1.687	287	700	700	% 100,0	Söz konusu projeye ait IV.Ara Rapor 02 Aralık 2019 tarihinde Bakanlığımıza teslim edilmiş olup, 2019 yılı son çeyreğinde ödenmesi planlanan 700.000TL (KDV Dahil) tutarındaki ödeme emanete alınmıştır.
2018K100310	Deniz Çöplerinin Önlenmesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	2.360	0	2	0	% 0,0	Proje kapsamında 2019 yılında 2.000 TL. iz bedel konulmuş olup , yıl içerisinde herhangi bir ihale çalışması yapılamamıştır.
2018K100410	EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (Çevre Sektörü)	2018-2020	3.000	1.500	1.000	1.000	% 100,0	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Karabük Üniversitesi ile yürütülmektedir. 12.07.2018 tarihinde protokol imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. MET kontrol listelerinde verileri toplamak için oluşturulan yazılım ile firmalardan veri girişi sağlanmıştır. Her alt sektör için 5 adet MET Kontrol listesi hazırlanmıştır. MET Referans Dokümanları ve MET Sonuçlarının Türkçe çevirisi tamamlanarak web sitesinde yayımlanmıştır. Proje tanım videosu, proje tanıtım broşürü hazırlanmış ve 2 Kasım 2018 tarihinde proje açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık ofisinde 2 adet proje asistanı çalışmaya başlamıştır. 7 adet Proje Yönetim Planı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlık personeline yönelik 2 adet Eğitim Programı ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 1. Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 2 adet yurtdışı çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Envanter güncelleme çalışmaları ile belirlenmiş tesislere saha ziyaretleri tamamlanmak üzeredir. Eğitimcilerin Eğitimine Yönelik Rehber Doküman Hazırlanmıştır. Uluslararası sempozyum programına ilişkin çalışmalar sunulmuştur. 2018 yılı içinde; Proje Yönetim Planı Raporu onaylanarak 885.000 TL (KDV Dahil) ilk ödeme ve Saha Ziyareti Planı Raporu onaylanarak 613.600 TL (KDV Dahil) ikinci ödeme ve Eğitimcilerin Eğitimine Yönelik Rehber Doküman onaylanarak 999.460 TL (KDV Dahil) üçüncü ödeme gerçekleştirilmiştir.2020 yılı ilk çeyreğinde ödeme bulunmamaktadır. Proje takvimine uygun olarak çalışmalar devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100670	Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000	0	300	0	% 0,0	
	Sulu Sistem Atık Depolama Alanı Bertarafı	2018-2021	2.000	0	200	0	% 0,0	Proje ile sulu sistem atık depolama faaliyetlerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin ortadan kaldırılması, çok geniş alanları kapsayan bu sahaların yeniden kazanımı, sulu sitem depolama yapılan atık barajlarının işletme esaslarının belirlenmesi (sızıntı suyu yönetimi, atık suyun proseste yeniden kullanılması vb), kapasitesi dolmuş atık barajlarının/depolama sahalarının kapatılması/rehabilitasyonu ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu toplulaştırılmış Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi Projesinin teknik şartname yazım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
	Termik Santral Taban Küllerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi	2018-2021	1.000	0	100	0	% 0,0	Proje ile ithal ve yerli kömür kullanan termik santrallerin faaliyeti sonucu oluşan küllerinin karakteristiğinin çıkarılması, karakteristiği belirlenen küllerin farklı kullanım olanaklarına yönelik literatür araştırması yapılması, örnek uygulama çalışmalarının incelenmesi, deneme üretimi yapılabilmesi için gerekli olan ön işlemlerin belirlenmesi, yapılan araştırmalar ve karakteristik kapsamında farklı kullanım olanağı bulunan sektörlerde deneme üretimi çalışması yapılması, farklı sektörlerde kullanımına yönelik kılavuz çalışması yapılması hedeflenmektedir. Söz konusu toplulaştırılmış Sanayi Kaynaklı Atıkların Yönetimi Projesinin teknik şartname yazım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2018K100390	Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Farkındalık (CITYAIR) Projesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.451	1.365	550	493	% 89,6	Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CITYAIR) Projesi 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlamıştır. Açılış toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşlarının katılım sağladığı Yönlendirme Komitesi Toplantılarından üçü gerçekleştirilmiştir. Aktivitelere göre hazırlanması beklenen raporların teslimi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyu farkındalığı çalışmaları çerçevesinde; hem proje tanıtımı etkinliği hem de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, ilköğretim öğrencilerine temiz hava konulu seminer verilmiştir. Uçurtma, boyama etkinlikleri, "Gökyüzüne Mesajını Yaz" temalı etkinlik, sosyal medya yarışması düzenlenmiştir. Broşür ve görsel malzemeler hazırlanmıştır. Projenin 1. ve 2. İlerleme Raporu hazırlanmış ve teslim edilmiştir. Emisyon envanteri çalıştaylar serisine Kahramanmaraş ilinde başlanmış, 3-5 Aralık 2019 tarihlerinde hem emisyon envanteri 1. çalıştayı, hem tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile paydaş toplantısı hem de Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personeline yönelik hava kalitesi başlığına esas formatör eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
AB katkısı	19.340		7.735	2.900	2.600	% 89,7		

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100400	KOK Kirlenmiş Saha Tespiti ve İyileştirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2022	2.938	0	600	600	% 100,0	Proje 8 Ekim 2019 tarihinde başlamış ve 7 Kasım 2019 tarihinde başlangıç toplantısı yapılmıştır. İlgili kurum/kuruluşların katılım sağlayacağı proje açılış toplantısı 14 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2019 Mali Yılı Bütçesine 600.000,00.-TL ödenek konulduğu ve talep edilen ödenek bütçe ödeneğini aştığından dolayı bu proje için konulan 600.000,00.-TL ödeneğin karşılığı olan 93.561,42 (Doksanüçbinbeşyüzaltmışbir Avro kırkiki cent) yatırıldığı gün kuru üzerinden hesaplanan 600.000,00 TL tutarındaki ulusal katkı payı "Çevre ve İklim Eylemi Program Ulusal Katkı Payı Ana Hesabına aktarılmıştır.
AB katkısı			16.577	0	5.525	5.525	% 100,0	
2018K100610	İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2022	10.721	0	1.500	1.392	% 92,8	Proje 09.10.2019 tarihi itibari ile başlamıştır. 48 ay sürecek olan proje 4 ana konuya odaklanacaktır. 1) İklim değişikliği etki ve etkilenebilirlik analizi çalışmaları ışığında Türkiye'nin Ulusal İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı hazırlanacaktır. 2) Yerel düzeyde iklim değişikliği uyum çalışmaları yapılacaktır. 4 farklı pilot büyükşehir belediyesi belirlenecek ve bu şehirlerin İklim Değişikliği Etki ve Etkilenebilirlik Analizleri yapılacaktır. 3) Türkiye'nin ilk İklim Değişikliği Platformu hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan platform sayesinde Türkiye'nin iklim değişikliği alanında yapmış olduğu bütün çalışmalar, veriler, bilimsel yayınlar ve iklim değişikliği alanında çalışan tüm uzmanlar için bir iletişim ağı sağlanmış olacaktır. 4) Proje kapsamında Hibe Programı kapsamında yaklaşık 7.500.000 Avro hibe yardımı yapılacaktır.
AB katkısı			59.395	0	15.190	14.100	% 92,8	
2019K100030	REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2019-2021	1.588		650	617	% 94,9	1 Kasım 2019'da projenin başlangıç toplantısı yapılmıştır. Projenin Başlangıç Raporu Bakanlığımıza sunulmuş, görüşlerimiz doğrultusunda yapılan değişikliklerle nihai hale getirilmiştir. İlgili kurum/kuruluşların katılım sağlayacağı proje açılış toplantısı 8 Ocak 2020'de gerçekleştirilecektir.
AB katkısı			8.842		3.900	3.700	% 94,9	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100040	Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi (AB)	2017-2020	9.078	4.820	3.300	3.300	% 100,0	
<i>AB katkısı</i>	(Çevre Sektörü)		78.194	42.560	25.806	25.806	% 100,0	
Ülke Katkısı	Düşük Karbonlu Kalkınma Strateji ve Eylem Geliştirilmesi	2018-2019	2.753	1.000	1.250	1.250	% 100,0	4 Bileşenden oluşan Projenin birinci bileşeni kapsamındaki raporlama faaliyetleri tamamlanmış olup, ikinci bileşen kapsamındaki raporlama süreçleri devam etmektedir. Ayrıca, üçüncü bileşene ilişkin raporlama faaliyetleri de devam etmektedir. Dördüncü bileşen kapsamındaki raporlama süreçleri ise devam devam etmektedir. Proje kapsamında planlanan toplam 10 eğitimin 5'i gerçekleştirilmiş olup, kalan eğitimler planlama aşamasındadır. Bunun yanı sıra proje kapsamındaki toplam üç çalışma ziyareti tamamlanmıştır. Aylık toplantılar ve yürütme kurulu toplantıları da periyotlarına uygun olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir.
<i>AB katkısı</i>			22.613	8.450	8.450	8.450	% 100,0	
Ülke Katkısı	Florlu Sera Gazlarına Geçiş İçin Kapasite Geliştirilmesi	2017-2019	1.345	390	500	500	% 100,0	Projenin birçok aktivitesi tamamlanmış olup, proje 2020 yılının Mayıs ayında sona erecektir. Florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ekipman için elektronik veri tabanı geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 16/4/2014 tarihli ve (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik, proje kapsamında revize edilerek taslak yönetmelik hazırlanmış olup, söz konusu taslağın nihai halini alması için yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
<i>AB katkısı</i>			11.701	3.471	4.115	4.115	% 100,0	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülke Katkısı	Arazi Yönetimi Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme	2017-2019	1.350	850	500	500	% 100,0	Proje Temmuz ayı itibari ile tamamlanmıştır.
AB katkısı			11.700	7.592	4.108	4.108	% 100,0	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Konusunda Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi	2017-2019	1.350	850	500	500	% 100,0	Proje kapsamında 20 ilde 3'er günlük iklim değişikliği konulu eğitimler gerçekleştirilmekte olup 19 ilimizdeki eğitimler tamamlanmıştır. Bu eğitimler de kullanılmak üzere 17 ayrı başlıkta eğitim modüllü hazırlanmıştır. Antalya ilinde iklim değişikliği alanında Uluslararası Konferans gerçekleştirilmiştir. Ankara ODTÜ, İzmir Ege Üniversitesi, İstanbul Marmara Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi olmak üzere 4 adet üniversite etkinliği gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı içerisinde fotoğraf yarışması düzenlenerek çıktılar 10 ilde sergilenmiştir. Bu kapsamda İzmir TAV Havalimanı ve Büyükşehir Belediyesi Kordon Sergi Alanında, Gaziantep Zeugma Müzesi sergi salonu içerisinde "Senin İklimin Fotoğraf Sergileri" kurulmuştur. Ayrıca Ankara Cer Modern Sanatlar Müzesi içerisinde 23 Temmuz itibariyle "Yuva, Nefes, Damla" konseptleriyle hazırlanan sergimiz açılmıştır. 20-28 Temmuz tarihleri arasında Oran, Tunalı, Kızılay, Bahçelievler ve Tandoğan'da yer alan dijital ekranlarda billboard çalışmaları yayınlanmıştır." Ulusal İklim Değişikliği İletişim Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları başlamıştır.
AB katkısı			11.700	7.592	4.108	4.108	% 100,0	
Ülke Katkısı	İklim Değişikliği Hibe Programı	2017-2019	2.280	1.730	550	550	% 100,0	Hibe programı bileşeni kapsamında, 37 hibe projesinin uygulama süresi tamamlanmıştır. Hibe programları izlemesi sürecinde, soruların yanıtlanması ve değişikliklerin işlenmesi adına Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System - MIS) temel araç olarak kullanılmıştır.
AB katkısı			20.480	15.455	5.025	5.025	% 100,0	
17 Proje		06 ve 07 TOPLAM	177.480	54.389	65.344	61.136	% 93,6	
			AB KATKISI	182.348	50.295	53.321	51.731	% 97,0

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2014K100040	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2020	122.598	80.347	17.707	13.317	% 75,2	
	Genel Bütçe Ödeneği		62.598	34.498	10.560	6.171	% 58,4	*Projenin Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kısmı ile ilgili, 2019 yılı Güneydoğu Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı illerdeki hava kalitesi izleme istasyonlarının bakım onarım ve kalibrasyonu için 7 Hakediş gerçekleştirilmiş olup, toplam 431.585 TL (KDV Dahil) harcama gerçekleştirilmiştir. *Söz konusu projenin yılı hizmet alımı 7 adet Bölgesel Temiz Hava Merkezleri tarafından Bölgesel olarak yapılmaya başlanmış olup; proje kapsamında bölgelerinde bulunan istasyonlar için talep edilen ve aktarma yoluyla gerçekleştirilen ödenekten 5.678.084 TL. harcanmıştır.. *Öte yandan, gelen talep yazıları çerçevesinde; Hava Kirliliğinin İzlenmesi amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının taşıma gideri, enerji ihtiyacının temini, elektrik bağlantıları vb. iş ve işlemlere için talep edilen ve aktarma yoluyla gerçekleştirilen ödenekten 61.099,00-TL harcanmıştır.
	Döner Sermaye Ödeneği		60.000	45.849	7.147	7.146	% 100,0	Akdeniz Temiz Hava Merkezi' ne bağlı illerde istasyon kurulumu kapsamında 11 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmuş olup, bütçenin tamamı Akdeniz Temiz Hava merkezi tarafından kullanılmıştır.
2018K100470	Sanayi Tesis Hava Kirliliği Etki Modellemesi (Çevre Sektörü)	2018-2021	3.000	0	300	300	% 100,0	Proje bütçesinin 2019 yılı % 10 luk kısmı ile ilgili ödeme gerçekleştirilmiştir. Projenin Başlangıç Raporunun içeriğinin belirlendiği çalışma toplantısı yapılmıştır. Başlangıç Raporu ve Proje Tanıtım Videosu hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuştur. 04.12.2019 tarihinde Proje açılış toplantısı yapılmıştır. Şartname kapsamında yer alan 1. Değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Analiz ve tasarım aşaması hazırlanarak Çevre
2018K100620	Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyonu, Entegrasyonu ve Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2018-2020	4.400	0	440	440	% 100,0	Projenin İş Termin Planı ve Analiz Tasarım Raporu onaylanarak ödemesi yapılmıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100120	E-PRTR Kapasite Geliştirme (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.742	912	830	797	% 96,0	Projenin 830.000-TL olan yılı Genel Bütçe Ödeneğinden 120.600 euro karşılığı 796.611,24 TL (1€=6.6054 TL) üzerinden ödeme gerçekleştirilmiştir. Projeyle ait tüm faaliyetler tamamlanmıştır. Proje Başlangıç- Bitiş tarihleri:25 Mayıs 2017 – 25 Mayıs 2019 / 2 yıldır. Toplam proje bütçesi:2.410.000 € (AB Katkısı: 2.149.000 € - Ulusal Katkı: 261.000 €)'dir. Projeyle 2017 Yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe 1.195.000 TL proje tutarı ve 641.000 TL 2017 yılı ödeneği ile yer verilmiştir. Proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Ayrıca projenin AB hibesi toplam proje tutarı 9.822.000 TL, 2017 yılı ödeneği 5.924.000 TL olup proje ödeneğinin tamamı harcanmıştır. Projede %100,00 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.
AB KATKISI			13.969	8.427	5.542	5.350	% 96,5	Projeyle 2018 yılı Yatırım Programının Çevre Sektöründe yer verilmemiştir. 2019 yılı için AB Katkısı 852.678 €, Ulusal katkı ise 120.600 € dur.İPA 2013 I. Bileşen Programı kapsamında TR2013/0327.06.01 Proje kodlu , 2019 yılı Yatırım Programında yer alan "2017K100120 nolu Capacity Building on E-PRTR in Turkey (E- PRTR Kapasite Geliştirme)" projesi için talep edilen 120.600,00-Avro karşılığı (Kur 6,6054) 796.611,24-TL, İPA I. Bileşen 2013 Ulusal Programı Ulusal Katkı Ana Hesabına Genel Müdürlüğümüzce 26.06.2019 tarihinde aktarılmıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K100010	SÇD Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi (AB) (Çevre Sektörü)	2017-2019	306		130	112	% 86,0	<p>Proje için talep edilen 17.940,00-Avro karşılığı (Kur 6,2354) 111.863,08-TL,Ulusal Fon III. Bileşen Ulusal Katkı Ana Hesabına 03.04.2019 tarihinde aktarılmıştır. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 11.07.2019 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir. • Kurum/kuruluşlardan SÇD Yönetmeliğinin etkin uygulanmasının sağlanması amacıyla SÇD odak noktaları belirlenmiştir. • 26.09.2019 tarihinde SÇD Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi'ne ilişkin "Yerinde Kontrol Ziyareti" AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilmiş olup projenin son durumu, sürdürülebilirliği, dosyalama ve arşiv sistemi ile Avrupa Birliği görünürlük faaliyetleri hakkında incelemelerde bulunulmuştur. • 03.10.2019 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile "Kırklareli-Tekirdağ-Edirne Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı" SÇD Pilot uygulaması ile ilgili toplantı gerçekleştirilmiştir. • 07.10.2019 tarihinde Boşluk Analizi ve 08.10.2019 tarihinde Eğitim İhtiyaç Analizi Raporları sunulmuş olup, raporlar incelenerek 16.10.2019 tarihinde görüş verilmiştir. • 21.10.2019 tarihinde Tarım Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde Kuzey Ege Nitrat Eylem Planı Pilot SÇD 3.Toplantısı yapılmıştır. • 22.10.2019 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı Pilot SÇD 2.Toplantısı yapılmıştır. • 23.10.2019 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde 2.Yönlendirme Kurulu Toplantısı yapılmıştır. • 3.12.2019 tarihinde Ankara'da Stratejik Çevresel Değerlendirme Konusunda Farkındalık Arttırma Çalıştaylarından birincisi yapılmıştır. • 4-5.12.2019 tarihlerinde Ankara'da "Stratejik Çevresel Değerlendirme Eğitim Programı-1/ Turizm Sektörü Özelinde" yapılmıştır. • 12.12.2019 tarihinde Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünde Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı Pilot SÇD 3.Toplantısı yapılmıştır. • 13.12.2019 tarihinde Kuzey Ege Nitrat Eylem Planı Pilot SÇD 4.Toplantısı yapılmıştır. • Kuzey Ege Havzası Nitrat Eylem Planı ve Edirne-Tekirdağ-Kırklareli Bütünleşik Kıyı Yönetim Planı sektörlerinin Taslak Kapsam Belirleme Raporları sunulmuştur.</p>
AB KATKISI			1.658		663	580	% 87,5	
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	72.046	35.410	12.260	7.819	% 63,8	
		DÖNER SERMAYE	60.000	45.849	7.147	7.146	% 100,0	
		GENEL TOPLAM	132.046	81.259	19.407	14.965	% 77,1	
		AB KATKISI	15.627	8.427	6.205	5.930	% 95,6	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090530	Bakanlık Hizmet Binası Kesin Hesabı (Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2017-2018	16.500	8.500	2.000	1.316	% 65,8	İlk ihale olan Bakanlık Hizmet Binası işine ilişkin kesin hesap işlemleri tamamlanmıştır. İkinci ihale olan CBS Veri Merkezi ve İlave İşler İnşaatı işinin kesin kabulü yapılmış ve 10.07.2017 tarihinde onaylanmış olup, işe ait kesin hesap çalışmaları tamamlanmıştır.
2018E050290	Ulus Meydanı Düzenlemesi (Kentiçi Ulaşım Sektörü)	2018-2023	750.000	100.000	7.800	7.800	% 100,0	17.08.2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız arasında "ULUS KENT MEYDANI, KAVŞAK VE BAĞLANTI YOLLARININ DÜZENLEMESİNE DAİR PROJE VE YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL" imzalanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğüne söz konusu işe ilişkin düzenlenen Fizibilite Raporu 31.08.2018 tarih, 316207 sayılı yazıları ekinde Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 2018 yılı ödeneği olan 100.000,00 TL, Genel Müdürlüğümüzce Karayolları Genel Müdürlüğüne ilgili hesabına aktarılmıştır. Proje çalışmalarının kapsamının belirlenmesi amacıyla 1/5000 Ölçekli ön proje doğrultusunda sondaj çalışmalarına başlandığı bilinmektedir. İhale süreçleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bu aşamada, Başkanlığımıza iletilen başkaca bir husus bulunmamaktadır.
2019D000290	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (Enerji Sektörü)	2019-2024	1.120.000	0	27.000	0	% 0,0	Dünya Bankası ile kredi ve hibe anlaşması öncesi teknik dokümanların hazırlanması tamamlanmıştır. Finans anlaşması öncesi müzakere tutanağı imzalanmıştır. Finans anlaşması Dünya Bankası Kurulunda 24 Ekim 2019 tarihinde görüşülerek imzalanacaktır. Kamu binalarının enerji etüdlерinin yapılması, uygulama projelerinin hazırlanması ve inşaat ihalelerinin yapılması için teknik şartnameler hazırlanmaktadır. 2019 yılı sonu kredi ve hibenin aktif olması sonucu kredi ve hibe ödeneği kullanılabilir olacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2014 yılında enerji etüdleri yaptırılan toplam 938 adet bina için 14 adet kurumdan gelen bilgiler kurum kurum toplanmaya başlanılmıştır. Proje kapsamında yer alan binaların uygunluk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiş, proje ve fatura bilgilerinin arşivlenmesi işlemleri ve envanter çalışması tamamlanmıştır. Dünya Bankası proje kapsamına alınacak ilave binaların tespiti için tüm Bakanlıklar ve Başkanlıklara proje kapsamına alınmasını istedikleri binalarının bilgilerinin gönderilmesi istenilmiş, kurumlardan gelen bilgileri toplanmaktadır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek		1.092.000		22.000	0	% 0,0	
	Hibe Ödeneği		28.000		5.000	0	% 0,0	
2019K14-147264	Afet ve Acil Durumlara Müdahale ve Hasar Tespit Merkezi Hizmet Araçlarının Temini (Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2019-2020	11.400		11.000	11.000	% 100,0	Hasar tespit hizmetlerinde kullanılacak araçların alım işi tamamlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Yapı İşleri ve Mesleki Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)							
	Çevrimiçi Proje Süreç Yönetim Sisteminin Kuruluşu (CADD Uyumlu) ve Yaygınlaştırılması	2019-2019	1.150		1.150	1.132	% 98,4	Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim (CADD) Düzenleme Usul ve Esasları yayımlanmış olup yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.
	Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılımının Yaygınlaştırılması	2019-2019	760		760	755	% 99,3	Yeni Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yazılım uygulaması değişen mevzuat kapsamında dağıtım modülünü de içerecek şekilde revize edilerek 2019 yılı itibarıyla 81 ilde devreye alınmıştır. Ayrıca, mülga Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile imzalanan protokol kapsamında geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi de 81 ilde uygulamaya alınmıştır.
	Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırılması	2019-2019	500		500	500	% 100,0	Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki yazılımların bakım onarım ve iyileştirme işlemlerinde ve donanım ihtiyaçlarının sağlanmasında proje ödeneği kullanılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K070120	İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	5.700	300	700	540	% 77,1	
	Muhtelif İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri	2018-2022	5.100	300	100	49	% 49,0	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyulduka harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ne zaman kullanılacağı bilinmemektedir. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması	2019-2019	600		600	491	% 81,8	Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Kapsamında projeler tamamlanmıştır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
1992K070040	Göçebelerin İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	1992-2020	30.850	11.966	6	0	% 0,0	
	Bismil-Beritanlı Göç.-Dicle-Batman Brj.iskanı	2013-2020	9.379	3.513	2	0	% 0,0	1. kısım 30 konut inşaatları tamamlanmıştır. Projeyle ilgili olarak 5543 sayılı İskan Kanununa 25.05.2018 tarihinde geçici madde eklenmiş olup yıkıp yeniden yapılacak 250 adet konut belirlenmiştir. Kanun gereği 250 aileye başvuru için 6 ay süre verilmiş olup müracaatlar alınmıştır. Proje çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılında ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
	Hassa-Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı	1992-2020	11.970	3.389	2	0	% 0,0	131 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkmeden Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.
	Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskanı	1994-2020	9.501	5.064	2	0	% 0,0	152 aile için konut ve işletme yapımı planlanmıştır. Çalışmalar yürütülürken hak sahipliği iptalleri olmuş, itirazlar sonrası Bakanlığımız aleyhine davalar açılmıştır. İdari Mahkmeden Bakanlığımız lehine karar çıkmasına rağmen Danıştaydan Bakanlığımız aleyhine kararlar çıkmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup haksahibi sayısı mahkeme kararlarına göre belirlenecek ve bu sayıya göre işlem yapılacaktır. Bu nedenle Yatırım programında iz bedelle bulunmaktadır. Bu nedenle bu aşamada ödenek talebimiz bulunmamaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2010K070040	İskan Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2010-2022	33.600	5.000	13.004	11.287	% 86,8	
	Muhtelif İskan Konutları Altyapı İşleri	2010-2022	20.600	5.000	4	0	% 0,0	
	Ilisu Barajı İskan Konutları Altyapı İşleri	2018-2019	13.000	0	13.000	11.287	% 86,8	
2011K070030	Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	4.277	1.826	2	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070040	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	221.885	57.304	64.845	64.834	% 100,0	
	Merkez Güldere Köyü İskanı	2017-2020	26.100	3.500	13.000	12.998	% 100,0	İş devam etmektedir.
	Muhtelif İskan İşleri	2011-2022	195.785	53.804	51.845	51.836	% 100,0	İşlerin yapım çalışmaları devam etmektedir. (Samsun-Vezirköprü-Susuz köyü tamamlanmış olup konut kuraları çekilmiştir. Erzincan İli Uluköy-Kayı-Kalecik köyleri yapım işleri ise devam etmektedir). 11 milyon 493 bin ek ödenek gerekmektedir.
2013K070010	Yerleri Kamulaştırılanların İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2022	220.414	167.660	4	0	% 0,0	
	Anamur-Alaköprü Barajı İskanı	2013-2022	211.477	158.725	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmediğinden iş devam edememektedir. Yaklaşık 50 milyon ek ödenek gerekmektedir.
	Doğanpınar Barajı İskanı	2017-2019	8.937	8.935	2	0	% 0,0	İş Bitti.
2013K070020	İskan Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2013-2022	3.620	1.400	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K070010	Karyağmaz Ormaniçi Köyü Nakli (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	135.206	40.000	29.800	29.800	% 100,0	82 milyon 768 bin ek ödenek gerekmektedir.
2018K070020	Bozkır Barajı İskanı (KOP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	170.164	0	73.000	59.212	% 81,1	İş devam etmektedir.
2018K070030	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (KOP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	37.619	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K070130	İlisu Barajı İskanı (GAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	76.287	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2018K070140	Yusufeli Barajı İskanı (DOKAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2022	115.488	0	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2019K07- 147022	Bulanık Alparslan 1 Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2020	4.557	0	4.500	4.374	% 97,2	Ödenek tahsis edilmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K070050 (**)	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2011-2022	5.950	2.800	2	0	% 0,0	Ödenek tahsis edilmemiştir.
2016K070020 (**)	Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi-I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2016-2022	268.800	53.849	9.890	8.655	% 87,5	İşler devam etmektedir. Aksaray, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak illerinden yaklaşık 93 adet köyde yaklaşık 2.140 ailenin konut yapımı işidir.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2019	9.627		9.627	6.181	% 64,2	Kamulaştırma ve satın alımlar için kullanılmaktadır.
20 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.932.077	385.456	223.079	180.234	% 80,8	
		08 TOPLAM	274.750	56.649	9.892	8.655	% 87,5	
		DÖNER SERMAYE	27.900	8.500	13.000	12.316	% 94,7	
		GENEL TOPLAM	3.234.727	450.605	245.971	201.205	% 81,8	
		Kamu laştırma	9.627	0	9.627	6.181	% 64,2	

(**) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2016K010100	İnşaat Sektöründe ve Altyapı Tesislerinde Kullanılan Malzemelerin İyileştirilmesi ve Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2016-2020	6.500	3.750	550	0	% 0,0	07/03/2017 tarihli ve 1308 sayılı Makam Olur'una istinaden "Kamu İhale Kanunu'nun 3(f) Maddesi Kapsamında Araştırma Geliştirme Protokolü" imzalanmış olup, söz konusu protokol kapsamında tamamlanmamış bileşenler ve eksiklikler, daha evvel bitirilen iş kalemleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 2019 yılında projeye yapılacak harcamaya ilişkin ayrıca değerlendirme yapılacaktır.
2018K090320	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	2.200	0	1.000	0	% 0,0	Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla, kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup, bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek olan "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Rehberi oluşturulmuştur. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlanmasına Yönelik çalışmalar devam ilgili belediyelere hazırlanmakta olup Proje kapsamında herhangi bir harcama öngörülmektedir..
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2019-2019	4.000		4.000	4.000	% 100,0	6306 sayılı kanun kapsamında Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına ilişkin projede tamamlanmıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	8.700	3.750	1.550	0	% 0,0	
		Kamu laştırma	4.000	0	4.000	4.000	% 100,0	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018D000070	Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yazılımları (Enerji Sektörü)	2018-2022	3.950	125	683	136	% 19,9	*Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (Bep-TR) Uygulaması 2. Versiyon Bakım, Destek ve İyileştirme İşi Hizmet Alımına ait 219.000 TL bedelli, 365 gün süreli sözleşme 25/06/2019 tarihinde imzalanmıştır. Yükleniciye ödemeler 6 şar aylık dönemler halinde iki seferde yapılacaktır. İlk ödeme işlemi Aralık ayı içinde yapılmıştır. *Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi (YeS-TR) Yazılımı İşinin ihalesi 17/07/2019 tarihinde yapılmış ancak iptal olmuştur. 2019 yılı Ekim ayında ihale tekrarlanmıştır. Kasım ayı içinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme süresi 240 gündür. İhale bedelinin tasarım raporu onaylandıktan sonra %15'inin, işin tamamlanmasından sonra kalan %85'inin ödenmesi planlanmaktadır.
2019G000370	Konut Araştırması (Konut Sektörü)	2019-2020	1.000		300	206	% 68,8	Üniversite ile sözleşme imzalanmış olup 3 aşama halinde hazırlanacak olan raporun 1. Aşamasının kabulü yapılmıştır. Ayrıca protokole göre 1. Aşamada yapılması öngörülen ilgili tarafların katıldığı çalıştay Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
2015K010090	Yapı Sistemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi (Genel İdare Sektörü)	2015-2019	2.458	1.758	700	260	% 37,1	Binalarda Betonarme Kalıpları ve Taşıyıcı Kalıp İşkelelelerinin Yapım Esaslarının Belirlenmesi Protokolü ODTÜ ile 02.09.2019 tarihinde imzalanmış olup protokol kapsamında 259.600.00TL ödenerek 17.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Proje kapsamındaki hedeflere ulaşılmıştır.
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2019-2019						
	YAMBİS ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncelleme	2019-2019	300		300	45	% 14,9	19.03.2019 tarih ve 63900 sayılı olur ile; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne 300.000,00 ödenek aktarıldı. Kalan ödenekten İlan giderleri olarak 27.655,00 TL harcandı. 17.04.2019 tarih ve 91644 sayılı olurâ istinaden yapılan İbankta yapılan eğitime 17.000,00 TL harcandı. Toplam harcama 44.655,00TL
2019K010820	Yapı Malzemelerine İlişkin Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2019-2019	500		500	341	% 68,2	İhale ilan bedeli ve TSE Deney Hizmeti Ücreti ödemesi yapılmıştır. Tablet ve Mobil yazıcı ihalesi ile Laboratuvar cihaz ve malzeme alım ihalesine ait ödeme gerçekleştirilmiştir
5 Proje		06 ve 07 TOPLAM	8.208	1.883	2.483	988	% 39,8	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010080	Bilişim Projeleri İdame ve Yenileme Projesi (Ortak Proje) (Genel İdare Sektörü)	2019-2019						
	YAMBİS ve e-Şantiye Bakım, Onarım ve Güncelleme	2019-2019	300		300	292	% 97,3	YAMBİS ve MYS Uygulamaları Bakım Onarım Sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamındaki iş ve ödemeler proje takvimine göre gerçekleştirilmiştir.
	Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sistemlerine Entegrasyonu	2019-2019	1.120		1.320	1.315	% 99,6	Milli Emlak İlan ve Kurum Tahsis" İnternet sitelerinin yeniden yazılması hizmeti alımı ve Sybase Veritabanı ve SAP İş Zekası lisans alımı tamamı ödenmiştir.Oracle Weblogic Uygulama Sunucuları idame bakım hizmeti alımı gerçekleştirmiştir.
	Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme	2019-2019	1.960		1.760	1.702	% 96,7	Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) yazılım geliştirme hizmeti alımı hizmeti tamamlanmıştır.
2015K090430	Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (Şehirleşme Sektörü)	2015-2019	4.000	3.500	500	89	% 17,8	Proje 2019 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır.
2017K090360	Bilgi Sistemleri Yazılım Temini Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2017-2019	30.000	21.600	8.400	7.973	% 94,9	
	Bilgi Sistemleri Güvenlik Yazılımı Temini	2017-2019	8.600	6.000	2.600	2.450	% 94,2	
	Bilgi Sistemleri Sistem Yazılımı Temini	2017-2019	19.000	14.000	5.000	4.800	% 96,0	*2019 yılı Belgenet bakım ve güncelleme işi ile Nitelikli Elektronik Sertifika ve Minikart koyucu ödemesi tamamlanmıştır. *Bilişim ve Donanım Cihazları alımı tamamlanmıştır. *Lisans alımları tamamlanmıştır. *Yardım Masası Yazılım Bakım Bakanlık Bilişim envanterindeki güvenlik ve sistem yazılımları temin edilmiştir.
	Bilgi Sistemleri Uygulama Yazılımı Temini	2017-2019	2.400	1.600	800	723	% 90,4	

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K090630	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2018-2019	24.000	13.000	11.000	10.958	% 99,6	
	Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulumu	2018-2019	7.500	4.000	3.500	3.458	% 98,8	2019 yılı itibarıyla 8 adet veri temasına ait standart geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır..
	Coğrafi Bilgi Platformunun Kurulumu	2018-2019	6.000	3.000	3.000	3.000	% 100,0	2019 yılı itibarıyla Coğrafi Bilgi Platformunun Kurulumu gerçekleştirilmiştir.
	Coğrafi Veri Uyumlaştırma Projesi	2018-2019	6.500	3.500	3.000	3.000	% 100,0	81 ilin kent atlası tamamlanmıştır. 11.500.000 adet binanın ve ilişkili topografik veri seti üretimi tamamlanmıştır.
	TUCBS Entegrasyonu Projesi	2018-2019	4.000	2.500	1.500	1.500	% 100,0	2019 yılı itibarıyla 32 adet kamu kurum ve kuruluşu ile 30 Büyükşehir Belediyesi ile ilgili entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır..
2015K090600	Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Projesi (Şehirleşme Sektörü)	2015-2020	13.310	2.000	1.000	320	% 32,0	2 adet sunucu temin edilmiştir.
2018K090040	İmar Planları İzleme ve Denetim Modeli (Şehirleşme Sektörü)	2018-2020	3.000		1.500	1.488	% 99,2	Proje ödeneği Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılmış olup, harcama gerçekleştirilmiştir.
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	77.690	40.100	25.780	24.137	% 93,6	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K100500	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2021	20.475	1.441	2.200	1.734	% 78,8	Program dahilinde, 2019 yılı Mart ayında başlamış olan AB Mali Yardımları Dairesi Başkanlığı'nın kapasitesini geliştirme projesi kapsamında başlıca aşağıdaki aktiviteler gerçekleştirilmiştir: - AB görünürlük ve iletişim klavuzu hazırlığı - Proje hazırlama bölümüne destek kapsamında operasyon tanımlama belgelerinin (OIS) revizyonu - MIS bilgi sisteminin güncellenmesi - Diğer bölümlere ihtiyaçları doğrultusunda uzman desteğinin sağlanması - IPA Uygulama El Kitabının mevcut duruma göre güncellenmesi - Sektör İzleme Toplantılarının (SMC) organizasyonu - Eğitim faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanması Ayrıca, program dahilinde hazırlanmış olan Doğrudan Harcama Planı (DEP) kapsamında aşağıdaki aktiviteler gerçekleştirilmiştir: - 22 adet sözleşmeli uzmanın görevlendirilmesi - Personelin harcırah ödeneklerinin verilmesi - İhale komite üyelerine ödemeler
AB KATKISI			116.025	8.169	11.106	5.865	% 52,8	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.475	1.441	2.200	1.734	% 78,8	
		AB KATKISI	116.025	8.169	11.106	5.865	% 52,8	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018F000630	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2018-2021	1.412	455	319	204	% 63,9	*Ihlara Vadisi Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzenleme Projesi inceleme ve onay işlemleri tamamlanarak,sözleşme bedeli olan 103.604,00 TL(KDV dahil)ödemesi yapılmıştır.. *Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova ve Patara ÖÇKB Bisiklet Yolları Uygulama Projesi inceleme ve onay işlemleri tamamlanarak sözleşme bedeli olan 100.300,00 TL (KDV dahil) ödemesi yapılmıştır.
2017F000120	Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP) (Turizm Sektörü)	2017-2019	18.620	8.900	9.720	9.720	% 100,0	Sultanhanı (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında 2017 yılında mali katkı protokolü imzalanarak 28/07/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yıllara sari olarak yürütülen projede 2017 yılında 2.900.000,00TL, 2018 yılında 5.942.526,06 TL. 2019 yılında 9.720.000,00TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. İmalat çalışmaları tamamlanmıştır.
	Genel Bütçe Ödeneği		10.950	8.900	2.050	2.050	% 100,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		7.670	0	7.670	7.670	% 100,0	
2018F000200	Gökçeada Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	2.500	0	2.500	0	% 0,0	2019 yılı yatırım programında Gökçeada Aydıncık Mevkii Çevre Düzenlemesi Projesi için ayrılan 2.500.000,TL ödeneğinin Kaş Kınık Çevre Düzenleme Projesine aktarılması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ödenek revizyonu teklif edilmiştir. Ödenek kullanılamamıştır.
2018F000240	Tortum Gölü Yarım Ada Çevre Düzenlemesi (DAP) (Turizm Sektörü)	2018-2019	9.500	4.500	5.000	2.282	% 45,6	Uzundere (Erzurum) Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmıştır. İşin sözleşmesi imzalanmış olup imalat çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 1.953.593,25 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. İmalat çalışmaları tamamlanmıştır.
2018F000740	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (Turizm Sektörü)	2018-2019	8.500	3.000	5.500	1.270	% 23,1	Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi için Genel Müdürlüğümüz ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği arasında kırkinler mevkii için2018 yılında imzalanan mali katkı protokolüne 20.12.2019 tarihinde ek mali katkı protokolü imzalanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K050050	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (İçmesuyu Sektörü)	2018-2021	16.514	3.800	3.815	1.832	% 48,0	
	Saros ÖÇKB Köyleri İçmesuyu Temini	2019-2019	1.500		1.500	256	% 17,1	Gelibolu Kaymakamlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup Gelibolu Kaymakamlığı ile yüklenici arasında proje için sözleşme imzalanmış olup, imalat çalışmaları tamamlanmıştır.
	Habilli Mahallesi İçmesuyu Temini	2019-2019	1.250		1.250	964	% 77,1	Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü imzalanmış olup SASKİ tarafından yürütülen projenin imalat çalışmaları tamamlanmıştır.
	Çamlıhemşin İçmesuyu Temini	2019-2019	385		385	383	% 99,5	Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı ek protokolü imzalanmış olup proje tamamlanmıştır.
	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2021	13.379	3.800	680	229	% 33,7	*Aksaray Sultanhanı İçmesuyu Temini Projesi için 114.200,00TL ödenek kullanılarak imalatlar tamamlanmıştır. *Aksaray İhlara İçmesuyu Mal Alım İşi için 26/07/2019 tarihinde İhlara Belediye Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz arasında mali katkı protokolü kapsamında 115.000,00TL ödenek kullanılarak imalatlar tamamlanmıştır.
2014K100140	Mogan Gölü Batimetrik Harita Alımı ve Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi (Çevre Sektörü)	2014-2019	71.237	61.386	9.851	4.707	% 47,8	2019 yılı ödeneği olan 9.851.000 TL nin 4.707.314,19 TL'lik kısmının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşme gereğince yüklenici firmaya ödenmesi için aktarılmıştır. Kalan kısmı gölde rıhtımda atıl halde bekleyen vasıtaların geri mobilizasyonunda kullanılacaktır.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2011K100190	Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (KOP) (Çevre Sektörü)	2011-2019	2.532	2.101	431	417	% 96,8	Sahadaki çalışmalar ve hakediş ile ilgili işlemler devam etmektedir.
	Göksu ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	899	829	70	69	% 98,6	Proje sonuçlanmıştır.
	Fethiye-Göcek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	546	476	70	69	% 98,6	Proje sonuçlanmıştır.
	Belek ÖÇKB Tür ve Habitat Koruma ve İzleme	2011-2019	547	477	70	68	% 97,1	Proje sonuçlanmıştır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme	2016-2019	177	137	40	35	% 87,5	Proje sonuçlanmıştır.
	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2016-2019	147	107	40	36	% 90,0	Proje sonuçlanmıştır.
	Pamukkale ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama	2017-2019	216	75	141	140	% 99,3	Pamukkale ÖÇKB yönetim planı hazırlama ve uygulama projesi 2018-2019 yıllarını kapsamaktadır. Proje % 100 gerçekleştirilmiştir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K100020	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme Projesi (Çevre Sektörü)	2017-2019	825	209	616	573	% 93,0	Değerlendirme dosyaları ilgili şirket tarafından teslim edilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz tarafından teslim edilen dosyaların incelemesi tamamlanmıştır. Yatırım Programının Çevre Sektöründe 694.000,00 TL+KDV bedel ile ihale edilmiştir 2018 yılı içerisinde % 30u ödenmiş olup, 2019 yılı içerisinde kalan % 70 lik kısım ödenmiştir.
2017K100030	Özel Çevre Koruma Biyoçeşitlilik Araştırmaları Projesi (KOP) (Çevre Sektörü)	2017-2019	1.335	797	538	524	% 97,4	
	Belek ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	270	135	135	135	% 100,0	Proje sonuçlanmıştır.
	Kaş-Kekova ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	285	156	129	128	% 99,2	Proje sonuçlanmıştır.
	Patara ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	450	325	125	112	% 89,6	Proje sonuçlanmıştır.
	Tuz Gölü ÖÇKB Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi	2017-2019	330	181	149	149	% 100,0	Proje sonuçlanmıştır.
2019K100040	Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi (DOKAP) (Çevre Sektörü)	2019-2020	500		100	64	% 64,0	%20 ile ilk hakedişi Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K090270	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2021	12.400		3.594	1.218	% 33,9	
	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2021	3.300		994	468	% 47,1	*Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı tamamlanmış olup, hakediş işlemleri tamamlanmıştır. *Muğla İli Ula İlçesi, Akyaka 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi hakediş işlemleri tamamlanmıştır *Kırşehir ili, Seyfe gölü 1/1000 ölçekli halihazır harita alımhakediş işlemleri tamamlanmıştır *Karaman İli, Merkez İlçesi, Kurucabel Köyü Yenidünya (Göz) Mağarası 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi hakediş işlemleri tamamlanmıştır *Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Salda, Doğanbaba, Kayadibi Köyleri 1/1000 ölçekli halihazır harita alımı işi hakediş işlemleri tamamlanmıştır
	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2021	6.700		2.000	225	% 11,3	1-Fethiye Göcek ÖÇKB Fethiye Kentsel Rehberinin Hazırlanması projesi hazırlık aşamasında.(0.00TL) 2-Köyceğiz Dalyan ÖÇKB Dalyan Tasarım Rehberinin Hazırlanması çalışmalarına başlanacak.(0.00TL) 3-İzmir Balçova İnciraltı Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı kurum görüşleri toplanıyor.(0.00TL) 4-Aksaray (Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray ve Ankara İli Şereflikoçhisar kısmı) 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı % 30 Ödeme yapıldı. (31.506 TL) 5-Aksaray (Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray ve Ankara İli Şereflikoçhisar kısmı)1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına esas jeolojik etüt ihalesi yapıldı devam ediyor (0.00TL) 6-İhlara ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Kurum görüşüne çıktı.(0.00TL) 7-Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl Mahallesi İmar Planına Esas Jeolojik etüt 2006 yılında yapılmış mevcut Etüt için Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda kullanılacağı için etüt iptal oldu. (0.00TL) 8-Kaş-Kekova ÖÇKB 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kurum görüşlerine çıktı.(0.00TL) 9-Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı işi tamamlandı ödemesi yapıldı. (92.512 TL) 10-Köyceğiz Dalyan ÖÇKB Köyceğiz İlçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu protokolü konusu işler tamamlandı.(99.993,20TL) 11-Belek ÖÇKB Antalya İli Manavgat İlçesi Yavrudöğün, Büklüce, Denizyaka, Denizkent, Parekende, Kısalar Mahalleleri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Belediyeden Tarım görüşü bilgisi bekleniyor.(0.00TL) 12- Tuz Gölü ÖÇKB Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı protokolü süresinde bitirilmemiş olup, ödenek kullanılmama yazısı yazıldı(0.00TL) 13-Rize Çamlıhemşin İmar Planına Esas Jeolojik etüt protokolü onaylı rapor'un protokol süresi içinde sunulmadığı için ödeme yapılmamıştır.(0.00TL) 14-Fethiye Göcek ÖÇKB İnce Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışmaları kadastro kanununun 22 a maddesi gereği uygulama yapıldığı için baslatılmadı.(0.00TL)

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması	2019-2021	2.400		600	525	% 87,5	Konya İli, Cihanbeyli İlçesi Karatepe, Gölyazı, Günyüzü Mahallelerinde İmar uygulaması işine ilişkin Belediyesi ile protokol imzalanmış olup, Belediyesince ihaleleri yapılarak sözleşmeleri gönderilmiştir. Yıl sonu itibari ile tüm işler tamamlanarak hakedişleri yapılmıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Şehirleşme Sektörü)	2019-2019	1.000		1.000	0	% 0,0	
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	138.205	85.148	34.314	15.141	% 44,1	
	DÖNER SERMAYE		7.670	0	7.670	7.670	% 100,0	
	GENEL TOPLAM		145.875	85.148	41.984	22.811	% 54,3	
	Kamu laştırma		1.000	0	1.000	0	% 0,0	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K080080	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Dipnot: 121) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2021	8.000	5.000	1.000	71	% 7,1	
2017K080030	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Dipnot: 121) (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2021	5.710	500	1.570	85	% 5,4	
2019K070020	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi (Dipnot: 118) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2019-2019	1.496.700		1.496.700	1.496.700	% 100,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.510.410	5.500	2.570	156	% 6,1	

Dipnot: 121 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Dipnot: 118 12.01.32.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek , Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K010070	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2019-2019	4.000		4.000	3.500	% 87,5	Harcama yapılmamıştır.
	Harita Alımları	2019-2019	250		250	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Plan, Proje Alımları	2019-2019	250		250	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2019-2019	3.500		3.500	3.500	% 100,0	Proje ödeneğinin tamamı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. Aktarılan ödeneğin tamamı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2019-2021	444.850		438.950	392.421	% 89,4	Başlangıç ödeneği 2.950.000 TL dir. Yıl içerisinde 436.000.000 TL ödenek eklenmiştir.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	4.000	0	4.000	3.500	% 87,5	
		Kamu laştırma	444.850	0	438.950	392.421	% 89,4	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2015K090830	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)	2014-2020	152.539	41.500	34.093	31.121	% 91,3	
	Genel Bütçe Ödeneği		48.400	15.000	4.050	3.128	% 77,2	
	Döner Sermaye Ödeneği		104.139	26.500	30.043	27.993	% 93,2	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	14.000	7.000	2.900	2.577	% 88,9	Hizmet binası yapım işi 23.06.2017 tarihinde KDV dahil 9.770.400,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 18.09.2017 tarihinde imzalandı. KDV dahil 410.586 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 10.180.986 TL dir. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2021	13.000	0	200	178	% 89,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2020	9.900	8.000	900	373	% 41,4	Hizmet binası yapım işi 12.12.2016 tarihinde KDV dahil 6.652.840,00 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 09.01.2017 tarihinde imzalandı. KDV dahil 665.275 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 7.318.115 TL dir. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası	2017-2021	11.500	0	50	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
	Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	20.000	11.000	9.000	8.818	% 98,0	Hizmet binası yapım işi 30.10.2017 tarihinde KDV dahil 17.039.200 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.01.2018 tarihinde imzalandı. 2018 yılında Genel Bütçeden 5.481.473,52 TL ve Döner Sermayeden 7.672.889,69 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Kasım ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	13.000	5.500	6.000	5.273	% 87,9	Hizmet binası yapım işi 15.01.2018 tarihinde KDV dahil 8.782.740 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 23.02.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 673.522 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 9.456.262 TL dir. 2018 yılında Genel Bütçeden 4.992.315,98 TL ve Döner Sermayeden 1.710.848,36 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Eylül ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	15.295	7.000	8.295	8.295	% 100,0	Hizmet binası yapım işi 19.01.2018 tarihinde KDV dahil 10.924.440 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 28.02.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 1.069.374 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 11.993.814 TL dir. 2018 yılında Genel Bütçeden 5.214.443,56 TL ve Döner Sermayeden 2.051.930,62 TL ödeme yapılmıştır. 2019 yılı Ekim ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2022	35.320	0	210	204	% 97,1	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2022	8.000	0	50	0	% 0,0	Tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz ihalesi yapılmadı.
	Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası (*.Döner Sermaye)	2017-2021	11.000	3.000	5.980	4.898	% 81,9	Hizmet binası yapım işi 08.02.2018 tarihinde KDV dahil 6.629.240 TL 'ye ihale edilmiştir. Sözleşme 10.04.2018 tarihinde imzalandı. KDV dahil 662.924 TL iş artışı yapıldı. Toplam Maliyet 7.292.164 TL dir. 2019 yılı Eylül ayı içerisinde HİZMETE AÇILMIŞTIR.
	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (*Döner Sermaye)	2019-2021	1.524		508	505	% 99,4	İhtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu kapsamda; Hakkari İl Müdürlüğü hizmet binası kesin hesabı, İzmir THM Müdürlüğü Binası ve Konya THM Müdürlüğü Binası kesin hesapları ödenmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K090050	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2019-2019	3.750		3.750	3.443	% 91,8	
	Hizmet Binası Onarımı	2019-2019	4.750		4.750	4.745	% 99,9	
2019G000060	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2019-2019	4.199		4.199	1.732	% 41,2	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	61.099	15.000	16.749	13.048	% 77,9	
		DÖNER SERMAYE	104.139	26.500	30.043	27.993	% 93,2	
		GENEL TOPLAM	165.238	41.500	46.792	41.041	% 87,7	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2018 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2019 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2019 31.12.2019 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019G000060	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2019-2019	100		100	68	% 68,0	
2019K090050	Muhtelif İşler (SGB-Destek Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2019-2019	250		250	247	% 98,8	
	Hizmet Binası Onarımı	2019-2019	250		250	250	% 100,0	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	600	0	600	565	% 94,2	
