

**STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI**

**2025 Yılı
Bütçe ve Yatırım Programı
4. Dönem Gerçekleşme Raporu
(01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 Dönemi)**





BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ


01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2025 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2025 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	15.571.414.000,00	17.424.603.879,86	16.170.187.898,65	% 92,8
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.071.366.000,00	2.281.785.356,72	2.091.892.477,98	% 91,7
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	966.471.000,00	2.337.599.533,86	2.007.709.840,90	% 85,9
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	817.743.000,00	2.229.451.345,15	1.914.499.129,69	% 85,9
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	148.728.000,00	108.148.188,71	93.210.711,21	% 86,2
05	CARİ TRANSFERLER	144.750.175.000,00	125.835.463.800,00	124.109.939.156,26	% 98,6
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	136.553.846.000,00	115.367.460.000,00	113.669.063.474,00	% 98,5
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	2.200.000.000,00	1.566.364.800,00	1.565.036.587,04	% 99,9
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	5.202.000.000,00	6.429.750.000,00	6.429.750.000,00	% 100,0
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredis-i-TOKİ ödemesi	508.955.000,00	505.515.000,00	505.515.000,00	% 100,0
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	222.934.000,00	222.934.000,00	201.560.331,84	% 90,4
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	59.081.000,00	59.081.000,00	56.609.263,38	% 95,8
	İskan Uygulamaları Ödeneği	2.000.000,00	2.000.000,00	45.500,00	% 2,3
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	% 100,0
	Deprem Bölgesi İLBANK Projeleri KDV Ödemeleri	0,00	353.000.000,00	353.000.000,00	% 100,0
	Ahıska Türklerinin İskanı-TOKİ Ödemesi	0,00	1.328.000.000,00	1.328.000.000,00	% 100,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	29.794.713.000,00	192.348.488.093,84	181.126.273.060,58	% 94,2
	Bakanlık Yatırım Programı	29.404.713.000,00	29.467.259.602,75	18.708.418.356,65	% 63,5
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	390.000.000,00	568.600.000,00	537.374.153,22	% 94,5
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	142.952.543.918,97	142.851.824.096,83	% 99,9
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	280.000.000,00	227.978.913,13	% 81,4
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	19.080.084.572,12	18.800.677.540,75	% 98,5
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	26.060.329.000,00	34.900.834.509,00	34.634.723.491,39	% 99,2
	Bakanlık Yatırım Programı	535.483.000,00	885.483.000,00	619.372.297,25	% 69,9
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	22.874.383.000,00	22.874.383.000,00	22.874.383.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Altyapı Projeleri Destek	2.000.000.000,00	2.273.150.000,00	2.273.150.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	4.100.000.000,00	4.099.999.999,99	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Hava Kalitesi Programı	430.463.000,00	210.613.000,00	210.613.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Sıfır Atık Destek Programı	220.000.000,00	166.700.000,00	166.700.000,00	% 100,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	82.882.000,00	82.881.685,15	% 0,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	4.307.623.509,00	4.307.623.509,00	% 100,0
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği		0,00	0,00	% 0,0
08	BORÇ VERME	80.000.000,00	118.650.000,00	118.553.500,00	% 99,9
GENEL TOPLAM		219.294.468.000,00	375.247.425.173,28	360.259.279.425,76	% 96,0



BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

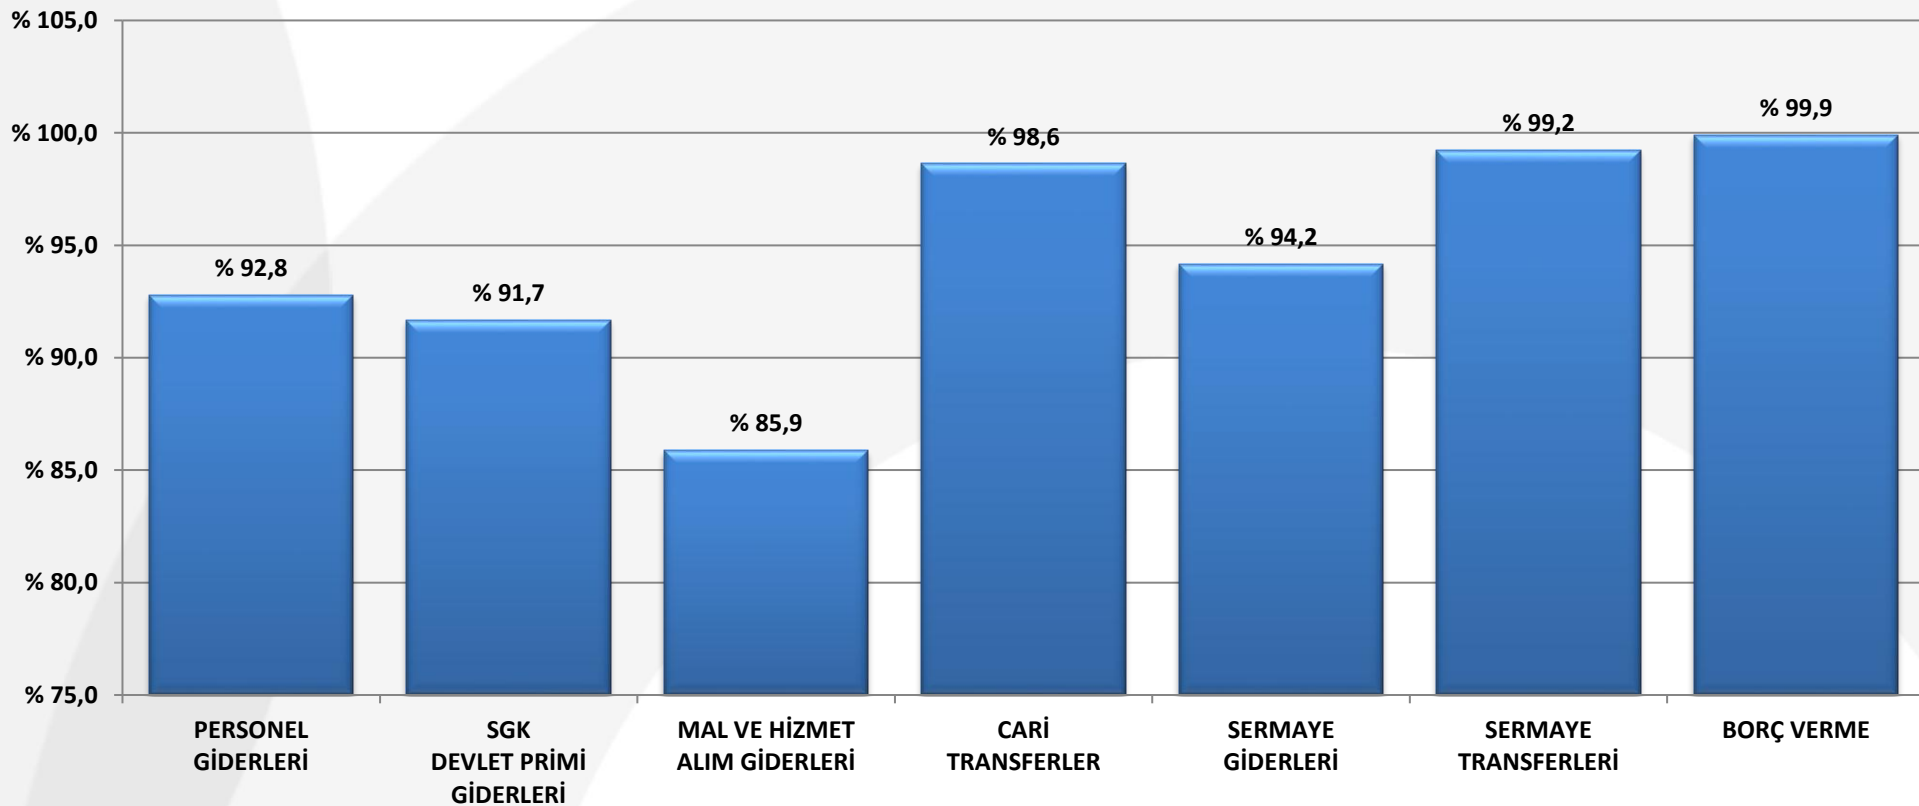




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2025 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2025 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	95.491.000,00	39.410.000,00	33.294.288,00	% 84,5
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	13	2.467.650.000,00	532.821.000,00	281.100.997,00	% 52,8
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	4	1.105.150.000,00	257.700.000,00	187.012.690,00	% 72,6
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	20	85.641.230.000,00	29.356.486.000,00	18.274.950.414,00	% 62,3
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	2	10.972.000,00	7.000.000,00	4.559.631,00	% 65,1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	11	916.811.000,00	595.350.000,00	577.942.522,00	% 97,1
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	5.512.126.000,00	9.000.000,00	5.892.213,00	% 65,5
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	29	5.782.083.000,00	1.550.175.000,00	1.401.992.626,00	% 90,4
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	7.528.100.000,00	5.650.000,00	746.400,00	% 13,2
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	3	293.548.000,00	70.000.000,00	58.382.025,00	% 83,4
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	421.274.000,00	259.205.000,00	230.789.238,00	% 89,0
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	1	100.000,00	100.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	97	109.795.035.000,00	32.703.397.000,00	21.056.663.044,00	% 64,4
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	60	104.598.504.000,00	30.360.596.000,00	19.229.060.607,00	% 63,3
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	37	5.196.531.000,00	2.342.801.000,00	1.827.602.437,00	% 78,0
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	3 adet		568.600.000,00	537.374.153,22	% 94,5



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

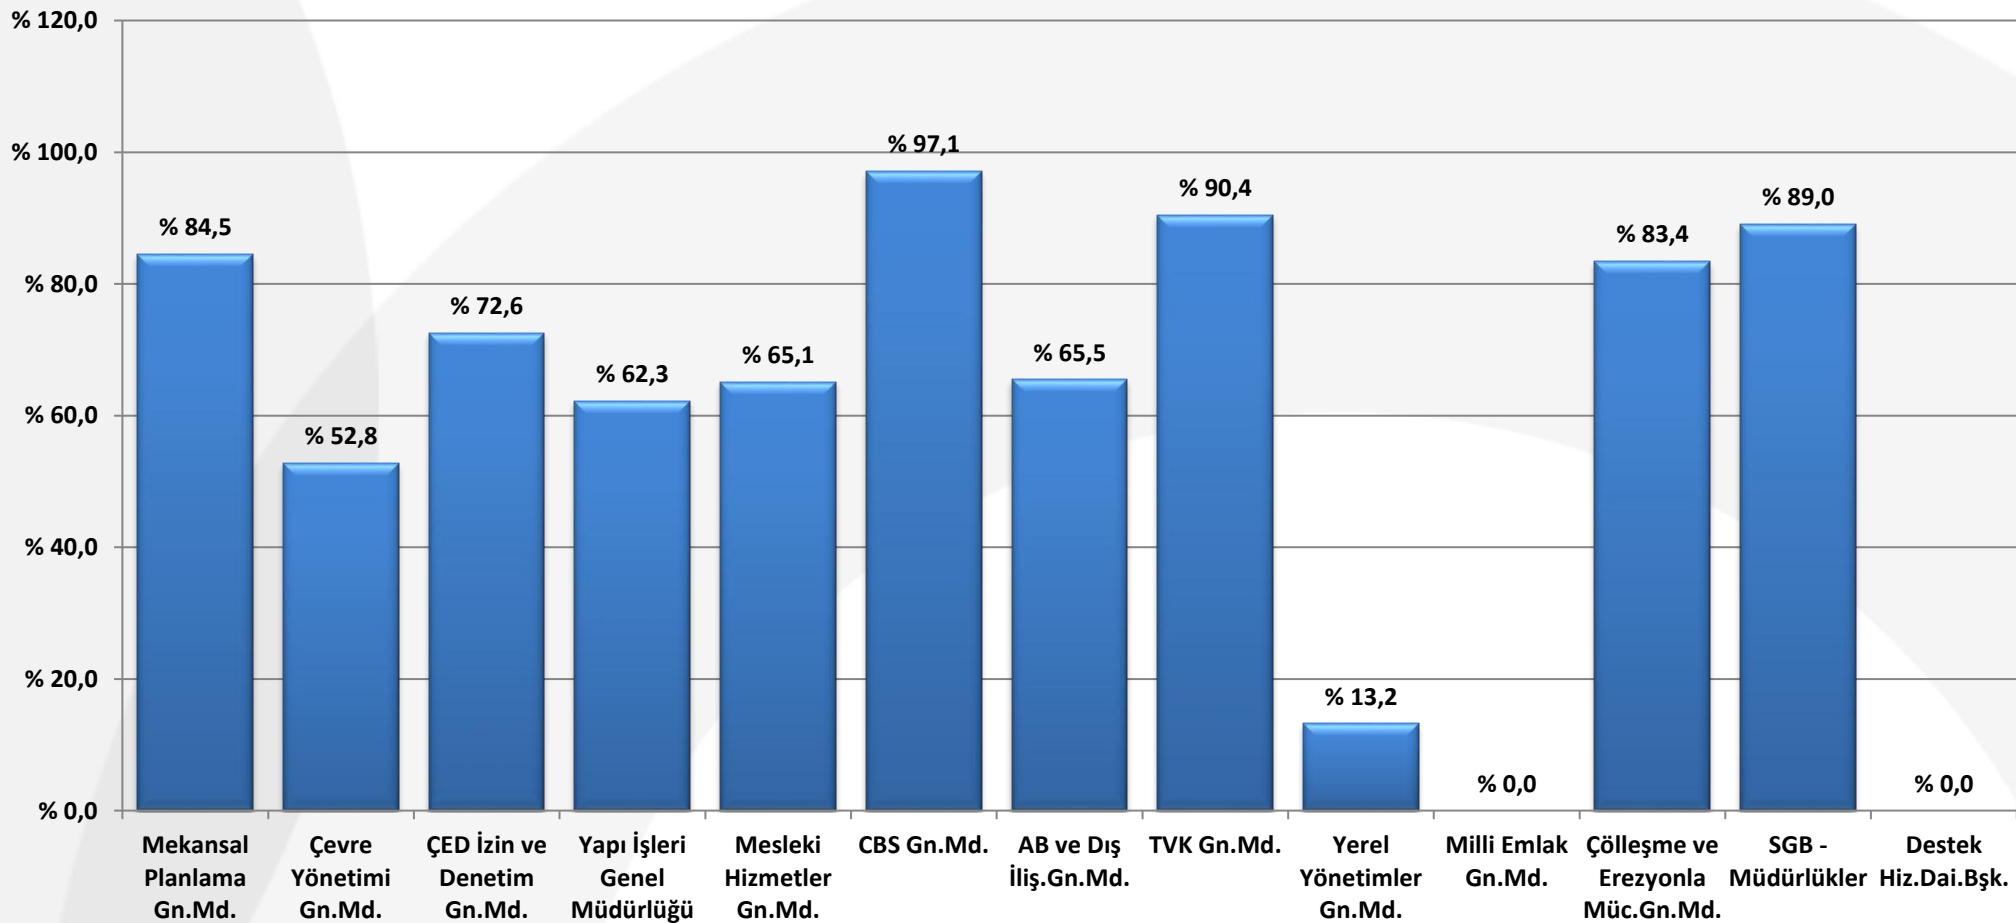




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2025 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2025 REVİZE ÖDENEĞİ	31.12.2025 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	233.099.000,00	258.009.800,00	251.093.353,46	% 97,3
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	10.559.857.000,00	15.465.966.800,00	15.205.876.605,40	% 98,3
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	687.192.000,00	686.112.719,32	618.522.296,90	% 90,1
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	29.959.973.000,00	181.186.177.726,87	170.183.640.795,97	% 93,9
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	209.218.000,00	218.225.800,00	214.598.493,29	% 98,3
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	380.853.000,00	444.304.400,00	423.924.363,11	% 95,4
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	347.420.000,00	455.893.800,00	420.463.579,76	% 92,2
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	613.456.000,00	805.202.000,00	714.955.888,97	% 88,8
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	82.247.000,00	85.397.000,00	81.088.536,15	% 95,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	607.594.000,00	780.194.000,00	740.426.556,50	% 94,9
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	198.339.000,00	207.648.800,00	193.664.544,11	% 93,3
Personel Genel Müdürlüğü	86.259.000,00	101.534.000,00	99.732.374,10	% 98,2
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	108.512.000,00	1.276.096.400,00	1.141.369.376,94	% 89,4
Özel Kalem Müdürlüğü	122.288.000,00	146.328.000,00	142.225.894,66	% 97,2
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.069.269.000,00	1.430.602.420,70	1.086.051.126,11	% 75,9
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	26.718.000,00	25.576.000,00	23.437.522,94	% 91,6
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	156.067.000,00	156.167.000,00	146.624.289,23	% 93,9
Strateji Geliştirme Başkanlığı	160.007.236.000,00	138.822.640.200,00	137.121.492.301,76	% 98,8
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	11.534.000,00	15.820.800,00	15.348.877,95	% 97,0
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	70.722.000,00	77.172.000,00	73.062.472,65	% 94,7
İl Müdürlükleri	13.712.735.000,00	32.548.258.106,39	31.317.271.965,98	% 96,2
Yurtdışı Teşkilatı	43.880.000,00	54.097.400,00	44.408.209,82	% 82,1
TOPLAM	219.294.468.000,00	375.247.425.173,28	360.259.279.425,76	% 96,0



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2025 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

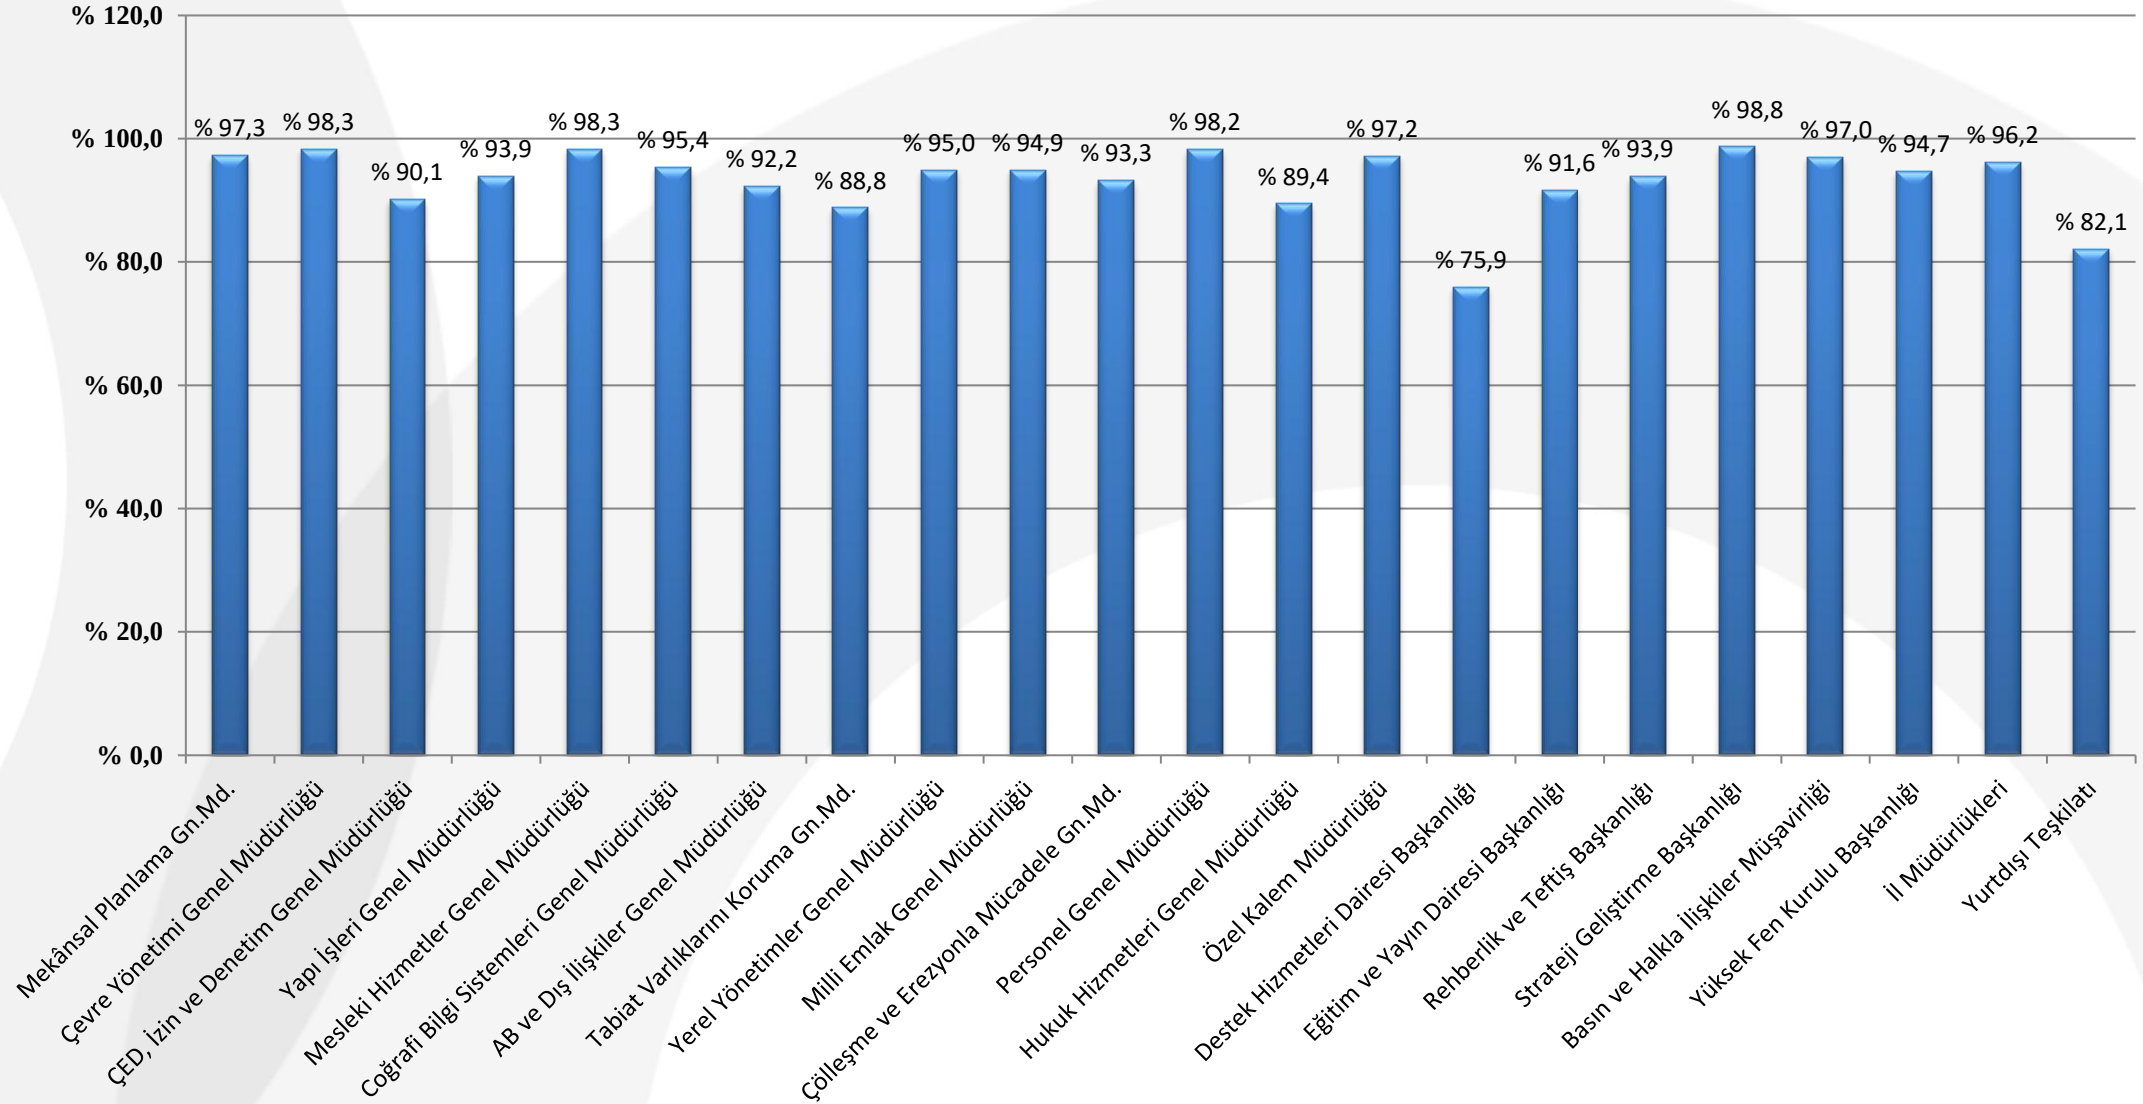



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

**Harcama Birimi Bazında
2025 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri
01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025**

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2020K09-150592	İmar Planları Etüt ve Projelerinin Sayısallaştırılması (Şehirleşme Sektörü)	2020-2025	31.306.000	20.946.000	10.360.000	9.435.000	% 91,1	
2020K09-150592-150594	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma	2020-2025	19.146.000	15.146.000	4.000.000	3.135.000	% 78,4	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi Hizmetleri(YERBİS) projesi kapsamında 3.hakediş ödemesi olarak 3.135.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
2020K09-150592-150602	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Yoluyla Coğrafi Veri Üretimi	2020-2025	12.160.000	5.800.000	6.360.000	6.300.000	% 99,1	İmar Planlarının Sayısallaştırılması Projesi kapsamında 1.hakediş ödemesi olarak 630.000,00 TL İmar Planlarının Sayısallaştırılması Projesi kapsamında 2.hakediş ödemesi olarak 2.428.734,73 TL İmar Planlarının Sayısallaştırılması Projesi kapsamında 3.hakediş ödemesi olarak 3.241.265,27 TL olmak üzere toplam 6.300.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2025	4.500.000	2.000.000	2.500.000	1.754.640	% 70,2	Çankırı İli Ilgaz ilçesi örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında 3. hakediş ödemesi olarak 259.920,00 TL Ardahan İli Merkez İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında 4. hakediş ödemesi olarak 230.400,00 TL Bolu İli Mengen İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında 3. hakediş ödemesi olarak 258.000,00 TL
2023K09-209859-209860	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2025	4.500.000	2.000.000	2.500.000	1.754.640	% 70,2	Çankırı İli Ilgaz ilçesi örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında 4. hakediş ödemesi olarak 259.920,00 TL Ardahan İli Merkez İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında 5. hakediş ödemesi olarak 230.400,00 TL Bolu İli Mengen İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Projesi kapsamında 4. hakediş ödemesi olarak 516.000,00 TL olmak üzere toplam 1.754.640,00 TL ödeme yapılmıştır.
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2026	23.785.000	0	7.200.000	7.200.000	% 100,0	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları Projesi kapsamında 1. hakediş ödemesi olarak 7.200.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	8.500.000	0	3.250.000	3.229.848	% 99,4	İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması 1 nolu hakediş kapsamında 01.01.2025-31.12.2025 arasında 3.229.848,00 TL ödeme yapılmıştır.
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	7.900.000	0	3.500.000	2.208.000	% 63,1	Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı 1 nolu hakediş kapsamında 552.000,00 TL, 2 nolu hakediş kapsamında 1.656.000,00 TL olmak üzere 01.01.2025-31.12.2025 arasında toplam 2.208.000 TL ödeme yapılmıştır.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K09-249151	Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2025-2025	7.500.000		7.500.000	7.076.400	% 94,4	Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışma Hizmetleri projesi 1. hakediş ödemesi kapsamında 1.079.100,00 TL ödeme yapılmıştır. Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışma Hizmetleri projesi 2. hakediş ödemesi kapsamında 3.956.700,00 TL ödeme yapılmıştır. Kentleri İzleme Çerçevesi Pilot Çalışma Hizmetleri projesi 3. hakediş ödemesi kapsamında 2.040.600,00 TL ödemesi olmak üzere toplam 7.076,400 TL ödeme yapılmıştır.
2025K09-249153	Çevre Düzeni Planı-2 (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2025-2026	12.000.000		5.100.000	2.390.400	% 46,9	Çevre Düzeni Planı Projesi 1.hakediş ödemesi kapsamında 2.390.400,00 TL ödeme yapılmıştır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	59.591.000	22.946.000	20.060.000	18.389.640	% 91,7	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	35.900.000	0	19.350.000	14.904.648	% 77,0	
		GENEL TOPLAM	95.491.000	22.946.000	39.410.000	33.294.288	% 84,5	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	25.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	% 100,0	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 16.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 20.226.852 TL (KDV Hariç) ve projenin toplam süresi 764 (yedi yüz altmış dört) takvim günüdür. 19.11.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 1. Ara Rapor 25 Haziran 2025 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuştur. Rapor uygun bulunmuş olup, hakediş işlemleri gerçekleştirilmiştir. yükleniciye 12.000.000 (KDV dahil) ödeme yapılmıştır. 2. Ara Raporun taslak hali 9.12.2025 tarihinde Bakanlığımıza sunulmuş olup, uygun bulunan nihai hali 14.01.2024 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Projenin konusuyla ilgili ülkemizde ve diğer ülkelerde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve mevzuat karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 2025 yılı için belirlenen 13 tesisden atıksu deneysel karakterizasyon çalışmaları için alınan numunelerde analizleme çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında toplam 22 adet AAT için saha çalışmalarının yapılması planlanmış olup, 16 adet AAT'ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu 16 adet AAT'den 5'ine Bakanlığımız personeli eşlik etmiştir. Bakanlığımız eşlik ettiği saha ziyaretleri 06.05.2025 tarihinde Tatlar AAT'de, 07.05.2025 tarihinde Konya İli Merkezi AAT'de, 26.05.2025 tarihinde Kastamonu İli, Kastamonu Belediyesi AAT'de, 06.11.2025 tarihinde Mersin İli Mezitli AAT'de, 07.11.2025 tarihinde Adana İli Yüreğir AAT'de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Mayıs 2025 tarihinde AAT tasarım eğitimi ve 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde AAT tasarımı ve simülasyon programı kullanımına ilişkin eğitim Bakanlık binasında gerçekleştirilmiştir. Proje iş paketleri doğrultusunda yapılması gereken çalışmalara devam edilecektir.
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	50.000.000	15.000.000	24.000.000	23.821.770	% 99,3	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje (15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Mükerrer Resmi Gazete, Karar Sayısı: 8082) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 15.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 39.405.901 TL + KDV olup; 15.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje başladığı tarihten itibaren, endüstriyel atıksu yönetimine ilişkin literatür araştırmaları, uluslararası mevzuatta atıksuda izlenen kirlenici parametrelerin ve deşarj standartlarının incelenmesi, sektörel eğitimler, saha ziyaretleri, anket çalışmaları ve diğer sektörel faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Planlanan 60 saha ziyaretinin 39'u tamamlanmış, 24 adet sektörel eğitim ile AB mevzuatına yönelik bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Atıksu numune alma ve analiz çalışmaları kapsamında pilot tesisler belirlenmiştir. Proje kapsamında; endüstriyel atıksu yönetimine ilişkin uluslararası uygulamaların yerinde incelenmesi ve yasal düzenlemelere yönelik karşılıklı bilgi alış-verişinin sağlanması amacıyla, 21-23.10.2025 tarihleri arasında Avusturya'ya üç günlük çalışma ziyareti düzenlenmiştir.23-25.12.2025 tarihleri arasında İl Müdürlüklerine yönelik "Endüstriyel Atıksu Yönetimi Eğitimi" düzenlenmiştir. 24.11.2025 tarihinde sunulan İkinci Ara Rapor uygun görüldüğünden yükleniciye 11.821.770,30 TL (KDV Dahil) ödeme yapılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K06-247883	OSB Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı (*. Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2025-2026	18.000.000		4.000.000	3.960.000	% 99,0	15.01.2025 tarihli ve 32783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9409 sayılı Cumhurbaşkan Kararı ile 2025 yılı yatırım programına kabul edilen "Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Projesi" Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 15.000.000 TL + KDV olup; projenin 14 Kasım 2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Projenin başlatıldığını ilgili kurum ve kuruluşlara duyurmak, işbirliğini sağlamak ve projede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla Bakanlığımız Konferans salonunda 6 Ocak 2026 tarihinde Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 28.11.2025 tarihinde sunulan Başlangıç Raporu uygun görüldüğünden yükleniciye 3.960.000 TL (KDV Dahil) ödeme yapılmıştır.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2027	1.100.000.000	404.750.000	196.000.000	192.126.369	% 98,0	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 2025 yılı yatırım programında 196 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 2025 yılı KAP proje detay listesinin oluşturulması amacıyla komisyon toplantıları düzenlenmiş ve en son Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 23.11.2025 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür. 2025 yılı içerisinde yapılması öngörülen proje çalışmaları sürdürülmüş olup ayrılan 2025 yılı yatırım programı ödeneğinden 192.126.369 TL ödenek kullanımı gerçekleştirilmiştir.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2026	5.000.000	0	2.500.000	0	% 0,0	Proje bütçesi revize talebi yatırım programında değerlendirilmek üzere sunulmuş olup belirlenecek yeni bütçeye göre teknik şartname çalışmaları yürütülecektir. Bu nedenle 2025 yılı yatırım programında ayrılan ödenekten herhangi bir harcama yapılamamıştır.
2025K08-263549	Arsuz Katı Atık Yönetimi Tesisleri (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2025-2026	900.000.000		250.000.000	23.532.377	% 9,4	Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının belediye atık yönetimi yatırımlarını en uygun ve ekonomik şekilde yapması, atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla önerilen proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Proje ile Hatay ilinin belediye atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesi, entegre atık yönetim tesislerinin (ön işlem tesisleri ve düzenli depolama tesisleri) faaliyete geçirilmesi ve atık yönetim tesisleri finansman eksikliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yapım İşleri İlker Bankası A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Fizibilite raporu, ÇED süreci ve uygulama projesi onay süreci tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. 2025 yılı içerisinde başlatılan inşaat çalışması ile 23.532.377 TL ödenek kullanımı sağlanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-183739	STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması (Çevre Sektörü)	2022-2025	12.220.000	8.499.000	3.721.000	3.000.000	% 80,6	2023 Yatırım Programında yer alan STÜ Ulusal Eylem Planı Hazırlanması Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanmış olup, 02.02.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje kapsamında Yüklenici Proje Yönetim Planı, STÜ Ulusal Eylem Planı Mevcut Durum Raporu, Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Rapor Taslağı, BAT ve BEP Kılavuzu ve Sektör Notları Rapor Taslağı hazırlanmıştır. Proje kapsamında Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi Hazırlanmasına Yönelik Konut ve İnşaat Sektörü Çalıştayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü, Otomotiv, Tüketiciler Ürünleri İmalatı, Plastik ve Tekstil Sektörüne Yönelik ilgili paydaşların katılımıyla çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Sektörel Değer Zinciri Metodolojisi taslak Raporları sunulmuş olup nihai hale getirilmesi hazırlıkları devam etmektedir. 2024 yılında protokol kapsamında 6.000.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 27/12/2024 tarihinde imzalanan ek protokol ile proje süresi 200 gün uzatılmasına karar verilmiştir. 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde STÜ Ulusal Eylem Planı hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi. STÜ UEP Eylem Planı İzleme Yazılımı, Sektörel BAT ve BEP Kılavuzları, Rapor ve eylem planı hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. 10-11 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'da farkındalık semineri ve kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında hazırlanması gereken raporlar güncellenmiştir. Yönetici özeti ve final raporu hazırlanmıştır. Proje "Yönetici özeti ve final raporu" için 2025 yılında 3.000.000 TL ödeme yapılmıştır. Proje 21 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 2023-2025 yılları arasında Protokol kapsamında iş ve işlemlere göre toplam 11.950.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)	2018-2026	10.450.000	3.150.000	4.800.000	4.800.000	% 100,0	EKÖK Sektör Uzmanı Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile 17.10.2024 tarihinde imzalanan protokol sonrası 18.10.2024 tarihinde başlamıştır. Proje ile Proje Yönetim Planı Raporu hazırlanmış ve ilk ödemesi gerçekleştirilmiştir. Projede aşağıda sıralanan işlerin tamamlanması hedeflenmiştir: - Proje Başlangıç Toplantısı - Proje Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları - Proje Yönetim Planı Raporu - Sektörel Tebliğlerin Hazırlanması - Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Raporların Usul ve Esaslarının Hazırlanması - Uzmanlığa Yönelik Usul ve Esaslar ile Eğitim ve Rehber Dokümanların Hazırlanması - Sektörel Toplantılar - Final Raporu
2018K10-150237-183734	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2026	10.450.000	3.150.000	4.800.000	4.800.000	% 100,0	Proje Kapsamında 22-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Proje Yönetimi ve Değerlendirme ve Sektörel Tebliğ Taslakları hazırlanmasına ilişkin Toplantı gerçekleştirilmiştir. 9-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında sektörel toplantı gerçekleştirildi, toplantıda sektörel tebliğ taslakları ve puanlama üzerinden geçildi. Tebliğ puanlama tabloları ve uzmanlık alt yapısına yönelik usul ve esaslar taslağı hazırlanmıştır. Projede Ekim ayı sonunda "Uzmanlığa Yönelik Usul ve Esaslar ile Eğitim ve Rehber Doküman"lar sunulmuştur. Hazırlanması için ödeme gerçekleştirilecektir. 21-22 Kasım 2025 tarihinde Antalya'da Tebliğ Puanlamalarına yönelik çalıştay düzenlendi. 2025 yılında 4.800.00 TL ödeme yapıldı. Proje kapsamında ek protokol imzalanarak sektör uzmanlığı iletişim ve bilgi paylaşımı amaçlı SYD Hub platformu hazırlandı.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2027	38.000.000	0	12.050.000	0	% 0,0	
2018K10-43862- 247921	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-3	2025-2027	19.000.000		5.550.000	0	% 0,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren HEY Portalı veritabanının, veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. Bu Portal aracılığıyla NEFES yazılımına esas şehirlerde hava kalitesi seviyelerinin belirlenmesi, Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatının kullanımına yönelik hava kalitesi haritalarının üretilmesi ile birlikte katı yakıt uygunluk, satış ve dağıtım hizmetinin elektronik süreç takibi gerçekleştirilmektedir. Katı Yakıt Modülü;ısıma amaçlı yerli ve ithal tüm katı yakıtların ülkeye giristen son kullanıcıya ulaşana kadar süreçte mevzuatın gereği olarak verilen tüm belgeler elektronik ortamda e-imza ile düzenlenmeye başlanmıştır. Modül, mobil arayüz geliştirilerek Bakanlık uygulama listesine eklenmiştir. Ülkemizdeki katı yakıt satıcılarının bu mobil versiyon ile satış yaptıkları müşterileri sisteme tanımlamaları ve adrese dayalı katı yakıt tüketim miktarı bilgisine ulaşmaları mümkün olmaktadır. HEYGEL projesi ile yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında hava kalitesi tahminleme sisteminin ilk adımları atılmış olup, büyük veri yönetimi, uzaktan algılama teknolojileri gibi farklı teknolojilerin sisteme entegrasyonu ile hesaplamalardaki belirsizlik oranının asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmekte, devam projesi için ileri düzey teknolojilerin entegrasyonu çalışmaları sürdürülmektedir. Hava kalitesi yönetiminde karar destek aracı olarak kullanılan Hava Emisyon Yönetim Portalının teknolojik açıdan iyileştirilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, web yazılım ile hayata geçirilen çevre yatırımının sürdürülmesi ve daha ileriye taşınması amaçlanmaktadır. Teknik şartname hazırlıkları yıl boyunca sürdürülmüş olup TURKSAT Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme Anonim Şirketine 27.08.2025 tarihinde gönderilmiştir. Yaklaşık maliyetin 80 Milyon TL gelmesi üzerine revize edilen teknik şartnameye 47.5 milyon TL fiyat alınmıştır, mevcut bütçe ile imza aşamasına geçilememiş olup, toplam bütçenin 35 Milyon TL'ye çıkarılması 2026 yılı Yatırım Programı için önerilmiş ve öneri kabul edilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862- 247934	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Faz-2	2025-2027	19.000.000		6.500.000	0	% 0,0	Bakanlığımız sunucularında hizmet veren NEFES yazılımına ait veri yönetimi, veri arşivleme, yedekleme, bakım ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde kesintisiz hizmet vermesi önem taşımaktadır. NEFES yazılımı kapsamında şehirlerin hava kalitesine ilişkin değerlendirme ve sonuç odaklı eylemlerinin belirlenmesine esas şehirlerin hava kalitesi yönetiminde karar destek mekanizması için dijital ikizleri üzerinden 3 boyutlu haritalarının üretilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi yönetiminde şehirlere özgü yüksek çözünürlüklü veri üretiminin devamlılığı ile kirliliğin kaynağının tespiti sağlanmaktadır. Sağlık indeksi hesabı ile şehrin hava kalitesini etkileyen tüm etmenlere ilişkin karar destek süreçlerine değerlendirme aracı sağlanmıştır. Projenin sözleşme süreci devam etmektedir. Teknik şartname hazırlıkları yıl boyunca sürdürülmüş olup, TURKSAT Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme Anonim Şirketine 30.07.2025 tarihinde gönderilmiştir. Yaklaşık maliyetin 50 Milyon TL gelmesi üzerine revize edilen teknik şartname ile TURKSAT tarafından ihalesi 3 kasım 2025 tarihinde yapılmış olup; 35 Milyon TL bedelle tamamlanmış ve mevcut bütçe ile imza aşamasına geçilememiştir.. Bu nedenle toplam bütçenin 35 Milyon TL'ye çıkarılması 2026 yılı Yatırım Programı için önerilmiş ve kabul edilmiştir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müd. ile Ortak Proje-Ödeneği Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müd.ne aktarıldı) (Çevre Sektörü)	2021-2026	24.564.000	7.400.000	3.500.000	0	% 0,0	Proje, aynı proje adı ve proje numarası altında 2 fazlı olarak yürütülmekte olup birinci fazında hazırlanan planlar, kılavuzlar ve mevzuatlar için nihai düzenlemeler yapılmakta ve Kapanış Toplantısı hazırlıkları yürütülmektedir. Projenin ikinci fazı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup sistem analizi ve yazılım çalışmaları devam etmektedir.
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2026	29.886.000	6.730.000	10.000.000	10.000.000	% 100,0	01.01.2025-30.09.2025 tarihleri arasında Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen hususlara uygun olarak; yazılım geliştirme, test ve entegrasyon çalışmaları sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür. 06.03.2025 tarihinde 3. ilerleme raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş ve tarafımızca uygun değerlendirilmiş ve 1.513.305,15 TL ödenmiştir. 23.06.2025 tarihinde Sonuç Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş ve tarafımızca uygun değerlendirilmiş ve 2.017.740,20 TL ödenmiştir. Bu bağlamda projenin birinci aşaması sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Diğer taraftan projenin ikinci aşaması çalışmaları kapsamında, 30.07.2025 tarihinde TÜRKSAT A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında iş başlamıştır. 28.08.2025 tarihinde Proje Yönetim Planı Bakanlığımıza teslim edilmiş ve tarafımızca uygun değerlendirilmiş ve 2.910.821,40 TL ödenmiştir. 21.11.2025 tarihinde 1. İlerleme Raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş ve tarafımızca uygun değerlendirilmiş ve 3.492.985,68 TL ödenmiştir. Ayrıca proje kapsamında, sistemin çalışır durumda olduğu 7 gün 24 saat esasına göre takip edilmiş, sistemsel konularla ilgili olarak telefon ve e-posta desteği sorunsuz bir şekilde karşılanmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-247998	Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı (Çevre Sektörü)	2025-2026	25.000.000		4.750.000	0	% 0,0	Hizmet alımına ilişkin iki kez yaklaşık maliyet ve bir kez fiyat teklifi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'den talep edilmiş; ancak alınan teklif bedellerinin öngörülen ve tahsis edilen bütçe tutarlarının üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle proje bütçe tutarının artırılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bütçe artışının, 2026 yılı yatırım programında yayımlanmıştır.
2022K10-181853	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek [AB-1] (Çevre Sektörü)	2022-2025	34.000.000	25.000.000	9.000.000	7.860.481	% 87,3	Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesinin kapsamı 11 Şubat 2025 tarihinde resmi olarak gerçekleştirilmiştir. Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı 18 Ekim 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planının da yayımlanmasıyla Projeye ait Final Raporu 25 Kasım 2025 tarihinde onaylanarak tüm çıktılar tamamlanmıştır. Atık Sonu Projesi kapsamında; -Faaliyet 2.4 kapsamında, toplamda dokuz kılavuz - Agregalar, Alüminyum, Kompost, Bakır, Cam, Demir ve Çelik ve Tekstil ile İl Müdürlüğü ve Bakanlık Kılavuzları dahil olmak üzere - sunulmuştur. -Faaliyet 2.1.3 kapsamında hazırlanan Teknik Yönetmelik Taslağı sunulmuştur. -Faaliyet 2.3 kapsamında hazırlanan Yol Haritası sunulmuştur ve yorumlar doğrultusunda revize edilmiştir. -Türkiye'de Atık Sonu Kavramının Geliştirilmesi için Teknik Yardım kapsamında Nihai Rapor hazırlanmıştır. - 17 Nisan 2025 tarihinde Faaliyet 4.5 kapsamında Kapanış Etkinliği düzenlenmiştir. - Faaliyet 4.5 kapsamında düzenlenen Kapanış Etkinliği için Kapanış Etkinliği Raporu hazırlanmıştır. -Faaliyet 2.3 kapsamında hazırlanan Teknik Yönetmelik Taslağı sunulmuş ve belgeye ilişkin yorumlar iletilmiştir. -Faaliyet 2.1.1: Etki değerlendirme çalışmaları -Faaliyet 2.3: Yol Haritası ve mevzuat revizyonu -Faaliyet 2.4: Uygulama kılavuzları (Çevre ve İşçi Çalışma Bakanlığı, İl Müdürlükleri, Alüminyum, Bakır, Cam, Demir-Çelik, Tekstil) - Faaliyet 3.1: Eğitim programları (İstanbul Çalıştayı, Cam Sektörü, Metal Sektörü) - Faaliyet 3.2: Çalışma Ziyareti -Faaliyet 4.5: Kapanış Toplantısı onaylanmıştır. -Faaliyet 2.4 : Türkiye'de Atık Sonu Uygulama Kılavuzları – Kompost -Faaliyet 2.4 : Türkiye'de Atık Sonu Uygulama Kılavuzları - Agregalar -Faaliyet 2.1.3: Teknik Yönetmelik Taslağı da 03.10.2025 tarihinde onaylanmıştır. Türkiye'de Atık Sonu Kavramının Geliştirilmesi için Teknik Yardım kapsamında hazırlanan Nihai Rapor 14 Kasım 2025 tarihinde sunulmuş ve onaylanmıştır.
AB katkısı			220.094.000	164.581.000	55.513.000	48.500.000	% 87,4	
9 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.124.670.000	441.399.000	482.821.000	231.319.227	% 47,9	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	122.886.000	24.730.000	50.000.000	49.781.770	% 99,6	
		GENEL TOPLAM	2.247.556.000	466.129.000	532.821.000	281.100.997	% 52,8	
		AB KATKISI	220.094.000	164.581.000	55.513.000	48.500.000	% 87,4	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K10-198443	Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme-Faz3 (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2024-2025	49.900.000	17.200.000	32.700.000	32.700.000	% 100,0	Marmod Faz III Projesi 15.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Not: KDV hariç 27.250.000 TL, KDV dahil 32.700.00 TL hakediş yapıldı.
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)	2014-2027	915.000.000	327.000.000	188.500.000	147.832.690	% 78,4	
2014K10-169742- 2117	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2027	885.000.000	327.000.000	158.500.000	127.006.690	% 80,1	
	Genel Bütçe Ödeneği		463.000.000	182.000.000	78.500.000	69.708.616	% 88,8	Merkez ve 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakım, onarım ve kalibrasyon hizmet alımına ait ilgili yıl hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği		422.000.000	145.000.000	80.000.000	57.298.074	% 71,6	Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ile ilgili ihtiyaç duyulan sarf ve yedek malzeme cihaz alımı işine ait teslim edilen malzemelere ilişkin ödemeler gerçekleştirilmiştir.
2014K10-169742- 254653	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi (**.Döner Sermaye)	2025-2025	30.000.000		30.000.000	20.826.000	% 69,4	4 tane Hava Kalitesi İzleme İstasyonu yenilerek hizmet alımı tamamlanmıştır.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi (Çevre Sektörü)	2021-2026	20.250.000	3.750.000	6.500.000	6.480.000	% 99,7	Bakanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan "Türkiye Çevre Etiket Sistemi'nin (TÇES) Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında 2 hakediş ödemesi gerçekleştirilmiş olup, kriter belirleme çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246784	Sürekli İzleme Merkezi Modernizasyonu (Çevre Sektörü)	2025-2027	120.000.000		30.000.000	0	% 0,0	Proje kapsamında süre ve bütçe revizyonu talebi yapılmış olup süreç tamamlanmadığından projenin ihalesine çıkılamamıştır.
	Genel Bütçe Ödeneği		30.000.000		10.000.000		% 0,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		90.000.000		20.000.000		% 0,0	
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	513.250.000	185.750.000	95.000.000	76.188.616	% 80,2	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	591.900.000	162.200.000	162.700.000	110.824.074	% 68,1	
		GENEL TOPLAM	1.105.150.000	347.950.000	257.700.000	187.012.690	% 72,6	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2026	7.733.722.000	6.281.922.000	647.900.000	587.913.244	% 90,7	KABEV Projesi 2025 yılı sonunda tamamlanmış olup, 4 aylık ödemesiz dönem devam etmektedir.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2026	7.651.822.000	6.201.922.000	646.000.000	577.300.141	% 89,4	
	Hibe Ödeneği	2019-2026	81.900.000	80.000.000	1.900.000	1.900.000	% 100,0	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	10.767.000.000	117.000.000	1.823.400.000	227.715.086	% 12,5	Danışmanlık işleri 2025 yılında devam etmiş olup, yapım ihaleleri ve işleri yapılmaya başlanmıştır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	10.708.500.000	109.200.000	1.800.000.000	199.941.608	% 11,1	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	58.500.000	7.800.000	23.400.000	23.400.000	% 100,0	
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-1] (Enerji Sektörü)	2023-2026	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	2025 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği	2023-2026	0	0	0	0		
	Hibe Ödeneği-AB katkısı	2023-2026	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2 (*.Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2024-2030	12.813.050.000	20.000	3.500.000.000	3.079.760.956	% 88,0	KABEV-2 Projesi planlandığı gibi devam etmektedir.
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadag 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (Destek Hiz.Dai. Bşk. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2026	233.280.000	0	183.280.000	0	% 0,0	2025 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*.Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2026	31.226.000.000	6.098.355.000	11.690.800.000	7.099.568.931	% 60,7	Deprem Bölgesinde toplam ilk kredi ile 1812 adet konut yapıp teslim edilmiştir.İlave Kredi ile 2560 adet köy konutunun ihalesi yapıp çalışmalar devam etmektedir.
2024G00-224663	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar-JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA) (Konut Sektörü)	2024-2026	8.585.253.000	3.415.571.000	5.091.680.000	4.446.305.645	% 87,3	Elazığ ili ve Malatya İlinde toplam 6 adet Köy onutu ihalesi yapıldı ve konutlar teslim edildi
	JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2024-2026	7.414.253.000	2.846.571.000	4.567.680.000	4.377.896.514	% 95,8	
	Genel Bütçe Ödeneği	2024-2026	1.171.000.000	569.000.000	524.000.000	68.409.131	% 13,1	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021H03-255345	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (*Kredili Proje) (Yükseköğretim Sektörü)	2021-2027	6.738.613.000	277.157.000	4.018.326.000	1.469.719.545	% 36,6	İstanbul ili Hatay İli Kocaeli ilindeki Yüksek öğrenim binaları ile Yutrt Binalarının güçlendirme ve enerji verimliliği çalışmaları devam etmektedir.
2021H03-255345-255346	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı	2021-2027	766.196.000	0	338.218.000	0	% 0,0	2025 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.
2021H03-255345-255347	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri	2023-2027	1.563.113.000	0	942.356.000	0	% 0,0	2025 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.
2021H03-255345-255963	Bogaziçi Üniv.Uçaksavar Kampüsü Superdorm Binası	2024-2025	150.250.000	24.000.000	126.250.000	122.520.000	% 97,0	Geçici Kabulü yapılmıştır
2021H03-255345-255971	İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar	2024-2025	234.600.000	19.000.000	215.600.000	201.703.731	% 93,6	Geçici Kabulü yapılmıştır
2021H03-255345-255977	İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar	2024-2025	285.000.000	0	285.000.000	197.013.995	% 69,1	İş devam etmektedir.
2021H03-255345-255987	İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü	2024-2025	142.700.000	0	142.700.000	138.701.654	% 97,2	İş devam etmektedir.
2021H03-255345-255992	Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü	2024-2025	175.500.000	6.000.000	169.500.000	169.379.354	% 99,9	Geçici Kabul aşamasındadır

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021H03-255345- 256013	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar	2024-2025	331.000.000	16.000.000	315.000.000	313.162.820	% 99,4	Geçici Kabulü yapılmıştır
2021H03-255345- 256029	Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci Yurtları	2024-2025	120.000.000	0	120.000.000	80.066.426	% 66,7	İş devam etmektedir.
2021H03-255345- 256035	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar	2024-2025	350.000.000	0	350.000.000	247.171.565	% 70,6	İş devam etmektedir.
2021H03-255345- 256080	Boğaziçi Üniversitesi Kare Bina	2025-2026	802.400.000		597.200.000	0	% 0,0	Üniversite yönetimi tarafından iş iptal edildi
2021H03-255345- 254389	Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap Binalar	2024-2025	234.157.000	212.157.000	22.000.000	0	% 0,0	Geçici kabulü yapıldı
2021H03-255345- 278759	Fırat Üniversitesi-1.Etap Binalar	2025-2027	821.647.000		161.782.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2021H03-255345- 263427	İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Büyükdere Kampüsü Binaları	2025-2026	702.050.000		209.720.000	0	% 0,0	İhalesi yapıldı sözleşme aşamasında
2021H03-255345- 262736	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü C Blok	2025-2026	20.000.000		8.000.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2021H03-255345- 262735	Dokuz Eylül Üniv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası	2025-2026	40.000.000		15.000.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları devam etmektedir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2024-2027	2.000.000.000	0	910.000.000	787.868.525	% 86,6	İnşaat devam etmektedir
2024I00-235103-235104	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı	2024-2027	1.980.000.000	0	900.000.000	787.868.525	% 87,5	
2024I00-235103-235105	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi Makine Teçhizat	2024-2027	20.000.000	0	10.000.000	0	% 0,0	
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
2017K09-3813-171165	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2026	46.183.000	0	40.000.000	0	% 0,0	Bahse konu Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işinin Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı 21.02.2025 tarih ve 11827252 sayılı yazımız ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne iletilmiş, ayrıca 17.08.2025 tarihinde (Bakanlığımız yetkilileri ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin katılımış olduğu) online olarak gerçekleştirilen 2026 yatırım programı görüşmeleri sonrasında bahse konu işe ait 18.07.2025 tarih ve 13062234 sayılı yazımız ile gerekli ödenek revize işleminin yapılarak ihale talimatının gönderilmesi için Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne konu tekrardan iletilmiştir.
2017K09-3813-171166	Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2025	46.476.000	43.476.000	3.000.000	3.000.000	% 100,0	Yapım işi tamamlanarak geçici kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2017K09-3813-171167	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2026	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,0	Uygulama projeleri Bakanlığımız tarafından tamamlanmış olup yatırım programına alınması ve ödenek sağlanması halinde yapım aşamasına geçilebilecektir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2025	2.710.737.000	1.530.737.000	900.000.000	147.029.138	% 16,3	Tunceli İlinde bulunan Kamu binalarının güçlendirme ve enerji verimliliği çalışmaları devam etmektedir.
2021K14-172248-172249	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2025	513.362.000	263.362.000	250.000.000	131.024.263	% 52,4	
	Hibe Ödeneği	2021-2025	31.500.000	31.500.000	0		% 0,0	
2021K14-172248-172250	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*.Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2025	1.815.875.000	1.235.875.000	580.000.000	16.004.875	% 2,8	
2021K14-172248-278574	Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	2025-2026	27.000.000		5.400.000	0	% 0,0	İhalesi yapıldı sözleşme aşamasında
2021K14-172248-278579	Tunceli Hükümet Konağı	2025-2026	157.000.000		31.400.000	0	% 0,0	İhalesi yapıldı sözleşme aşamasında
2021K14-172248-278580	Tunceli Hozat Hükümet Konağı	2025-2026	30.000.000		6.000.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2021K14-172248-278581	Tunceli Mazgirt Hükümet Konağı	2025-2026	41.500.000		8.300.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2021K14-172248-278582	Tunceli Nazımiye Hükümet Konağı	2025-2026	32.500.000		6.500.000	0	% 0,0	İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2021K14-172248-278583	Tunceli Kültür Merkezi	2025-2026	62.000.000		12.400.000	0	% 0,0	İhalesi yapıldı sözleşme aşamasında
2025K14-246725	Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini (**.Döner Sermaye)-(Afetler Sektörü)	2025-2025	85.000.000		85.000.000	65.495.941	% 77,1	Alım DMO üzerinden gerçekleştirilmiş olup, proje tamamlanmıştır.Toplamda 19 araç alımı yapılmıştır.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (Destek Hiz.Dai. Bşk. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2024-2026	284.676.000	2.000.000	120.000.000	0	% 0,0	2025 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2027	495.000.000	10.000.000	223.000.000	222.999.994	% 100,0	24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Olur'u ile tahmini ödenek teminine esas revize bedeli onaylanmış olup 04.07.2024 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. Yapılan sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 16.06.2028 olarak güncellenmiştir. İş devam etmektedir. Fiziki Gerçekleşme oranı % 75,00, Nakdi Gerçekleşme oranı da % 75,00'dir.
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2026	161.000.000	0	2.000	0	% 0,0	2024 yılında yatırım programına alınmış olup,haksahipleri tarafından yapılan yerşecimi işlemi beğenilmediğinden dolayı ihalesi iptal edilmiştir. Yeniden yerşecimi çalışması yapılacaktır. 2026 yılı yatırım programında da yer alacaktır.
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2025	77.000.000	1.000.000	64.000.000	58.164.580	% 90,9	2024 yılında yatırım programına alınmış olup, 48.000.000,00 TL anahtar teslim götürü bedeli üzerinden ihalesi tamamlanmıştır. 11.02.2025 tarihinde işin ihalesi yapılmış olup,17 haksahibine ait olan konutlar tamamlanmıştır. Kura çekimi yapılacaktır.
2025K07-245711	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	174.000		174.000	168.000	% 96,6	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukça harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K07-245713	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	5.574.000		5.574.000	2.073.910	% 37,2	Bingöl-Solhan-Kale köyü yeni yerleşim yeri projesi hazırlama işi kesin hesap ödemesi 256.193,21 TL (KDV dahil) ve Bursa-Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Kayağmaz köyünün, Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş beldesi sınırları içerisinde nakledilmesi yapım işi ödemesi 1.817.716,39 TL (KDV dahil) kesin hesap ödeneginden karşılanmıştır.
2025K07-255697	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2028	1.500.000.000		118.600.000	118.553.500	% 100,0	Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Niğde, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 81 uygulama da yaklaşık 1.200 ailenin konut yapım işidir. 2025 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı 79.950.000 TL olarak belirlenmiştir. 2025 Yılı Yatırım Programı çalışmaları kapsamında, Ocak-Aralık Döneminde, 08.1 kaleminden (Yurt İçi Borç Verme-K.E.Y.'li konutlar) Yatırım Programında yer alan Aksaray, Ankara, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Isparta, İzmir, K.Maraş, Sivas, Tunceli ve Uşak illerine, toplam da 118.553.500 TL (31.12.2025 tarihi itibariyle) tutarında ödenek gönderilmiş ve harcanmıştır. Toplam da 162 konut tamamlanmıştır.
2025K07-245714	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (*08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	50.000		50.000	0	% 0,0	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2027			59.600.000	59.509.197	% 99,8	Kamulaştırma ve konut ile arazi satın alımları için kullanılmaktadır. "06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) kaleminden 2025 Yılında; Adıyaman, Çorum, Samsun Kocaeli, ve Ankara İllerinde 5 Tarım arazisi ve 41 konut olmak üzere toplam da 46 satın alımı işi için 59.509.196,80 TL ödenek gönderilmiştir. Sene başında ödenek 45.000.000 TL olarak belirlenmiş olup daha sonrasında revize edilmiştir.
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	83.141.223.000	17.612.462.000	28.849.556.000	18.090.900.973	% 62,7	
2 Proje		08 TOPLAM	1.500.050.000	0	118.650.000	118.553.500	% 99,9	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	602.956.000	2.000.000	388.280.000	65.495.941	% 16,9	
		GENEL TOPLAM	85.416.129.000	17.733.762.000	29.356.486.000	18.274.950.414	% 62,3	
3 Proje		HİBE	171.900.000	119.300.000	25.300.000	25.300.000	% 100,0	
1 Proje		AB KATKISI	108.974.000	53.397.000	38.141.000	0	% 0,0	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	116.127.000	43.476.000	60.000.000	3.000.000	% 5,0	
		Kamu laştırma	0	0	59.600.000	59.509.197	% 99,8	

Not-1: "GES Kurulumu" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-2: "Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİ F HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2027	4.972.000	1.425.000	1.000.000	955.020	% 95,5	1.7 Nisan 2025 de, Bakanlığımız ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) arasında “Binalarda Yalıtım Uygulamaları ve İyi Uygulama Kurallarına İlişkin Farkındalığın Artırılması” konusunda protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında çeşitli konularda bölgesel eğitimler verilmiştir. 2. 8 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi ile; “Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR)’nin Uluslararası Sürümünün (YeS-INT) Oluşturulması Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması” çalışmaları tamamlanmıştır. 3. AB Binalarda Enerji Performansı Direktifi (AB/2024/1275) ile yeni binalar için zorunlu hale getirilen Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Raporunun hazırlanması hususunda ulusal YDD metodolojisinin geliştirilmesi ve BEP-TR yazılımına entegre edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. İşin Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak bir proje kapsamında yapılması hususunda protokol imzalanmış olup uluslararası ihaleye çıkılacaktır. 4. Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan Bina Yangın Yönetmeliği Taslağına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar ile özel sektör paydaşlarının görüşleri alınmış ve Taslağa nihai hali verilmiş olup, Taslak İçişleri Bakanlığı'na nihai onayı alınmak üzere iletilmiştir. Onaylanmasını müteakip yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına iletilecektir. 5. 4 Kasım 2025 tarihinde Adana'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle, Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde “Binalarda Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı Semineri” gerçekleştirdik. 6. 19 Kasım 2025 tarihinde Brezilya’nın Belem şehrinde düzenlenen “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30)” kapsamında gerçekleştirilen “2053 Net Sıfır Hedefine Giden Yolda Binalar” başlıklı panele katılım sağladık. 7. 2 Aralık 2025 Binalar İle Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yeşil sertifika uzmanlık yetkisinin geçerlilik süresi beş yıla indirildi. 4 yıllık lisans eğitimi mezunlarına YESU olma yetkisi verildi. *Proje kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur. İlgili tarafların eğitilmesi, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere materyallerin temini, yayımlanmak ve dağıtılmak üzere tanıtıcı kılavuz, broşür, katalog, sertifika, belge vb. gereç ve malzemelerin oluşturulması planlar dahilindedir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL**

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİ F HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNE SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K01-246705	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2025-2025	6.000.000		6.000.000	3.604.611	% 60,1	TSE'ye test ve deney ücreti ödenmesi, Geçici görev yolluk ödemeleri, .Laboratuvar Cihaz Kalibrasyon ödemeleri ve Türkak Akreditasyon ödemeleri gerçekleştirilmiştir. İleri Seviye PDG Eğitimi Düzenlenmiştir.
	Genel Bütçe Ödeneği		1.000.000		1.000.000	993.233	% 99,3	
	Döner Sermaye Ödeneği		5.000.000		5.000.000	2.611.378	% 52,2	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	5.972.000	1.425.000	2.000.000	1.948.253	% 97,4	
1 Proje		DÖNER SERMAYE	5.000.000	0	5.000.000	2.611.378	% 52,2	
		GENEL TOPLAM	10.972.000	1.425.000	7.000.000	4.559.631	% 65,1	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K60-181765	Mobil Altyapı Geliştirme (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2022-2025	9.768.000	5.400.000	4.368.000	1.738.909	% 39,8	Projenin 2025 yılı ödeneği Dijital Dönüşüm V4 (DDV4) Projesi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılması gereken işler söz konusu projenin iş artışı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Projenin 2025 yılı ödeneğinden 1.738.909 TL DDV4 projesinin iş artışı kapsamında kullanılmıştır.
2023K60-217018	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2025	195.932.000	96.000.000	99.932.000	99.932.000	% 100,0	Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Coğrafi Açık Veri Portalı, Katma Değerli Hizmetler, Analiz Portalı ve Yönetici Kumanda Paneli gibi yetenekler kazandırılmış olup, yaklaşık 687bin kullanıcı ile e-devlet üzerinden bütünsel olarak kesintisiz hizmet vermektedir.
2024K60-226941	e-Plan Semantik Planlama ve Yaygınlaştırma (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	31.050.000	9.000.000	22.050.000	22.050.000	% 100,0	Proje kapsamında 2025 yılı içerisinde e-Plan Otomasyon Sistemleri'nin bakımı ve çağrı merkezi hizmeti sağlanmış, gelişen ihtiyaçlar ve değişen mevzuatlar kapsamında yeni geliştirmeler yapılmış, PlanCBS'nin yeniden geliştirilmesi tamamlanmış ve sisteme semantik planlama kabiliyeti kazandırılmıştır. Proje 2025 yılı aralık ayı itibarıyla tamamlanmıştır.
2024K60-226942	Bulut Kent Bilgi Sistemi (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	42.500.000	13.500.000	29.000.000	29.000.000	% 100,0	Bulut Kent Bilgi Sistemi Yenileme ve Geliştirme Kapsamında Hizmet Temin İş'i ile Bulut Kent Bilgi Sistemi Veri Konsolidasyonu İşleri, 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla tamamlanmıştır. Altı aylık garanti bakım süreci, Ocak 2026 itibarıyla başlamıştır.
2023K60-230220	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2026	46.027.000	8.027.000	18.000.000	18.000.000	% 100,0	2025-2026 Mebis Bakım Onarım İdamesinin 2025 yılı tamamlanmış olup 2026 yılı bakım onarım çalışmaları devam etmektedir.
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4 (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2026	230.000.000	45.000.000	92.000.000	91.840.193	% 99,8	Proje kapsamında, yüklenici ARD Grup Bilişim Danışmanlık A.Ş ile 10.03.2025 tarihinde 33.776.66 + KDV değerinde iş artışı sözleşmesi imzalanmıştır. Ana sözleşme kapsamında, 2025 yılında toplam 5.Hakediş ödemesi; iş artışı sözleşmesi kapsamında 4 adet hakediş ödemesi yapılmıştır. Ana sözleşme kapsamında 2025 yılında toplam 91.840.193 TL ödeme yapılmış olup, iş artışı kapsamında toplam 14.738.908,80 ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje 31.12.2026 yılında sona erecektir.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K60-246748	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2025-2025	304.800.000		304.800.000	294.160.906	% 96,5	
2025K60-246748- 246749	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2025-2025	223.400.000		223.400.000	221.380.283	% 99,1	Aşağıdaki ürünler belirtilen fiyatlarla temin edilmiştir. Blok Tabanlı Veri Depolama Ürünü 40.748.582,4 - Teyp Sürücü Alımı1.677.600,00- Sunucu Alımı22.646.928,00-Bilgisayar Temini64.149.840,00-DMO üzerinden Yazıcı Temini3.260.402,35-Yazıcı/Fotokopi/Tarayıcı36.333.706,00-Tincad 204.630,00-Bakanlık Makamı Drone alımı180.000,00-Kablosuz Ağ Altyapısı46.199.388,00-Evrak İmha Makinesi52.872,19-Makam bilgisayar ve tercüme cihazı900.000,00-DMO Alımları 3.026.334,39-Dijital Versiyon Projesi2.000.000,00
2025K60-246748- 246750	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2025-2025	54.600.000		54.600.000	54.591.772	% 100,0	Aşağıdaki ürünler belirtilen fiyatlarla temin edilmiştir. OSKA E-Hakedis Lisans Güncellemesi800.000,00-AMP E-Hakedis Lisans Güncellemesi800.000,00-PROTA800.000,00-EDR LİSANSI800.000,00- İZLEME HİZMETİ942.000,00-MDR Lisans Güncellemesi959.400,00-Güvenlik Duvarı, Log Yazılımı ve Çoklu Kimlik Doğrulama Lisans Güncellemesi11.376.000,00-Yük Dengeleme Cihazı Lisans Güncellemesi25.320.000,00-NAC Ürünü Lisans Temini4.692.000,00-SSL Sertifika Temini151.077,00-Kurumsal Sızma Testleri672.000,00-Siber Güvenlik Eğitimleri MDM Alımı959.953,74-microsoft danışmanlık işi951.600,00-İş Sürekliliği Merkezi Ortam İzleme Ürünü307.741,20-ENVI + Pix4d 5.500.00,00
2025K60-246748- 246751	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2025-2025	11.500.000		11.500.000	11.060.851	% 96,2	2025 yılı Ocak-Aralık döneminde proje ödeneginden 11.060.851,2 TL + KDV TL harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme %96,18'dir. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi yazılımının kabulü yapılarak 3.230.000 TL +KDV ödemesi yapılmıştır.
2025K60-246748- 247713	Bakanlık Web Sitesi Altyapı Platformu Modernizasyonu	2025-2025	11.100.000		11.100.000	2.928.000	% 26,4	Proje kapsamında; •Bakanlığımız ana web sitesi ile merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve yürütülmekte olan projelere ait web sitelerinin barındırıldığı web alt yapısının günümüz teknolojilerine uygun hale getirilmiştir. •Anıt Ağaçlar ve Mağaralar yönetim modülü Bakanlığımız ana sayfası ile uyumlu hale getirilmiştir. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde proje ödeneginden 2.480.000 TL + KDV TL harcama yapılmıştır. Ayrıca; Açık Kaynak Kodlu PostgreSQL veri tabanı yönetim sistemi için hizmet seviye taahhüt işleri (SLA) ve Danışmanlık Hizmetleri Alımı için 16.06.2025 tarihinde 448.000 TL + KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır ve yıl içerisinde gerekli iş ve işlemler yapılmıştır.
2025K60-246748- 247716	CA Api Gateway Lisans Hizmet ve Bakım	2025-2025	2.500.000		2.500.000	2.500.000	% 100,0	Bakanlığımız ile diğer kurumlar arasında yapılan protokol/anlaşmalar sonucunda yapılan veri gönderme/alma işlemlerine ilişkin REST/SOAP API'lerin tek noktadan yönetilmesi ve Bakanlık merkez birimlerinin uygulamalarında kullanılmak üzere dağıtımı için lisanslı ürün ve ürüne ilişkin olarak bakım onarım desteği satın alınmıştır.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K60-246748-247719	Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama	2025-2025	1.700.000		1.700.000	1.700.000	% 100,0	2025/876611 numaralı ihale kapsamında yürütülen “Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Raporlama Faaliyetleri Kapsamında Olgunluk Modelinin Uygulaması İşi” projesi sonuçlandırılmış olup tamamlanan kontrol ve kabul işlemlerine istinaden ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2025K60-259557	Merkezi Yapay Zeka Çözümleri (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2025-2026	10.000.000		5.000.000	4.520.514	% 90,4	2025 yılı ödeneği kapsamında, ekran kartı (GPU) destekli sunucu temin edilmiş; Doğal Dil İşleme (NLP), Görüntü İşleme ve sunucu kurulumu alanlarında danışmanlık hizmetleri alınmıştır. Ayrıca, yapay zekâ ürün ve servislerine yönelik olarak OpenAI API ve Google Vertex AI entegrasyonları gerçekleştirilmiş; ChatGPT aboneliği ile Gemini Pro hizmetlerinin temini sağlanmıştır.
2024K08-226946	Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Dönüşüm Desteği (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2025	5.570.000	1.870.000	3.700.000	3.700.000	% 100,0	Proje kapsamında kırıkate için Akıllı Şehir Stratejisi ve Fortifikası hazırlanmış, saha incelemeleri, paydaş ve uzman görüşmeleri, odak grup toplantıları, anketler ve eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. GZFT ve PESTEL analizleri ile vatandaş farkındalığı ve yerel yönetim etki analizleri tamamlanmış, veri toplama ve analiz süreçleriyle ilerleme raporları hazırlanarak paydaşlarla paylaşılmıştır. E-Plan, Ulaşım, Altyapı, Enerji ve Çevre Bilgi Sistemleri Genel Müd. ile KPS ile çalışılmaktadır.
2024K10-226936	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Modül Eklenmesi (Çevre Sektörü)	2024-2025	16.600.000	3.600.000	13.000.000	13.000.000	% 100,0	Projenin 2025 yılı ödeneği Dijital Dönüşüm V4 (DDV4) projesi kapsamında iş artışı olarak değerlendirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılması gereken işler söz konusu projenin iş artışı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Projenin 2025 yılı ödeneğinden 13.000.000 TL DDV4 projesinin iş artışı kapsamında kullanılmıştır.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Yönetimi Genel Müd. ile Ortak Proje-Ödeneği Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müd.ne aktarıldı) (Çevre Sektörü)	2021-2026	24.564.000	7.400.000	3.500.000	0	% 0,0	
6 Proje		06 ve 07 TOPLAM	320.414.000	134.900.000	171.850.000	165.720.909	% 96,4	
5 Proje		DÖNER SERMAYE	596.397.000	54.897.000	423.500.000	412.221.613	% 97,3	
		GENEL TOPLAM	916.811.000	189.797.000	595.350.000	577.942.522	% 97,1	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB)	2018-2026	72.840.000	53.840.000	9.000.000	5.892.213	% 65,5	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibariyle sona ermiştir. 2.Bileşen olan teknik yardım sözleşmesinin nihai raporu 11/12/2024 tarihinde onaylanmıştır. Nihai ödemesi 21/01/2025 tarihinde yapılmıştır. Geri kalan 2 bileşenin uygulaması devam etmektedir. Dört bileşenden biri olan 2. teknik yardım projesinin uygulama aşaması 2024 Yılı Eylül ayında başlamış olup, devam etmektedir.
AB katkısı	(Çevre Sektörü)		453.318.000	340.836.000	55.545.000	33.389.205	% 60,1	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2026	4.985.968.000	4.465.918.000	490.257.000	402.618.572	% 82,1	Açıklamalar aşağıda verilmiştir.
	AB Hibesi		4.238.635.000	3.796.635.000	416.697.000	342.225.786	% 82,1	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		308.518.000	275.118.000	31.480.000	25.307.217	% 80,4	
	Mahalli İdare Katkısı		438.815.000	394.165.000	42.080.000	35.085.569	% 83,4	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	72.840.000	53.840.000	9.000.000	5.892.213	% 65,5	
AB KATKISI			453.318.000	340.836.000	55.545.000	33.389.205	% 60,1	
İçmesuyu Sektörü Projesi			4.985.968.000	4.465.918.000	490.257.000	402.618.572	% 82,1	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K05-93010- 103430	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2026	822.962.000	749.978.000	89.600.000	89.258.582	% 99,6	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		699.515.000	637.489.000	76.000.000	75.869.795		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		49.385.000	44.995.000	5.500.000	5.355.515		
	Mahalli İdare Katkısı		74.062.000	67.494.000	8.100.000	8.033.272		
2019K05-93010- 103433	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2026	1.062.788.000	1.017.932.000	101.200.000	100.817.178	% 99,6	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinden 2. Yapım İşinin geçici kabulü 31.10.2025 tarihinde yapılmıştır. 1.Yapım İş'i olan Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı İşinin yugulama süreci devam etmektedir. En kısa sürede geçici kabulün yapılması beklenmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		903.363.000	865.244.000	86.000.000	85.694.601		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		63.775.000	61.075.000	6.100.000	6.049.031		
	Mahalli İdare Katkısı		95.650.000	91.613.000	9.100.000	9.073.546		
2019K05-93010- 103441	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2026	1.023.198.000	964.517.000	55.861.000	55.717.764	% 99,7	Proje kapsamında yer alan atıksu arıtma tesisi yapım işinin uygulama aşaması devam etmektedir. Projenin diğer bileşeni olan kollektor hattı yapım işi sözleşmesi 01.04.2025 tarihinde feshedilmiştir.Kalan işlerin tamamlanmasına dair ihale sürecine başlanmıştır. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		869.713.000	819.842.000	47.361.000	47.360.099		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		61.400.000	57.870.000	3.400.000	3.343.066		
	Mahalli İdare Katkısı		92.085.000	86.805.000	5.100.000	5.014.599		
2019K05-93010- 103447	Trabzon Su Tesisi	2019-2026	747.880.000	691.651.000	89.705.000	3.478.066	% 3,9	Proje kapsamında yer alan yapım işi 11.04.2025 tarihinde feshedilmiştir.Kalan işlerin tamamlanmasına dair ihale sürecine başlanmıştır.
	AB Hibesi		635.693.000	587.905.000	76.836.000	2.956.356		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		44.878.000	41.498.000	5.830.000	208.684		
	Mahalli İdare Katkısı		67.309.000	62.248.000	7.039.000	313.026		
2019K05-93010- 149593	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2026	701.184.000	427.729.000	152.100.000	151.647.294	% 99,7	Proje kapsamında ; Müşavirlik işi sözleşmesi 30.08.2023 tarihinde başlamıştır. 2. yapım işi olan yağmursuyu hatları yapımı işinin kesin kabulü 26.12.2025 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapım işi ise 22.01.2024 tarihinde başlamıştır.Uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		596.589.000	364.155.000	129.000.000	128.900.200		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		46.690.000	28.230.000	10.500.000	10.236.192		
	Mahalli İdare Katkısı		57.905.000	35.344.000	12.600.000	12.510.902		
2019K05-93010- 149594	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2026	627.956.000	614.111.000	1.791.000	1.699.688	% 94,9	Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu toplama hattı yapım işinin kesin kabulü 03.03.2025 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su artıma tesisi inşaatının uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		533.762.000	522.000.000	1.500.000	1.444.735		
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		42.390.000	41.450.000	150.000	114.729		
	Mahalli İdare Katkısı		51.804.000	50.661.000	141.000	140.224		

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025F00-261992	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini (Turizm Sektörü)	2025-2025	15.000.000		15.000.000	8.202.420	% 54,7	3 adet proje için toplam 8.202.420,00.-TL tutarında ödenek kullanılmıştır. Bu projeler;
2025F00-261992- 261993	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2025-2025	15.000.000		15.000.000	8.202.420	% 54,7	1-)Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Projesi kapsamında KDV Dahil 2.640.000,00.-TL bedelli sözleşme imzalanmış olup 2025 yılı içerisinde proje teslim işlemleri tamamlanmıştır. 2-)Korunan Alanlarda Kamp ve Karavan Alanlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında KDV Dahil 2.802.420,00.-TL bedelli sözleşme imzalanmış olup 2025 yılı içerisinde proje teslim işlemleri tamamlanmıştır. 3-)Narlıgöl Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında KDV Dahil 2.760.000,00.-TL bedelli sözleşme imzalanmış olup 2025 yılı içerisinde proje teslim işlemleri tamamlanmıştır.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2027	155.600.000	35.600.000	30.000.000	144.000	% 0,5	“Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme Projesi Kapsamında ÇED ve EDR Dosyalarının Hazırlanması İşİ” mali katkı protokolleri Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Ortaca Belediye Başkanlığı arasında imzalanmış olup iş devam etmektedir. 2025 yıl sonu itibarı ile KDV Dahil 144.000,00.-TL ödenek aktarılmıştır.
2023F00-198824	Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı (Turizm Sektörü)	2023-2027	29.000.000	0	1.000	0	% 0,0	“Edremit Körfezi Doğal Yaşam Parkı” projesinin yapılacağı alana ilişkin İmar Plan çalışmaları süreci Belediyesince tamamlanamadığından projenin uygulanmasına yönelik ödenek aktarımı gerçekleştirilememiştir.
2025F00-254757	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Yapımı (Turizm Sektörü)	2025-2027	40.750.000		14.999.000	14.999.000	% 100,0	Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Eğirdir (Isparta) Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 14.999.000,00.-TL tutarındaki ödenek aktarılmıştır.
2025F00-254761	Seydikemer Çevre Düzenleme Yapımı (Turizm Sektörü)	2025-2027	40.816.000		20.000.000	20.000.000	% 100,0	Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Seydikemer (Muğla) Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 20.000.000,00.-TL tutarındaki ödenek aktarılmıştır.
2025F00-262857	Uzundere Tortum Şelalesi Çevre Düzenlemesi (*).Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2025-2025	22.000.000		22.000.000	21.990.764	% 100,0	Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Uzundere (Erzurum) Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 21.990.764,14.-TL tutarındaki ödenek aktarılmıştır.
2025F00-270566	Ekşisu Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi (*).Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2025-2025	49.000.000		49.000.000	49.000.000	% 100,0	Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Erzincan Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 49.000.000,00.-TL tutarındaki ödenek aktarılmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025F00-279213	Girlevik Şelalesi Tanıtım Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi (**.Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2025-2025	60.000.000		60.000.000	60.000.000	% 100,0	Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Erzincan Valiliği arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 60.000.000,00.-TL tutarındaki ödenek aktarılmıştır.
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (**.Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2027	398.171.000	120.000.000	78.420.000	50.000.000	% 63,8	4 adet içmesuyu projesine toplam 50.000.000,00.-TL tutarında ödenek aktarılmıştır. Bu projeler;
2018K05-18615- 63117	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2027	160.000.000	45.000.000	75.920.000	50.000.000	% 65,9	1-) "Süleymaniye (Gümüşhane) Mahallesi 1000 m³ ve 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İş'i" için Bakanlığımız ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 20.000.000,00.-TL tutarında ödenek aktarılmıştır. 2-) "Bahçeli (Gümüşhane) Belediyesi 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İş'i" için Bakanlığımız ile Bahçeli (Gümüşhane) Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 10.000.000,00.-TL tutarında ödenek aktarılmıştır. 3-) "Torul (Gümüşhane) Belediyesi 100 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İş'i" için Bakanlığımız ile Torul (Gümüşhane) Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 10.000.000,00.-TL tutarında ödenek aktarılmıştır. 4-) "Şiran (Gümüşhane) Belediyesi 200 m³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu ve İsale Hattı Yapım İş'i" için Bakanlığımız ile Şiran (Gümüşhane) Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 10.000.000,00.-TL tutarında ödenek aktarılmıştır.
2018K05-18615- 141350	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2027	238.171.000	75.000.000	2.500.000	0	% 0,0	Yıl içerisinde ilgili idareler ile mali katkı protokolü imzalanmadığından ödenek kullanılamamıştır.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2027	369.224.000	87.000.000	58.451.000	4.892.028	% 8,4	
2021K06-161764- 199492	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2027	225.000.000	55.000.000	5.000.000	4.892.028	% 97,8	"İhlara (Aksaray) Belediyesi İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı 1. Etap Yapım İş'i" kapsamında Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) ile Ihlara (Aksaray) Belediye Başkanlığı arasında imzalanan mali katkı protokolü gereği KDV Dahil 4.892.028,00.-TL tutarında ödenek aktarılmıştır.
2021K06-161764- 199500	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2027	144.224.000	32.000.000	53.451.000	0	% 0,0	Yıl içerisinde ilgili idareler ile mali katkı protokolü imzalanmadığından ödenek kullanılamamıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2026	52.524.000	33.500.000	16.024.000	12.370.800	% 77,2	
2017K09-3807- 92807	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2026	13.705.000	8.000.000	4.705.000	4.678.800	% 99,4	1)Muğla İli Seydikemer ilçesi Özel Çevre Koruma Bölgesi 3000 Ha lık Alanın Fotogrametrik Halihazır Alım işi tamamlandı 2)İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesinde Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Alım işi tamamlandı 3) Gümüşhane İli,Merkez İlçesi Süleymaniye mahallesi 149.3 Ha Alanın Halihazır Haritalarının Güncellenmesi ve Onayının Sağlanması Projesi işi tamamlandı
2017K09-3807- 92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2026	18.996.000	13.500.000	4.836.000	2.496.000	% 51,6	1-Datça-Bozburun Öçkb, Cumalı Köyü Ve Karaköy İmar Planları Ve Kentsel Tasarım Rehberi İşi (İptal Olur'u Alınıyor 247.800,00 TL) 2-Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç 1/5000-1/1000 İmar Planı Revizyonu Yapımı İşi (Tarım Bakanlığı Görüşü Bekleniyor 159.300,00 TL) 3-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalı Kıyı Kesimi 1.Etap 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Ve Plan Açıklama Raporu Yapımı İşi (Kurum Görüşü Beklendiğinden İş'in Süresi Durduruldu 73.200,00 TL) 4-Gümüşhane İli Merkez İlçesi Süleymaniye Kayak Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Ve Plan Açıklama Raporu Yapımı İşi (İş Bitirildi Ödeme Yapıldı 1.548.000,00 TL) 5- Muğla İli, Menteşe İlçesi, Akbük Koyu Mevkii Nitelikli Doğal Koruma Alanında 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İşi (Sözleşme İmzalandı İş Devam Ediyor 885.600,00 TL) 6- Muğla İli, Menteşe İlçesi, Akbük Koyu Mevkii Nitelikli Doğal Koruma Alanında İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu İşi (İş Bitirildi Ödeme Yapıldı 948.000.,00 TL) 7-İmar Planı Paftalarının Taranması ve Koordinatlandırılması İşi (İş Gerçekleştirilmedi)
2017K09-3807- 92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2026	6.823.000	4.000.000	2.483.000	2.196.000	% 88,4	“Süleymaniye Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde kalan yaklaşık 149.3 hektar büyüklüğündeki Kentsel Sit Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı için Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” İşi (Ödemesi yapıldı 2.196.000,00 TL)
2017K09-3807- 92809	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması (* 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2026	13.000.000	8.000.000	4.000.000	3.000.000	% 75,0	1)Trabzon ili Çaykara İlçesinde 74 ha lık alanda yapılacak "Uzungöl Mahallesi İmar uygulaması İşi" için Çaykara Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında 2.000.000 TL transfer yapıldı 2)Aksaray ili Sultanhanı ilçesi Tuzgözü ÖÇK bölgesi 165 ha lık alanda yapılacak İmar Uygulaması işi için Sultanhanı belediyesi ile yapılan protokol kapsamında 1.000.000 Tl transfer yapıldı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	2021-2026	41.680.000	19.680.000	17.500.000	15.196.200	% 86,8	
2021K10-169752-183737	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2025	25.680.000	17.680.000	8.000.000	7.458.000	% 93,2	13.09.2024 te sözleşme imzalanmış ve 20.09.2024 te işe başlanmıştır.Ön Raporun kabulü ile birlikte % 50' si (2024 Yılı) 6.280.381,80 TL,,Ara Raporun kabulü ile birlikte % 25' i (2025 Yılı) 3.140.190,90 TL,,Sonuç Raporunun kabulü ile birlikte % 25'i (2025 Yılı) 3.140.190,90, Projenin % 100'ü tamamlanmıştır.
2021K10-169752-228254	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi	2024-2026	12.000.000	2.000.000	8.000.000	6.318.000	% 79,0	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi; Aksaray ve Ankara-Konya İlleri Bölümleri olarak iki proje halinde yürütülmüş olup; söz konusu iş tamamlanarak, 2. ve son hakedişlerinin sırasıyla KDV hariç 2.630.000,00 TL ve KDV hariç 2.635.000,00 TL şeklinde ödemeleri yapılmıştır (Toplam KDV Hariç 5.265.000,00 TL [KDV Dahil 6.318.000,00 TL]).
2021K10-169752-246728	Pamukkale Travertenlerindeki Mikroorganizmaların İzlenmesi ve Araştırılması	2025-2026	4.000.000		1.500.000	1.420.200	% 94,7	Projenin Ön Raporu Bakanlığımıza sunulmuş olup, 1. hakediş olarak (%45) KDV hariç 1.183.500,00 TL (KDV dahil 1.420.000,00 TL) ödeme yapılmıştır. Çalışmalar, iş planındaki takvime göre 2026 yılında da devam edecektir.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2026	14.500.000	2.430.000	4.080.000	3.415.800	% 83,7	
2021K10-161752-225373	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama	2024-2026	9.200.000	0	1.210.000	889.200	% 73,5	Projenin ön raporu Bakanlığımıza teslim edilmiş ve 1. hakediş olarak KDV hariç 741.000,00 TL (KDV dahil 889.200,00 TL) ödeme yapılmıştır. Çalışmalar, iş planındaki takvime göre 2026 yılında da devam edecektir.
2021K10-161752-228257	Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.800.000	1.260.000	1.540.000	1.200.000	% 77,9	Sözleşme Bedeli Oranında Ödeme Yapıldı Proje Tamamlandı.
2021K10-161752-236211	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planının Hazırlanması	2024-2025	2.500.000	1.170.000	1.330.000	1.326.600	% 99,7	Proje tamamlanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-188090	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Koruma ve Araştırma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2022-2025	14.794.000	7.794.000	7.000.000	6.466.074	% 92,4	Proje tamamlanmış ve tüm hakedişler ödenmiştir.
2024K10-225412	Marmara Denizinde Pina Koruma ve İzleme (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2025	2.900.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	% 100,0	Proje tamamlanmış ve tüm hakedişler ödenmiştir.
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2026	15.500.000	6.500.000	4.000.000	3.995.040	% 99,9	Proje 2025 Sözleşme oranı doğrultusunda ödeme yapılmış olup 2026 Mali yılında tamamlanacaktır.
2017K10-3827- 20858	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Arttırımı	2017-2026	15.500.000	6.500.000	4.000.000	3.995.040	% 99,9	
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2027	3.012.837.000	890.190.000	1.077.000.000	1.077.000.000	% 100,0	2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında, 2025 yılı içerisinde harcanmak üzere Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) için 592.000.000,00.-TL, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 250.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, 2025 Yılı Yatırım Programına ilave ödenek eklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif sunulmuştur. “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği” işi için Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2025 yılı için uygun görülen 800.000.000,00.-TL (KDV Dahil) tutarındaki ilave ödeneğin dağılımı; -100.000.000,00.-TL’si Bakanlığımız Genel Bütçe Ödeneği, -385.000.000,00.-TL’si Bakanlığımız Döner Sermaye Ödeneği, -315.000.000,00.-TL’si Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı katkısı olmak üzere Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA) üzerinden onaylanmış bu kapsamda Ek Protokol-6 tanzim edilmiştir. Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 2025 yılı içerisinde toplam 1.077.000.000,00.-TL ödenek aktarılmış; 2025 yılına ait 6, 7, 8 ve 9 numaralı hakedişler ödenmiş olup iş devam etmektedir.
	Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)		1.193.737.000	271.090.000	350.000.000	350.000.000	% 100,0	
	Döner Sermaye Ödeneği		1.819.100.000	619.100.000	727.000.000	727.000.000	% 100,0	
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı		1.285.000.000	485.000.000	565.000.000	522.885.504	% 92,5	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	8.500.000	2.670.000	3.700.000	2.735.280	% 73,9	Proje kapsamında 2025 yılına ait tüm hakedişler yapılmış olup, proje devam etmektedir.
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	6.275.000	1.600.000	2.600.000	2.113.344	% 81,3	Proje kapsamında 2025 yılına ait tüm hakedişler yapılmış olup, proje devam etmektedir.
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme (Çevre Sektörü)	2024-2027	33.300.000	0	9.000.000	7.987.453	% 88,7	Proje kapsamında 2025 yılına ait tüm hakedişler yapılmış olup, proje devam etmektedir.
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2026	10.500.000	1.500.000	4.000.000	3.857.438	% 96,4	Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa İlleri Anıt Ağaç Rehabilitasyonu hizmet alım işi 1. Hakediş ödemesi 08.10.2025 tarihinde 3.248.348,88 TL yapılmıştır.
2025K10-246738	Derin Su Sert Mercanları Biyoçeşitlik Tespiti (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2025	2.700.000		2.700.000	2.700.000	% 100,0	Proje tamamlanmış ve tüm hakedişler ödenmiştir.
2025K10-246740	Metruk Tuzlası Sulakalan Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2025	15.000.000		15.000.000	0	% 0,0	Yıl içerisinde İlgili İdaresi ile mali katkı protokolü imzalanamadığından ödenek kullanılamamıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246685	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	22.858.000		15.858.000	14.424.970	% 91,0	
2025K10-246685-246686	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	600.000	% 60,0	Projenin 29.05.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 30.05.2025 tarihinde işe başlanılmıştır. Proje kapsamında birinci hak ediş (250.000,00 TL + KDV) ve ikinci hak ediş (250.000,00 TL + KDV) hakedişler yapılmış olup, plandaki takvime göre iş süreçleri tamamlanmıştır.
2025K10-246685-246687	Fethiye-Göcek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	955.800	% 95,6	Projenin 08.05.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 09.05.2025 tarihinde işe başlanılmıştır. Proje kapsamında tüm hakedişler (1. hakediş (%50) 398.250,00 TL + KDV, 2. ve son hakediş (%50) 398.250,00 TL + KDV) yapılmış olup, plandaki takvime göre iş süreçleri tamamlanmıştır.
2025K10-246685-246688	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	955.200	% 95,5	12.05.2025 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 13.05.2025 tarihinde işe başlanmıştır. Ön Raporun kabulü ile birlikte %50' si (402.186,96 TL) Sonuç Raporunun kabulü ile birlikte %50' si (402.186,96 TL) ödenmiş olup; Projenin % 100'ü tamamlanmıştır.
2025K10-246685-246689	Belek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.000.000		1.000.000	936.000	% 93,6	Projenin 20.05.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 21.05.2025 tarihinde işe başlanılmıştır. Proje kapsamında tüm hakedişler (1. hakediş (%50) 390.000,00 TL + KDV, 2. ve son hakediş (%50) 390.000,00 TL + KDV) yapılmış olup, plandaki takvime göre iş süreçleri tamamlanmıştır.
2025K10-246685-246690	Göksu Deltası ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2025-2025	1.500.000		1.500.000	1.482.000	% 98,8	06.08.2025 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 07.08.2025 tarihinde de işe başlanmış olup; Ön Raporun kabulü ile birlikte %50' si (623.996,10 TL) ve Sonuç Raporunun kabulü ile birlikte %50' si (623.996,10 TL) ödenmiş olup; Projenin %100'ü tamamlanmıştır.
2025K10-246685-246744	Kum Zambağı Koruma ve İzleme	2025-2025	3.500.000		3.500.000	3.120.000	% 89,1	Projenin 22.07.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 23.07.2025 tarihinde işe başlanılmıştır. Proje kapsamında birinci hakedişte (1.300.000,00 TL) ve ikinci hak edişte ise (1.300.000,00TL.) ödemeler yapılmış olup, plandaki takvime göre iş süreçleri tamamlanmıştır.
2025K10-246685-246745	Göcek Semenderi Koruma ve İzleme	2025-2025	2.000.000		2.000.000	1.980.000	% 99,0	Projenin 14.07.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 15.07.2025 tarihinde işe başlanılmıştır. Proje kapsamında 1. hakedişte (825.000,00 TL+KDV) ve 2. hakedişte (825.000,00 TL+KDV) ödemeler yapılmış olup, plandaki takvime göre iş süreçleri tamamlanmıştır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246685- 246746	Datça Hurması Koruma ve İzleme	2025-2026	4.000.000		1.500.000	1.248.000	% 83,2	Projenin 19.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 20.06.2025 tarihinde işe başlanmıştır. Proje kapsamında 1. hakediş ödemesi KDV hariç 1.040.000,00 TL (KDV dahil 1.248.000,00) şeklindedir. Proje 2026 yılında da plandaki takvime göre devam edecektir.
2025K10-246685- 246747	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2025-2026	3.500.000		1.500.000	1.290.370	% 86,0	Projenin 02.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 03.06.2025 tarihinde iş başlanmıştır. 1.Ara Raporun kabulü ile birlikte % 40'ı (1.081.622,37 TL) ödenmiştir. Proje 2026 yılında da plandaki takvime göre devam edecektir.
2025K10-246685- 246752	Karakulak Popülasyonlarının İzlenmesi ve Araştırılması	2025-2026	4.358.000		1.858.000	1.857.600	% 100,0	Projenin 19.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 20.06.2025 tarihinde işe başlanmıştır. Proje kapsamında 1. hakediş ödemesi KDV hariç 1.548.000,00 TL (KDV dahil 1.857.600,00) şeklindedir. Proje 2026 yılında da plandaki takvime göre devam edecektir.
2025K10-246753	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Araştırma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2027	17.404.000		4.642.000	3.919.178	% 84,4	
2025K10-246753- 246754	Göksu Deltası ÖÇKB Karasal Alanlarda Biyoçeşitlilik Araştırma	2025-2027	5.904.000		892.000	885.724	% 99,3	Proje Sözleşme Tutarı 4.572.000 TL (KDV dahil) olup, sözleşme tutarının %19,2 lik kısmı ödenmiştir. (Projede % 20 lik fiili gerçekleşme sağlanmıştır.)
2025K10-246753- 246757	Uzungöl ÖÇKB Denizel ve Karasal Alanlarında Biyoçeşitlilik Araştırma	2025-2027	5.000.000		1.000.000	971.180	% 97,1	Proje Sözleşme Tutarı 4.608.000 TL (KDV dahil) olup, sözleşme tutarının %20 lik kısmı ödenmiştir. (Projede % 20 lik fiili gerçekleşme sağlanmıştır.)
2025K10-246753- 246759	Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Alanlarında Biyoçeşitlilik Araştırma	2025-2027	6.500.000		2.750.000	2.062.274	% 75,0	Proje Sözleşme Tutarı 4.728.000 TL (KDV dahil) olup, sözleşme tutarının %42 lik kısmı ödenmiştir. (Projede % 20 lik fiili gerçekleşme sağlanmıştır.)

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246766	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyon (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	5.250.000		3.000.000	3.000.000	% 100,0	1. yıl sonuç raporu alındı ve 2. hakediş ödemesi yapıldı.
2025K10-246767	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2027	24.000.000		6.000.000	3.382.837	% 56,4	Ön Rapor teslim alındı ve 1. hakediş ödemesi yapıldı.
2025K10-246771	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Deniz Çayırı Koruma (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	8.000.000		4.000.000	4.000.000	% 100,0	1. yıl sonuç raporu alındı ve 2. hakediş ödemesi yapıldı.
2025K10-246776	Erdek Körfezi Pina Katılımı ve Büyüme Tespiti (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	9.000.000		4.500.000	4.500.000	% 100,0	1. yıl sonuç raporu alındı ve 2. hakediş ödemesi yapıldı.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği							
13 Proje		06 ve 07 TOPLAM	1.647.182.000	373.070.000	486.904.000	441.159.337	% 90,6	
17 Proje		DÖNER SERMAYE	2.849.901.000	836.594.000	1.063.271.000	960.833.289	% 90,4	
		GENEL TOPLAM	4.497.083.000	1.209.664.000	1.550.175.000	1.401.992.626	% 90,4	
1 Proje		Belediye Katkısı	1.285.000.000	485.000.000	565.000.000	522.885.504	% 92,5	
		Kamu laştırma	0	0	0	0		

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2027	8.100.000	5.100.000	850.000	746.400	% 87,8	YERELBİLGİ Sistemi ile 2025 yılı içerisinde 14 adet form toplanmıştır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç olan veriler Sistem ile toplanmaktadır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2026	20.000.000	6.500.000	4.800.000	0	% 0,0	Söz konusu proj ile ilgili olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları beklenmişti. Yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ancak geline nokta Cumhurbaşkanlığının 2024/7 Sayılı ve Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesi yayımlanmış olup yapılacak ihaleler durdurulmuştur.
2025K07-245708	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 637) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2025	7.500.000.000		7.500.000.000	6.500.000.000	% 86,7	** Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından KÖYDES Projesi ödeneği 6.5 Milyar TL olarak revize edilmiştir. KÖYDES Projesi Cumhurbaşkanlığı kararı 15 Mayıs 2025 Tarihinde yayımlanmıştır. Karar ekinde belirtilen ödeneklere göre illerimizden programları istenilmiştir. Gelen programların kontrolleri yapılarak Bakan Oluruna sunulmuştur. 30.06.2025 tarihinde KÖYDES Projesi programlarının Bakan Oluru imzadan çıkmıştır. İllerimize onaylanan programlar gönderilerek iş ve işlemlerine başlamaları istenilmiştir. 51 ilimizden yaptıkları işlere dair aylık izleme raporları Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Yıl sonu itibarıyla illerimizden köy envanterleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	7.528.100.000	11.600.000	5.650.000	746.400	% 13,2	

Dipnot: 231

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K01-246700	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2025-2025	20.500.000		20.500.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
2025K01-246700- 246701	Harita Alımları	2025-2025	250.000		250.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
2025K01-246700- 246702	Plan, Proje Alımları	2025-2025	250.000		250.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
2025K01-246700- 246703	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2025-2025	20.000.000		20.000.000	0	% 0,0	Harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2025-2027			499.000.000	472.790.931	% 94,7	335.000.000,00.-'e başlangıç ödeneği ile yıl içinde eklenen 164.000.000,00.-'e ödenekle birlikte toplam 499.000.000,00.-'e ödeneğin tamamı serbest bırakılmış 472.790.931,00,00.-'e harcama yapılmış olup, 26.209.069,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2025-2027			10.000.000	6.572.088	% 65,7	10.000.000,00.-'e başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 6.572.088,00.-'e harcama yapılmış olup, 3.427.912,00.-'e kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	20.500.000	0	20.500.000	0	% 0,0	
Kamu laştırma			0	0	509.000.000	479.363.019	% 94,2	

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormancılık Sektörü)	2023-2027	52.425.000	8.900.000	16.935.000	16.323.328	% 96,4	Ana Proje olup detaylar aşağıdaki projelerde yer almaktadır.
2023A05-196779-196780	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2026	33.520.000	6.500.000	15.230.000	14.649.328	% 96,2	Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme (UASİS) projesi kapsamında gerçekleşen 2024 yılına ait UASİS Yazılım Bakım Hizmetinin 2. ödemesi için 1.848.611,00 ödenmiştir. 2025 UASİS Yazılımı Bakım Hizmetinin 1. ödemesi için 8.376.000,00 TL hakediş gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı içerisinde üretilen 2023 yılına ait üretilen taslak UASİS haritası üzerinde etiketleme ve düzenleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımı işine 4.424.717 TL hakediş yapılmıştır. Elde edilen editlenmiş veriler ile 2023 yılına ait nihai ulusal arazi örtüsü haritası üretilmiştir. 2026 yılı içerisinde 2024 yılına ait taslak ulusal arazi örtüsü haritası ve 2021-2023 yılları arasındaki değişimi gösteren değişim haritanın üretilmesi hedeflenmektedir.
2023A05-196779-196781	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2027	3.255.000	1.250.000	600.000	594.000	% 99,0	Erozyon Portal Veri Tabanı ve Web Tabanlı Yazılım Güncellemesi Hizmet Alımı İşi tamamlanmıştır. 594.000 TL ödeme yapılmıştır.
2023A05-196779-225368	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	2024-2026	15.650.000	1.150.000	1.105.000	1.080.000	% 97,7	Türkiye'yi Etkileyen Kum ve Toz Fırtınaları (KTF) Kaynak Alanlarının Belirlenmesi ve Nedensellik Analizi Hizmet Alımı İşi kapsamında projenin çalışma planı hazırlanmıştır. Yıllara sari ödeme planı kapsamında 1.080.000 TL ödeme yapılmıştır.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2024-2027	177.200.000	27.200.000	53.065.000	42.058.697	% 79,3	Ana Proje olup detaylar aşağıdaki projelerde yer almaktadır.
2024A05-229765- 229766	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2024-2027	137.200.000	27.200.000	34.560.000	32.981.487	% 95,4	* İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Ankara Ay-Yıldız Karbon Yutak Alanı Oluşturma (Faz-2) Projesi: 19.000 adet ağaç ve çalı fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. 3.229.628 TL ödeme yapılmıştır. * İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Konya İli Selçuklu İlçesi Karbon Yutak Alanı Projesi: 9.400 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 2.947.108 TL ödeme yapılmıştır. * İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Karbon Yutak Alanı Projesi: 3.750 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 1.987.000 TL ödeme yapılmıştır. * İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında İbank Karbon Yutak Alanı Hatıra Ormanı Oluşturulması Projesi 3.400 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 1.040.900 TL ödeme yapılmıştır. * İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Model Karbon Yutak Alanı Projesi: 3.000 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 1.059.210 TL ödeme yapılmıştır. * İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Model Yutak Alanı Uygulama Projesi: 2.690 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 475.000 TL ödeme yapılmıştır. * İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Ankara Ay-Yıldız Karbon Yutak Alanı Oluşturma (Faz-1) Bakım Projesi: 4.000 adet tamamlama fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. 945.600 TL ödeme yapılmıştır. * Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri Çalışması: Türkiye genelindeki yerel bitki örtüsü incelenmiş, kentlerin iklim ve ekolojik özelliklerine uygun doğal bitki türleri belirlenerek peyzaj uygulamalarına yönelik pratik bilgiler içeren rehberler hazırlanmıştır. 2025 yılı itibarıyla kalan beş coğrafi bölgeye ait rehberlerin hazırlanması tamamlanmış olup çalışma için 2.754.120 TL ödeme yapılmıştır. * Evsel Atık Arıtma Çamurunun Toprak ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi Faz-2 faaliyetleri tamamlanmış olup 915.864 TL ödeme yapılmıştır. * Bilecik-Bozüyük Aşağıarmutlu Köyü Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi tamamlanmış olup 643.620 TL ödeme yapılmıştır. * Nevşehir-Gülşehir Eski-Yeni Yaylacık Köyleri Yukarı Havza Sel Kontrol Projesi tamamlanmış olup 917.304 TL ödeme yapılmıştır. * Sivas-Gemerek Yeniçubuk Mah. Yukarı Havza Sel Kontrol Uygulaması tamamlanmış olup 5.358.356 TL ödeme yapılmıştır. * Kastamonu Üniversitesi Karbon Yutak Alan Bakım ve Tamamlama çalışmaları tamamlanmış olup 599.556 TL ödeme yapılmıştır. * Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Karbon Yutak Alan Bakım ve Tamamlama çalışmaları tamamlanmış olup 731.400 TL ödeme yapılmıştır. * Aksaray ili Gülağaç ilçesinde bulunan Demirci 100. Yıl karbon yutak alanında bakım ve tamamlama çalışmaları yapılmış olup fidan bedeli dahil 1.469.660,00 TL ödeme yapılmıştır. * Çankırı ili Orta ilçesinde bulunan Kırşakal karbon yutak alanında bakım ve tamamlama çalışmaları yapılmış olup fidan bedeli dahil 969.298,80 TL ödeme yapılmıştır. * Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde bulunan Baraklı karbon yutak alanında bakım ve tamamlama çalışmaları yapılmış olup fidan bedeli dahil 536.350,00 TL ödeme yapılmıştır.. * Konya ili Karapınar ilçesinde bulunan Hotamış karbon yutak alanı ve Çumra ilçesinde bulunan Adakale karbon yutak alanında bakım ve tamamlama çalışmaları yapılmış olup fidan bedeli dahil 1.718.925,60 TL ödeme yapılmıştır. * Iğdır Üniversitesinde erozyon kontrolü çalışması yapılmış olup 3.165.600,00 TL ödeme yapılmıştır. * Entegre Projeler çatısı altında Çölleşmeye Hassas Alanlarda Arazi Kullanım Performansının Belirlenmesi Projesi; Konya-Şanlıurfa Model Çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2025 yılı içerisinde toprak profilleri alınmış ve toprak örneklerinin laboratuvar analizleri yapılmıştır. 2025 Yılı içerisinde Konya çalışması için 775.730 TL ve Şanlıurfa çalışması için 872.162 TL ödeme yapılmıştır.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765- 248146	Çığ Alanlarının Sağlıklı Ekosisteme Dönüştürülmesi Modeli	2025-2026	40.000.000		18.505.000	9.077.210	% 49,1	Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi Çığ Kontrol Projesi tamamlanmıştır. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi Çığ Kontrol Uygulaması Faz-1 1. kısım çalışmaları tamamlanmıştır. İklim Değişikliğine Uyumlu, Potansiyel Çığ Alanlarında Dayanıklı Bitki Türlerinin Tespiti Araştırma Projesi ara raporu tamamlanmış olup toplamda 9.077.210 TL harcama gerçekleşmiştir.
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi (Ormancılık Sektörü)	2024-2027	63.923.000	2.203.000	21.934.000	8.641.629	% 39,4	Proje Başlangıç Çalıştayı 15 Nisan 2025'te Rize'de gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama alanlarının belirlenmesi, heyelan duyarlılık haritasının oluşturulması ve kurumlar arası bilgilendirme görüşmeleri için Rize'ye teknik bir arazi çalışması yapılmıştır. 16 Aralık 2025 tarihinde Rize'de, Sürdürülebilir Çay Kriterlerinin Belirlenmesi Çalıştayı düzenlenmiştir. 22-23 Aralık 2025 tarihlerinde Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Ekosistem Hizmetleri Haritalaması Çalıştayı düzenlenmiştir. Rize'de MEB Rize İl Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde 9 okulda toplam 610 öğrencinin katılımıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	229.625.000	36.100.000	70.000.000	58.382.025	% 83,4	
1 Proje		UNDP HİBESİ	63.923.000	2.203.000	21.934.000	8.641.629	% 39,4	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
2017K09-3813- 152319	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2025	1.500.000	500.000	1.000.000	0	% 0,0	Geçmiş yıllarda inşaa edilen İl Müdürlükleri binalarında kesin hesap ödemesi gerektiğinde kullanılmaktadır. 2025 yılında ödeme talebi gelmemiştir.
2017K09-3813- 226070	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (**.Döner Sermaye)	2024-2025	63.391.000	19.629.000	43.762.000	43.762.000	% 100,0	İhalesi Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 12.06.2024 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 43.850.000 TL (KDV dahil 52.620.000 TL) üzerinden sözleşmesi 24.07.2024 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı) (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	331.700.000	0	190.938.000	169.779.102	% 88,9	İhalesi Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 14.01.2025 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 214.621.000 TL (KDV dahil 257.545.200 TL) üzerinden sözleşmesi 17.03.2025 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNER SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K09-246691	Muhtelif İşler (Şehirleşme Sektörü)	2025-2025	19.605.000		19.605.000	15.293.888	% 78,0	
2025K09-246691- 246692	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2025-2025	9.605.000		9.605.000	7.899.875	% 82,2	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2025K09-246691- 246693	Hizmet Binası Onarımı	2025-2025	10.000.000		10.000.000	7.394.013	% 73,9	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2025K09-246691- 248158	Taşıt Alımı (HİBE)	2025-2025	1.178.000		1.178.000	1.178.000	% 100,0	Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yurtiçi hibe olarak 2 adet binek otomobil (T02) tipi taşıt edinilmiştir.
2025G00-251235	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2025-2025	3.900.000		3.900.000	1.954.248	% 50,1	
2025G00-251235- 251239	Taşra Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	2025-2025	3.900.000		3.900.000	1.954.248	% 50,1	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	23.505.000	0	23.505.000	17.248.136	% 73,4	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	396.591.000	20.129.000	235.700.000	213.541.102	% 90,6	
		GENEL TOPLAM	420.096.000	20.129.000	259.205.000	230.789.238	% 89,0	
1 Proje		HİBE	1.178.000	0	1.178.000	1.178.000	% 100,0	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2025 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2025 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2025 31.12.2025 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadag 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (Yapı İşleri Genel Müd. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2026	233.280.000	0	183.280.000	0	% 0,0	
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (Yapı İşleri Genel Müd. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2024-2026	284.676.000	2.000.000	120.000.000	0	% 0,0	
2025G00-251235	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2025-2025	100.000		100.000	0	% 0,0	
2025G00-251235- 251237	Merkez Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	2025-2025	100.000		100.000	0	% 0,0	
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	100.000	0	100.000	0	% 0,0	
Proje		DÖNER SERMAYE						
		GENEL TOPLAM	100.000	0	100.000	0	% 0,0	

Not-1: "GES Kurulumu" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-2: "Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.
