

**STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI**

**2026 Yılı
Bütçe ve Yatırım Programı
1. Dönem Gerçekleşme Raporu
(01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 Dönemi)**






BAKANLIĞIMIZ 2026 YILI BÜTÇESİ

01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

KOD	AÇIKLAMA	2026 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2026 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2026 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
01	PERSONEL GİDERLERİ	20.996.658.000,00	21.619.984.233,01	5.746.120.558,02	% 26,6
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.715.924.000,00	2.838.214.105,17	746.797.234,52	% 26,3
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.157.166.000,00	2.034.918.337,84	358.613.168,79	% 17,6
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	961.770.000,00	1.837.943.853,29	351.926.374,09	% 19,1
	Çevre Katkı Payı Ödeneği	195.396.000,00	196.974.484,55	6.686.794,70	% 3,4
05	CARİ TRANSFERLER	114.656.154.000,00	14.656.154.000,00	256.781.976,46	% 1,8
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	111.119.150.000,00	11.119.150.000,00	0,00	% 0,0
	AAT %50 Enerji Desteği Ödeneği	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	% 0,0
	Türkiye Çevre Ajansı Ödeneği	100.000.000,00	100.000.000,00	60.304.000,00	% 60,3
	Şehit Aileleri Faizsiz Konut Kredisi-TOKİ ödemesi	609.369.000,00	609.369.000,00	180.198.000,00	% 29,6
	Yurt Dışı Kuruluşlar Üyelik Aidatları Ödeneği	247.249.000,00	247.249.000,00	0,00	% 0,0
	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	76.364.000,00	76.364.000,00	14.620.476,46	% 19,1
	İskan Uygulamaları Ödeneği	2.395.000,00	2.395.000,00	32.500,00	% 1,4
	Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler	1.627.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	% 100,0
	Deprem Bölgesi İLBANK Projeleri KDV Ödemeleri	0,00	0,00	0,00	% 0,0
	Ahıska Türklerinin İskanı-TOKİ Ödemesi	0,00	0,00	0,00	% 0,0
06	SERMAYE GİDERLERİ	31.149.626.000,00	58.062.350.950,18	25.838.200.176,48	% 44,5
	Bakanlık Yatırım Programı	30.655.626.000,00	30.749.126.881,51	1.699.026.611,35	% 5,5
	Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği	494.000.000,00	494.000.000,00	321.315.724,42	% 65,0
	Kahramanmaraş Depremi Kapsamında Ek Ödenek	0,00	26.012.297.349,42	23.717.491.121,04	% 91,2
	Kamulaştırma İşlemleri İlam Ödenekleri-Hukuk	0,00	50.000.000,00	1.754.669,23	% 3,5
	Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği	0,00	756.926.719,25	98.612.050,44	% 13,0
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	104.185.563.000,00	105.988.334.306,01	1.594.470.945,78	% 1,5
	Bakanlık Yatırım Programı	1.012.180.000,00	1.012.180.000,00	362.750.073,81	% 35,8
	Sosyal Konut Finansmanı-TOKİ ödemesi	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Altyapı Projeleri Destek	2.394.588.000,00	2.394.588.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Döner Sermaye	0,00	1.150.000.000,01	806.636.427,97	% 70,1
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Hava Kalitesi Programı	515.390.000,00	515.390.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-Sıfır Atık Destek Programı	263.405.000,00	263.405.000,00	0,00	% 0,0
	Çevre Katkı Payı Ödeneği-IPA2 Katkı Ödemeleri	0,00	0,00	0,00	% 0,0
	KKTC Yatırımları-TOKİ ödemesi	0,00	652.771.306,00	425.084.444,00	% 65,1
	Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ödeneği	0,00	0,00	0,00	% 0,0
08	BORÇ VERME	150.000.000,00	150.000.000,00	22.270.000,00	% 14,8
GENEL TOPLAM		275.011.091.000,00	205.349.955.932,21	34.563.254.060,05	% 16,8



BAKANLIĞIMIZ 2026 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

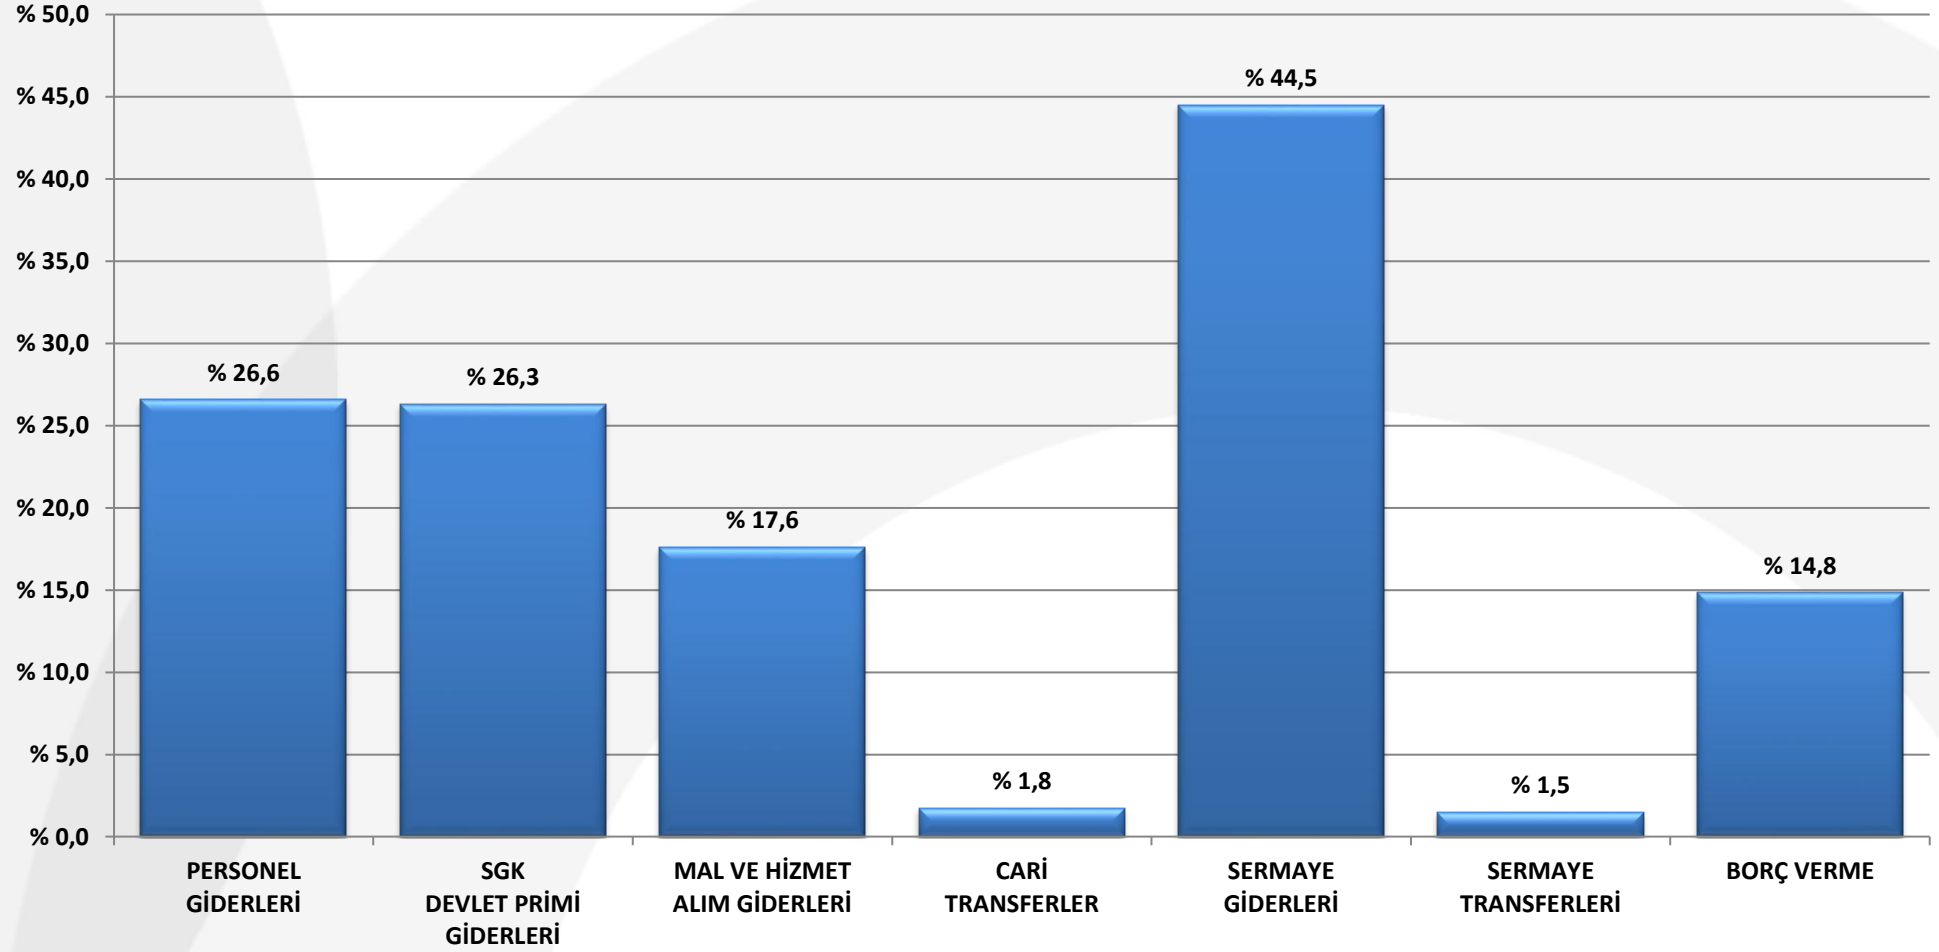




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2026 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

BİRİM ADI	PROJE SAYISI	REVİZE PROJE TUTARI	2026 Yatırım		Gerçekleşme ORANI
			REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2026 İtibariyle HARCAMA	
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7	85.450.000,00	53.198.000,00	0,00	% 0,0
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	17	3.371.471.000,00	1.049.656.000,00	125.240.120,38	% 11,9
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	7	1.636.028.000,00	293.500.000,00	1.417.200,00	% 0,5
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	22	144.466.849.000,00	30.618.875.000,00	1.715.547.824,00	% 5,6
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	3	37.674.000,00	18.000.000,00	0,00	% 0,0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	11	1.074.427.000,00	680.500.000,00	0,00	% 0,0
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	2	6.853.396.000,00	26.400.000,00	0,00	% 0,0
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	30	8.433.718.000,00	1.491.243.000,00	248.440.215,00	% 16,7
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	3	9.912.304.000,00	7.100.000,00	0,00	% 0,0
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	1	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	% 0,0
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	6	414.070.000,00	175.000.000,00	0,00	% 0,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri	4	426.491.000,00	110.900.000,00	24.998.516,00	% 22,5
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	4	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	% 0,0
GENEL TOPLAM	111	176.759.428.000,00	34.571.922.000,00	2.115.643.875,38	% 6,1
GENEL BÜTÇE KAYNAĞI KULLANILAN PROJELER	54	169.349.296.000,00	31.831.306.000,00	2.059.048.170,38	% 6,5
DÖNER SERMAYE KAYNAĞI KULLANILAN PROJER	57	7.410.132.000,00	2.740.616.000,00	56.595.705,00	% 2,1
"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği	4 adet		494.000.000,00	321.315.724,42	% 65,0



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA 2026 YILI YATIRIM PROJELERİ 01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

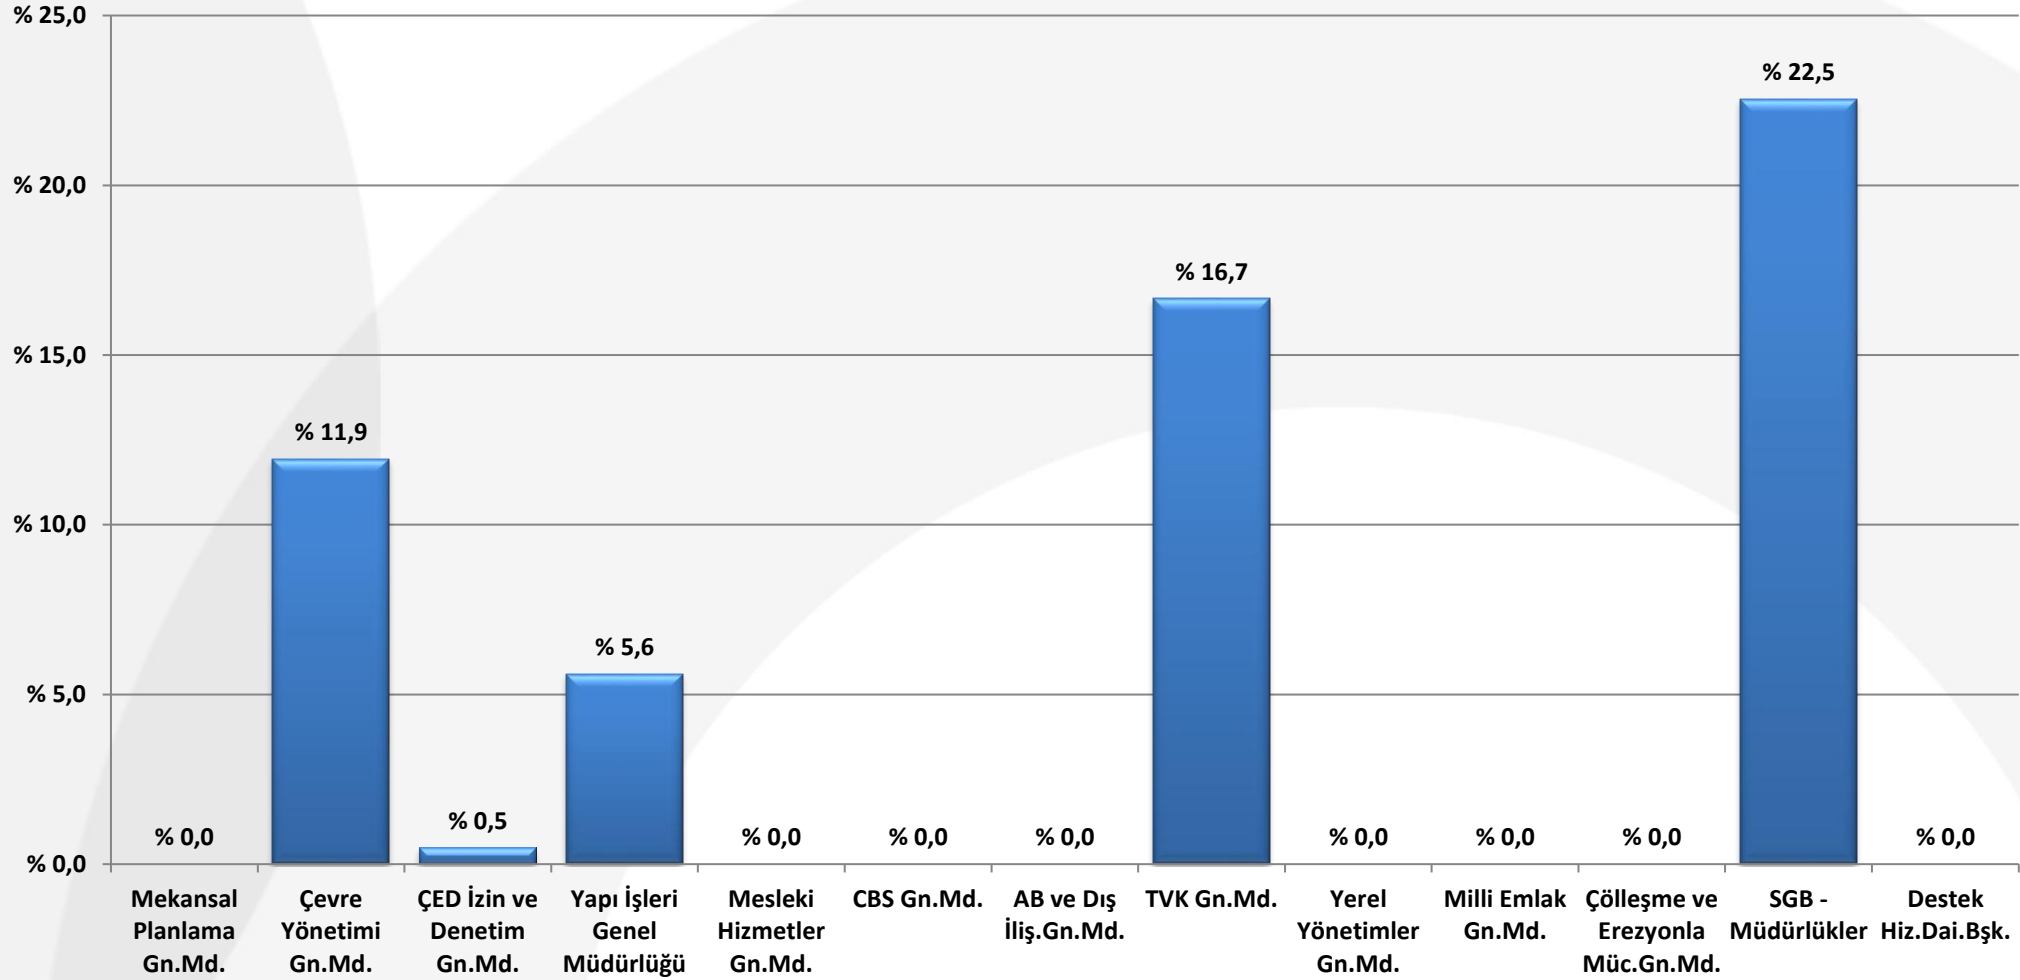




HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2026 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

Harcama Birimi	2026 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2026 REVİZE ÖDENEĞİ	31.03.2026 İtibariyle HARCAMA	Gerçekleşme ORANI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü	308.071.000,00	308.313.400,00	81.024.668,76	% 26,3
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	6.785.220.000,00	7.922.658.884,56	1.076.252.385,93	% 13,6
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	891.956.000,00	895.940.830,50	171.949.025,64	% 19,2
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	31.525.062.000,00	58.259.995.124,16	26.018.338.963,86	% 44,7
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	290.080.000,00	290.715.400,00	83.239.497,84	% 28,6
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	419.319.000,00	451.822.000,00	94.572.863,99	% 20,9
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	432.756.000,00	433.204.600,00	42.492.076,50	% 9,8
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	782.879.000,00	818.225.546,80	320.716.675,06	% 39,2
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü	112.615.000,00	112.615.000,00	32.134.723,88	% 28,5
Milli Emlak Genel Müdürlüğü	764.953.000,00	764.953.000,00	418.343.874,85	% 54,7
Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	246.610.000,00	247.519.200,00	49.804.739,39	% 20,1
Personel Genel Müdürlüğü	119.957.000,00	120.228.000,00	40.479.710,02	% 33,7
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	151.077.000,00	981.348.400,00	187.258.588,24	% 19,1
Özel Kalem Müdürlüğü	170.702.000,00	175.473.000,00	73.168.313,50	% 41,7
Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı	0,00	4.500.000,00	0,00	% 0,0
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	1.222.150.000,00	1.291.634.064,19	238.286.046,80	% 18,4
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	36.084.000,00	36.688.400,00	9.219.355,29	% 25,1
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	214.096.000,00	214.700.400,00	56.187.657,36	% 26,2
Strateji Geliştirme Başkanlığı	211.824.678.000,00	111.825.852.400,00	208.903.756,19	% 0,2
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	16.155.000,00	17.857.400,00	5.419.288,13	% 30,3
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı	98.027.000,00	98.027.000,00	27.171.401,60	% 27,7
İl Müdürlükleri	18.540.700.000,00	20.019.100.282,00	5.317.145.414,92	% 26,6
Yurtdışı Teşkilatı	57.944.000,00	58.583.600,00	11.145.032,30	% 19,0
TOPLAM	275.011.091.000,00	205.349.955.932,21	34.563.254.060,05	% 16,8



HARCAMA BİRİMİ BAZINDA BAKANLIĞIMIZ 2026 YILI BÜTÇESİ 01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

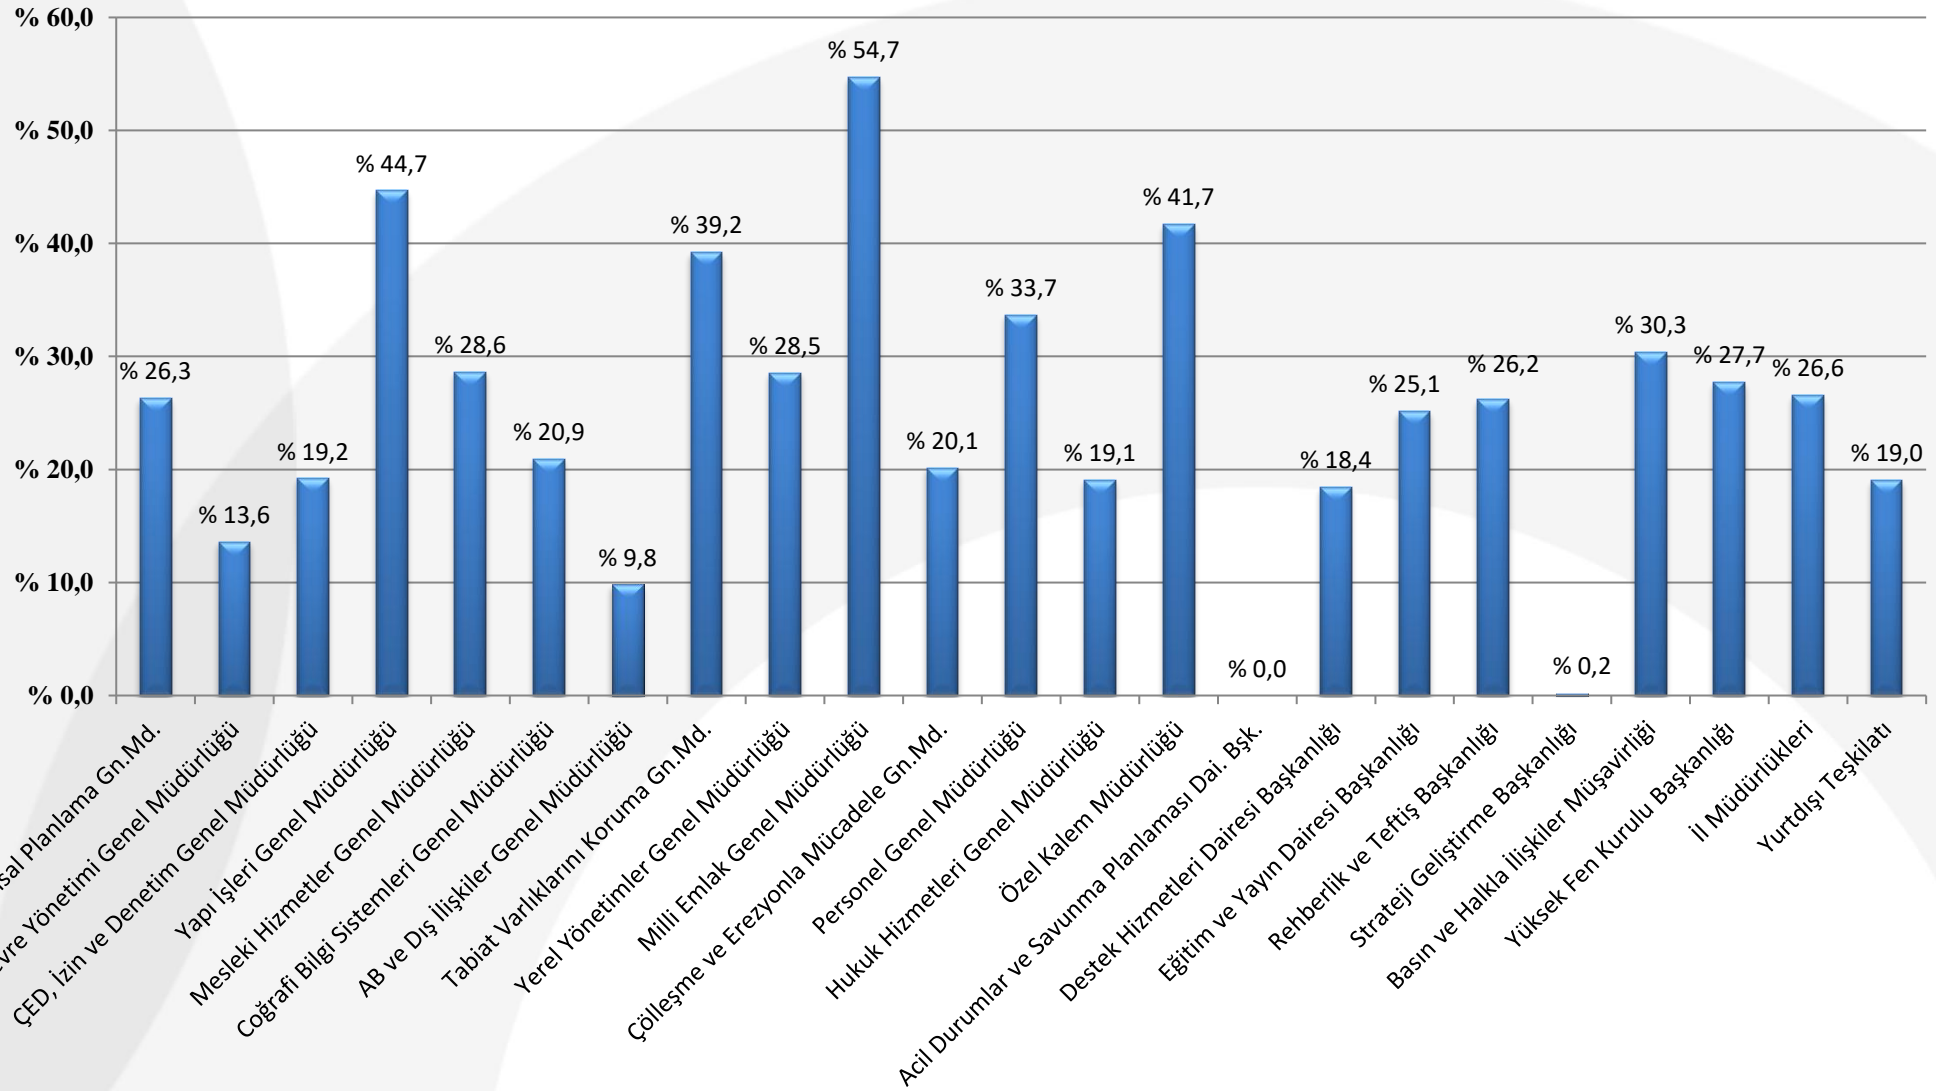



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

**Harcama Birimi Bazında
2026 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri
01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026**

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K09-181929	Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonları (Şehirleşme Sektörü)	2022-2026	19.200.000	7.200.000	12.000.000	0	% 0,00	<p>2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan "Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi-Etap 1" projesi ile 3 yerleşim alanında yer alan aktif fay zonları 1/1.000 ölçekte haritalanacak, fay sakınım zonları belirlenerek Yer Bilimsel Etüt Sistemi (YERBİS) üzerinden ilgili kurum/kuruluşların kullanımına açılacaktır.</p> <p>2023 yılında projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış ve yaklaşık maliyet belirlenebilmesi için müellif firmalardan teklif mektupları alınarak ihale süreci başlatılmış ancak bütçe yetersizliği nedeniyle ihale süreci tamamlanamamıştır.</p> <p>Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan bütçe talebinde bulunulmuştur. Arttırılan bütçe ile yeniden teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci başlatılmıştır, ancak bu süreçte de tasarruf tedbirleri nedeniyle proje bütçesinde tekrar kesintiler meydana gelmiştir.</p> <p>Düzenlenen proje bütçesine uygun olacak şekilde projenin Teknik Şartnamesi tekrar revize edilerek ihale süreci başlatılmış, ancak ön yeterlilik başvurusu yapan istekli sayısı yetersizliği nedeniyle ihale gerçekleştirilememiştir. Projenin yapılabilmesi için 2024 yılı Eylül ayı içerisinde tekrar piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet belirlenmiş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan belirlenen yaklaşık maliyet doğrultusunda proje bütçesinin tekrar revize edilmesi talebinde bulunulmuştur.</p> <p>Yeniden arttırılan bütçe ile tekrar teknik şartname revize edilmiş ve yaklaşık maliyet alınarak ihale süreci tamamlanmış ve yüklenici ile 20.03.2025 tarihinde sözleşme imzalanarak çalışmalar başlatılmıştır.</p> <p>Proje kapsamında, Çorum (Osmançık-Kamil), Burdur (Merkez-Hacılar) ve Bingöl (Merkez-İlçalar) illerinde seçilen 3 farklı bölgeye ait ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılmış, mevcut uygulamalar ve ülkemizdeki uygulamalar incelenmiş, çalışma alanında yer alan aktif fay/fay zonunda uzaktan algılama yöntemleri, arazi çalışmaları, drone uçuşları ve/veya uzaktan algılama görüntüleri ile 1/1.000 ölçekli aktif fay haritalama çalışmaları gerçekleştirilmiş, paleosismoloji çalışmaları ve C14/OSL yöntemi ile yaşlandırma çalışmaları tamamlanmış, aktif fay zonuna yönelik jeofizik yöntemlerle ölçümler tamamlanmış ve 3 bölge için hazırlanacak İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları kapsamında gerekli tüm jeolojik-jeofizik ve jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Ayrıca, tüm bu veriler ışığında proje sonuçlarının tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı, 16-17 Şubat 2026 tarihleri arasında hem çevrim içi (online) hem de yüzyüze olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Proje Sonuç Çalıştayı" başarı ile tamamlanmıştır.</p>
2023K09-209859	Örnek İmar Uygulamaları (Şehirleşme Sektörü)	2023-2026	4.500.000	2.500.000	2.000.000	0	% 0,00	Mahkeme kararı ile İmar planı ve parselasyon planlarının iptal edilmesi nedeniyle bu dönemde projede ilerleme kaydedilememiştir.
2023K09-209859-209860	4. Etap İller Örnek İmar Uygulamaları	2023-2026	4.500.000	2.500.000	2.000.000	0	% 0,00	

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K09-234281	Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması (**Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	8.500.000	3.000.000	5.500.000	0	% 0,00	Sözleşme bedeli 7.083.000,00 TL olan ve 4 etaptan oluşan "İzmir İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama İşi" kapsamında "I. Etap: Hazırlık Aşaması" için 01.01.2025-31.12.2025 arasında 2.691.540,00 TL (KDV dahil 3.229.848,00 TL) tutarında 1 nolu hakedişi yapılmış olup, projenin II. Etap: Araştırma Raporu'nun Hazırlanması" çalışmaları devam etmektedir.
2024K09-234285	Çevre Düzeni Planı (**Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	5.250.000	552.000	4.698.000	0	% 0,00	Sözleşme bedeli 4.600.000,00 TL olan ve 4 etapten oluşan "Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı" kapsamında "I. Etap: Hazırlık Aşaması" için 1 nolu hakediş kapsamında 460.000,00 TL (KDV dahil 552.000,00 TL), "II. Etap: Araştırma Raporunun Hazırlanması" için 2 nolu hakediş kapsamında 1.380.000,00 TL (KDV dahil 1.656.000,00 TL) olmak üzere 01.01.2025-31.12.2025 arasında toplam 1.840.000,00 TL (KDV dahil 2.208.000 TL) ödeme yapılmış olup, işin "III. Etap: Alternatif Taslak Planların Hazırlanması" çalışmaları devam etmektedir.
2025K09-249151	Kentleri İzleme Çerçevesi (**Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2025-2026	8.000.000	7.500.000	500.000	0	% 0,00	"Türkiye'de Kentleri İzleme Çerçevesinin Pilot Bir Şehirde Uygulanması" Projesi 2025 yılında tamamlanmış olup ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 2026 yılında ilave şehirlerde hazırlanmasına ilişkin teknik şartname hazırlıkları ve şehir seçimi çalışmaları sürdürülmektedir.

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K09-249153	Çevre Düzeni Planları Veri Toplama, Güncelleme, Sayısallaştırma, Uyumlaştırma ve Ortak Veri Tabanına Alınması (*Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2025-2027	12.000.000	0	10.000.000	0	% 0,00	6 adet çevre düzeni planının (Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri) 1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP, Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli ÇDP, Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP, Bilecik İli 1/100.000 Ölçekli ÇDP, Bolu İli 1/100.000 Ölçekli ÇDP, Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli ÇDP) "Güncel Mevzuata Uyumlaştırılarak Sayısallaştırılması ve Mekansal Veri Tabanlarının Birleştirilmesi İçin Yöntem Geliştirilmesi" İşinin Teknik Şartnamesi çerçevesinde 2. Etap çalışmaları (Araştırma ve Geliştirme) Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
2026K09-273298	Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Geliştirme ve Arşivin YERBİS Uygulamasına Aktarımı (**Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2026-2027	28.000.000		18.500.000	0	% 0,00	İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme ve Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporlarına 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren aktif olarak kullanılmakta olan Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması tüm verilere hızlı ve güvenilir bir sistemden erişilebilir, iş süreçlerinin takibini ve harita servisleri ile web ortamında gerçek ve tüzel kişilerin veri girişi, indirme, yükleme ve raporlama yapılabilmesini,, proje inceleme ve kontrol ve onay sürecinin e-imza yoluyla YERBİS üzerinden yürütülebilmesini ve paydaş kurumlara dağıtım işlemlerinin sistem üzerinden yapabildiğini sağlayan bir uygulamadır. 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında yer alan "Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi Geliştirme ve Arşivin YERBİS Uygulamasına Aktarımı" projesi kapsamında, YERBİS yazılımının geliştirme, idame, bakım ve destek çalışmaları ve 2011-2018 yılları arasında basılı matbu raporlar şeklinde hazırlanan etüt raporlarının YERBİS uygulamasına aktarılması çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir. Projeye ilişkin teknik şartname hazırlıkları devam etmektedir.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	23.700.000	9.700.000	14.000.000	0	% 0,00	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	61.750.000	11.052.000	39.198.000	0	% 0,00	
GENEL TOPLAM			85.450.000	20.752.000	53.198.000	0	% 0,00	

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K06-226052	AAT Ulusal Tasarım Kriterleri Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	25.000.000	15.000.000	10.000.000	0	% 0,00	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 16.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 20.226.852 TL (KDV Hariç) ve projenin toplam süresi 764 (yedi yüz altmış dört) takvim günüdür. 19.11.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında toplam 22 adet AAT için saha çalışmalarının yapılması planlanmış olup, 17 adet AAT'ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu 17 adet AAT'den 5'ine Bakanlığımız personeli eşlik etmiştir. 2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla toplam 15 tesisden atıksu deneysel karakterizasyon çalışmaları için alınan numunelerde analizleme çalışmaları tamamlanmıştır. 2 ara rapor sunulmuş (1. Ara Rapor 25 Haziran 2025, 2. Ara Rapor 14.01.2026 tarihinde) ve toplam 15.000.000 TL (KDV dahil) ödeme yapılmıştır. Projenin konusuyla ilgili ülkemizde ve diğer ülkelerde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve mevzuat karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Mayıs 2025 tarihinde AAT tasarım eğitimi ve 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde AAT tasarımı ve simülasyon programı kullanımına ilişkin eğitim Bakanlık binasında gerçekleştirilmiştir. Simülasyon programının kurulumu ve kullanımına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Nisan ayında gerçekleştirilecek saha ziyaretleri, Mayıs ayında gerçekleştirilecek uluslararası konferansa katılım ve yine Mayıs ayında gerçekleştirilecek çalıştay için koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir. Proje iş paketleri doğrultusunda yapılması gereken çalışmalara devam edilmektedir.
2024K06-226053	Endüstriyel Atıksu Profili Belirleme (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2024-2026	50.000.000	39.000.000	11.000.000	0	% 0,00	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 15.10.2024 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 39.405.901 TL + KDV olup; 15.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje başladığı tarihten itibaren, endüstriyel atıksu yönetimine ilişkin literatür araştırmaları, uluslararası mevzuatta atıksuda izlenen kirletici parametrelerin ve deşarj standartlarının incelenmesi, sektörel eğitimler, saha ziyaretleri, anket çalışmaları ve diğer sektörel faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Planlanan 60 saha ziyaretinin 42'si tamamlanmış, 27 adet sektörel eğitim ile AB mevzuatına yönelik bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Atıksu numune alma ve analiz çalışmaları kapsamında belirlenen pilot tesislerde atıksu örnekleme çalışmaları başlamıştır. Proje kapsamında; endüstriyel atıksu yönetimine ilişkin uluslararası uygulamaların yerinde incelenmesi ve yasal düzenlemelere yönelik karşılıklı bilgi alış-verişinin sağlanması amacıyla, 21-23.10.2025 tarihleri arasında Avusturya'ya 30.03-01.04.2026 tarihleri arasında ise Almanya'ya üçer günlük çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.23-25.12.2025 tarihleri arasında İl Müdürlüklerine yönelik "Endüstriyel Atıksu Yönetimi Eğitimi" düzenlenmiştir. Sektörel Çalıştaylar, Sektörel Klavuzlar ve Endüstriyel Atıksu Yönetim Planlarının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K06-247883	OSB Artırılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı (**.Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2025-2027	24.000.000	2.000.000	16.000.000	0	% 0,00	Yatırım Programına kabul edilen söz konusu Proje 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi (f) bendi uyarınca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile 14.11.2025 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. Proje tutarı toplam 24.000.000 TL'ye olup; 2027 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında; Organize Sanayi Bölgeleri(OSB)'lerinden çıkan atıksuların özellikleri, miktarları ve su kullanımları incelenerek artırılmış atıksuların yeniden kullanım olanakları ve kalitesinin belirlenmesi, OSB'ler için sürdürülebilir atıksu yönetimi modelleri geliştirilmesi, pilot OSB'lerde fizibilite ve ön fizibilite raporlarının hazırlanması, artırılmış atıksuların yeniden kullanımı için eylem planı çalışmaları devam etmektedir. OSB-SUYAP isimli bir yazılım web sayfası oluşturulmuş, OSB ve OSB içerisinde yer alan firmalara yönelik anket çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Atıksu Arıtma Tesisi olan 135 OSB'den 41 tanesinde saha ziyareti yapılmıştır. 27-29.04.2026 tarihleri arasında 3 günlük OSB SUYAP Projesi Çalıştayı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
2017K08-28036	Katı Atık Programı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2028	1.751.000.000	600.750.000	250.000.000	2.359.267	% 0,94	KAP, büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin/birliklerin, entegre atık yönetimi tesisi, II. sınıf düzenli depolama tesisi, mevcut II. sınıf düzenli depolama tesisine ilave lot, ön işlem tesisi (mekanik ayırma veya biyokurutma veya atıktan türetilmiş yakıt tesisi) ve aktarma istasyonu yapım işleri, uygulama projelerinin hazırlanması, uygun görülmesi/onaylanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır. 2025 yılı yatırım programında 196 milyon TL ödenek belirlenmiş olup 192.126.369 TL ödenek kullanımı gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı ödeneği 250.000.000 TL olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uygun görülen proje detay listesi çerçevesinde proje hazırlama ve yapım işleri yürütülmektedir.
2023K08-207616	Atık Yönetimi Maliyet Belirleme (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2023-2027	8.000.000	0	2.000.000		% 0,00	Teknik şartname çalışmaları tamamlanmıştır. İhale süreci başlatılacaktır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K08-263549	Arsuz Katı Atık Yönetimi Tesisi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2025-2027	900.000.000	23.532.000	650.000.000	122.880.853	% 18,90	
	Genel Bütçe Ödeneği		600.000.000	23.532.000	350.000.000	122.880.853	% 35,11	Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının belediye atık yönetimi yatırımlarını en uygun ve ekonomik şekilde yapması, atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla önerilen proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Proje ile Hatay İlinin belediye atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesi, entegre atık yönetim tesislerinin (ön işlem tesisleri ve düzenli depolama tesisleri) faaliyete geçirilmesi ve atık yönetim tesisleri finansman eksikliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir. İnşaat çalışmalarına başlanılmış olup yapım işi, İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 2025 yılı içerisinde başlatılan inşaat çalışması ile 23.532.377 TL ödenek kullanımı sağlanmıştır. 2026 yılı ödeneği gelen hakedişler çerçevesinde İLBANK A.Ş.'ye aktarılmaktadır.
	Döner Sermaye Ödeneği		300.000.000		300.000.000	0	% 0,00	
2018K10-150237	Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) (Çevre Sektörü)	2018-2026	10.450.000	7.950.000	2.500.000	0	% 0,00	EKÖK Sektör Uzmanı Projesi Boğaziçi Üniversitesi ile 17.10.2024 tarihinde imzalanan protokol sonrası 18.10.2024 tarihinde başlamıştır. Proje ile Proje Yönetim Planı Raporu hazırlanmış ve ilk ödemesi gerçekleştirilmiştir. Projede aşağıda sıralanan işlerin tamamlanması hedeflenmiştir: - Proje Başlangıç Toplantısı - Proje Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları - Proje Yönetim Planı Raporu - Sektörel Tebliğlerin Hazırlanması - Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Raporların Usul ve Esaslarının Hazırlanması - Uzmanlığa Yönelik Usul ve Esaslar ile Eğitim ve Rehber Dokümanların Hazırlanması - Sektörel Toplantılar - Final Raporu
2018K10-150237-183734	EKÖK Sektör Uzmanı	2022-2026	10.450.000	7.950.000	2.500.000	0	% 0,00	Proje Kapsamında 22-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Proje Yönetimi ve Değerlendirme ve Sektörel Tebliğ Taslakları hazırlanmasına ilişkin Toplantı gerçekleştirilmiştir. 9-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında sektörel toplantı gerçekleştirildi, toplantıda sektörel tebliğ taslakları ve puanlama üzerinden geçildi. Tebliğ puanlama tabloları ve uzmanlık alt yapısına yönelik usul ve esaslar taslağı hazırlanmıştır. Projede Ekim ayı sonunda "Uzmanlığa Yönelik Usul ve Esaslar ile Eğitim ve Rehber Doküman"lar sunulmuştur. Hazırlanması" için ödeme gerçekleştirilecektir. 21-22 Kasım 2025 tarihinde Antalya'da Tebliğ Puanlamalarına yönelik çalıştay düzenlendi. 2025 yılında 4.800.00 TL ödeme yapılmıştır. Proje kapsamında ek protokol imzalanarak sektör uzmanlığı iletişim ve bilgi paylaşımı amaçlı SYD Hub platformu hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. Raporlara ilişkin Bakanlık ile görüş alışverişi devam etmektedir.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-43862	Hava Emisyonlarının Yönetimi (Çevre Sektörü)	2018-2027	70.000.000	5.700.000	15.000.000	0	% 0,00	
2018K10-43862-247921	Hava Emisyon Yönetim Portalının Geliştirilmesi (HEYGEL) Faz-3	2025-2027	35.000.000	2.850.000	7.500.000	0	% 0,00	Projeye esas hazırlanan teknik şartnameye esas şekilde TURKSAT A.Ş. ile ihale süreci devam etmektedir.
2018K10-43862-247934	3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Faz-2	2025-2027	35.000.000	2.850.000	7.500.000	0	% 0,00	NEFES 3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Faz-II Projesi ihalesi TURKSAT tarafından 3 Kasım 2025 tarihinde yapılmış, 35 Milyon TL (KDV dahil) bedelle tamamlanmış ve sözleşmesi 25 Şubat 2026 tarihinde imzalanmıştır. Açılış toplantısı 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilmiş ve proje çalışmalarına başlanmıştır.
2021K10-161745	Deniz Kirliliği Olaylarında Müdahalenin Planlanması (Çevre Sektörü)	2021-2026	24.564.000	10.564.000	14.000.000	0	% 0,00	Proje, aynı proje adı ve proje numarası altında 2 fazlı olarak yürütülmekte olup, birinci faz tamamlanmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ikinci fazın sistem analizi ve yazılım çalışmaları devam etmektedir.
2023K10-198450	Egzoz Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Modernizasyon (*.*.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2023-2026	29.886.000	16.730.000	13.156.000	0	% 0,00	Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen hususlara uygun olarak; yazılım geliştirme, test ve entegrasyon çalışmaları sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür. 26/04/2026 tarihine kadar 2. İlerleme Raporu, 24/08/2026 tarihine kadar 3. İlerleme Raporu, 12/12/2026 tarihine kadar Sonuç Raporu yüklenici tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza sunulacaktır.
2025K10-247998	Denizcilik Atıkları Uygulamasının Geliştirilmesi, Bakım ve Onarımı (Çevre Sektörü)	2025-2027	35.000.000	0	15.000.000	0	% 0,00	Söz konusu projenin bütçe artışı, 2026 yılı yatırım programında yayımlanmıştır. Projenin başlamasına ilişkin idari ve teknik işlemlere başlanmıştır.
2026K10-272230	Kimyasal Kayıt Sisteminin Ulusal ve Uluslararası Mevzuata Uyumu Kapsamında Güncellenmesi (*.*.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2026-2027	21.000.000		11.000.000	0	% 0,00	Proje ödeneğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne aktarılması amacıyla, Yönetim Hizmetleri ve Finansman Dairesi Başkanlığına 31 Mart 2026 tarihinde, 15220755 sayılı yazı yazılmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K10-272254	İzmir Körfezinin Dijital İkizinin Oluşturulması İzmir Körfezi Bütünleşik Modelleme Sistemi (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2026-2027	40.000.000		18.000.000	0	% 0,00	Projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmıştır. Projenin başlatılmasına yönelik iş ve işlemlere devam edilmektedir.
2026K10-272275	Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Stratejik Eylem Planı İçin Yönetişim Modelleri Geliştirilmesi (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2026-2027	30.000.000		16.000.000	0	% 0,00	Proje kapsamında piyasa araştırması ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmış olup, Makam Onayı alınması süreci devam etmektedir.
2026K10-272302	Endüstriyel Emisyonların Kontrolü İçin Koku Kontrol Tekniklerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2026-2027	12.000.000		6.000.000	0	% 0,00	Proje teknik şartnamesi hazırlanmıştır. Kamu ihale kanununun 3f maddesi kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Üniversite ile görüşülmüş olup mutabık kalmıştır. 3f komisyon oluru talebi Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmiştir. Projenin 2026 yılı ikinci çeyreğinde başlatılması planlanmaktadır.
2026K10-282282	Türkiye'de Deniz Çöplü Yönetimi Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi [AB-Hibe Ödeneği] (Çevre Sektörü)	2026-2029	216.105.000	0	31.633.000	0	% 0,00	Proje, Uygulama Anlaşması'nın imzalanması aşamasındadır. 2026 yılı içinde başlaması beklenmektedir.
2026K10-282289	AB Döngüsel Ekonomi Paketi Kapsamında İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Stratejisi Geliştirilmesi [AB-Hibe Ödeneği] (Çevre Sektörü)	2026-2028	124.466.000	0	15.046.000	0	% 0,00	Projenin ihale ilanı 04/03/2026 tarihinde http://ipa.csb.gov.tr adresinde ve TED eTendering AB ihale çağrılarını platformunda yayımlanmış olup, söz konusu ihalenin kısa liste değerlendirme aşaması için Değerlendirme Komitesi çalışmalarına 06/04/2026 tarihinde başlayacaktır. İhale sürecinin 2026 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
7 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.499.014.000	648.496.000	648.500.000	125.240.120	% 19,31	
9 Proje		DÖNER SERMAYE	531.886.000	72.730.000	401.156.000	0	% 0,00	
		GENEL TOPLAM	3.030.900.000	721.226.000	1.049.656.000	125.240.120	% 11,93	
2 Proje		AB KATKISI	340.571.000	0	46.679.000	0	% 0,00	

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K10-167192	Türkiye Çevre Etiket Sistemi (Çevre Sektörü)	2021-2026	20.250.000	10.250.000	10.000.000	0	% 0,00	Söz konusu proje kapsamında ayakkabı ve deri, ahşap yüzey kaplama ürün gruplarında kriterler yayınlanmıştır.Turistik konaklama hizmet grubunda çevre etiketi kriteri güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yapı malzemeleri ürün grubunda kriter geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.
2014K10-169742	Hava Kalitesi İzleme (Çevre Sektörü)	2014-2028	1.339.000.000	490.000.000	210.000.000	1.417.200	% 0,67	
2014K10-169742-2117	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarımı	2014-2028	1.274.000.000	460.000.000	190.000.000	1.417.200	% 0,75	
	Genel Bütçe Ödeneği		660.000.000	260.000.000	80.000.000	0	% 0,00	Merkez Mobil Araç Bakım Hizmet Alım İşi 11 Şubat 2026 tarih itibarı ile tamamlanmıştır. Merkez ve 8 adet Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Bakım, onarım hizmet alımına ait 2025 ve 2026 yılı hakedişleri ödenek yetersizliğinden gerçekleştirilememiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği		614.000.000	200.000.000	110.000.000	1.417.200	% 1,29	2025 yılı Sarf ve yedek malzeme alım işi yılı bütçesinden gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı sarf ve yedek malzeme alım işi için de yaklaşık maliyet belirleme çalışmaları devam etmektedir.
2014K10-169742-254653	Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Yenilenmesi (**.Döner Sermaye)	2025-2027	65.000.000	30.000.000	20.000.000	0	% 0,00	2026 yılı için Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının yenilenmesi işi Teknik Şartname hazırlanmıştır. Süreç devam etmektedir.
2025K10-246784	Sürekli İzleme Merkezi Modernizasyonu (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2025-2027	120.000.000		50.000.000	0	% 0,00	Söz konusu iş için teknik şartname hazırlanarak, yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmış olup, ihale aşamasına gelinmiştir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K10-271313	Çevre Referans Laboratuvarının Kapasite Artırımı (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2026-2028	23.000.000		7.500.000	0	% 0,00	Söz konusu iş için teknik şartname hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
2026K10-272643	Merkezi Çevre Belgelendirme Takip ve İzleme Sistemi (**.Döner Sermaye) (Çevre Sektörü)	2026-2027	35.000.000		16.000.000	0	% 0,00	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
2026K10-282290	AB Temiz Hava Direktifi İle Uyumlu Olarak Ortam Havasının İzlenmesi Uygulamalarının Geliştirilmesi [AB-Hibe Ödeneği] (Çevre Sektörü)	2026-2026	57.198.000	0	57.198.000	0	% 0,00	Proje faaliyetleri devam etmekte olup, proje Temmuz ayının sonunda tamamlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti olarak bir ödeme yapılması söz konusu değildir.
2026K10-282291	AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifine Uygun Deniz İzleme ve Raporlama Uygulamaları Geliştirilmesi [AB-Hibe Ödeneği] (Çevre Sektörü)	2026-2026	41.580.000	0	41.580.000	0	% 0,00	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	680.250.000	270.250.000	90.000.000	0	% 0,00	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	857.000.000	230.000.000	203.500.000	1.417.200	% 0,70	
		GENEL TOPLAM	1.537.250.000	500.250.000	293.500.000	1.417.200	% 0,48	
2 Proje		AB KATKISI	98.778.000	0	98.778.000	0	% 0,00	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019D00-131876	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2019-2026	9.238.797.000	9.236.172.000	2.625.000	0	% 0,00	Proje 31.12.2025 tarihinde tamamlanmış olup, Nisan 2026 ayı sonuna kadar ödeme süreci devam etmektedir. Bu tarih itibarıyla kapanacaktır.
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2019-2026	9.140.958.000	9.138.458.000	2.500.000	0	% 0,00	
	Hibe Ödeneği	2019-2026	97.839.000	97.714.000	125.000	0	% 0,00	
2023D00-215894	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2023-2028	12.861.170.000	3.881.555.000	2.606.066.000	53.309.476	% 2,05	Projede yapım işlerine ait ihaleler devam etmekte olup, sözleşmesi imzalan işlere ait hakediş ödemeleri yapılmaktadır
	Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2023-2028	12.791.285.000	3.834.965.000	2.587.430.000	41.147.520	% 1,59	
	Hibe Ödeneği	2023-2028	69.885.000	46.590.000	18.636.000	12.161.956	% 65,26	
2023D00-217031	Kamu Bina Stoğu Enerji Performansı Güçlendirme [AB-Hibe Ödeneği] (Enerji Sektörü)	2023-2026	141.953.000	119.240.000	22.713.000	0	% 0,00	Proje planlandığı şekilde devam etmekte olup, işlere ait ihaleler devam etmektedir.
2024D00-231546	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları-2 (*Kredili Proje) (Enerji Sektörü)	2024-2030	14.209.950.000	2.218.043.000	2.862.570.000	575.295.091	% 20,10	20 cm çapında fore kazık (mini kazık) imalatı yapılarak beton dökülmüştür. Fiziki ilerleme %8,12'dir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (Destek Hiz.Dai. Bşk. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2026	233.280.000	133.280.000	100.000.000	2.347.422	% 2,35	20 cm çapında fore kazık (mini kazık) imalatı yapılarak beton dökülmüştür. Fiziki ilerleme %8,12'dir.
2023G00-217198	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar (*.Kredili Proje) (Konut Sektörü)	2023-2027	36.600.990.000	16.145.000.000	17.165.500.000	837.118.879	% 4,88	
2024G00-224663	Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar-JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı-JICA) (Konut Sektörü)	2024-2026	8.034.080.000	5.270.580.000	2.763.500.000	13.425.380	% 0,49	
	JICA Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek	2024-2026	6.694.650.000	4.392.150.000	2.302.500.000	13.425.380	% 0,58	
	Genel Bütçe Ödeneği	2024-2026	1.339.430.000	878.430.000	461.000.000	0	% 0,00	
2021H03-255345	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Yükseköğretim Sektörü)	2021-2027	4.779.999.000	2.166.994.000	2.338.000.000	105.113.390	% 4,50	
2021H03-255345- 255346	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı	2021-2027	350.000.000	0	300.000.000	29.902.588	% 9,97	
2021H03-255345- 255347	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri	2023-2027	379.955.000	0	285.000.000	0	% 0,00	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021H03-255345-255963	Boğaziçi Üniv.Uçaksavar Kampüsü Superdorm Binası	2024-2026	162.675.000	160.175.000	2.500.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-255971	İTÜ Ayazağa Kampüsü-1. Etap Binalar	2024-2026	236.357.000	233.857.000	2.500.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-255977	İTÜ Ayazağa Kampüsü-2. Etap Binalar	2024-2026	466.550.000	266.550.000	200.000.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-255987	İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü	2024-2026	193.580.000	163.580.000	30.000.000	17.693.034	% 58,98	
2021H03-255345-255992	Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü	2024-2026	185.226.000	180.226.000	5.000.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-256013	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-1. Etap Binalar	2024-2026	395.718.000	390.718.000	5.000.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-256029	Kocaeli Kandıra ve Gazanfer Bilge Öğrenci Yurtları	2024-2026	120.000.000	110.000.000	10.000.000	8.561.294	% 85,61	
2021H03-255345-256035	Hatay Mustafa Kemal Üniv.-2. Etap Binalar	2024-2026	445.863.000	295.863.000	150.000.000	48.956.474	% 32,64	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021H03-255345-254389	Boğaziçi Üniv. Kilyos Kampüsü-1. Etap Binalar	2024-2026	260.025.000	259.025.000	1.000.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-262736	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü C Blok	2025-2026	20.000.000	2.000.000	18.000.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-262735	Dokuz Eylül Üniv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası	2025-2026	40.000.000	5.000.000	35.000.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-263427	İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Büyükçekmece Kampüsü	2025-2026	702.050.000	50.000.000	652.050.000	0	% 0,00	
2021H03-255345-278759	Fırat Üniversitesi-1.Etap Binalar	2025-2027	822.000.000	50.000.000	641.950.000	0	% 0,00	
2026H03-283587	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik-2 (*.Kredili Proje) (Yükseköğretim Sektörü)	2026-2026	15.000.000		15.000.000	0	% 0,00	
2026H03-283587-283588	Boğaziçi Üniversitesi Laboratuvar Binası	2026-2026	15.000.000		15.000.000	0	% 0,00	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024I00-235103	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2024-2029	4.600.000.000	670.000.000	1.153.250.000	99.363.437	% 8,62	
2024I00-235103-235104	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı-A Blok	2024-2028	2.300.000.000	670.000.000	923.250.000	99.363.437	% 10,76	
2024I00-235103-278908	Çapa Cerrahi Bilimler Hastanesi İnşaatı-B Blok	2026-2029	2.300.000.000		230.000.000	0	% 0,00	
2026I00-283585	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik-2 (*.Kredili Proje) (Sağlık Sektörü)	2026-2029	48.625.000.000		346.750.000	0	% 0,00	
2026I00-283585-283586	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastane Ek Bina	2026-2029	2.100.000.000		15.000.000	0	% 0,00	
2026I00-283585-283589	Atatürk Üniversitesi Hastane Ek Bina	2026-2029	3.465.000.000		24.750.000	0	% 0,00	
2026I00-283585-283591	Erciyes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi	2026-2029	11.200.000.000		80.000.000	0	% 0,00	
2026I00-283585-283592	Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi	2026-2029	8.460.000.000		60.000.000	0	% 0,00	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026100-283585-283600	Selçuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi	2026-2029	8.400.000.000		60.000.000	0	% 0,00	
2026100-283585-283601	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi	2026-2029	3.500.000.000		25.000.000	0	% 0,00	
2026100-283585-283602	Kastamonu Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi	2026-2029	3.500.000.000		25.000.000	0	% 0,00	
2026100-283585-283611	Çukurova Üniversitesi Çocuk Hastanesi	2026-2029	3.500.000.000		25.000.000	0	% 0,00	
2026100-283585-283620	Ege Üniversitesi Hastane Binası 1.Etap (Çocuk Hastanesi)	2026-2029	4.500.000.000		32.000.000	0	% 0,00	
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (Şehirleşme Sektörü)							
2017K09-3813-171165	Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2027	358.561.000	0	40.000.000	0	% 0,00	Hizmet binmasının yapımı için, , Cumhurbaşkanlığı'nın 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında Cumhurbaşkanlığından izin talep edilmiş olup, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden alınan 07.04.2026 tarihli yazı ile gerekli izin verilmiştir.
2017K09-3813-171167	Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (*.Arsa Karşılığı)	2021-2027	23.468.000	0	17.000.000	0	% 0,00	Hizmet binmasının yapımı için, , Cumhurbaşkanlığı'nın 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında Cumhurbaşkanlığından izin talep edilmiş olup, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden alınan 07.04.2026 tarihli yazı ile binanın yapımına izin verilmemiştir.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K12-283076	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Teknolojik Araştırma Sektörü)	2026-2026	345.375.000		345.375.000	0	% 0,00	
2021K14-172248	Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik (*Kredili Proje) (Afetler Sektörü)	2021-2027	1.724.250.000	1.187.250.000	380.000.000	2.564.400	% 0,67	
2021K14-172248-172249	Danışmanlık, Eğitim ve Donanım Alımı (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2021-2027	220.000.000	200.000.000	10.000.000	2.564.400	% 25,64	
	Hibe Ödeneği	2021-2027	41.250.000	41.250.000	0			
2021K14-172248-172250	Kamu Binalarında Uygulama İşlemleri (*Kredi Karşılığı Tahsis Edilen Ödenek)	2023-2027	943.000.000	923.000.000	10.000.000	0	% 0,00	
2021K14-172248-278574	Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	2025-2026	40.000.000	2.000.000	38.000.000	0	% 0,00	
2021K14-172248-278579	Tunceli Hükümet Konağı	2025-2027	250.000.000	10.000.000	103.000.000	0	% 0,00	
2021K14-172248-278580	Tunceli Hozat Hükümet Konağı	2025-2026	40.000.000	2.000.000	38.000.000	0	% 0,00	
2021K14-172248-278581	Tunceli Mazgirt Hükümet Konağı	2025-2026	60.000.000	2.000.000	58.000.000	0	% 0,00	

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2021K14-172248-278582	Tunceli Nazımiye Hükümet Konağı	2025-2026	45.000.000	2.000.000	43.000.000	0	% 0,00	
2021K14-172248-278583	Tunceli Kültür Merkezi	2025-2026	85.000.000	5.000.000	80.000.000	0	% 0,00	
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (Destek Hiz.Dai. Bşk. ile Ortak Proje) (**.Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2024-2026	284.676.000	84.676.000	200.000.000	16.902.305	% 8,45	80 cm çapında betonarme fore kazık yapılarak beton dökülmüştür. Fiziki ilerleme %9,03'tür.
2018K07-18500	Sarıkeçili Göçebe Grubu İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2018-2026	435.560.000	335.560.000	100.000.000	0	% 0,00	24 Mayıs 2024 tarih ve E-98177452-602.07-29530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Makam Olur'u ile tahmini ödenek teminine esas revize bedeli onaylanmış olup 04.07.2024 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. Yapılan sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 16.06.2028 olarak güncellenmiştir. İş devam etmektedir. Fiziki Gerçekleşme oranı % 78,50, Nakdi Gerçekleşme oranı da % 78,36'dır.
2024K07-224145	Perre Antik Kenti İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2026	55.000.000	40.000.000	15.000.000	0	% 0,00	2024 yılında yatırım programına alınmış olup, 48.000.000,00 TL anahtar teslim götürü bedeli üzerinden ihalesi tamamlanmıştır. 11.02.2025 tarihinde işin ihalesi yapılmış olup, 17 haksahibine ait olan konutlar tamamlanmıştır. Kura çekimi yapılacaktır işin.,Fiziki Gerçekleşme oranı % 90,00, Nakdi Gerçekleşme oranı da % 86,71'dir.
2024K07-224142	Çetintepe Barajı İskanı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2024-2027	199.640.000	0	69.000.000	0	% 0,00	2024 yılında yatırım programına alınmış olup,haksahipleri tarafından yapılan yerleşimi işlemi beğenilmediğinden dolayı ihalesi iptal edilmiştir. Yeniden yerleşimi çalışması yapılacaktır. 2026 yılı yatırım programında da yer almaktadır.
2026K07-271274	İskan Hizmetleri Etüt İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2026-2026	5.000.000		5.000.000	0	% 0,00	İskan konutlarının yapılacağı yeni yerleşim yerleri ile ilgili bu ödenek gerek duyuldukcı harcanmaktadır. Mahkemelere itirazlar sonrasında vatandaşlara ödenecek kamulaştırma farklarında bu kalemden ödenmekte olup ödemesi takvime bağlanamamaktadır. Ayrıca İmar planı, parselasyon, jeolojik etüt yapılması gibi işlerde kullanılmaktadır.
2026K07-271275	Kesin Hesap (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2026-2026	20.000.000		20.000.000	0	% 0,00	İhtiyaç duyuldukcı harcama yapılmaktadır.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K07-255697	Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2029	1.675.000.000	79.950.000	149.900.000	22.270.000	% 14,86	Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzurum, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Uşak illerinde 36 uygulama da yaklaşık 1.500 ailenin konut yapım işidir. 2026 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı 149.900.000 TL olarak belirlenmiştir. Mart ayında Aksaray, Çorum, Elazığ, Erzurum, Isparta, İzmir ve Malatya illerine toplam da 22.270.000 TL ödenek gönderilmiştir.
2026K07-271276	Göçürülenlerin İşletme Donatım Kredisi (**.08-Borç Verme Ödeneği) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2026-2026	100.000		100.000	0	% 0,00	İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2025-2027			80.000.000	0	% 0,00	Kamulaştırma ve konut ile arazi satın alımları için kullanılmaktadır. 2026 yılı itibariyle bu iş için ayrılan ödenek miktarı 80.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
17 Proje		06 ve 07 TOPLAM	141.540.837.000	40.965.600.000	30.168.875.000	1.674.028.097	% 5,55	
2 Proje		08 TOPLAM	1.675.100.000	79.950.000	150.000.000	22.270.000	% 14,85	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	517.956.000	217.956.000	300.000.000	19.249.727	% 6,42	
		GENEL TOPLAM	143.942.867.000	41.449.060.000	30.618.875.000	1.715.547.824	% 5,60	
3 Proje		HİBE	208.974.000	185.554.000	18.761.000	12.161.956	% 64,83	
1 Proje		AB KATKISI	141.953.000	119.240.000	22.713.000	0	% 0,00	
1 Proje		ARSA KARŞILIĞI	382.029.000	0	57.000.000	0	% 0,00	
		Kamu laştırma	0	0	80.000.000	0	% 0,00	

Not-1: "GES Kurulumu" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-2: "Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023D00-207812	Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi (Enerji Sektörü)	2023-2028	12.674.000	1.750.000	3.000.000	0	% 0,00	<p>1. 29 Ocak 2026 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 11364 sayılı kararıyla konut kredilerine ilişkin düzenleme yapılarak, Enerji Kimlik Belgesi uygulaması çerçevesinde, daha önce A ve B enerji sınıfı konutlara uygulanan avantajlı kredi değer oranı kapsamına, C enerji performans sınıfına sahip konutlar da dahil edilmiştir.</p> <p>2. 30 Ocak 2026 tarihli ve 33153 sayılı Resmî Gazete'de Ulusal YDD metodolojisinin geliştirilmesi ve BEP-TR yazılımına entegre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında danışmanlık hizmeti alınması için uluslararası ihale ilanı yayımlanmıştır.</p> <p>3. 2 Mart 2026 tarihinde 10.000 m² üzeri Yeni Kamu binalarında zorunlu olacak YeS-TR için sertifikalandırma sürecinde yol gösterecek olan "Kamu Binaları İçin Yeşil Sertifika Uygulama Rehberi" Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımlanmıştır.</p> <p>4. Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" taslağına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar ile özel sektör paydaşlarının görüşleri alınmış ve Taslağı nihai hali verilerek İçişleri Bakanığı'na iletilmiştir. Ancak bu süreçte birkaç hususa İçişleri Bakanığı ve bazı kamu kurumlarının çekinceleri intikal etmiş olup, ilgili kurumlarla konu üzerindeki değerlendirmeler devam etmektedir.</p> <p>5. Bakanlığımız ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) arasında "Binalarda Yalıtım Uygulamaları ve İyi Uygulama Kurallarına İlişkin Farkındalığın Artırılması" konusunda imzalanan protokol kapsamında çeşitli konularda 73 ile ulaşılarak bölgesel seminerler yapılmış olup, son bölgesel seminerin İstanbul ilinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa Bilecek, Sakarya illerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p> <p>6. İstanbul Teknik Üniversitesi ile; "Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi (YeS-TR)'nin Uluslararası Sürümünün (YeS-INT) Oluşturulması Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması" imzalanan protokol kapsamında kılavuzlar teslim alınmış olup, YeS-INT değerlendirme kılavuzunun yayın aşamasına geçebilmesi için düzenlemeler yapılmaktadır.</p> <p>7. 12-13 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul ilinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Türkiye Çevre Ajansı arasında, yapım işlerinin YeS-TR ve YeS-INT standartlarına uygun şekilde yürütülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştır.</p> <p>8. 14-15 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul ilinde gerçekleşen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kongresine "2026'ya Yeşil Binalar ve Yeşil Şehir Yerleşimleri" başlığı altında katkıda bulunulmuştur.</p> <p>9. 6 Şubat 2026 tarihinde İstanbul ilinde gerçekleşen 25. Ozon Paneline katılım sağlanmıştır.</p> <p>*Proje kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi ile ilgili eğitim faaliyetleri talepler doğrultusunda devam etmektedir. İlgili tarafların eğitilmesi, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere materyallerin temini, yayımlanmak ve dağıtılmak üzere tanıtıcı kılavuz, broşür, katalog, sertifika, belge vb. gereç ve malzemelerin oluşturulması planlar dahilindedir.</p>
2026K01-271270	Yapı Malzemeleri Ürün Güvenliğinin Sağlanması (Genel İdare Sektörü)	2026-2026	10.000.000		10.000.000	0	% 0,00	
	Genel Bütçe Ödeneği		1.500.000		1.500.000	0	% 0,00	2026 Yılı 1. Dönemde harcama gerçekleşmemiştir.
	Döner Sermaye Ödeneği		8.500.000		8.500.000	0	% 0,00	

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K01-271272	Yenilikçi Yapım Sistemleri Geliştirme (*Döner Sermaye) (Genel İdare Sektörü)	2026-2028	15.000.000		5.000.000	0	% 0,00	Proje geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmekte olup yılın ilk üç aylık döneminde ödeme yapmayı gerektiren bir durum oluşmamıştır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	14.174.000	1.750.000	4.500.000	0	% 0,00	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	23.500.000	0	13.500.000	0	% 0,00	
		GENEL TOPLAM	37.674.000	1.750.000	18.000.000	0	% 0,00	

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023K60-217018	Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2026	315.900.000	195.900.000	120.000.000	0	% 0,00	Teknik Şartname hazırlanmış olup, sözleşme imzalanmasını müteakip gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
2023K60-230220	Milli Emlak Bilgi Sistemi (MEBİS) (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2023-2026	46.027.000	26.027.000	20.000.000	0	% 0,00	Teknik Şartname kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
2024K60-230228	Dijital Dönüşüm V4 (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2024-2026	232.000.000	137.000.000	95.000.000	0	% 0,00	13. hakediş hazırlık süreçleri devam etmektedir. Bu çeyrekte henüz harcama gerçekleşmemiştir.
2025K60-259557	Merkezi Yapay Zeka Çözümleri (**.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2025-2026	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	% 0,00	01.01.2026-31.03.2026 tarihleri arasında Claude Max, Claude Pro, Kimi, Cursor Pro, Rask AI, Vimeo, Open Router, Pictoart Pro, Windsurf üyelikleri için harcanan tutar 354.174 TL dir. Canva Pro ve Google AI Pro için harcanan tutar 25.824 TL dir. Bahsedilen alımlar (toplamda 379.998 TL) yapılmıştır ancak ödemesi henüz gerçekleşmemiştir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K60-272897	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2026-2026	395.000.000		395.000.000	0	% 0,00	
2026K60-272897- 272898	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Temini	2026-2026	271.500.000		271.500.000	0	% 0,00	Veri Merkezi Ortam İzleme Ürünü Garanti Bakım İşii-- 666.000 KDV Dahil DMO Bilgisayar Alımı(3 Sepet) (19.843629,00 TL avans verilmiştir.)
2026K60-272897- 272899	Altyapı Bileşenleri Bakım, Onarım ve Lisans Temini	2026-2026	100.000.000		100.000.000	0	% 0,00	Satınalma süreçleri devam etmektedir. Henüz harcama gerçekleşmemiştir.
2026K60-272897- 272900	Bakanlık Merkez ve Taşra Yazılım Altyapısı Lisans Temini	2026-2026	18.000.000		18.000.000	0	% 0,00	01.01.2026-31.03.2026 tarihleri arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2026K60-272897- 272902	CA Api Gateway Lisans Hizmet ve Bakım	2026-2026	5.500.000		5.500.000	0	% 0,00	2025 Yılı içerisinde 1 yıllık Lisans Yenileme+Bakım idame desteği üzerinden anlaşılmıştır. 2026 yılı için 2 Yıl üzerinden satın alma yapılması planlanmıştır. Satın alma işlemleri devam etmektedir. Henüz harcama yapılmamıştır.
2026K60-273429	Coğrafi Bilgi Zenginleştirmeli Dil Modeli (GeoLM) Projesi (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2026-2026	10.000.000		10.000.000	0	% 0,00	Coğrafi Bilgi Zenginleştirmeli Dil Modeli (GeoLM) Projesi'nin şartnamesi hazırlanmış olup, 01.01.2026-31.03.2026 tarihleri arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2026K60-273463	Çevreci Şehir Mobil Uygulaması (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2026-2026	7.000.000		7.000.000	0	% 0,00	Satınalma süreçleri devam etmektedir. Henüz harcama gerçekleşmemiştir.

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K60-273203	Ulusal Çevre Bilgi Sistemine Ek Modül Eklenmesi (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2026-2027	20.000.000		10.000.000	0	% 0,00	Satınalma süreçleri devam etmektedir. Henüz harcama gerçekleşmemiştir.
2026K60-273264	e-Plan Otomasyon Sistemleri İdame ve Yaygınlaştırma (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2026-2027	20.000.000		8.000.000	0	% 0,00	Projeye yönelik ihale süreci Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince yürütülmektedir.
2026K60-273447	Müteahhitlik ve Şantiye Şefliği Bilişim Sistemi Bakımı (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2026-2027	15.000.000		7.000.000	0	% 0,00	01.01.2026-31.03.2026 tarihleri arasında herhangi bir harcama yapılmamıştır.
2026K09-273152	Akıllı Şehir Standartları Platformu Bakım ve İdame (*.*.Döner Sermaye) (Bilişim Altyapısı Sektörü)	2026-2026	3.500.000		3.500.000	0	% 0,00	Projeye yönelik ihale süreci Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince yürütülmektedir.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	315.900.000	195.900.000	120.000.000	0	% 0,00	
10 Proje		DÖNER SERMAYE	758.527.000	168.027.000	560.500.000	0	% 0,00	
		GENEL TOPLAM	1.074.427.000	363.927.000	680.500.000	0	% 0,00	

AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K10-18396	Çevre ve İklim Değişikliği Operasyonel Programı (AB) (Çevre Sektörü)	2018-2026	92.611.000	66.211.000	26.400.000	0	% 0,00	Projenin 4 adet bileşeni vardır. Bunlardan DEP Sözleşmesi Mart 2022 itibariyle sona ermiştir. 2.Bileşen olan teknik yardım sözleşmesinin nihai raporu 11/12/2024 tarihinde onaylanmıştır. Nihai ödemesi 21/01/2025 tarihinde yapılmıştır. Geri kalan 2 bileşenin uygulaması devam etmektedir. Dört bileşenden biri olan 2. teknik yardım projesinin uygulama aşaması 2024 Yılı Eylül ayında başlamış olup, devam etmektedir.
<i>AB katkısı</i>			524.785.000	375.200.000	149.585.000	0	% 0,00	
2019K05-93010	İPA Altyapı Yatırımları Programı (AB) (İçmesuyu Sektörü)	2019-2026	6.236.000.000	3.791.000.000	2.445.000.000	51.339.120	% 2,10	Açıklamalar aşağıda verilmiştir.
	AB Hibesi		5.040.000.000	3.265.000.000	1.775.000.000	43.883.549	% 2,47	
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hibesi		506.000.000	176.000.000	330.000.000	3.218.102	% 0,98	
	Mahalli İdare Katkısı		690.000.000	350.000.000	340.000.000	4.237.469	% 1,25	
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	92.611.000	66.211.000	26.400.000	0	% 0,00	
	<i>AB KATKISI</i>		524.785.000	375.200.000	149.585.000	0	% 0,00	
	<i>İçmesuyu Sektörü Projesi</i>		6.236.000.000	3.791.000.000	2.445.000.000	51.339.120	% 2,10	

2019K05-93010 nolu "IPA Altyapı Yatırımları Programı (AB)" Projesi Detay Programı Gerçekleşme Bilgileri

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2019K05-93010-103430	Çankırı Su ve Atıksu Tesisi	2019-2026	1.050.000.000	650.000.000	400.000.000	2.917.915	% 0,73	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinin uygulama aşaması devam etmektedir. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		870.000.000	560.000.000	310.000.000	2.725.525	% 0,88	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		80.000.000	30.000.000	50.000.000	192.390	% 0,38	
	Mahalli İdare Katkısı		100.000.000	60.000.000	40.000.000		% 0,00	
2019K05-93010-103433	Giresun Atıksu Tesisi	2019-2026	1.315.000.000	940.000.000	375.000.000	32.362.559	% 8,63	Proje kapsamında yer alan yapım işlerinden 2. Yapım İşinin geçici kabulü 31.10.2025 tarihinde yapılmıştır. 1.Yapım İşinin olan Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı İşinin geçici kabulü 29.12.2025 tarihinde yapılmıştır. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		1.010.000.000	810.000.000	200.000.000	27.508.175	% 13,75	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		125.000.000	50.000.000	75.000.000	1.941.753	% 2,59	
	Mahalli İdare Katkısı		180.000.000	80.000.000	100.000.000	2.912.630	% 2,91	
2019K05-93010-103441	Rize Su ve Atıksu Tesisi	2019-2026	1.168.000.000	565.000.000	603.000.000	0	% 0,00	Proje kapsamında yer alan atıksu arıtma tesisi yapım işinin uygulama aşaması devam etmektedir. Projenin diğer bileşeni olan kollektor hattı yapım işi sözleşmesi 01.04.2025 tarihinde feshedilmiştir.Kalan işlerin tamamlanmasına dair ihale sürecine başlanmıştır. Avro kuru ve proje süresi değişiklikleri sebebiyle harcama oranlarında farklılık görülmektedir.
	AB Hibesi		930.000.000	460.000.000	470.000.000	0	% 0,00	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		90.000.000	25.000.000	65.000.000	0	% 0,00	
	Mahalli İdare Katkısı		148.000.000	80.000.000	68.000.000	0	% 0,00	
2019K05-93010-103447	Trabzon Su Tesisi	2019-2026	1.000.000.000	578.000.000	422.000.000	0	% 0,00	Proje kapsamında yer alan yapım işi 11.04.2025 tarihinde feshedilmiştir.Kalan işlerin tamamlanmasına dair ihale sürecine başlanmıştır.
	AB Hibesi		810.000.000	495.000.000	315.000.000	0	% 0,00	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		83.000.000	28.000.000	55.000.000	0	% 0,00	
	Mahalli İdare Katkısı		107.000.000	55.000.000	52.000.000	0	% 0,00	
2019K05-93010-149593	Suluova Entegre Su Tesisi	2020-2026	898.000.000	563.000.000	335.000.000	16.058.646	% 4,79	Proje kapsamında ; Müşavirlik işi sözleşmesi 30.08.2023 tarihinde başlamıştır. 2. yapım işi olan Yağmursuyu Hatları Yapımı İşinin kesin kabulü 26.12.2025 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atıksu arıtma tesisi yapım işi ise 22.01.2024 tarihinde başlamıştır.Uygulama aşaması devam etmektedir.
	AB Hibesi		785.000.000	515.000.000	270.000.000	13.649.849	% 5,06	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		53.000.000	18.000.000	35.000.000	1.083.959	% 3,10	
	Mahalli İdare Katkısı		60.000.000	30.000.000	30.000.000	1.324.838	% 4,42	
2019K05-93010-149594	Doğubayazıt Atıksu Tesisi	2019-2026	805.000.000	495.000.000	310.000.000	0	% 0,00	Proje kapsamında yer alan kollektör hatları ve yağmursuyu toplama hattı yapım işinin kesin kabulü 03.03.2025 tarihinde yapılmıştır. 1. yapım işi olan atık su arıtma tesisi inşaatının uygulama aşaması devam etmektedir. Müşavirlik sözleşmesi devam etmektedir.
	AB Hibesi		635.000.000	425.000.000	210.000.000	0	% 0,00	
	ÇŞİD Bakanlığı Hibesi		75.000.000	25.000.000	50.000.000	0	% 0,00	
	Mahalli İdare Katkısı		95.000.000	45.000.000	50.000.000	0	% 0,00	

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026F00-271281	Muhtelif Etütler (Turizm Sektörü)	2026-2026	18.000.000		18.000.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda gerekli çalışmalara devam edilmektedir.
2026F00-271281-271282	Korunan Alanlarda Turizm Amaçlı Proje Temini	2026-2026	18.000.000		18.000.000	0	% 0,00	Proje yapılması planlanan alanlarla ilgili arazi değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Gümüşhane ili Korunan Alanlarda Çevre ve Peyzaj Düzenleme Projesi ön çalışmalarına başlanmıştır.
2025F00-254761	Seydikemer Çevre Düzenleme Yapımı (Turizm Sektörü)	2025-2026	41.000.000	20.000.000	21.000.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında "Seydikemer (Muğla) Çevre Düzenleme Yapım İşinin yıllara ait ödenek dilimlerinin revizyona uğraması nedeniyle 03/03/2026 tarihinde Ek Protokol imza edilmiş olup iş devam etmektedir.
2021F00-161821	Dalyan Kanalları Kıyı Düzenleme (Turizm Sektörü)	2021-2027	155.600.000	65.600.000	36.000.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda gerekli çalışmalara devam edilmektedir.
2025F00-254757	Eğirdir Gölü Çevre Düzenleme Yapımı (Turizm Sektörü)	2025-2027	40.750.000	14.750.000	21.000.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında "Eğirdir Gölü (Isparta) Çevre Düzenleme Yapım İşinin yıllara ait ödenek dilimlerinin revizyona uğraması nedeniyle 12/03/2026 tarihinde Ek Protokol imza edilmiş olup iş devam etmektedir.
2026F00-271607	Selime Katedrali Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenlemesi (*Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2026-2026	43.000.000		43.000.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda gerekli çalışmalara devam edilmektedir.
2026F00-271640	Ihlara Vadisi Çevre Düzenlemesi (*Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2026-2026	43.000.000		43.000.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda gerekli çalışmalara devam edilmektedir.
2026F00-282850	Köyceğiz Atatürk Kordonu Yapısal Peyzaj Onarımı (*Döner Sermaye) (Turizm Sektörü)	2026-2026	14.000.000		14.000.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda gerekli çalışmalara devam edilmektedir.

TABIAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2018K05-18615	Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini (*Döner Sermaye) (İçmesuyu Sektörü)	2018-2028	541.081.000	198.420.000	94.104.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda Yerel Yönetimler ile imza edilecek mali katkı protokolleri kapsamındaki çalışmalara devam edilmektedir.
2018K05-18615-63117	Muhtelif Korunan Alanlarda İçmesuyu Temini	2018-2028	225.000.000	75.000.000	40.000.000	0	% 0,00	Korunan alan statüsündeki yerleşim yerlerine yönelik içmesuyu temin talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirme aşamasında olup uygun bulunan projelere ilişkin mali katkı protokolü hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.
2018K05-18615-141350	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İçmesuyu Temini	2020-2028	316.081.000	123.420.000	54.104.000	0	% 0,00	"Selime (Aksaray) Belediyesi 600 m ³ ve 50 m ³ Hacimli Gömme İçmesuyu Deposu Yapım İşi" kapsamında 12/03/2026 tarihinde Selime (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile KDV Dahil 10.000.000,00 TL bedelli mali katkı protokolü imzalanmış olup Belediyesince ihale süreci devam ettirilmektedir.
2021K06-161764	Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi (*Döner Sermaye) (Kanalizasyon Sektörü)	2021-2028	532.600.000	145.412.000	81.141.000	0	% 0,00	2026 Yılı Yatırım Programı doğrultusunda Yerel Yönetimler ile imza edilecek mali katkı protokolleri kapsamındaki çalışmalara devam edilmektedir.
2021K06-161764-199492	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Yönetimi	2022-2028	313.000.000	85.000.000	45.000.000	0	% 0,00	"İhlara (Aksaray) Belediyesi İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı 2. Etap Yapım İşi" kapsamında İhlara (Aksaray) Belediye Başkanlığı ile KDV Dahil 15.000.000,00 TL bedelli mali katkı protokolünün Genel Müdürlük Makam Onayı süreci devam etmektedir.
2021K06-161764-199500	Muhtelif Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi	2023-2028	219.600.000	60.412.000	36.141.000	0	% 0,00	Korunan alan statüsündeki yerleşim yerlerinin atıksu bertarafına yönelik talepleri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmekte olup uygun bulunan projelere ilişkin mali katkı protokolü hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3807	Korunan Alanlar Planlama Çalışmaları (Şehirleşme Sektörü)	2017-2027	102.243.000	49.517.000	49.226.000	0	% 0,00	
2017K09-3807-92807	Korunan Alanlarda Halihazır Harita Alımı	2019-2027	19.350.000	12.704.000	5.646.000	0	% 0,00	1-)Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Dumanlı köyü(Santa Harabeleri Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı 160 Ha Alanın Halihazır Harita Alımı
2017K09-3807-92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı	2019-2027	24.630.000	18.330.000	5.800.000	0	% 0,00	1-Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Dumanlı Köyü (Santa Harabeleri) Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan Araştırma ve Açıklama Raporu Hazırlanması İşi. (İhale Öncesi Çalışmalar devam Ediyor) 2-Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu Yapımı İşi
2017K09-3807-92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2027	9.963.000	6.483.000	2.980.000	0	% 0,00	Mahalli idare ile Protokol Çalışması Devam Etmektedir.
2017K09-3807-92808	Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı (**.Döner Sermaye)	2026-2027	20.500.000		20.000.000	0	% 0,00	1-Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Dumanlı Köyü (Santa Harabeleri) Koruma Amaçlı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi (İhale Öncesi Çalışmalar devam Ediyor) 2-Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Gözlemsel Jeolojik Etüt Hazırlanması İşi (İhale Öncesi Çalışmalar devam Ediyor) 3-Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hazırlanması İşi (İhale Öncesi Çalışmalar devam Ediyor) 4-İmar Planı Paftalarının Taranması ve Koordinatlandırılması İşi (İhale Öncesi Çalışmalar devam Ediyor) 1-İhlara Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Kalan, İhlara Beldesinde Yaklaşık 320 Hektarlık Alanda İlave+Revizyon İmar Planı Hazırlanması İşi (Sermaye Transferi Tertibinden) (Mahalli idare ile Protokol Çalışması Devam Etmektedir)
2017K09-3807-92809	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması ve ve Kentsel Tasarım Projelerinin Yapımı (*. 07-Sermaye Transferi Ödeneği)	2019-2027	17.300.000	12.000.000	4.800.000	0	% 0,00	İdarelerle protokol çalışması devam etmektedir.
2017K09-3807-92809	Korunan Alanlarda İmar Uygulaması ve ve Kentsel Tasarım Projelerinin Yapımı (**.Döner Sermaye)	2026-2027	10.500.000		10.000.000	0	% 0,00	Proje çalışmaları devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K09-271301	Muhtelif İşler (SGB-İl Müdürlükleri ve Destek Hizmetleri Dai.Bşk. Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
2026K09-271301-271305	Taahhüt Alımı-1 (**.Döner Sermaye)	2026-2026	10.000.000		10.000.000	0	% 0,00	03.04.2026 tarihli ve 11157 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile araçların edinilmesi uygun görülmüştür.
2026K09-271562	Korunan Alanlarda DHTA Alanların Tespiti, Haritalanması ve Envanterinin Oluşturulması (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2026-2026	30.000.000		30.000.000	0	% 0,00	Proje çalışmaları devam etmektedir.
2026K09-271948	Korunan Alanlar Takip Yönetim ve Otomasyon Sistemi (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2026-2026	3.500.000		3.500.000	0	% 0,00	Proje çalışmaları devam etmektedir.
2021K10-169752	Tür ve Habitat Koruma-İzleme ve Uygulama	2021-2028	49.930.000	36.680.000	10.500.000	0	% 0,00	
2021K10-169752-183737	Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alan ve Karasal Alan Ekosistem Rehabilitasyon	2022-2028	28.930.000	25.180.000	1.000.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.
2021K10-169752-228254	Tuz Gölü ÖÇKB Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması, İzlenmesi ve Haritalanması	2024-2026	17.000.000	10.000.000	7.000.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır
2021K10-169752-246728	Pamukkale Travertenlerindeki Mikroorganizmaların İzlenmesi ve Araştırılması	2025-2026	4.000.000	1.500.000	2.500.000	0	% 0,00	Projenin Ön Raporu 2025 yılında Bakanlığımıza sunulmuş olup, 1. hakediş olarak (%45) KDV hariç 1.183.500,00 TL (KDV dahil 1.420.000,00 TL) ödeme yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Nisan 2026'da Ara Rapor teslimi ile 2. hakediş ödemesi (%20) yapılacaktır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024K10-225401	İklim Değişikliğinin Tuzgölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	8.500.000	6.370.000	2.130.000	0	% 0,00	Projenin 4. ara raporu Nisan ayı içerisinde sunulacak olup 2026 yılında henüz hak ediş ödemesi yapılmamıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.
2024K10-225402	İklim Değişikliğinin Salda Gölü ÖÇKB'ye Etkisi (Çevre Sektörü)	2024-2026	6.275.000	4.200.000	2.075.000	0	% 0,00	Projenin 4. ara raporu Mart ayı içerisinde sunulmuş olup 2026 yılında henüz hak ediş ödemesi yapılmamıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.
2025K10-246685	Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (*Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	17.925.000	4.858.000	13.067.000	0	% 0,00	
2025K10-246685- 246746	Datça Hurması Koruma ve İzleme	2025-2026	4.000.000	1.500.000	2.500.000	0	% 0,00	Proje kapsamında 1. hakediş ödemesi, 2025 yılında KDV hariç 1.040.000,00 TL (KDV dahil 1.248.000,00) şeklinde yapılmıştır. Proje 2026 yılında da plandaki takvime göre devam etmekte olup, Haziran 2026'da Sonuç Raporu teslimi ile 2. (Son) hakediş ödemesi (%60) yapılacaktır.
2025K10-246685- 246747	Gölbaşı ÖÇKB Sevgi Çiçeği Koruma ve İzleme	2025-2026	3.500.000	1.500.000	2.000.000	0	% 0,00	Projenin 02.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 03.06.2025 tarihinde işe başlanmıştır.1.Ara Raporun kabulü ile birlikte % 40'ı (1.081.622,37 TL) ödenmiştir.Proje çalışmaları devam etmekte olup; işin % 40'ı tamamlanmıştır.
2025K10-246685- 246752	Karakulak Popülasyonlarının İzlenmesi ve Araştırılması	2025-2026	3.100.000	1.858.000	1.242.000	0	% 0,00	Projenin 19.06.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 20.06.2025 tarihinde işe başlanmıştır. Proje kapsamında 1. hakediş ödemesi (%60) KDV hariç 1.548.000,00 TL (KDV dahil 1.857.600,00) şeklindedir. Proje 2026 yılında da 2. hakediş ödemesi (%20) KDV hariç 516.000,00 TL yapılmıştır. Proje plandaki takvime göre devam etmektedir.
2025K10-246685- 271327	Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2026-2026	1.150.000		1.150.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246685- 271328	Fethiye-Göcek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2026-2026	1.150.000		1.150.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.
2025K10-246685- 271329	Patara ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2026-2026	1.150.000		1.150.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.
2025K10-246685- 271330	Belek ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2026-2026	1.150.000		1.150.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.
2025K10-246685- 271331	Göksu Deltası ÖÇKB Deniz ve Nil Kaplumbağaları Araştırma, Koruma ve İzleme	2026-2026	2.725.000		2.725.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.
2025K10-246766	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Mercan Restorasyon (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	5.250.000	3.000.000	2.250.000	1.000.000	% 44,44	2. yıl için Ön Rapor alındı ve 3. hakediş ödemesi yapıldı.
2025K10-246771	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Deniz Çayırı Koruma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	8.000.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000	% 60,00	2. yıl için Ön Rapor alındı ve 3. hakediş ödemesi yapıldı.
2025K10-246776	Erdek Körfezi Pina Katılımı ve Büyüme Tespiti (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2026	9.000.000	4.500.000	4.500.000	2.700.000	% 60,00	2. yıl için Ön Rapor alındı ve 3. hakediş ödemesi yapıldı.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K10-3827	Tabiat Varlıkları ve Potansiyel Doğal Sit Alanları Değerlendirme (Çevre Sektörü)	2017-2028	25.500.000	10.500.000	4.500.000	0	% 0,00	2025 yılında çalışmalarına başlanılan "Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Bursa, Zonguldak, Sivas, Kocaeli, Gümüşhane İlleri Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" işinin sözleşme bedeli 2,590,000 TL+KDV
2017K10-3827-20858	Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması, Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi, Tanıtımı ve Kapasite Artırımı	2017-2028	25.500.000	10.500.000	4.500.000	0	% 0,00	2025 yılında 1. Hakediş (%10) 259,000,000 TL+KDV ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2026 yılında 2. Hakediş (%40) ve 3. Hakediş (%50) ödemesi henüz yapılmadı.
2021K10-161752	Korunan Alanlarda Yönetim Planı Hazırlama (Çevre Sektörü)	2021-2027	45.200.000	1.200.000	22.000.000	0	% 0,00	
2021K10-161752-225373	Karaburun-İldır Körfezi ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama	2024-2026	9.200.000	1.200.000	8.000.000	0	% 0,00	1. Hakediş Sosyo-ekonomik Araştırma Ön Raporu teslimine ait, işin %13'lük kısmının (741.000 TL+KDV) ödemesi 2025 yılında yapılmıştır. Proje 2026 yılında da plandaki takvime göre devam etmekte olup, 2. Hakediş ödemesine esas Kesin Rapor Genel Müdürlüğümüze sunulmuş henüz ödeme yapılmamıştır.
2021K10-161752-283475	Köyceğiz Dalyan ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama	2026-2027	18.000.000		7.000.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.
2021K10-161752-283479	Gökova ÖÇKB Sosyo Ekonomik Araştırma ve Yönetim Planı Hazırlama	2026-2027	18.000.000		7.000.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİLEN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2022K10-190089	İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği (Çevre Sektörü)	2022-2028	4.197.190.000	1.967.190.000	900.000.000	237.509.953	% 26,39	2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında 2026 yılı içerisinde harcanmak üzere Bakanlığımız (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) için 900.000.000,00.-TL, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 500.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Bu kapsamda Ek Protokol-7 tanzim edilmiştir. Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 2026 yılı içerisinde 10, 11 ve 12 numaralı hakedişler kapsamında Bakanlığımız ödeme oranına göre toplam 237.509.953,23.-TL ödenek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aktarılmış olup iş devam etmektedir.
	Genel Bütçe Ödeneği (07.Sermaye Transferi Ödeneği)	2022-2028	1.521.090.000	621.090.000	300.000.000	237.509.953	% 79,17	
	Döner Sermaye Ödeneği	2022-2028	2.676.100.000	1.346.100.000	600.000.000	0	% 0,00	
	Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katkısı	2022-2028	2.165.000.000	1.050.000.000	500.000.000	109.053.111	% 21,81	
2024K10-225410	Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Koruma ve İzleme (Çevre Sektörü)	2024-2027	33.300.000	9.000.000	10.000.000	0	% 0,00	Proje çalışmaları devam etmektedir.
2024K10-225417	Anıt Ağaç Envanteri, Budanması ve Rehabilitasyonu (**.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2024-2027	31.500.000	5.500.000	12.000.000	4.830.262	% 40,25	2025 yılında Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa İlleri Anıt Ağaç Rehabilitasyonu Hizmet Alım İşi için son hakediş ödenmiş olup, 2026 yılı için projelerin ihalesi gerçekleştirilecektir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2025K10-246753	Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Araştırma (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2028	59.450.000	4.500.000	15.250.000	0	% 0,00	
2025K10-246753- 246754	Göksu Deltası ÖÇKB Karasal Alanlarda Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	5.920.000	750.000	3.670.000	0	% 0,00	Söz konusu dönemde herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir. Proje planlandığı şekilde devam etmektedir.
2025K10-246753- 246757	Uzungöl ÖÇKB Denizel ve Karasal Alanlarında Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	5.000.000	1.000.000	2.500.000	0	% 0,00	Söz konusu dönemde herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir. Proje planlandığı şekilde devam etmektedir.
2025K10-246753- 246759	Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Alanlarında Biyçeşitlilik Araştırma	2025-2027	6.530.000	2.750.000	2.280.000	0	% 0,00	Söz konusu dönemde herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir. Proje planlandığı şekilde devam etmektedir.
2025K10-246753- 271334	Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi Denizel Karasal ve Kıyı Alanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Araştırılması	2026-2028	30.000.000		4.400.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.
2025K10-246753- 271337	Pamukkale ÖÇK Bölgesi Karasal Alanlarda Biyolojik Çeşitliliğin Araştırılması	2026-2028	12.000.000		2.400.000	0	% 0,00	İhale Öncesi iş ve işlemleri yapılmaktadır.
2025K10-246767	Marmara Denizi ve Adalar ÖÇKB Yönetim Planı Hazırlama (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2025-2027	24.000.000	6.000.000	8.000.000	0	% 0,00	2025 yılında 1. ödemesi yapılmış olup ,birinci dönem paydaş toplantısı yapılacaktır.
2026K10-272285	Korunan Alanlarda Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi Kurulması (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2026-2026	7.000.000		7.000.000	0	% 0,00	İdarelerle protokol çalışması devam etmektedir.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K10-272319	Mağaraların Araştırılması (*.*.Döner Sermaye)-(Çevre Sektörü)	2026-2026	10.000.000		10.000.000	0	% 0,00	Projeye ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
2025K10-282292	İklim Değişikliği Direncini Artıran Deniz Koruma Alanları Ağı ile Deniz Ekosistem Bağlantısı [AB-Hibe Ödeneği] (Çevre Sektörü)	2025-2028	155.924.000	31.185.000	31.185.000	0	% 0,00	Proje devam etmekte olup henüz hakediş ödemesi yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği				4.500.000	0	% 0,00	
12 Proje		06 ve 07 TOPLAM	2.016.388.000	838.907.000	466.431.000	237.509.953	% 50,92	
19 Proje		DÖNER SERMAYE	4.096.406.000	1.722.290.000	1.024.812.000	10.930.262	% 1,07	
		GENEL TOPLAM	6.112.794.000	2.561.197.000	1.491.243.000	248.440.215	% 16,66	
1 Proje		Belediye Katkısı	2.165.000.000	1.050.000.000	500.000.000	109.053.111	% 21,81	
		Kamu laştırma	0	0	4.500.000	0	% 0,00	
1 Proje		AB KATKISI	155.924.000	31.185.000	31.185.000	0	% 0,00	

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2003K08-656	Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2003-2027	8.100.000	5.800.000	1.100.000	0	% 0,00	YERELBİLGİ Sistemi ile bu yıl 15 adet form toplanması planlanmıştır. 01.01.2026-31.03.2026 tarihleri arasında 7 konuda form toplanmıştır. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç olan veriler Sistem ile toplanmaktadır.
2017K08-3797	Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Belediye Hizmetleri Sektörü)	2017-2026	24.500.000	6.500.000	6.000.000	0	% 0,00	Söz konusu proj ile ilgili olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçları beklenmiştir. Yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ancak gelinen noktada Cumhurbaşkanlığının 2024/7 Sayılı ve Tasarruf Tedbirleri Konulu Genelgesi yayımlanmış olup yapılacak ihaleler durdurulmuştur.
2026K07-271273	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) (Dipnot: 210) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü)	2026-2026	9.879.704.000		9.879.704.000	0	% 0,00	Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesinin uygulanmasına ilişkin 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Kararı henüz yayımlanmadığından, 2026 yılı için herhangi bir gerçekleştirme verisi bulunmamaktadır.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	9.912.304.000	12.300.000	7.100.000	0	% 0,00	

Dipnot: 210

36-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacak olup iller bazında dağılımı, kullanılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından karara bağlanacaktır.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K01-271266	Muhtelif İşler (Genel İdare Sektörü)	2026-2026	22.500.000		22.500.000	0	% 0,00	Henüz bir harcama yapılmamıştır.
2026K01-271266-271267	Harita Alımları	2026-2026	250.000		250.000	0	% 0,00	Henüz bir harcama yapılmamıştır.
2026K01-271266-271268	Plan, Proje Alımları	2026-2026	250.000		250.000	0	% 0,00	Henüz bir harcama yapılmamıştır.
2026K01-271266-271269	Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri	2026-2026	22.000.000		22.000.000	0	% 0,00	Henüz bir harcama yapılmamıştır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Genel İdare Sektörü)	2026-2028			402.000.000	321.361.676	% 79,94	402.000.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış 321.361.676,00.-₺ harcama yapılmış olup, 80.638.324,00.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
Kamulaştırma	"06.4-Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" Ödeneği (Çevre Sektörü)	2026-2028			7.500.000	408.277	% 5,44	7.500.000,00.-₺ başlangıç ödeneğinin tamamı serbest bırakılmış, 408.277,00.-₺ harcama yapılmış olup, 7.091.723,00.-₺ kullanılabilir ödenek bulunmaktadır.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	22.500.000	0	22.500.000	0	% 0,00	
Kamu laştırma			0	0	409.500.000	321.769.953	% 78,58	

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-229765	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (Ormancılık Sektörü)	2024-2026	150.550.000	77.700.000	72.850.000	0	% 0,00	
2024A05-229765-229766	Erozyon, Sel, Çığ, Kaya Yuvarlanması ve Heyelanla Mücadele	2024-2026	59.000.000	57.700.000	1.300.000	0	% 0,00	2025 yılında başlanan Çölleşmeye Hassas Alanlarda Arazi Kullanım Performansının Belirlenmesi Projesi; Konya ve Şanlıurfa Model Çalışmaları devam etmektedir. Toprak profilleri alınmış olup toprak örneklerinin laboratuvar analizleri yapılmıştır. 2026 yılı içerisinde projenin nihai hale getirilmesi hedeflenmektedir.
2024A05-229765-248146	Çığ Alanlarının Sağlıklı Ekosisteme Dönüştürülmesi Modeli	2025-2026	41.250.000	20.000.000	21.250.000	0	% 0,00	* Erzurum İli Palandöken Kayak Merkezi Jandarma Bölgesi Çığ Kontrol Uygulaması Faz-2 Projesi kapsamında mevsim koşulları nedeniyle faaliyet bulunmamaktadır. * İklim Değişikliğine Uyumlu, Potansiyel Çığ Alanlarında Dayanıklı Bitki Türlerinin Tespiti Projesi kapsamında mevsim koşulları nedeniyle faaliyet bulunmamaktadır.
2024A05-229765-271248	Erozyon Kontrolü Proje, Uygulama ve Model Saha (*.Döner Sermaye)	2026-2026	10.000.000		10.000.000	0	% 0,00	Saha etüt çalışmaları devam etmektedir.
2024A05-229765-271249	Toprak Muhafaza ve Yutak Alan Bakım, Onarım ve Tamamlama	2026-2026	13.000.000		13.000.000	0	% 0,00	* Iğdır, Aksaray ve Kırşehir illerinde bulunan sahalar için bakım işi ihalesi hazırlıkları devam etmektedir. *Ankara, Yozgat, Kahramanmaraş, Konya, Malatya Karbon Yutak Alan Bakım işi ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.
2024A05-229765-271250	Yutak Alan Etüt-Proje ve Uygulama (*.Döner Sermaye)	2026-2026	20.600.000		20.600.000	0	% 0,00	Eskişehir, Sivas , Çorum, Kırklareli, Hatay illerinde yapılacak yeni karbon yutak alan çalışmaları için saha etütleri ve fizibilite çalışmaları devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip ihale ve uygulama süreçlerine geçilecektir.
2024A05-229765-271251	Arazi Kullanımı ve Performans Çalışmaları	2026-2026	6.700.000		6.700.000	0	% 0,00	Saha etüt çalışmaları devam etmektedir.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2023A05-196779	Doğal Kaynakların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Ormanlık Sektörü)	2023-2027	75.500.000	27.500.000	27.700.000	0	% 0,00	
2023A05-196779-196780	UASİS İzleme ve Değerlendirme	2023-2027	50.000.000	23.000.000	11.000.000	0	% 0,00	2025-2026 yılı 2.Bakım Hizmeti devam etmekte olup, son ödeme (1.200.000) Temmuz ayında 2026 yılı bütçesinden ödenecektir. Geri kalan bütçe 2026-2027 yılı gerçekleştirilecek olan 3. Bakım Hizmeti işi için harcanılması planlanmaktadır.
2023A05-196779-196781	Erozyon Kaynaklı Toprak Kayıpları İzleme Sistemi	2023-2026	4.850.000	1.850.000	3.000.000	0	% 0,00	İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2023A05-196779-225368	Fırat-Dicle Havzaları Kum ve Toz Kaynak Alanlarının Değişimlerinin İncelenmesi	2024-2026	15.650.000	2.650.000	13.000.000	0	% 0,00	Projenin ilk aşaması olan Çalışma Planı Raporu tamamlanmış olup Literatür Taraması ve Metodoloji Raporunun hazırlanması işlemleri devam etmektedir.
2023A05-196779-271247	Havza Bazlı Çölleşme Yönetim Eylem Planı (*.Döner Sermaye)	2026-2027	5.000.000		700.000	0	% 0,00	Havza Bazlı Çölleşme Yönetim Eylem Planı Teknik Şartnamesi hazırlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2026A05-271253	Muhtelif İşler (Ormanlık Sektörü)	2026-2026	750.000		750.000	0	% 0,00	
2026A05-271253-271254	Mamul Mal Alımları	2026-2026	700.000		700.000	0	% 0,00	Mal alımına yönelik planlamalar devam etmektedir.
2026A05-271253-283224	Bakım Onarım	2026-2026	50.000		50.000	0	% 0,00	Yıl içinde oluşacak bakım ihtiyaçlarına göre değerlendirilecektir.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026A05-271255	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Araştırma ve Geliştirme (*.Döner Sermaye) (Ormancılık Sektörü)	2026-2028	13.676.000		5.500.000	0	% 0,00	
2026A05-271255-271256	Kurak Alanlarda Rüzgar Erozyonu ile Bozulmuş Ekosistemlerin Restorasyon Yöntemleri	2026-2028	3.050.000		1.500.000	0	% 0,00	İhale hazırlıkları devam etmektedir.
2026A05-271255-271258	Evsel-Kentsel Arıtma Çamurlarının Marjinal ve Bozulmuş Sahaların Islahı	2026-2027	4.126.000		1.500.000	0	% 0,00	Ankara Pursaklar Örneği Faz-3 için arıtma çamuru analizi yaptırılmış olup saha çalışmaları kontrol edilmiştir.
2026A05-271255-271260	Yaşam Döngüsü Analizi ile Karbon Tutma Kapasitelerinin Belirlenmesi	2026-2028	6.500.000		2.500.000	0	% 0,00	Teknik Şartname hazırlıkları devam etmektedir.
2026A05-271261	Hidrometeorolojik Afetlerle Mücadele (*.Döner Sermaye) (Ormancılık Sektörü)	2026-2027	115.290.000		68.200.000	0	% 0,00	Ana Proje olup açıklaması alt projelerde yapılmıştır.
2026A05-271261-271262	Çığ Kontrol Etüt	2026-2026	2.950.000		2.950.000	0	% 0,00	Çığ Kontrol Projesi tanzimi için saha etüt çalışmaları devam etmektedir.
2026A05-271261-271263	Çığ Kontrol Uygulama	2026-2027	42.750.000		28.000.000	0	% 0,00	"Isparta İli Davraz Kayak Merkezi Çığ Kontrol Uygulaması" için mevsim koşulları nedeniyle faaliyet bulunmamaktadır.
2026A05-271261-271264	Çığ Yayılım Haritalanması, Operasyonel Tahmin Sistemleri, Çığ Risk Uyarı Sistemi	2026-2027	31.850.000		13.250.000	0	% 0,00	"Çığ Yayılım Haritalanması, Operasyonel Tahmin Sistemleri, Çığ Risk Uyarı Sistemi" için teknik şartname hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.
2026A05-271261-271265	Sel ve Heyelan Kontrolü	2026-2027	37.740.000		24.000.000	0	% 0,00	* Zonguldak ve Samsun illeri Yukarı Havza Sel Kontrol Projeleri'nin ön etüt çalışmaları tamamlanmıştır. *Türkiye Yukarı Havzalarının, Potansiyel Sel Risk Alanlarının Belirlenmesi Projesi için teknik şartname hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. *Ulusal Heyelan Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması işi için teknik şartname hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. *Türkiye Potansiyel Moloz Akması Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Duyarlılık ve Tehlike Modellerinin Geliştirilmesi Projesi için teknik şartname hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.

ÇÖLLEŞME VE EREZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024A05-225371	Doğu Karadeniz Bölgesinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hibesi (Ormancılık Sektörü)	2024-2027	58.304.000	32.438.000	20.983.000	867.181	% 4,13	<ul style="list-style-type: none">Proje Yönlendirme Komitesi (PSC) Toplantısı yapılmış olup iş planı ve bütçe onaylanmıştır.Çiftçi eğitimi ve SAY uygulamaları için bilgilendirme dokümanları hazırlanmış olup teknik görüşe sunulmuştur.Entegre Doğal Kaynak Yönetim Planı hazırlıkları sahada devam etmekte olup paydaş kurum görüşmeleri yapılmıştır.Rize Kireçhane'de "Çay Tarımında Sürdürülebilir Arazi Yönetimi" eğitiminin hazırlık toplantısı yapılmıştır.Heyelan duyarlılık haritası oluşturulmuştur.
3 Proje		06 ve 07 TOPLAM	191.200.000	105.200.000	70.000.000	0	% 0,00	
4 Proje		DÖNER SERMAYE	164.566.000	0	105.000.000	0	% 0,00	
		GENEL TOPLAM	355.766.000	105.200.000	175.000.000	0	% 0,00	
1 Proje		UNDP HİBESİ	58.304.000	32.438.000	20.983.000	867.181	% 4,13	

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2017K09-3813	Hizmet Binaları İnşaatı (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)							
2017K09-3813- 152319	Hizmet Binaları İnşaatı Kesin Hesabı (**.Döner Sermaye)	2020-2026	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	% 0,00	Geçmiş yıllarda inşaa edilen İl Müdürlükleri binalarında kesin hesap ödemesi gerektiğinde kullanılmaktadır. 2026 yılında ödeme talebi gelmemiştir.
2017K09-3813- 226070	Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (**.Döner Sermaye)	2024-2026	63.391.000	62.891.000	500.000	0	% 0,00	İhalesi Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 12.06.2024 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 43.850.000 TL (KDV dahil 52.620.000 TL) üzerinden sözleşmesi 24.07.2024 tarihinde imzalanmıştır. İnşaat tamamlanmıştır.
2024K09-230960	Deprem Yeni İnşaat İşleri (Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası yapımı) (**.Döner Sermaye) (Şehirleşme Sektörü)	2024-2026	331.700.000	251.700.000	80.000.000	24.998.516	% 31,25	İhalesi Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 14.01.2025 tarihinde yapılmış olup, KDV hariç 214.621.000 TL (KDV dahil 257.545.200 TL) üzerinden sözleşmesi 17.03.2025 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEREN SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2026K09-271301	Muhtelif İşler (SGB-İl Müdürlükleri ve TVK Genel Müdürlüğü Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
2026K09-271301- 271302	Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı	2026-2026	10.000.000		10.000.000	0	% 0,00	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2026K09-271301- 271303	Hizmet Binası Onarımı	2026-2026	13.500.000		13.500.000	0	% 0,00	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2026G00-271278	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)							
2026G00-271278- 271280	Taşra Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	2026-2026	5.900.000		5.900.000	0	% 0,00	İl Müdürlüklerinden gelen talep doğrultusunda kullanılmaktadır.
2 Proje		06 ve 07 TOPLAM	29.400.000	0	29.400.000	0	% 0,00	
2 Proje		DÖNER SERMAYE	397.091.000	315.591.000	81.500.000	24.998.516	% 30,67	
		GENEL TOPLAM	426.491.000	315.591.000	110.900.000	24.998.516	% 22,54	

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2026 Yılı Fiyatlarıyla-TL

PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	REVİZE PROJE TUTARI	2025 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2026 YILI REVİZE YATIRIM ÖDENEĞİ	01.01.2026 31.03.2026 ARASI HARCAMA	Gerçekleşme ORANI	PROJEDE GELİNEK SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA
2024D00-225926	GES Kurulumu (Elmadağ 4MW Güneş Enerji Santrali Yapımı) (Yapı İşleri Genel Müd. ile Ortak Proje) (** Döner Sermaye) (Enerji Sektörü)	2024-2026	233.280.000	133.280.000	100.000.000	2.347.422	% 2,35	Projenin ödenekleri ve harcamaları Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.
2024K14-228238	Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı (Yapı İşleri Genel Müd. ile Ortak Proje) (** Döner Sermaye) (Afetler Sektörü)	2024-2026	284.676.000	84.676.000	200.000.000	16.902.305	% 8,45	Projenin ödenekleri ve harcamaları Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.
2026G00-271278	Lojman Onarımı (SGB-Destek Ortak Proje) (Konut Sektörü)	2026-2026	100.000		100.000	0	% 0,00	
2026G00-271278- 271279	Merkez Teşkilatına Tahsisli Lojmanların Onarımı	2026-2026	100.000		100.000	0	% 0,00	
2026K09-271301	Muhtelif İşler (SGB-İl Müdürlükleri ve TVK Genel Müdürlüğü Ortak Proje) (Şehirleşme Sektörü)							
2026K09-271301- 271305	Taşıt Alımı-2 (** Döner Sermaye)	2026-2026	24.950.000		24.950.000	0	% 0,00	03.04.2026 tarihli ve 11157 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile araçların edinilmesi uygun görülmüştür.
1 Proje		06 ve 07 TOPLAM	100.000	0	100.000	0	% 0,00	
3 Proje		DÖNER SERMAYE	24.950.000	0	24.950.000	0	% 0,00	
		GENEL TOPLAM	25.050.000	0	25.050.000	0	% 0,00	

Not-1: "GES Kurulumu" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-2: "Afet ve Acil Durum Lojistik Merkezi Yapımı" projesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak projedir. Ödeneği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tablosunda toplama dahil edildi.

Not-3: "Muhtelif İşler" projesi SGB-İl Müdürlükleri ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile ortak projedir.
