



**T.C.  
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI  
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



**Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği  
Projesi (KADEV)**

**Fırat Üniversitesi ve Tunceli Kamu Binaları Yapısal Değerlendirme, Enerji  
Etüdü, Yapısal - Enerji Güçlendirme Tasarımı ve İnşaat Kontrollüğü  
Danışmanlık Hizmetleri  
(WB/CS-DESSUP-05)**

**FIRAT ÜNİVERSİTESİ  
GRUP-1 BİNALARI**

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANI**

**OCAK  
2026**

### KİŞİSEL VERİ İŞLEME KURALLARI

Bu dokümanda yer alan kişisel verilerle ilgili olarak,  
**KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU** (Resmî Gazete  
Tarihi: 07.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29677) çerçevesinde;



Söz konusu gerçek kişiler, aşağıdaki hususlarla ilgili olarak  
aydınlatılmıştır.

- Veri Sorumluları,
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
- Kişisel verilerin işlendiği bu dokümanın ilgili bölümleri,
- İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla  
aktarılabileceği,



İş bu dokümanı inceleyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda  
belirtilen kurallara harfiyen uymaları gerekmektedir;

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini  
önlemek,
- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini  
önlemek,
- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun  
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü  
teknik ve idari tedbirleri almak,

# İçindekiler

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Terimler& Kısaltmalar.....                                                                                                    | 7  |
| 2. Amaç.....                                                                                                                     | 8  |
| 3. Kapsam .....                                                                                                                  | 8  |
| 4. Yasal Düzenlemeler .....                                                                                                      | 9  |
| 5. Yönetimin Taahhüdü & İSG Hedefleri.....                                                                                       | 11 |
| 5.1. Yönetim Taahhüdü .....                                                                                                      | 11 |
| 5.2. Politika .....                                                                                                              | 11 |
| 5.2.1. İSGP ile İlgili Temel Stratejiler.....                                                                                    | 12 |
| 5.3. Hedefler.....                                                                                                               | 12 |
| 6. Proje Bilgileri.....                                                                                                          | 14 |
| 6.1. Genel Bilgiler .....                                                                                                        | 14 |
| 6.1.1 Proje Kapsamındaki Binalar .....                                                                                           | 14 |
| 6.2 İnşaat Öncesi Bilgiler & Vaziyet Planları .....                                                                              | 32 |
| 6.3 Genel Şantiye Kuralları .....                                                                                                | 32 |
| 7. Sağlık & Güvenlik Organizasyonu .....                                                                                         | 34 |
| 7.1 Müşavir .....                                                                                                                | 35 |
| 7.1.1. Proje Müdürünün Görevleri.....                                                                                            | 35 |
| 7.1.2. İSG Uzmanının Görevleri.....                                                                                              | 36 |
| 7.1.3. İşyeri Hekimlerinin Görevleri.....                                                                                        | 38 |
| 7.1.4. Teknik Uzmanların İSG Görevleri .....                                                                                     | 40 |
| 7.1.5. Sosyal Uzmanın İSG Görevleri .....                                                                                        | 41 |
| 7.1.6. Destek Personeli Görevleri.....                                                                                           | 41 |
| 7.2 Yüklenici Firma.....                                                                                                         | 41 |
| 7.2.1. İşveren & İşveren Vekili Görevleri .....                                                                                  | 41 |
| 7.2.2. İSG Uzmanlarının Görevleri .....                                                                                          | 41 |
| 7.2.3. Alt Yüklenici İşyeri Hekimlerinin Görevleri.....                                                                          | 42 |
| 7.2.4. Teknik Uzmanların İSG Görevleri .....                                                                                     | 42 |
| 7.2.5. Çalışan Temsilcisi Görevleri .....                                                                                        | 42 |
| 7.2.6. Destek Personeli Görevleri.....                                                                                           | 43 |
| 8. İşlerin Yönetimi .....                                                                                                        | 44 |
| 8.1 Çalışma Yöntemleri.....                                                                                                      | 45 |
| 8.1.1 Yapısal Güçlendirme .....                                                                                                  | 45 |
| 8.1.2 Enerji Verimliliği.....                                                                                                    | 64 |
| 9. Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi .....                                                                         | 85 |
| 9.1. Genel İnşaat Sahasını Etkileyen Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi.....                                        | 85 |
| 9.2. İşle Alakalı Muhtemel Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi ve Üçüncü Taraflara Olan Etkinin Değerlendirilmesi..... | 86 |
| 9.3. Zaman ve Mekan Açısından Çıkışan Görevlerden Kaynaklanan Riskler .....                                                      | 87 |
| 10. İş Ekipmanları İhtiyacının ve Niteliklerinin Belirlenmesi .....                                                              | 87 |
| 10.1 Koruyucu Donanım İhtiyacının Belirlenmesi .....                                                                             | 88 |
| 10.1.1. Toplu Koruma Sistemleri.....                                                                                             | 88 |

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10.1.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar .....       | 89                                      |
| 11. İş İzin Sistemi .....                       | 90                                      |
| 12. EKED Sistemi .....                          | 91                                      |
| 13. Gözlem ve Denetim .....                     | 92                                      |
| 14. Çalışan Eğitimleri .....                    | 99                                      |
| 14.1. Personel Sağlık Durumlarının Takibi ..... | 99                                      |
| 14.2. Personel Mesleki Yeterliliği .....        | 99                                      |
| 15. Acil Durumlara Hazırlık .....               | 99                                      |
| 15.1. Acil Durum Toplanma Yerleri .....         | 102                                     |
| 15.2. ADME ve İlk Yardımcı Ekipleri .....       | 102                                     |
| 16. Kaza ve Olay Araştırması .....              | 103                                     |
| 17. İSG Bütçesi .....                           | 105                                     |
| 18. Ekler .....                                 | 106                                     |
| Ek-1 Trafik Planı, Acil Toplanma Alanı, .....   | 107                                     |
| Ek- 2 İş İzin Formu .....                       | 119                                     |
| Ek- 3 Kaza Bildirim Formu .....                 | <b>Hata! Yer işareti tanımlanmamış.</b> |
| Ek- 4 Güçlendirme Elemanları Tablosu .....      | 121                                     |

## Tablolar

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tablo 1 İlgili Yasal Düzenleme Listesi (Kanun).....                                                                   | 9   |
| Tablo 2 İlgili Yasal Düzenleme Listesi.....                                                                           | 9   |
| Tablo 3 Hedefler Tablosu.....                                                                                         | 12  |
| Tablo 4 Müşavir Bilgi Tablosu .....                                                                                   | 14  |
| Tablo 5 Elazığ Fırat Üniversitesi Grup1 Bina Listesi .....                                                            | 14  |
| Tablo 6 Elazığ Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Genel Bilgi Tablosu.....                                     | 17  |
| Tablo 7 Elazığ Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri (Eski Kütüphane)Genel Bilgi Tablosu .....                            | 18  |
| Tablo 8 Elazığ Fırat Üniversitesi Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Genel Bilgi Tablosu.....               | 19  |
| Tablo 9 Elazığ Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Binası Genel Bilgi Tablosu .....                              | 20  |
| Tablo 10 Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Genel Bilgi Tablosu .....                                      | 21  |
| Tablo 11 Elazığ Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Genel Bilgi Tablosu.....                                      | 22  |
| Tablo 12 Elazığ Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Genel Bilgi Tablosu.....                           | 23  |
| Tablo 13 Elazığ Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Genel Bilgi Tablosu .....                                      | 24  |
| Tablo 14 Elazığ Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Ek Binası Genel Bilgi Tablosu.....                      | 25  |
| Tablo 15 Elazığ Fırat Üniversitesi Misafirhane Binası Genel Bilgi Tablosu .....                                       | 26  |
| Tablo 16 Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Genel Bilgi Tablosu .....                          | 27  |
| Tablo 17 Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlük Binası Genel Bilgi Tablosu.....                                          | 28  |
| Tablo 18 Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metal Atölyesi Genel Bilgi Tablosu.....                        | 29  |
| Tablo 19 Elazığ Fırat Üniversitesi Yeni Prefabrik Hafif Çelik Kimya Laboratuvar Binası Genel Bilgi Tablosu .....      | 30  |
| Tablo 20 Fırat Üniversitesi Tablo 5’de yer alan Grup 1 Binalarında Yapılması Planlanan Çalışmalar.....                | 30  |
| Tablo 21 Fırat Üniversitesi Tablo 5 de belirtilen 13 ad binada Yapılması Planlanan Çalışmalar.....                    | 31  |
| Tablo 22 Güçlendirme & Altyapı İşleri Kontrol Tablosu .....                                                           | 51  |
| Tablo 23 Risk Analizi .....                                                                                           | 52  |
| Tablo 24 Arazi Tipi GES Uygulaması Kontrol Tablosu.....                                                               | 66  |
| Tablo 25 Arazi tipi GES Uygulaması Risk Analizi .....                                                                 | 67  |
| Tablo 26 Rooftop Tesisi kontrol tablosu .....                                                                         | 70  |
| Tablo 27 Rooftop Tesisi risk analizi.....                                                                             | 71  |
| Tablo 28 Bina sirkülasyon pompa değişim işleri kontrol tablosu.....                                                   | 73  |
| Tablo 29 Bina sirkülasyon pompa değişimi işleri risk analizi .....                                                    | 74  |
| Tablo 30 Mevcut Aydınlatma Elemanlarının LED Dönüşümünün Tamamlanması İşleri Kontrol Planı .....                      | 76  |
| Tablo 31 Aydınlatma Elemanlarının LED Dönüşümünün Tamamlanması İşleri Risk Analizi .....                              | 77  |
| Tablo 32 Elektronik Bina Yönetim Sistemi ve Otomasyon Sistemi İşleri Kontrol Planı.....                               | 78  |
| Tablo 33 Elektronik Bina Yönetim Sistemi ve Otomasyon Sistemi Risk Analiz.....                                        | 79  |
| Tablo 34 Mekanik Tesisat Ekipmanlarının Uygun Yalıtım Malzemesi ile İzolasyon Sağlanması işleri Kontrol Tablosu ..... | 80  |
| Tablo 35 Prefabrik Hafif Çelik Bina Montaj İşleri Kontrol Tablosu.....                                                | 81  |
| Tablo 36 Prefabrik Hafif Çelik Bina Montaj İşleri Risk Analizi.....                                                   | 83  |
| Tablo 37 Toplu Koruma Sistemleri Listesi.....                                                                         | 88  |
| Tablo 38 KKD Tablosu.....                                                                                             | 89  |
| Tablo 39 İSG Kontrol Listesi.....                                                                                     | 92  |
| Tablo 40 İSG İzleme Planı.....                                                                                        | 94  |
| Tablo 41 Acil Durumlar ve Acil Durumlara İlişkin Önleyici Tedbirler .....                                             | 100 |
| Tablo 42 Tahmini İSG Bütçesi .....                                                                                    | 105 |

## Şekiller

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Şekil 1 Elazığ Fırat Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Öğrenci İşleri, Makine Mühendisliği, Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Kimya Mühendisliği Laboratuvarı, Elektrik Müh. Fakültesi, İnşaat Müh Fakültesi, Jeoloji Müh., Bilgisayar Metalurji, Mlz Mühendisliği Binaları ve Yeni Prefabrik Hafif Çelik Kimya Laboratuvar Bina Lokasyonu Uydu Görüntüsü ..... | 15  |
| Şekil 2 Elazığ Fırat Üniversitesi, Rektörlük Binası, Metal Teknoloji Atölyesi ve Arazi Tipi Ges Lokasyonu Uydu Görüntüsü.....                                                                                                                                                                                                                                               | 16  |
| Şekil 3 Atatürk Kültür Merkezi Koordinat Bilgileri.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17  |
| Şekil 4 Öğrenci İşleri (Eski Kütüphane) Binası Koordinat Bilgileri .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18  |
| Şekil 5 Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19  |
| Şekil 6 Elektrik Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  |
| Şekil 7 İnşaat Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21  |
| Şekil 8 Jeoloji Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  |
| Şekil 9 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Koordinat Bilgileri .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23  |
| Şekil 10 Makina Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24  |
| Şekil 11 Makina Mühendisliği Ek Binası Koordinat Bilgileri.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25  |
| Şekil 12 Misafirhane Binası Koordinat Bilgileri .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26  |
| Şekil 13 Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Koordinat Bilgileri .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27  |
| Şekil 14 Rektörlük Binası Koordinat Bilgileri.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28  |
| Şekil 15 Teknoloji Fakültesi, Metal Atölye Binası Koordinat Bilgileri .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29  |
| Şekil 16 Fırat Üniversitesi Sağlık ve Güvenlik Organizasyon Şeması .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34  |
| Şekil 17 Fırat Üniversitesi Grup1 Binaları İş Programı.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44  |
| Şekil 18 Faz Dedektörü Örnek Görseli .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46  |
| Şekil 19 Pat Test Etiketleri Örnek Görsel .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46  |
| Şekil 20 Ankraj Çubuklarının Çakılması Örnek Görsel .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47  |
| Şekil 21 Dış Cephe İskele Örnek Görseli.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50  |
| Şekil 22 Fırat Üniversitesi PV Yerleşimi.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64  |
| Şekil 23 Mobil İskele Örnek Gösterim.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75  |
| Şekil 24 Kilitleme Etiketleme Eğitimi Örnekleri.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91  |
| Şekil 25 Atatürk Kültür Merkezi ve Öğrenci İşleri(Eski Kütüphane) Şantiye Trafik Planı .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 |
| Şekil 26 Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Şantiye Trafik Planı .....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109 |
| Şekil 27 İnşaat Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislik Fakültesi, Şantiye Trafik Planı .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 |
| Şekil 28 Makine Mühendisliği Fakültesi, Makine Mühendislik Fakültesi Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Şantiye Trafik Planı .....                                                                                                                                                                                                                                    | 111 |
| Şekil 29 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Binası Trafik Planı .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 |
| Şekil 30 Misafirhane Şantiye Trafik Planı.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113 |
| Şekil 31 Elektrik Mühendisliği Fakültesi Şantiye Trafik Planı .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 |
| Şekil 32 Rektörlük Binası Trafik Planı.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115 |
| Şekil 33 Metal Atölyesi Trafik Planı .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116 |
| Şekil 34 Yeni Prefabrik Laboratuvar Binası Trafik Planı.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116 |
| Şekil 35 Arazi Tipi GES Trafik Planı.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117 |
| Şekil 36 Vaziyet Planı.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 |

## 1. Terimler& Kısaltmalar

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADME                 | Acil Durum Müdahale Ekibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alt Yüklenici        | Yüklenici firma tarafından projenin bir kısmını yapmak üzere görevlendirilen firma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ÇŞİDB                | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Düzeltilici Faaliyet | Saptanmış bir uygunsuzluğun; sebebinin ve istenmeyen diğer durumların kök nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen çalışmalar bütünü. (Düzeltilici faaliyetlerin; tespit tarihi, tespiti yapan, sorumlu birim/kişiler, uygunsuzluk ve <b>kök neden tanımı</b> , düzeltilici aksiyon önerileri, termin, uygunsuzluğun giderilme tarihi ve yöntemini içerecek şekilde kayıt altına alınması zorunludur.) |
| EKED                 | Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IGU                  | İş Güvenliği Uzmanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ISGP                 | İş Sağlığı ve Güvenliği Planı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KKD                  | Kişisel Koruyucu Donanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kök Neden Analizi    | Bir olayı, sorunu veya istenmeyen sonuçları tanımlarken/değerlendirirken; acil nedenlerin ötesine geçmek ve ele alındığında, gelecekte benzer olayların veya sorunların tekrarlanmasını önlemek için ana sebeplerin/unsurların belirlenmesi. (Düzeltilici aksiyonlar; söz konusu ana sebeplerin/unsurların ortadan kaldırılması ya da düzeltilmesine odaklanmalıdır.)                                                 |
| Major                | Büyük, çok önemli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MSDS                 | Material Safety Data Sheet (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu *)<br>(*) Malzeme Güvenlik Formunun" adı, Türkçe Güvenlik Formu olarak değiştirilmiştir. (Bkz. 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik)                                                                                                       |
| Müşavir              | TİMA –OBS İş Ortaklığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAT                  | Portable Appliance Test (Taşınabilir Elektrikli Cihaz Testi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yararlanıcı Kurum    | Elazığ Fırat Üniversitesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Yüklenici            | Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale neticesinde, yapısal güçlendirme ve enerji verimliliği odaklı renovasyon faaliyetlerinin tamamını hayata geçirmekten sorumlu firma                                                                                                                                                                                                  |
| GES                  | Güneş Enerji Santrali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. Amaç

WB/CS-DESSUP 05 yapısal fizibilite, enerji denetimi, yapısal enerji güçlendirme, projelendirme ve inşaat kontrollüğü danışmanlık hizmetleri işi **YAPISAL GÜÇLENDİRME ve RENOVASYON süreci**

- Proje odaklı İnşaat süreci başlamadan önce Dış Ajanslardan elde edilmesi gereken Yüksek Tehlikeli İşleri kapsayan hizmetlerin tamamlanma beyanı,
- İnşaat faaliyetlerine ilişkin; tehlike ve risklerin, alınacak güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi,
- Yapım sürecinde görev alacak personellerin asgari şartlarının belirlenmesi, söz konusu asgari şartları karşılamayanların görev almalarının engellenmesi, amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda;

- Yapısal güçlendirme ve renovasyon sürecine ilişkin yapım metodu ve risk analizi,
- Personel nitelik çizelgeleri,
- Saha çalışmaları öncesi, esnası ve sonrasına ilişkin kontrol/denetim yöntemleri,
- Kayıt formları ve metotları,
- Yararlanıcı kurumlar tarafından alınması gereken ek güvenlik tedbirleri
- Hizmetlerin saha teslimi öncesinde Dış Tedarikçi Kuruluşları (Doğalgaz Yerel Dağıtım Şirketi, Elektrik Yerel Dağıtım Şirketi, Yerel Yönetim Altyapı ve Teknik İşler Müdürlükleri) nezdinde Proje ve Kurallara uygun olarak mevzuata uygun olarak gerekli operasyonların tamamlanması

Bu doküman içinde tanımlanmıştır.

Müşavir tarafından hazırlanan bu İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu, yüklenici firmaya proje bazlı operasyonlarla ilgili kendi İSG planını, Risk Değerlendirmelerini ve Yapım Yöntemlerinin hazırlaması gerektiği resmi kanallar aracılığıyla bildirilecektir. Bu işlem, Müşavir tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Planını referans alarak gerçekleştirilecektir.

## 3. Kapsam

WB/CS-DESSUP 05 projesi kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi yerleşkesinde yer alan 25 binanın birinci grup olarak 13 bina, Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali(GES) ve yeni yapılacak binasında yapılacak olan Yapısal Güçlendirme ve Yenileme İş Sağlığı Ve Güvenliği Planı , 54.055 m2 inşaat alanına sahip yapı listesi ve uydu görüntüleri "Proje Kapsamındaki Binalar" başlığı altında verilmektedir.

Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıda anlatılmıştır. Bu belge aşağıda listelenen çalışmalarla sınırlıdır.

- Yapı taşıyıcı elemanlarının güçlendirilmesi
- Enerji verimliliği çerçevesinde cephe ve cephe bileşenleri, mekanik ve elektrik sistem renovasyonları.
- Sürdürülebilir temiz enerji üretimi (Arazi tipi GES kurulumu)
- Yeni prefabrik hafif çelik kimya laboratuvar binası



#### 4. Yasal Düzenlemeler

Bu ISGP, öncelikle Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere, bunlara ek olarak da Dünya Bankası’nın başta ÇSS2: İşgücü ve Çalışma Koşulları, ÇSS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere Çevresel Sosyal Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. İlgili yasal düzenlemeler listesi aşağıda verilmiştir.

Tablo 1 İlgili Yasal Düzenleme Listesi (Kanun)

|                                                                                                          | <b><u>NO</u></b> | <b><u>KABUL TARİHİ</u></b> | <b><u>RESMİ GAZETE SAYISI &amp; TARİHİ</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| İş Kanunu                                                                                                | 4857             | 22.05.2003                 | RG: 10.06.2003/25134                           |
| İş Mahkemeleri Kanunu                                                                                    | 7036             | 12.10.2017                 | RG: 25.10.2017/30221                           |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu                                                                           | 6331             | 20.06.2012                 | RG: 30.06.2012/28726                           |
| Kabahatler Kanunu                                                                                        | 5326             | 30.03.2005                 | RG: 31.03.2005/25772 M.                        |
| Mesleki Eğitim Kanunu                                                                                    | 3308             | 05.06.1986                 | RG: 19.06.1986/19139                           |
| Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu) | 5544             | 21.09.2006                 | RG: 07.10.2006/26312                           |
| Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu                                                       | 5510             | 31.05.2006                 | RG: 16.06.2006/26200                           |
| Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun                               | 4703             | 29.06.2001                 | RG: 11.07.2001/24459                           |
| Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)                                     | 207 A(III)       | 10.12.1948                 | RG: 27.05.1949/7217                            |

Tablo 2 İlgili Yasal Düzenleme Listesi

|                                                                                               | <b><u>RESMİ GAZETE SAYISI &amp; TARİHİ</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Alt İşverenlik Yönetmeliği                                                                    | RG: 27.09.2008/27010<br>Değ. 25.08.2017/30165  |
| Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik                      | RG: 28.07.2013/28721                           |
| Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik       | RG: 15.05.2013/28648<br>Değ. 24.05.2018/30430  |
| Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | RG: 20.01.2022/31725                           |
| Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği                                                                | RG: 24.07.2013/28717                           |
| Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği                                          | RG: 28.04.2004/25466                           |
| Hijyen Eğitimi Yönetmeliği                                                                    | RG: 05.07.2013/28698                           |
| İlkyardım Yönetmeliği                                                                         | RG: 29.07.2015/29429                           |
| İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği                        | RG: 25.04.2013/28628<br>Değ. 18.02.2022/31754  |
| İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik          | RG: 29.12.2012/28512<br>Değ. 06.07.2021/31533  |

|                                                                                                              | <b><u>RESMİ GAZETE SAYISI &amp;<br/>TARİHİ</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği                                                            | RG: 06.04.2004/25425<br>Değ. 25.08.2017/30165      |
| İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği                                    | RG: 06.04.2004/25425<br>Değ. 25.08.2017/30165      |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği                                                               | RG: 29.12.2012/28512<br>Değ. 04.02.2024/32450      |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik                                                        | RG:18.01.2013/28532                                |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği                                                     | RG: 29.12.2012/28512                               |
| İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik        | RG: 20.07.2013/28713<br>Değ. 06.07.2021/31533      |
| İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik                                                               | RG: 18.06.2013/28681<br>Değ. 01.10.2021/31615      |
| İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik                                                             | RG: 30.03.2013/28603<br>Değ. 11.02.2016/29621      |
| Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik                            | RG:12.08.2013/28733<br>Değ. 10.10.2023/32345       |
| Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik                              | RG:23.06.2017/30105M<br>Değ. 23.12.2023/32408      |
| Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği                                                                         | RG: 01.05.2019/30761                               |
| Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik                                  | RG: 02.07.2013/28695                               |
| Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/at)                                                                     | RG: 03.03.2009/27158<br>Değ. 28.09.2014/29133      |
| Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği                           | RG: 15.10.2015/29503                               |
| Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği                                                                    | RG: 11.09.2013/28762                               |
| Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik | RG: 13.07.2013/28706<br>Değ. 11.05.2017/30063      |
| Tozla Mücadele Yönetmeliği                                                                                   | RG: 05.11.2013/28812                               |
| Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği                                                           | RG: 05.10.2013/28786<br>Değ. 31.12.2018/30642.4.M  |

## 5. Yönetimin Taahhüdü & İSG Hedefleri

### 5.1. Yönetim Taahhüdü

TİMA–OBS İş Ortaklığı yöneticisi olarak; Kamu Binalarında Sismik Güçlendirme ve Enerji Verimliliği projesinin, hazırlık ve uygulama aşamalarını kapsayacak şekilde projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede, çalışanların ve diğer paydaşların sağlık ve güvenliğini öncelikli olarak göz önünde bulundurulacağını, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve tanımlanmış diğer gerekliliklere tam olarak uyulacağını, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik her türlü tedbirin zamanında alınacağını, tedbirler belirlenirken ve uygulanırken toplu koruma önlemlerine öncelik verileceğini, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilgilendirilmesine önem verileceğini, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli ve yeterli kaynağın sağlanacağı ve yapılması gerekli harcamalardan kaçınılmayacağını, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanların öneri ve fikirlerinin göz önünde bulundurulacağı, yönetim ve çalışanlar arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli katılım, fikir alışverişi ve işbirliğinin sağlanacağını, planın bu şantiye koşulları, çalışanları ve diğer paydaşları için hazırlandığını, proje süresince uygulanacağını ve gerekli hallerde güncelleneceğini, projede görev alan en üst düzey yönetici de dahil olmak üzere her seviyedeki çalışana ve ziyaretçilere bu plan kapsamında üzerlerine düşen sorumlulukları konusunda yeterli bilgilendirmenin yapılacağını,

Tarih :06.01.2026  
Ad&Soyad : Bahadır ŞADAN  
İmza :

### 5.2. Politika

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyup, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayarak;

- İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm paydaşlarımız tarafından benimsenmesini ve sürekli gelişmesini sağlayacağız,
- İlgili tüm taraflara; İSG mevzuatları çerçevesinde her türlü tedbiri aldıracağız,
- Etkin risk değerlendirmesi ile iş kazalarını vuku bulmadan önce önlemek için çalışacağız,
- Çalışanlarımızı İSG konusunda mevzuat şartlarının üzerinde eğiteceğiz,
- Çalışanlarımızın; toplu iş sözleşmesi ve pazarlık haklarına saygı duyacak, bu yöndeki oluşumları destekleyeceğiz,
- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar Bildirgesi, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) çokuluslu şirketler için rehber ilkelerini referans kabul edeceğiz.
- Her seviyede ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimiz ve hizmet satın aldığımız firma çalışanlarının İSG kurallarına uymalarını sağlayacağız,
- Çalışanların kendilerini rahat, güvende ve çalışmaktan mutlu hissedecekleri sağlıklı bir ortam sağlayacak, akıl sağlığı sorunlarını ciddiye alarak, sorun ile karşılaşan tüm personeli destekleyeceğiz.

Tarih : 06.01.2026  
Ad Soyad : Bahadır ŞADAN  
İmza :

### 5.2.1. İSGP ile İlgili Temel Stratejiler

- Yönetim kadrolarının liderliği,
- Görüş ve önerilerini almak suretiyle tüm çalışanların İSG gerekliliklerine ve problemlerin çözümüne dahil edilerek katkı vermelerinin sağlanması,
- İş kazası meydana gelmeden, tehlikeleri tanımlayıp yeterli kontrol faaliyetlerinin önceden planlanıp uygulanması,
- Tüm çalışanlarda İş sağlığı ve Güvenliği konusunda yeteli düzeyde bilinç ve motivasyonun oluşmasının sağlanması.

### 5.3. Hedefler

Proje İSG performansının düzenli aralıklarla ölçülebilmesi için Proje sözleşmesi ile uyumlu “**performans ölçütleri**” ve her bir performans ölçütüne karşılık gelen ve aylık baz da takip edilecek ölçülebilir “**hedefler**” belirlenmiştir. Her ayın ilk haftası, bir önceki aya ilişkin İSG Aylık Faaliyet Raporu Müşavir tarafından uygun görülen formata göre hazırlanarak idareye iletilecektir.

Tablo 3 Hedefler Tablosu

| HEDEF TANIMI                                      | NİCEL VERİ    |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Kayıp zamansız iş kazası sayısı (en fazla)        | 0             |
| Kayıp zamanlı iş kazası sayısı (en fazla)         | 0             |
| Ramak kala olay sayısı (en fazla)                 | 2             |
| Kaza sıklık oranı (KSO <sup>1</sup> ) (en fazla)  | 60            |
| Kaza Ağırlık Oranı (KAO <sup>2</sup> ) (en fazla) | 0             |
| Bu proje özelinde İSG eğitimleri                  | 20 Birey.Saat |
| Bu proje özelinde yangın tatbikatı                | 1 Ad.         |
| Bu proje özelinde deprem ve İlk Yardım tatbikatı  | 1 Ad.         |

Performans kriterleri proje süresi boyunca sürekli olarak kümülatif olarak takip edilmektedir. Planlanan hedeflere göre elde edilen değerler aylık olarak analiz edilerek sapmalar tespit edilir ve gerekli düzeltici aksiyonlar başlatılır. Hedeflere ilişkin veri ve sonuçlar, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Aylık Faaliyet Raporu ile birlikte her ayın ilk haftasında danışmana iletilecektir.

Performans ölçümü kapsamında yanıtlanacak sorular şunlardır:

- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hedeflerimize ulaşıyor muyuz?
- İSG mevzuatına uyumlu çalışıyor muyuz?
- Risk değerlendirmesi sonucu planlanan kontrol faaliyetleri, risklerin azaltılmasında etkili oluyor mu?
- Kazalar, ramak kala olaylar kayıt altına alınıyor mu? Tekrar etmemeleri için kaza araştırması ve kök neden analizi yapılıyor mu?
- Sahada (Yüklenici veya Müşavir tarafından) tespit edilen uygunsuzluklar/ihlaller için Düzeltici Faaliyetler planlanıp uygulamaya alınıyor mu?
- Uygulamaya koyulan Düzeltici Faaliyetler etkin mi?
- İhtiyaç doğduğunda, hazırlanan İSGP’ de gerekli değişiklikler (revizyon) yapılıyor mu?

<sup>1</sup>  $KSO = \frac{\text{Toplam Kaza Sayısı}}{\text{Toplam Çalışma Süresi (saat)}} \times 1.000.000$

<sup>2</sup>  $KAO = \frac{\text{Toplam Kayıp Gün Sayısı}}{(\text{Toplam Çalışma Günü}-\text{Çalışma Olmayan Gün})} \times 1.000$

- Verilen eğitimler, çalışanlarda İSG bilinci ve motivasyonu oluşmasında etkili oluyor mu?

Müşavirin, Yüklenicinin İSG performansını takip edebilmesi için ihtiyaç duyacağı kayıtlar Yüklenici tarafından aylık baz da paylaşılacak:

- Kaza ve ramak kala olay raporları,
- Mevzuat gereği zorunlu olan eğitimlere ilişkin kayıtlar (eğitim kaydı, sertifika vb.)
- Makine/Ekipman Periyodik kontrol raporları

Yüklenici veya Müşavir tarafından kayıt altına alınan İSG ile ilgili uygunsuzlukların durumu (açık/kapalı, düzeltici faaliyet tanımı vb.)

## 6. Proje Bilgileri

### 6.1. Genel Bilgiler

Müşavir firmaya ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Tablo 4 Müşavir Bilgi Tablosu


|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MÜŞAVİR             | TİMA-OBS İŞ ORTAKLIĞI                                                              |
| SGK SİCİL NO        | 271120202003584600607-24/000                                                       |
| ADRES               | Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sk. Tunçludemir Plaza No:6 İç Kapı:5<br>Kadıköy/İSTANBUL |
| TELEFON / E-MAIL    | 0(216) 347 13 95 (Pbx) / info@timaengineering.com                                  |
| İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | Sevgideğer Bezinoglu   İGU-98457                                                   |
| İŞYERİ HEKİMİ       | Dr. Remzi Yıldız   İH-291113                                                       |

#### 6.1.1 Proje Kapsamındaki Binalar

Tablo 5 Elazığ Fırat Üniversitesi Grup1 Bina Listesi

| No            | Yapı Grubunun Adı                                   | Yapım Yılı | Toplam İnşaat Alanı (m²) |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1             | FÜ Atatürk Kültür Merkezi                           | 1967       | 2.102                    |
| 2             | Kütüphane Binası                                    | 1967       | 1.771                    |
| 3             | FÜ Bilgisayar Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği     | 2006       | 17.310                   |
| 4             | FÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü                     | 1968       | 5.482                    |
| 5             | FÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü                       | 1967       | 3.621                    |
| 6             | FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü                      | 1967       | 5.398                    |
| 7             | FÜ Kimya Mühendisliği Laboratuvarı                  | 1967       | 1.446                    |
| 8             | FÜ Makine Mühendisliği Bölümü                       | 1968       | 4.108                    |
| 9             | FÜ Makine Mühendisliği Bölümü Ek Bina               | 1968       | 2.929                    |
| 10            | FÜ Misafirhane                                      | 1970       | 1.478                    |
| 11            | FÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı                  | 1967       | 1.795                    |
| 12            | FÜ Rektörlük Binası                                 | 1987       | 4.335                    |
| 13            | FÜ Teknoloji Fakültesi Metal Atölyesi               | 1989       | 2.280                    |
| 14            | Yeni Prefabrik Hafif Çelik Kimya Laboratuvar Binası |            | 2.000                    |
| 15            | Arazi Tipi GES                                      |            | -                        |
| <b>TOPLAM</b> |                                                     |            | <b>56.055</b>            |



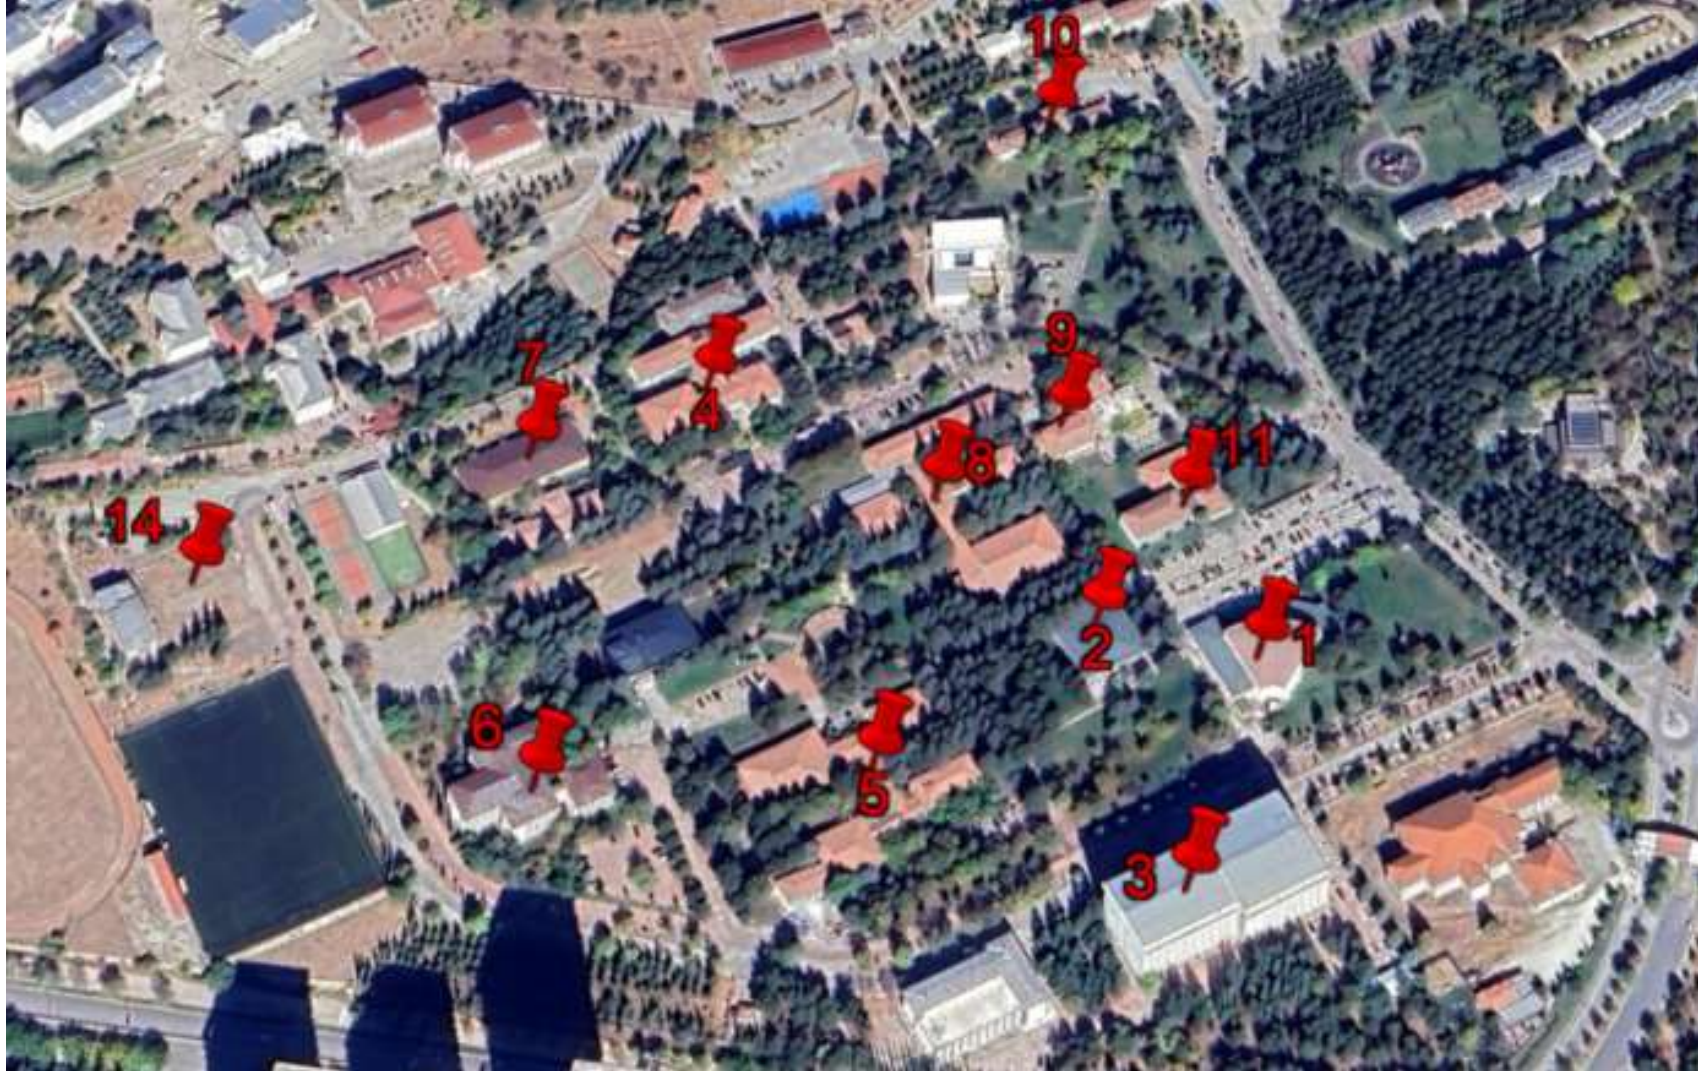

Şekil 1 Elazığ Fırat Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi(1), Öğrenci İşleri(2), Makine Mühendisliği(8), Ek Bina(9), Mühendislik Fakültesi Dekanlığı(11), Kimya Mühendisliği Laboratuvarı(7), Elektrik Müh. Fakültesi(4), İnşaat Müh Fakültesi(5), Jeoloji Müh(6), Bilgisayar Metalurji Mlz Mühendisliği Binaları(3) ve Yeni Prefabrik Hafif Çelik Kimya Laboratuvar Bina Lokasyonu(14) Uydu Görüntüsü





Şekil 2 Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlük Binası(12), Metal Teknoloji Atölyesi(13) ve Arazi Tipi Ges Lokasyonu(15) Uydu Görüntüsü




*Tablo 6 Elazığ Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Genel Bilgi Tablosu*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi                                               |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fırat Üniversitesi                                                                      |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                          |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Elazığ                                                                                  | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1967                                                                                    | İNŞAAT ALANI                | 2.102 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eğitim                                                                                  | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.102 m2                                                                                | TOPLAM KAPALI HACİM         | 17.951,39 m3    |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Personel Sayısı: 38 (29 Erkek, 9 Kadın)<br>Öğrenci Sayısı : 668 (330 kadın, 338 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | İSİM SOYİSİM                                                                            |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                                      | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Atatürk Kültür Merkezi imalatını yer teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/2027 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                         |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi :  
Kat Sayısı : B+ Z

- Bir sonraki sayfada planlanan inşaat faaliyetleri, tahmini personel sayısı ve tamamlanma süreleri tablo formatında sunulmaktadır. Bu tablo genel bilgilendirme amaçlı olup, yüklenici firmanın bu tabloyu kendi çalışma programına/planlarına göre revize etmesi beklenmektedir.

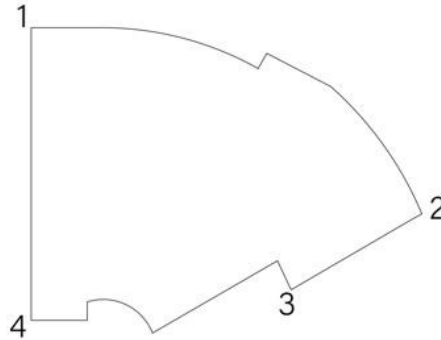

| Nokta No | (UTM)Universal Trans Y | ITRF96 (Internationa X | Coğrafi Y2 | World Geodetic X2 Syste |
|----------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 1        | 516426.95              | 4280595.91             | 39.18      | 38.67                   |
| 2        | 516487.32              | 4280602.30             | 39.18      | 38.67                   |
| 3        | 516477.26              | 4280583.78             | 39.18      | 38.67                   |
| 4        | 516448.23              | 4280557.74             | 39.18      | 38.67                   |


*Şekil 3 Atatürk Kültür Merkezi Koordinat Bilgileri*

Tablo 7 Elazığ Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri (Eski Kütüphane) Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri (Eski Kütüphane)                                      |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fırat Üniversitesi                                                                      |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                          |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elazığ                                                                                  | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1967                                                                                    | İNŞAAT ALANI                | 1.771 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eğitim                                                                                  | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.771 m2                                                                                | TOPLAM KAPALI HACİM         | 6711,22 m3      |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personel:6 (5 kadın, 1 erkek),<br>Öğrenci Sayısı : 41.125 (19.098 kadın, 22.027 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İSİM SOYİSİM                                                                            |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                                      | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Öğrenci İşleri imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                         |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Öğrenci İşleri (Eski Kütüphane)

Kat Sayısı : B+ Z+1NK

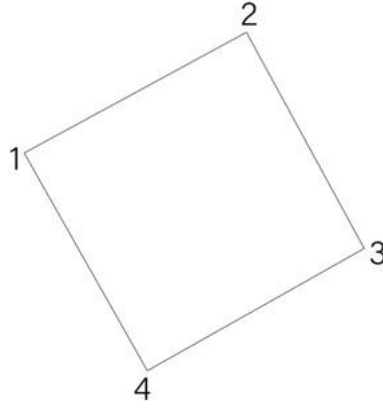


| Nokta No | (UTM)Universal Trans<br>Y | ITRF96 (Internationa<br>X | Coğrafi<br>Y2 | World Geodetic Syste<br>X2 |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| 1        | 516374.44                 | 4280597.80                | 39.18         | 38.67                      |
| 2        | 516398.82                 | 4280610.74                | 39.18         | 38.67                      |
| 3        | 516412.82                 | 4280587.20                | 39.18         | 38.67                      |
| 4        | 516388.20                 | 4280573.54                | 39.18         | 38.67                      |

Şekil 4 Öğrenci İşleri (Eski Kütüphane) Binası Koordinat Bilgileri

Tablo 8 Elazığ Fırat Üniversitesi Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fırat Üniversitesi Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği                    |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fırat Üniversitesi                                                                 |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                     |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elazığ                                                                             | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1967                                                                               | İNŞAAT ALANI                | 17.310 m2       |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eğitim                                                                             | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.310 m2                                                                          | TOPLAM KAPALI HACİM         | 68.993m3        |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personel: 35 (10 kadın, 45 erkek)<br>Öğrenci Sayısı : 928 (306 kadın, 1234 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İSİM SOYİSİM                                                                       |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                                 | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8' de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                    |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  
Kat Sayısı : B+ Z+5 NK

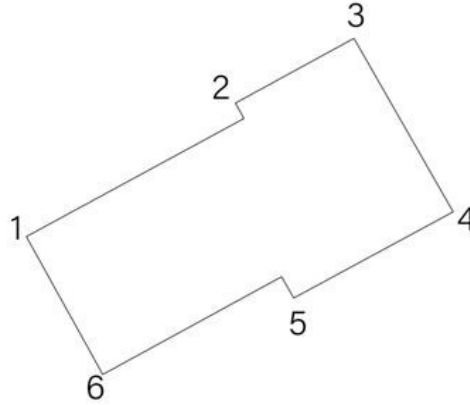


| Nokta No | (UTM)Universal Trans Y | ITRF96 (Internationa X | Coğrafi Y2 | World Geodetic Syste X2 |
|----------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 1        | 516397.60              | 4280485.62             | 39.18      | 38.67                   |
| 2        | 516437.90              | 4280511.58             | 39.18      | 38.67                   |
| 3        | 516461.45              | 4280524.67             | 39.18      | 38.67                   |
| 4        | 516480.20              | 4280491.31             | 39.18      | 38.67                   |
| 5        | 516449.95              | 4280475.45             | 39.18      | 38.67                   |
| 6        | 516412.67              | 4280459.87             | 39.18      | 38.67                   |

Şekil 5 Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri

Tablo 9 Elazığ Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Binası Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği                                          |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fırat Üniversitesi                                                                |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                    |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Elazığ                                                                            | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1967                                                                              | İNŞAAT ALANI                | 4.482 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eğitim                                                                            | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.482 m2                                                                          | TOPLAM KAPALI HACİM         | 16.669,20m3     |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Personel: 38 (9 kadın, 29 erkek),<br>Öğrenci Sayısı : 742 (122 kadın, 620 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İSİM SOYİSİM                                                                      |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                                | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Elektrik Mühendisliği imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                   |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği  
Kat Sayısı : Z+2 NK

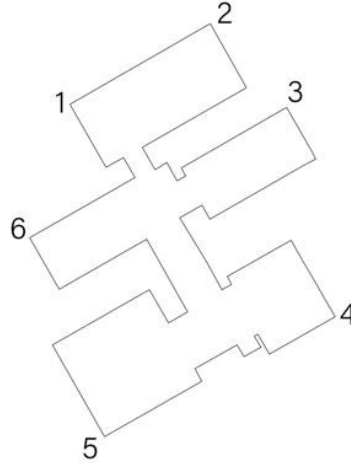


| Nokta No | (UTM)Universal Trans<br>Y | ITRF96 (Internationa<br>X | Cöğrafi<br>Y2 | World Geodetic Syste<br>X2 |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| 1        | 516206.40                 | 4280751.31                | 39.18         | 38.67                      |
| 2        | 516236.62                 | 4280769.18                | 39.18         | 38.67                      |
| 3        | 516461.45                 | 4280754.33                | 39.18         | 38.67                      |
| 4        | 516262.98                 | 4280710.03                | 39.18         | 38.67                      |
| 5        | 516449.95                 | 4280475.45                | 39.18         | 38.67                      |
| 6        | 516213.83                 | 4280684.70                | 39.18         | 38.67                      |

Şekil 6 Elektrik Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri

Tablo 10 Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği                                           |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fırat Üniversitesi                                                               |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                   |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elazığ                                                                           | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1967                                                                             | İNŞAAT ALANI                | 3.621 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eğitim                                                                           | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.621 m2                                                                         | TOPLAM KAPALI HACİM         | 11.933,12 m3    |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personel: 37 (5 kadın, 32 erkek),<br>Öğrenci Sayısı : 331 (61 kadın, 270 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İSİM SOYİSİM                                                                     |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                               | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin İnşaat Mühendisliği imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                  |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                             |                 |

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği  
Kat Sayısı : B+Z+1 NK

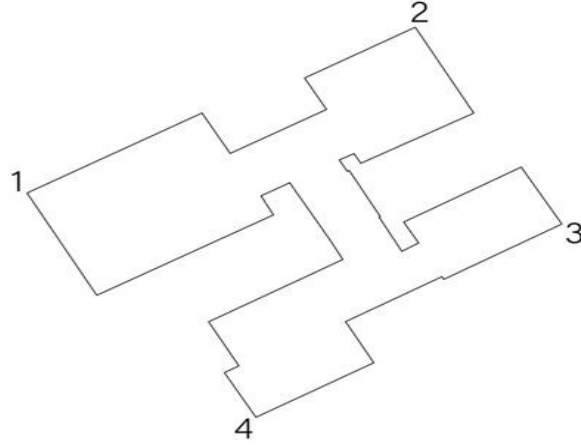

| Nokta No | (UTM)Universal Trans<br>Y | ITRF96 (Internationa<br>X | Cöğrafi<br>Y2 | World Geodetic Syste<br>X2 |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| 1        | 516257.45                 | 4280535.66                | 39.18         | 38.67                      |
| 2        | 516323.56                 | 4280570.30                | 39.18         | 38.67                      |
| 3        | 516351.27                 | 4280528.76                | 39.18         | 38.67                      |
| 4        | 516299.22                 | 4280486.67                | 39.18         | 38.67                      |


Şekil 7 İnşaat Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri



Tablo 11 Elazığ Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği                                           |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fırat Üniversitesi                                                                |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                    |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elazığ                                                                            | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1967                                                                              | İNŞAAT ALANI                | 5.398 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eğitim                                                                            | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.398 m2                                                                          | TOPLAM KAPALI HACİM         | 17.762,57 m3    |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personel: 35 (17 kadın, 18 erkek),<br>Öğrenci Sayısı : 180 (56 kadın, 124 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İSİM SOYİSİM                                                                      |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                                | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Jeoloji Mühendisliği imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                   |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği  
Kat Sayısı : B+Z+2 NK

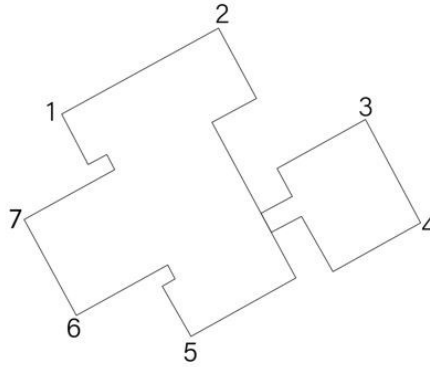


| Nokta No | (UTM)Universal Trans Y | ITRF96 (Internationa X | Coğrafi Y2 | World Geodetic Syste X2 |
|----------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 1        | 516154.90              | 4280542.24             | 39.18      | 38.67                   |
| 2        | 516180.50              | 4280555.88             | 39.18      | 38.67                   |
| 3        | 516203.54              | 4280540.71             | 39.18      | 38.67                   |
| 4        | 516213.13              | 4280524.30             | 39.18      | 38.67                   |
| 5        | 516175.80              | 4280507.74             | 39.18      | 38.67                   |
| 6        | 516157.46              | 4280511.26             | 39.18      | 38.67                   |
| 7        | 516148.91              | 4280525.65             | 39.18      | 38.67                   |

Şekil 8 Jeoloji Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri

Tablo 12 Elazığ Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Laboratuvarı                              |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fırat Üniversitesi                                                              |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                  |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elazığ                                                                          | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1967                                                                            | İNŞAAT ALANI                | 1.446 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eğitim                                                                          | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.446 m2                                                                        | TOPLAM KAPALI HACİM         | 1.091,32 m3     |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personel: 19 (6 kadın, 13 erkek),<br>Öğrenci Sayısı : 109 (60 kadın, 49 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İSİM SOYİSİM                                                                    |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                              | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Kimya Mühendisliği Laboratuvarı imalatını yer teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                 |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Laboratuvarı  
Kat Sayısı : B+Z+2 NK

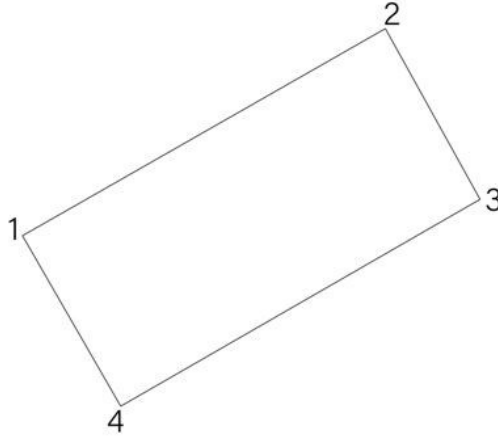


| Nokta No | (UTM)Universal Trans Y | ITRF96 (Internationa X | Coğrafi Y2 | World Geodetic Syste X2 |
|----------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 1        | 516133.16              | 4280672.59             | 39.18      | 38.67                   |
| 2        | 516176.41              | 4280697.39             | 39.18      | 38.67                   |
| 3        | 516187.34              | 4280677.95             | 39.18      | 38.67                   |
| 4        | 516145.88              | 4280655.08             | 39.18      | 38.67                   |

Şekil 9 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Koordinat Bilgileri

Tablo 13 Elazığ Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği                                          |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fırat Üniversitesi                                                              |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                  |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elazığ                                                                          | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1967                                                                            | İNŞAAT ALANI                | 4.108 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eğitim                                                                          | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.108 m2                                                                        | TOPLAM KAPALI HACİM         | 15519,89m3      |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personel: 40 (6 kadın, 34 erkek)<br>Öğrenci Sayısı : 300 (26 kadın, 274 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İSİM SOYİSİM                                                                    |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                              | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Makina Mühendisliği imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                 |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği  
Kat Sayısı : B+Z+1 NK

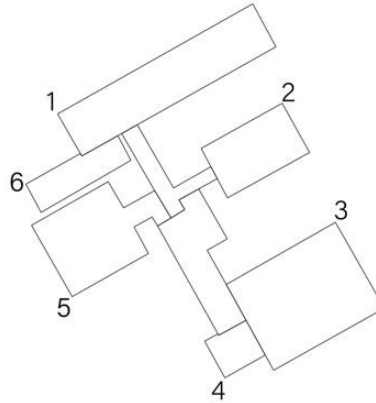


| Nokta No | (UTM)Universal Trans<br>Y | ITRF96 (Internationa<br>X | Coğrafi<br>Y2 | World Geodetic Syste<br>X2 |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| 1        | 516296.21                 | 4280680.00                | 39.18         | 38.67                      |
| 2        | 516355.88                 | 4280683.42                | 39.18         | 38.67                      |
| 3        | 516369.98                 | 4280650.68                | 39.18         | 38.67                      |
| 4        | 516342.45                 | 4280610.59                | 39.18         | 38.67                      |
| 5        | 516300.61                 | 4280638.43                | 39.18         | 38.67                      |
| 6        | 516288.13                 | 4280659.65                | 39.18         | 38.67                      |

Şekil 10 Makina Mühendisliği Binası Koordinat Bilgileri

Tablo 14 Elazığ Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Ek Binası Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Ek Binası                        |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fırat Üniversitesi                                                             |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                 |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elazığ                                                                         | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1967                                                                           | İNŞAAT ALANI                | 2.929 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eğitim                                                                         | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.929 m2                                                                       | TOPLAM KAPALI HACİM         | 9.105,62 m3     |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personel: 9 (1 kadın, 8 erkek),<br>Öğrenci Sayısı : 300 (26 kadın, 274 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İSİM SOYİSİM                                                                   |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                             | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Makina Mühendisliği Bölümü Ek Binası imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Ek Bina  
Kat Sayısı : B+Z+2 NK

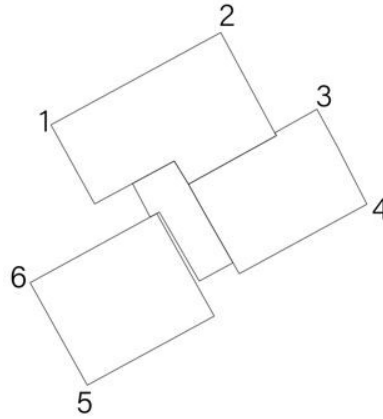


| Nokta No | (UTM)Universal Trans<br>Y | ITRF96 (Internationa<br>X | Coğrafi<br>Y2 | World Geodetic<br>X2 | Syste |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1        | 516368.69                 | 4280710.71                | 39.18         |                      | 38.67 |
| 2        | 516390.09                 | 4280721.93                | 39.18         |                      | 38.67 |
| 3        | 516403.17                 | 4280713.66                | 39.18         |                      | 38.67 |
| 4        | 516409.55                 | 4280701.05                | 39.18         |                      | 38.67 |
| 5        | 516372.16                 | 4280676.86                | 39.18         |                      | 38.67 |
| 6        | 516363.83                 | 4280688.12                | 39.18         |                      | 38.67 |

Şekil 11 Makina Mühendisliği Ek Binası Koordinat Bilgileri

*Tablo 15 Elazığ Fırat Üniversitesi Misafirhane Binası Genel Bilgi Tablosu*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fırat Üniversitesi Misafirhane Binası                                           |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fırat Üniversitesi                                                              |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                  |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elazığ                                                                          | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1967                                                                            | İNŞAAT ALANI                | 1.478 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eğitim                                                                          | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.478 m2                                                                        | TOPLAM KAPALI HACİM         | 4.091,9 m3      |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personel: 9 (5 kadın, 4 erkek),<br>Öğrenci Sayısı : 668 (330 kadın, 338 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İSİM SOYİSİM                                                                    |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                              | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Misafirhane Binası imalatını yer teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                 |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Misafirhane  
Kat Sayısı : B+Z+2 NK

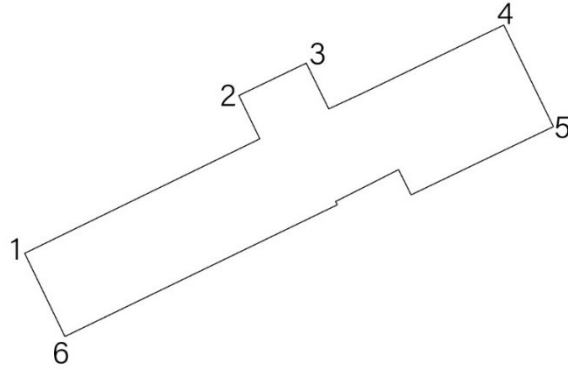

| Nokta No | (UTM)Universal Trans<br>Y | ITRF96 (Internationa<br>X | Coğrafi<br>Y2 | World Geodetic Syste<br>X2 |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| 1        | 516339.51                 | 4280841.88                | 39.18         | 38.67                      |
| 2        | 516362.07                 | 4280858.45                | 39.18         | 38.67                      |
| 3        | 516369.72                 | 4280862.58                | 39.18         | 38.67                      |
| 4        | 516390.12                 | 4280863.64                | 39.18         | 38.67                      |
| 5        | 516395.38                 | 4280851.86                | 39.18         | 38.67                      |
| 6        | 516343.67                 | 4280833.53                | 39.18         | 38.67                      |


*Şekil 12 Misafirhane Binası Koordinat Bilgileri*



Tablo 16 Elazığ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fırat Üniversitesi                                 |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ     |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elazığ                                             | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1967                                               | İNŞAAT ALANI                | 1.795 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eğitim                                             | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.795 m2                                           | TOPLAM KAPALI HACİM         | 4.119,05 m3     |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personel: 22 (2 kadın, 17 erkek),                  |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İSİM SOYİSİM                                       |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                 | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                    |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı  
Kat Sayısı : B+Z+2 NK

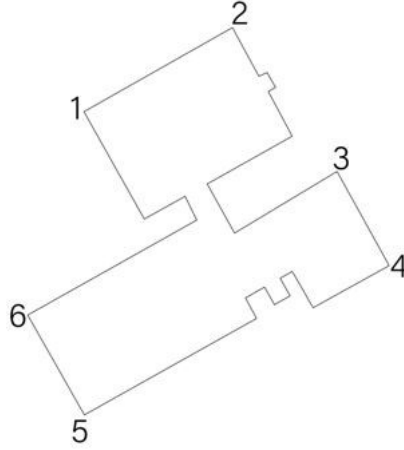


| Nokta No | (UTM)Universal Trans<br>Y | ITRF96 (Internationa<br>X | Coğrafi<br>Y2 | World Geodetic Syste<br>X2 |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| 1        | 516406.47                 | 4280671.93                | 39.18         | 38.67                      |
| 2        | 516425.49                 | 4280682.77                | 39.18         | 38.67                      |
| 3        | 516438.41                 | 4280665.78                | 39.18         | 38.67                      |
| 4        | 516444.54                 | 4280654.36                | 39.18         | 38.67                      |
| 5        | 516407.17                 | 4280638.06                | 39.18         | 38.67                      |
| 6        | 516400.06                 | 4280649.57                | 39.18         | 38.67                      |

Şekil 13 Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Koordinat Bilgileri

Tablo 17 Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlük Binası Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fırat Üniversitesi Rektörlük Binası                                                            |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fırat Üniversitesi                                                                             |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ<br>Öğrenci Sayısı : 668 (330 kadın, 338 erkek), |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elazığ                                                                                         | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1967                                                                                           | İNŞAAT ALANI                | 4.335 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eğitim                                                                                         | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.335 m2                                                                                       | TOPLAM KAPALI HACİM         | 12.206,52m3     |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personel: 129 (40 kadın, 89 erkek),                                                            |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | İSİM SOYİSİM                                                                                   |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                                             | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Rektörlük Binası imalatını yer teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                                |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Rektörlük Binası  
Kat Sayısı : Blok 1 Z+2NK  
Blok 2 Z+2NK




| Nokta No | (UTM)Universal Trans Y | ITRF96 (Internationa X | Coğrafi Y2 | World Geodetic Syste X2 |
|----------|------------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 1        | 517508.40              | 4281054.81             | 39.20      | 38.67                   |
| 2        | 517587.46              | 4281053.41             | 39.20      | 38.67                   |
| 3        | 517593.33              | 4281034.20             | 39.20      | 38.67                   |
| 4        | 517510.34              | 4281036.01             | 39.20      | 38.67                   |

Şekil 14 Rektörlük Binası Koordinat Bilgileri

Tablo 18 Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metal Atölyesi Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metal Atölyesi                            |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fırat Üniversitesi                                                               |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                                   |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elazığ                                                                           | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1967                                                                             | İNŞAAT ALANI                | 2.280 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eğitim                                                                           | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.280 m2                                                                         | TOPLAM KAPALI HACİM         | 10.712,34m3     |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personel: 13 (3 kadın, 10 erkek),<br>Öğrenci Sayısı : 194 (32 kadın, 162 erkek), |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İSİM SOYİSİM                                                                     |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                               | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Teknoloji Fakültesi Metal Atölyesi imalatını ver teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                                  |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metal Atölyesi  
Kat Sayısı :Z+1 NK

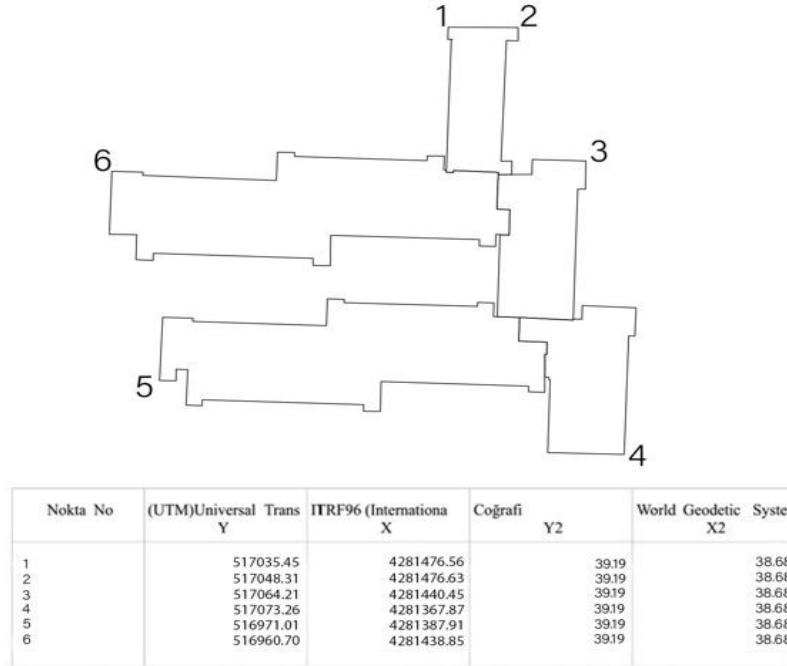

Şekil 15 Teknoloji Fakültesi, Metal Atölye Binası Koordinat Bilgileri

Tablo 19 Elazığ Fırat Üniversitesi Yeni Prefabrik Hafif Çelik Kimya Laboratuvar Binası Genel Bilgi Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| BİNA ADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fırat Üniversitesi Yeni Prefabrik Hafif Çelik Kimya Laboratuvar Binası |                             |                 |
| BİNA SAHİBİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fırat Üniversitesi                                                     |                             |                 |
| ADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Üniversite Mh. Aziz Sancar Caddesi NO:4 Elazığ                         |                             |                 |
| İLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elazığ                                                                 | POSTA KODU                  | 23200           |
| İNŞAAT YILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2016                                                                   | İNŞAAT ALANI                | 2.000 m2        |
| KULLANIM AMACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eğitim                                                                 | YAPI GRUBUNDAKİ BLOK SAYISI | 1               |
| KULLANILIR KAPALI ALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000 m2                                                               | TOPLAM KAPALI HACİM         | 10.100 m3       |
| KULLANICI SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personel:<br>Öğrenci Sayısı :                                          |                             |                 |
| TEKNİK SORUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İSİM SOYİSİM                                                           |                             | Mehmet Aktaş    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                     | TELEFON                     | 0 532 383 54 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | E-POSTA                     |                 |
| BİNADA YAPILMASI PLANLANAN İMALATLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                             |                 |
| Binada yapılması planlanan imalatların tamamı Tablo 7-8’ de listelenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                             |                 |
| FAALİYETLERİN SÜRESİ VE SEZONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                             |                 |
| İhale dokümanlarının hazırlanmasıyla birlikte <b><u>Yüklenicinin Yeni Prefabrik Hafif Çelik Kimya Laboratuvar Binası imalatını yer teslim tarihini takip eden 12 ay içerisinde tamamlaması planlanmaktadır.</u></b> Teslimin belirsizliği nedeniyle net bir sezon belirlenememekte olup, 2026/27 yılında planlanan ihale sürecinin ardından iş tamamlanacaktır. |                                                                        |                             |                 |
| RENOVASYON İŞLERİ SÜRESİNCE ÇALIŞMASI ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞAN SAYISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                             |                 |
| Planlanan imalatların hedeflenen sürede tamamlanması için 25 çalışan/gün istihdam öngörülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                             |                 |

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metal Atölyesi  
Kat Sayısı :Z+1 NK

Tablo 20 Fırat Üniversitesi Tablo 5’de yer alan Grup 1 Binalarında Yapılması Planlanan Çalışmalar

|                  | YAPILACAK İŞ GENEL TANIMI                    | ÖNGÖRÜLEN PERSONEL SAYISI | ÖNGÖRÜLEN SÜRE (HAFTA) |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| YAPI GÜÇLENDİRME | DUVAR YIKIMI & SÖKÜM İŞLERİ                  | 150                       | 15                     |
|                  | ELEKTRİK VE MEKANİK SİSTEM DEM.              |                           | 15                     |
|                  | SUBASMAN BETONU KIRIMI. VE TEMEL İÇİ DOLGUSU |                           | 15                     |
|                  | EPOKSİLİ ANKRAJLAR VE TESTLERİ               |                           | 15                     |
|                  | YENİ DONATI TESİSİ                           |                           | 15                     |
|                  | FRP İMALATI                                  |                           | 12                     |
|                  | KALIPLAMA VE BETON DÖKÜMÜ                    |                           | 12                     |
|                  | DUVAR YAPIMI                                 |                           | 12                     |
| İNCE İŞLER       | ALÇI SIVA                                    | 150                       | 15                     |
|                  | BOYA                                         |                           | 20                     |
|                  | DÖŞEME                                       |                           | 25                     |
|                  | ELEKTRİK & MEKANİK TESİSAT                   |                           | 20                     |
|                  | OTOMASYON                                    |                           | 15                     |
|                  | SOLAR PANEL TESİSAT                          |                           | 10                     |

|  |                                                                   |  |    |
|--|-------------------------------------------------------------------|--|----|
|  | YENİ PREFABRİK HAFİF<br>ÇELİK KİMYA<br>LABORATUVAR BİNA<br>YAPIMI |  | 20 |
|  | TEST & MUAYENE                                                    |  | 5  |

Tablo 20’de belirtilen elektrik & mekanik tesisat işlerinin bir kısmı ile otomasyon, solar panel tesisat bölümleri enerji verimliliği önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek işleri kapsamaktadır. Söz konusu önlemler aşağıda liste halinde verilmiştir.

*Tablo 21 Fırat Üniversitesi Tablo 5 de belirtilen 13 ad binada Yapılması Planlanan Çalışmalar*

| YAPILACAK İŞ GENEL TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÖNGÖRÜLEN<br>PERSONEL<br>SAYISI | ÖNGÖRÜLEN<br>SÜRE<br>(HAFTA) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Güçlendirme ve Tadilat İşleri: Yapıların güçlendirme projesi kapsamında konvansiyonel betonarme ile gerekli kolon ve kirişler mantolanarak yapıya betonarme perde ilaveleri yapılmıştır. Yapının güçlendirilmesi kapsamında davranışı bozulan ve/veya mevcut durumda yetersiz kalan kiriş/kolon veya perde elemanlarda ise karbon elyaf (FRP) ile güçlendirme planlanmıştır.<br><br>Güçlendirme imalatları kapsamında binalarda yapılacak güçlendirme elemanları tablosu Ek-4’de verilmiştir.             |                                 |                              |
| Bina Duvarlarına 12 cm Kalınlıkta Taş Yünü Malzeme ve Çatı Alanında ise 16 cm Kalınlığında Cam Yünü Malzeme ile ısı yalıtımı yapılması.<br>Mevcut durumda bulunan 4+12+4 mm kalınlığında alüminyum pencerelerin, 4+16+4 mm kalınlığında PVC çerçeveli pencereler ile yenilenmesi                                                                                                                                                                                                                          | 150                             | 4                            |
| Radyatörlere Termostatik Vana Uygulanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 3                            |
| Atatürk Kültür Merkezi Binasın da arızalı olarak bulunan chillerin ve atıl durumda bulunan klima santrallerinin demonte edilerek, yerine 26 kW kapasitede Rooftop cihazı uygulanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 3                            |
| Atatürk Kültür Merkezi, Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği Ek Bina, Misafirhane, Mühendislik Fakültesi Dekanlık, Rektörlük Binasın da Eşanjör Dairesinde Bulunan Mekanik Tesisat Ekipmanlarının Uygun Yalıtım Malzemesi ile İzolasyon Sağlanması ve toplamda 28 ad.İsıtma Sirkülasyon Pompalarının Yüksek Verimli Pompa, IE4 Motor ve VSD'li Olarak Yenilenmesi |                                 | 4                            |
| 6408 Verimsiz Aydınlatma Armatürlerinin LED Aydınlatma Armatürleri İle Değiştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 4                            |
| Elektrik tüketiminin bir kısmını karşılamaya yönelik 3.000 KWe gücünde Arazi Tipi GES kurulumu(25 bina için)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 3                            |
| Bina Otomasyon ve Enerji Ölçüm İzleme Sisteminin Kurulması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 4                            |
| Yeni Prefabrik Hafif Çelik Kimya Laboratuvar Binası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 20                           |

## 6.2 İnşaat Öncesi Bilgiler & Vaziyet Planları

Çalışma yapılacak binaya ilişkin saha verileri, bina yaklaşım alanları, trafik eylem planları, geçici depolama alanları, iş araçları ve makineleri park alanları ve kot farkı vb. riskli alanlar; EK 1’de belirtilmiştir.

## 6.3 Genel Şantiye Kuralları

- Araçların (iş makineleri dahil) çalışma alanlarına ve park alanlarına giriş ve çıkışları Ek 1’de belirtilmiştir.
- Proje kapsamına giren yapılar faaliyetler süresince kullanım dışıdır. Bu nedenle;  
–Şantiye kapsamında konteyner vb. bir yapının çalışma sahalarında tesisi söz konusu değildir.
- Çalışanların yemek yeme ve dinlenmeleri için özel alan tahsis söz konusu değildir. Çalışanların; umumi ve insani ihtiyaçları için çalışma yapılacak binalarda hangi alanların kullanılacağı (tuvalet, mola/dinlenme alanları, yemek odaları vb.) faydalanıcı kurum teknik ve idari birimler tarafından belirlenecek ve yüklenici firmaya bildirilecektir.
- Çalışanların kampüs sahası içinde konaklaması söz konusu değildir. Yüklenici ve alt yükleniciler çalışanların konaklaması için uygun yerler (otel, motel vb.) ayarlayacaktır.
- Geçici depolama alanları (*yapı dışı*) bina bazlı olarak aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu alanların haricinde geçici depolamaya izin verilmemektedir.

Geçici depolama esnasında malzeme, ekipmanların risk yaratmayacak şekilde istiflenmesi, çevresel koşullardan korunması ve tehlikeli kimyasalların toprağa sızmasının engellenmesi için gerekli tedbirler yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Söz konusu depolama alanlarının kullanımı öncesinde yukarıda belirtilen hususların nasıl sağlanacağı yüklenici firma tarafından tarif edilmelidir. Aksi takdirde geçici depolama sahalarının kullanımına izin verilmez.

- Acil durum toplanma alanları acil çıkış kapıları, trafik planları bina bazlı olarak aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu alanlarda uyarı levhaları tahsis edilecek ve bütün çalışanlara İSG uzmanı tarafından toplanma alanları hakkında bilgi verilecektir.
- Ek1’de belirtilen acil durum toplanma alanları, İSG tatbikatlarının tamamında kullanılacaktır. Her bir tatbikat için acil toplanma sürelerinin sorumlu İSG Uzmanları tarafından belirlenmesi istenecektir.
- Acil durum toplanma alanlarının İSG eğitim materyallerinin içinde belirtilmesi istenecektir.
- Tuvalet ihtiyaçları için bina içi WC’ler kullanılacaktır.
- Personellerin, duş ihtiyaçları yüklenici ve alt yüklenicilerin çalışanların konaklaması için ayarlayacağı (otel vb.) alanlarda karşılanacaktır. Lavabo ihtiyaçları için bina içi WC’ler kullanılacaktır.
- WC, lavabolardan su içilmesine izin verilmez. İçme suyu bütün çalışanlar için pet şişeler ile temin edilecektir. WC’lerin tamamına aşağıda belirtilen uyarı levhaları tesis edilecektir.



- Bina içinde ve geçici depolama alanlarında sigara kullanımı yasaktır. Yapı girişlerinde ve geçici depolama alanlarında (*geçici depolama alanlarında açık alev yasağına ilişkin de uyarı levhası tesis edilmelidir*) aşağıda belirtilen uyarı levhaları tesis edilecektir.





- Bina giriş kapılarına asgari 5m mesafede, açık sahada sigara içme alanları belirlenebilir. Söz konusu alanların aşağıda belirtilen uyarı levhası ile belirtilmesi ve bütün çalışanların izin verilen sigara içme alanları konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.



İnşaat faaliyetleri esnasında kullanılan bütün makine ve elektrikli cihazların CE işaretine haiz olması ve zaruridir. “CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ kapsamına<sup>3</sup> giren ve söz konusu sembolü ve beraberinde getirdiği gereklilikleri sağlamayan ürünlerin kullanımına izin verilmez.

---


<sup>3</sup>İlgili Direktifler;

- MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)
- BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/AB)
- BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB)
- GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB)

İlgili standartlar (her bir cihaz için ayrıca gözden geçirilmelidir.)

- TS EN ISO 12100 Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
- TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar
- TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
- TS 1203 EN 286-1 Tanklar – Basit – Alev almayan – Basınçlı
- TS 10116 Vinçler (Krenler) – Deney ve muayene yöntemleri
- TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel

## 7. Sağlık & Güvenlik Organizasyonu

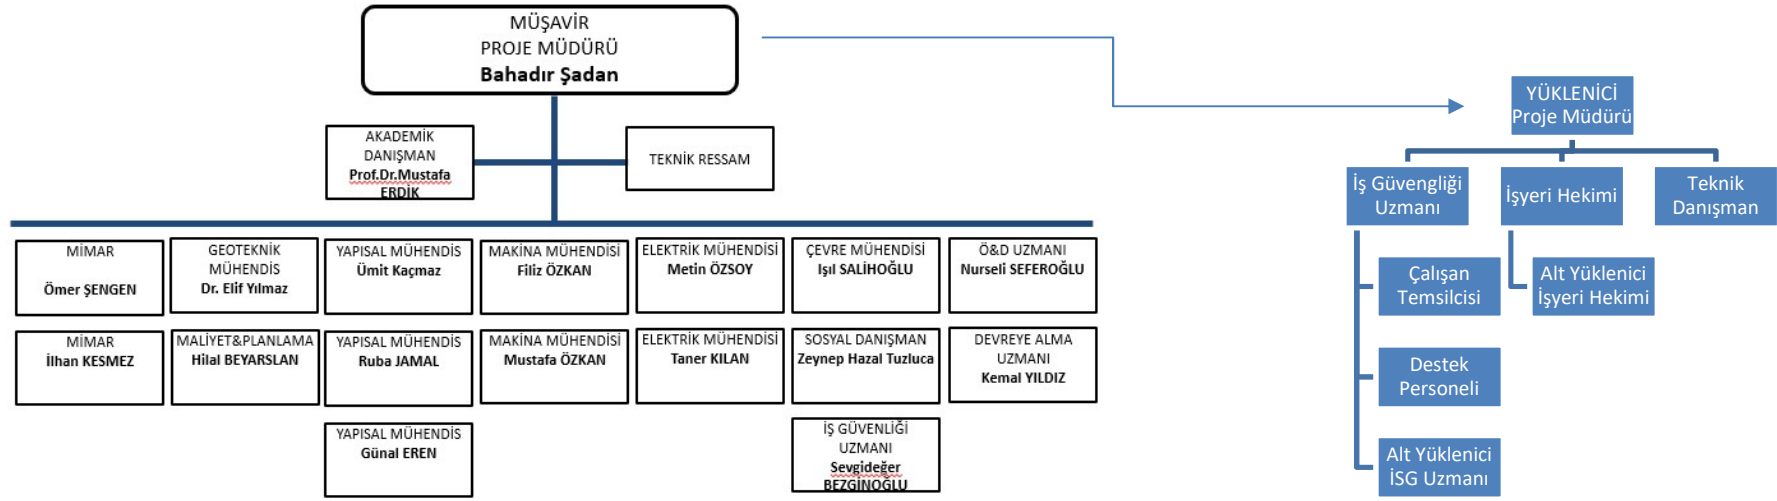

Şekil 16 Fırat Üniversitesi Sağlık ve Güvenlik Organizasyon Şeması

- Organizasyon şemasında belirtilen birimlerin görev ve sorumlulukları bir sonraki sayfada ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.

## 7.1 Müşavir

### 7.1.1. Proje Müdürünün Görevleri

Proje Müdürü, bu proje ile sınırlı olmak üzere işveren vekili olarak tayin edilmiştir. Bu çerçevede işveren görevlerini<sup>4</sup> yüklenmiştir.

Bu çerçevede;

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Planının ve yasal mevzuat ve ISG uygulamaların proje kapsamında uygulanmasını sağlamak.
2. Yüklenici firma tarafından hazırlanacak yapım metotları, risk analizlerini; teknik, idari ve İSG odaklı incelemek. Yetersiz bulunması halinde<sup>5</sup> gerekçeleri bildirmek ve revizyon süreçlerinin takip etmek.
  - a) Yüklenici firma tarafından hazırlanacak yapım metotları ve risk analizleri projenin tamamını kapsayacak mahiyette olmalıdır. Dolayısı ile alt yüklenici faaliyetleri de bu kapsama dahildir.
  - b) Yüklenici ve alt yüklenicilerin; risk ve önlemler konusunda aşağıda belirtilen hususlarda kontrol/denetimini sağlamak;
    - i. Bütün çalışanlarını uygun biçimde bilgilendirilmesi,
    - ii. Gerekli kaynakların (araç, gereç, insan kaynağı) sağlanması,
    - iii. Bütün yönetici ve çalışanların söz konusu kurallara uyması.
3. Risk değerlendirmelerinin uygunluğunun ve yeterliliğinin saha denetimleri ile kontrol edilmesini sağlamak.
  - a) Söz konusu denetimler neticesinde tespit edilen uygunsuzlukların tamamı düzeltici faaliyetler kapsamında kayıt altına alınacaktır. Tespit edilen uygunsuzlukların uygun şekilde ve termin içinde giderilmesi sağlanmalıdır.
  - b) Tespit edilen uygunsuzluklar ya da düzeltici aksiyonlar, risk analizi revizyonunu gerekli kılabilir. Bu durumda; revizyon numarası, tarihi ve gerekçeleri belirtilerek ve gerekli onay işlemleri gerçekleştirilerek risk analizlerinin yeniden yayınlanması sağlanmalıdır.
4. Çalışanların periyodik sağlık raporlarını temin edilmesi ve yaptıkları iş bazında kontrol edilmesini sağlamak. Yaptıkları iş çerçevesinde sağlık durumlarının uygunluğunu gösterir raporlara sahip olmayanların çalışmalarına izin vermemek.
5. Çalışanların eğitim durumlarının kontrol edilmesini sağlamak, yasal şartlara uygun biçimde eğitim aldıklarını ispat edemeyenlerin çalışmalarına izin vermemek.
6. Çalışanların mesleki yeterliliklerinin kontrol edilmesini sağlamak, Görevleri çerçevesinde uygun mesleki yeterliliğe sahip olduğunu ispat edemeyenlerin çalışmalarına izin vermemek.
7. Gerekli KKD'lerin belirlenmesini, temin edilmesini ve çalışanlara uygun biçimde teslim edilmesini sağlamak.
8. Çalışma sahalarında bulundurulması gereken güvenlik ekipmanlarının (koruyucu ağ, korkuluk, yaşam hatları vb.) belirlenmesi, temin edilmesi ve uygun biçimde tesis edilmesini sağlamak.

---

<sup>4</sup> 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU (Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28339) Madde 3 2.<sup>44</sup>Fıkra: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.

<sup>5</sup> Düzeltici Faaliyet kapsamında değerlendirilmeli (tespit tarihleri, gerekçeler, düzeltici aksiyon önerileri, termin vb.) kayıt altına alınmalıdır

9. İş kazalarının; 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Madde 14' e uygun biçimde bildirilmesini sağlamak.
10. 6331 sayılı İSG kanunu çerçevesinde işverenin tanımlı diğer görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek.  
a-) Bunun sağlanabilmesi için Proje Müdürü; 6331 sayılı **güncel** kanun ve ilgili diğer yönetmelikleri; İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile birlikte gözden geçirmelidir

### 7.1.2. İSG Uzmanın Görevleri

İSG Uzmanlarının; İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28512) Madde 9 içinde belirtilen görevleri aşağıda verilmiştir. Aşağıda verilen görevlere uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yönetecektir.

1. Rehberlik;
  - a) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
  - b) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
  - c) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
  - d) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
2. Risk değerlendirmesi;

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
3. Çalışma ortamı gözetimi;
  - a) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
  - b) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
4. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
  - a) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
  - b) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarını kaydetmek.
  - c) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

- d) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
- 5. İlgili birimlerle iş birliği;
  - a) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
  - b) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
  - c) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde çalışmak,
  - d) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak.

Bu çerçevede;

1. İnşaat yöntemlerini ve risk analizlerini inceler, uygunluğuna ilişkin rapor hazırlar. Hazırlanan raporu Proje Yöneticisine ve Yüklenicinin Proje Yöneticisine iletin.
2. Proje hazırlama aşamasında haftalık izleme raporları hazırlayarak Proje Uygulama Birimi'ne sunun.
3. Proje uygulama aşamasında Yüklenici tarafından aylık İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve raporları belirtilen formatta idareye sunmak.
4. İş makinelerinin periyodik muayene raporlarının alınması ve kontrol edilmesi. (Yönetmelikte azami denetim sıklığı 1 yıldır.)
5. Risk analizinde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanların tüm çalışanlara ulaştırılmasını sağlamak. (Saha denetimleri sırasında KKD teslimat kayıtlarının kontrol edilmesi, ekipmanların yeterliliğinin ve amacına uygun kullanımının sorgulanması.)
6. Yüklenici ve Taşeron İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Doktorunun yetki ve atamalarının doğrulanması.
7. Bu dokümanın iyileştirilmesi ve yerinde tespitlere göre güncellenmesi.
8. Çalışan özlük dosyalarının kontrol edilmesi.
9. Çalışanların geçmiş İSG eğitimlerine ilişkin kayıt ve sertifikaların kontrolü (en fazla 1 yıl).
10. Haftalık ve aylık İSG toplantılarına katılmak ve bunları yönetime raporlamak.
11. Çalışanların mesleki yeterlilik belgelerinin doğrulanması.
12. İş raporlarını iş sağlığı ve güvenliği açısından incelemek, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı olabilecek iş veya ekipmanı değerlendirmek.
13. Günlük saha denetimleri yapmak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı olabilecek iş veya ekipmanları değerlendirmek. Risk analizlerinin ve belirlenen tedbirlerin yeterliliğinin yerinde değerlendirilmesi.
14. Yüklenici ve Alt Yüklenici İSG uzmanları tarafından yapılan yerinde denetim raporlarının incelenmesi. Tespit edilen uygunsuzlukların izlenmesi ve kontrol edilmesi.
15. Yüklenici ve Alt Yüklenici İSG Uzmanları tarafından verilen mevcut eğitimlerin (Risk Analizi, Araç Kutusu vb.) kayıtlarının incelenmesi. Yeterliliklerinin incelenmesi (süre, içerik).
16. Çalışan Temsilcileri ile iletişim kurmak, geri bildirim istemek. Çalışan Temsilcileri tarafından dile getirilen konuların Proje Koordinatörüne raporlanması, gerekli aksiyonların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi.
17. Yüklenici ve Alt Yüklenici İSG Uzmanları tarafından hazırlanan kaza raporlarını alıp içerik ve olay sıra düzeyinde inceleyerek bildirimlerin yasal gerekliliklere uygun olarak yapıp yapılmadığını kontrol edin.
18. Öneri ve şikâyet kutularının kontrol edilmesi. Basılı veya dijital ortamda alınan geri bildirimleri İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) çerçevesinde değerlendirmek, geri bildirim verenlerin bilgilendirilmesi, talepleri değerlendirmek ve gerekli aksiyonları belirlemek. (Sosyal Uzman ile işbirliği bu süreçte yer alacaktır).
19. Saha gözlemleri, geri bildirimler, Yüklenici ve Alt Yüklenici İSG uzmanlarından alınan bilgiler ve

iş kazaları hakkında gecikmeden Proje Yöneticisine zamanında bilgi vermek.

### 7.1.3. İşyeri Hekimlerinin Görevleri

İşyeri hekimlerinin; İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28713) Madde 9 içinde bildirilen görevleri aşağıda verilmiştir;

#### 1. Rehberlik;

- a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
- b) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
- c) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
- d) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili araştırmalara katılmak, işyerindeki ergonomik ve psikososyal riskleri dikkate alarak iş ile çalışanların yetenekleri arasındaki uyumu sağlamak ve çalışanları çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korumak için araştırmalar yapmak. Rehberlik faaliyetlerinde bu araştırmaların sonuçlarını dikkate alın.
- e) Kantin, yemekhane, yatakhane ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
- f) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
- g) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
- h) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

#### 2. Risk değerlendirmesi;

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

#### 3. Sağlık gözetimi;

- a) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
- b) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
- c) Yılda bir, periyodik muayene tekrarlamak. (Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.)
- d) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
- e) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep



etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.

- f) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
  - g) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile iş birliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
  - h) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.
4. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
- a) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
  - b) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
  - c) Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.
  - d) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile iş birliği halinde hazırlamak.
  - e) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG Kâtip sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.
  - f) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personel eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek
5. İlgili birimlerle iş birliği;
- a) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.
  - b) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde çalışmak.
  - c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmak.
  - d) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.
  - e) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile iş birliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak.
  - f) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.

- g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak.

Bu çerçevede;

1. Yüklenici, Alt Yüklenici İşyeri Hekimi yetki ve atamalarını kontrol etmek.
2. İş bu dokümanı geliştirmek, saha tespitleri doğrultusunda güncellemek,
3. Alt yüklenici ve diğer uzmanlardan temin edilen yapım metotları, çalışma yapılacak sahalara ilişkin verileri inceleyerek risk analizi kontrol sürecine destek vermek.
4. Çalışan özlük dosyalarını kontrol etmek.
5. Çalışanların Periyodik Sağlık raporlarını incelemek.
6. Haftalık iş raporlarını iş sağlığı yönünden inceleyerek; uygunsuz bir çalışma, ekipman varlığını değerlendirmek.
7. Yüklenici, Alt Yüklenici İşyeri hekimleri tarafından gerçekleştirilen saha kontrollerine ilişkin raporları incelemek. Tespit edilen uygunsuzlukları takip ve kontrol etmek.
8. Yüklenici, Alt Yüklenici İşyeri Hekimleri tarafından verilen güncel eğitimlere ilişkin kayıtları incelemek. Uygunluğunu (*süre, içerik*) sorgulamak.
9. Çalışan Temsilcileri ile temas halinde bulunmak, geri bildirim talep etmek. Çalışan temsilcisi tarafından bildirilen hususları Sosyal Uzman ve Proje Müdürüne bildirmek, iş sağlığı açısından gerekli aksiyonları belirlemek ve hayata geçirmek.
10. Yüklenici, Alt Yüklenici İşyeri Hekimi tarafından tanzim edilen iş hastalığı raporlarını temin etmek, içerik ve olay örgüsü seviyesinde incelemek. Yasal şartlara uygun biçimde bildirim yapıp yapılmadığını kontrol etmek.
11. Öneri ve şikâyet sistemi çerçevesinde temin edilen geri bildirimlerin Sosyal Uzman talepleri doğrultusunda iş sağlığı açısından değerlendirmek ve gerekli aksiyonları belirlemek.
12. Saha gözlemleri, geri bildirimler, Yüklenici ve Alt Yüklenici İşyeri Hekimlerinden temin edilen bilgiler ve işyeri kazaları konusunda Proje Müdürünü zaman kaybetmeden bilgilendirmek.

#### 7.1.4. Teknik Uzmanların İSG Görevleri

İnşaat Mühendisliği, Makine mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği disiplinlerinden oluşan Teknik Uzmanlık Birimi; İSG Süreçlerinde aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

1. İSG Uzmanlarını, işin teknik detayları ve süreçleri konusunda bilgilendirmek,
2. Kontrol ettikleri işin, çalışanların sağlık ve güvenliği koruyacak şekilde yürütüldüğünden emin olmak.
3. Yüklenici tarafından hazırlanan yapım metotlarını incelemek ve yeterliliği konusunda hüküm vermek.
4. Risk analizlerinde belirtilen hususları (tehlike, risk ve önlemleri) teknik açıdan değerlendirmek ve uygunluğu konusunda hüküm vermek.
5. İSG Uzmanının gerekli görmesi halinde iş izin sistemi içine dahil olmak, İSG uzmanının sorularını cevaplandırmak, İSG Uzmanı tarafından iletilen dokümanları bu çerçevede değerlendirmek, sorgulamak.
6. Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen İSG eğitim içeriklerini teknik açıdan değerlendirmek. Yeterliliği hususunda hüküm vermek (Örn. EKED sistemi, İskele kurulumu ve kullanımı vb.)

### 7.1.5. Sosyal Uzmanın İSG Görevleri

1. İSG Uzmanı tarafından alınan Matbu öneri şikâyet formlarını almak ve listelemek,
2. Öneri & Şikâyet sistemi kapsamında temin edilen geri bildirimleri incelemek, gerekli gördüğü hallerde İSG Uzmanı ve İşyeri Hekiminin geri bildirim değerlendirme sürecine dahil etmek.
3. Çalışan Temsilcileri ile irtibat halinde olmak, İSG Uzmanı ve İşyeri hekimi ile Çalışan Temsilcileri arasından sağlıklı ve güçlü bir iletişimin sağlanmasında destek olmak.

### 7.1.6. Destek Personeli Görevleri

İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından talep edilen çalışmaları yerine getirmek.

## 7.2 Yüklenici Firma

### 7.2.1. İşveren & İşveren Vekili Görevleri

Proje Müdürü, bu proje ile sınırlı olmak üzere işveren vekili olarak tayin edilmiştir. Bu çerçevede işveren görevlerini<sup>6</sup> yüklenmiştir.

1. İşveren olarak, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içinde belirtilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek,
2. Yüklenicinin Tablo 24 de İSG İzleme Planında belirtilen izleme gerekliliklerini, sıklıklarını ve sorumluluklarını sağlamak,
3. Müşavir İSG Uzmanı tarafından verilen bu dokümanın ilgili tüm birimlere iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak
4. Yapım metotları ve risk analizinin hazırlanması ve saha çalışmaları öncesinde Müşavire iletilmesini sağlamak,
5. Saha çalışması başlamadan önce İSGP'nin, inşaat yöntemlerinin ve risk analizinin hazırlanmasını ve müşavire sunulmasını sağlamak,
6. Müşavir Sosyal Uzmanı tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin ivedilikle temin ve teslim edilmesini sağlamak.
7. Müşavir Sosyal Uzmanı tarafından iletilen öneri şikâyet sisteminin kurmak ve etkinliğini sağlamak.
8. Müşavir Proje Müdürü tarafından talep edilen toplantı ve görüşmelere katılmak.
9. Atanmış İSG uzmanı ve İşyeri hekimi performansları takip ve kontrole etmek.
10. Müşavir İSG Uzmanı tarafından bildirilen, İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi performanslarına ilişkin tutanakları incelemek ve talepleri yerine getirmek (Uzman değişikliği, ihtarı vb.)

### 7.2.2. İSG Uzmanlarının Görevleri

1. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK içinde belirtilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek.
2. Yüklenici firma İSGP'nin bu İSGP doğrultusunda proje çalışmalarına hazırlanmasını, inşaat metodu çerçevesinde risk analizinin oluşturulmasını ve saha çalışması başlamadan önce müşavir firmanın İSG Uzmanına sunulmasını sağlamak.
3. Çalışanların geçmiş İSG eğitimlerine ilişkin kayıt ve sertifikaları Müşavir İSG Uzmanına iletmek.
4. İş bu doküman ve risk analizi çerçevesinde çalışanlara güncel eğitimler vermek. Eğitim kayıtları tutmak

---

<sup>6</sup> İşveren olarak, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içinde belirtilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek,

ve söz konusu kayıtları Müşavir İSG Uzmanına iletmek.

5. Çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgelerini Müşavir İSG Uzmanına iletmek.
6. Çalışanların tamamına bu proje özelinde uygulanan öneri şikâyet sistemi hakkında bilgi vermek.
7. İş makinesi periyodik muayene raporlarını Müşavir İSG Uzmanına iletmek.
8. KKD Listeleri (Standart, miktar vb.) ve teslim tutanaklarını Müşavir İSG Uzmanına iletmek.
9. Müşavir İSG Uzmanı saha denetimlerine katılmak ve Müşavir İSG Uzmanının talep ettiği bilgi ve belgeleri hazır bulundurmak.
10. İş kazalarına ilişkin tutanakları Müşavir İSG Uzmanına iletmek.
11. Müşavir tarafından tebliğ edilen düzeltici aksiyonları hayata geçirmek ve süreç ile ilgili olarak Müşavir İSG Uzmanını ve/veya İşyeri Hekimini bilgilendirmek.
12. Haftalık ve aylık İSG toplantılarını planlamak, katılmak ve raporlamak

### 7.2.3. Alt Yüklenici İşyeri Hekimlerinin Görevleri

1. İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK içinde belirtilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek.
2. Yapım metodu çerçevesinde risk analizinin oluşturulmasını sağlamak.
3. Çalışan periyodik iş sağlığı raporlarını Müşavir İşyeri Hekimine iletmek.
4. Çalışanların geçmiş İş sağlığı eğitimlerine ilişkin kayıt ve sertifikaları Müşavir İşyeri Hekimine iletmek.
5. Müşavir İşyeri Hekimi tarafından talep edilen ek eğitimleri planlamak ve hayata geçirmek. Eğitim kayıtlarını tutmak ve Müşavir İşyeri Hekimine iletmek.
6. İş hastalıklarına ilişkin tutanakları, Müşavir İşyeri Hekimine iletmek.

### 7.2.4. Teknik Uzmanların İSG Görevleri

İnşaat Mühendisliği, Makine mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği disiplinlerinden oluşan Teknik Uzmanlık Birimi; İSG Süreçlerinde aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

1. İSG Uzmanlarını, işin teknik detayları ve süreçleri konusunda bilgilendirmek,
7. Yürütülen işin çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde yürütüldüğünden emin olmak.
2. Yapım metodlarını oluşturmak ve İSG Uzmanına iletmek.
3. Risk analizlerinde belirtilen hususları (tehlike, risk ve önlemleri) teknik açıdan değerlendirmek ve uygunluğu konusunda hüküm vermek.
4. İSG Uzmanının gerekli görmesi halinde iş izin sistemi içine dahil olmak, İSG uzmanının sorularını cevaplandırmak, İSG Uzmanı tarafından iletilen dokümanları bu çerçevede değerlendirmek, sorgulamak.
5. İSG eğitim içeriklerini teknik açıdan geliştirilmesini sağlamak. (Örn. EKED sistemi, İskele kurulumu ve kullanımı vb.)

### 7.2.5. Çalışan Temsilcisi Görevleri

1. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği KANUNU (Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28339) içinde belirtilen görev ve sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmek.
2. Yapım metodu çerçevesinde risk analizi çalışmalarına katılmak.
3. Diğer çalışanların geri bildirimlerinin, bu proje özelinde hazırlanan Öneri Şikâyet sistemi ile gerçekleştirilmesi hususunda İSG Uzmanını desteklemek, çalışanlara bu konuda bilgi vermek.

4. Müşavir İSG Uzmanı, İşyeri hekimi ve sosyal Uzman ile güçlü iletişim sağlamak, çalışanların genel talep ve durumları hakkında bilgi vermek.
5. Çalışmadan kaçınma konusunda karşılaşılan durumları zaman kaybetmeden Müşavir İSG Uzmanına bildirmek.
6. Öneri & şikâyet sisteminin etkinliğini olumsuz etkileyebilecek her türlü durumu Müşavir sosyal Uzmanına bildirmek.

#### 7.2.6. Destek Personeli Görevleri

İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından talep edilen çalışmaları yerine getirmek. 2 kişiden oluşan iş sağlığı ve güvenliği işçisi sahada düzenli görev yapacaktır.

## 8. İşlerin Yönetimi

### Genel İş Programı ve Çapraz Etkileşim

Genel iş programı aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Söz konusu program nihai değildir sadece çalışmalar esnasında çapraz etkileşim risklerinin belirlenmesi maksadı ile oluşturulmuştur. Detaylı iş programı/planı yüklenici firma tarafından oluşturulmalı ve müşavire teslim edilmelidir.

| İş Kalemi                             | 1. AY   |         |         |         | 2. AY   |         |         |         | 3. AY   |         |         |         | 4. AY   |         |         |         | 5. AY   |         |         |         | 6. AY   |         |         |         | 7. AY   |         |         |         | 8. AY   |         |         |         | 9. AY   |         |         |         | 10. AY  |         |         |         | 11. AY  |         |         |         | 12. AY  |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                       | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta |
| MOBİLİZASYON                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| YAPISAL GÜÇLENDİRME                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| DUVAR YIKIM VE SÖKÜM İŞLERİ           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ELEKTRİK VE MEKANİK SİSTEM DEMONTAJ   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TEMEL KAZI & TEMEL PERDE & GERİ DOLGU |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EPOKSİ ANKRAJLAR VE TESTLER           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| YENİ DONATI TESİSİ(KATLAR)            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| KALIP YAP. VE BETON DÖKÜMÜ            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| İNCE İŞLER                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| DUVAR YAPIM                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ALÇI SIVA                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| BOYA                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| BİNA KABUĞU YALITIMI                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ENERJİ VERİMLİLİĞİ                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ELEKTRİK TESİSATI                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| MEKANİK TESİSAT                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| OTOMASYON                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| PV PANEL TESİS                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TEST VE MUAYENE                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| YENİ PREFABRİK BİNA YAPIMI            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ALTYAPI, ZEMİN, TEMEL İŞLERİ          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| HAFİF ÇELİK TAŞIYICI SİSTEM           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| DIŞ CEPHE, ÇATI VE YALITIM            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| MİMARİ, MEKANİK, ELEKTRİK İŞLERİ      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

Şekil 17 Fırat Üniversitesi Grup1 Binaları İş Programı



## 8.1 Çalışma Yöntemleri

Aşağıda belirtilen yapım sürecine ilişkin genel tarifler; yüklenici firmaya detaylı yapım metodu ve risk analizi çalışmalarında rehberlik yapması maksadı ile oluşturulmuştur. Yüklenici her yeni işe başlarken yapım yöntemini ve risk analizini hazırlayıp müşavirin onayına sunacak, onay alındıktan sonra işe başlayacaktır.

### 8.1.1 Yapısal Güçlendirme

1. Yapısal araştırma ve bulgular doğrultusunda hazırlanan Mevcut Durum Performans Raporu, yapının güçlendirilmesi gerektiğine dair objektif kanıtlar sunmaktadır. Binaların etrafındaki altyapı inşaatı, arazi ölçümü, güzergâh kazısı, güzergah kotlarının ayarlanması, iskele döşenmesi, baca oluşturulması gibi geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilecek. Binadan çıkan üst yapının yeni bacalara bağlantısı yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır.
  - İş makinesi kullanımı çok önemlidir. Kazı çalışmaları ekskavatörlerin, yükleyicilerin ve kamyonların kullanımını içerir. Çalışmaya başlamadan önce bu cihazlara ait periyodik muayene raporlarının ve kullanıcı yeterlilik belgelerinin (operatör ehliyeti, C sınıfı ehliyet) kontrol edilmesi şarttır.
  - Yeraltı doğal gaz boru hattı tesisinin bulunduğu bölgelerde, Projelerin II. Aşaması (İnşaat Aşaması) başlamadan önce gerekli çalışmaları yaparak, Doğal Gaz Sağlayıcı Şirketi uygun bir ortam sağlamaktan sorumludur. Projenin uygulamasının Altyapı İnşaat Kontrol Personeli Seviye 4 (Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu No. 5544 - 12UY0042-4) gözetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
    - (\*Söz konusu Doğal Gaz Boru Hattı süreci tamamen hazır olacak, gerekli ortamın oluşturulabilmesi amacıyla Saha Devri gerçekleşmeden önce tüm kontrol ve testler **Hizmet Sağlayıcı Yerel Dağıtım Şirketi** tarafından yapılacak ve projelerde belirtildiği şekilde teslimat sağlanacaktır. Mülk Sahibi, söz konusu tesislerin yapımı için ilgili mevzuata uygun olarak başvuruda bulunmalıdır. Bu nedenle ne Müşavir Firmanın ne de Yüklenicinin bu doğalgaz boru hatlarına müdahale etmesi **KESİNLİKLE** imkansızdır.)
2. Üstyapı güçlendirme uygulamasında öncelikli olarak üst katlardan alt katlara doğru sökülme işlemleri gerçekleştirilecektir. Belirlenen akslardaki donatı perdeleri ve kolon ceketleri en üst kattan başlayarak çekiç ve kırıcı kullanılarak yıkılacaktır. Duvarların yıkılmasından önce, zarar görebilecek kapı, pencere, demirbaşlar, tezgahlar, elektrik ve mekanik tesisat gibi eşyalar sökülerek korunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda sıralanmıştır.
  - Yıkılacak elemanların elektrik kablolarını da içermesi potansiyel tehlikesi dikkate alınmalıdır. Bölgedeki elektrik kesintilerine öncelik verilmesi; kesici, matkap vb. aletlerin elektrik ihtiyacı alternatif kaynaklardan sağlanmalıdır. Dağıtım kutuları, prizler, aydınlatma elemanları hatları, anahtarlar vb. bileşenler yıkımdan önce kontrol edilmeli ve elektrik olmadığı doğrulanmalıdır. Bu süreçte sadece muayene maddelerinin kullanılması yeterli değildir. Faz voltaj dedektörü gibi kontrol cihazları minimumda kullanılmalıdır. Bu test cihazlarının işlevsel kontrolleri günlük olarak yapılmalıdır (çalışma prizleri kullanılarak).



Şekil 18 Faz Dedektörü Örnek Görseli

- Elektrikli el aletlerinin tamamının PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.)



Şekil 19 Pat Test Etiketi Örnek Görsel

- Elektrik uzatma kablolarının tahrip olmaması ve söz konusu kabloların suya temas etmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Uzatma kabloları ve diğer elektrikli cihaz güç kabloları günlük kontrol edilecektir. Tahrip olmuş kabloların kullanımına izin verilmez.
- Yıkım esnasında duvarların iki tarafı da kontrol edilmeli, çalışanların moloz altında kalmaması için gereken kısıtlamalar (girişlerin kısıtlanması, yıkılacak duvarların etki alanlarının gözlenmesi, ikaz ve uyarı levhalarının kullanımı vb.)
- Bina dışını etkileyen duvar yıkımlarında etki bölgeleri belirlenmeli ve söz konusu alanlara giriş yasaklanmalıdır.
- Duvar yıkımı öncesinde donatılı alanlar işaretlenmelidir. Söz konusu donatılı elemanların (taşıyıcı) zarara görmemesi esastır. Yıkım ekibi bu konuda günlük olarak uyarılacaktır.
- Yıkım çalışmalarının döşemeye zarar vermemesi için, duvarların parçalara ayrılması ve kontrollü şekilde düşürülmesi gerekmektedir. Duvarların bütün halinde yıkılmaması için uygulanması gereken teknikler, çalışanlara bildirilmelidir. Korunması icap eden yüzeyler için uygun kalınlıkta koruyucu örtüler kullanılmalıdır.
- Enkazın taşınmasında görev alan çalışanlar, elle taşıma prosedürleri konusunda bilgilendirilmelidir. Yüksekten kontrolsüz bir şekilde dışarıya çöp atmak yasaktır. Enkazın kaldırılma yöntemi yüklenici firma tarafından belirlenecek ve bildirilecektir.
- Molozların taşınmasında görev alacak çalışanların, elle taşıma kuralları konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Molozların dışarıya yüksekten kontrolsüz şekilde atılması yasaktır. Molozların dışarı çıkarılmasına ilişkin yöntem yüklenici firma

tarafından belirlenecek ve bildirilecektir.

- Yıkım sürecinde çalışanların tozdan korunması için, toz maskesi ve koruyucu gözlük kullanımı zorunludur.
  - Yıkım sürecinde çalışanların gürültüden korunması için kulak tıkacı ya da kulaklık kullanımı zaruridir.
  - Yıkım sürecinde çalışanların fırlayan parçalardan korunması için koruyucu gözlük kullanmaları zaruridir.
3. Söküm işleminden sonra güçlendirme elemanlarının temellere bağlanması amacıyla perde ve kolon mantosu çevresinin açılması için subasman betonunun kırılması ve temel içi dolgusunun kazılması gerekmektedir. Bu kırım ve kazı işlemleri el ile (kırıcı ve balyoz yardımıyla) ve/veya yapı içerisine girebilen küçük makinelerle (bobcat vb.) gerçekleştirilecektir.

Dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir.

- Kazı çalışmaları esnasında kullanılacak küçük kazıyıcı, yükleyici kullanımı için; öncelikle söz konusu makinelerin periyodik kontrol raporlarının ve kullanıcı yetkinlik sertifikalarının (operatör belgesi) kontrolü zaruridir.
  - Dar alanda iş makinesi ile yapılacak manevralar esnasında, korunması gereken duvar ve donatılı bileşenlerin zarar görmemesi için sorumlu operatörler çalışma öncesinde bilgilendirilmelidir. Söz konusu iş makinelerinin bina içinde kullanımına ilişkin yapım metotları önceden müşavire iletilmelidir. *(İş makinesinin çalışma sahasına taşınması, bina içine alınması için yıkılacak duvarlar, bina içi manevra ve çalışmada kalıcı hasar riskinin olup olmadığı bu doküman içinde belirtilmelidir.)*
  - Kazılan bölgelerin çevresine uyarı bantları tesis edilmelidir. Gece çalışmalarının yapılması halinde söz konusu bantların reflektörlü özellikte olması gerekmektedir.
4. Kırım ve kazı işlemleri tamamlandıktan sonra mevcut kolon, kiriş ve temellere ankraj çubukları çakılır. Ankraj delikleri detay projelerindeki ölçülere uygun olarak delici matkaplarla mevcut elemanlara delik açılması, deliğin hava kompresörü ile temizlenmesi, *epoksi yapıştırıcının delik içerisine sıkılması ve önceden hazırlanana ankraj demirinin (normal nervürlü inşaat demirinden hazırlanır) delik içerisine sokulması* şeklinde yapılır.



Şekil 20 Ankraj Çubuklarının Çakılması Örnek Görsel

Dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir.

- Ucu açıkta ki ankraj çubukları düşme halinde ciddi yaralanma hatta ölüm riski barındırmaktadır. Söz konusu alanlar risk barındırdıkları sürece uyarı etiketleri ile

çevrelenmeli ve çalışanlar uyarılmalıdır. (*Ankraj demirlerinin uç kısımlarının sivri, kesici olmaması için gereken özen gösterilmelidir.*). Özellikle düşme riskinin bulunduğu alanlar etki bölgesi prensibi ile uyarıcı bantlar ile çevrelenmelidir.

- Elektrikli el aletlerinin tamamının PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.)
- Elektrik uzatma kablolarının tahrip olmaması ve söz konusu kabloların suya temas etmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Uzatma kabloları ve diğer elektrikli cihaz güç kabloları günlük kontrol edilecektir. Tahrip olmuş kabloların kullanımına izin verilmez.
- Çakılacak ankraj çubuklarının bina dışından yere düşme riski söz konusudur. Çalışanlar; söz konusu nervürlü demirlerin istiflenmesi ve tesisi esnasında bu riski göz önünde bulundurmalıdır. Çalışanların tamamının çalışma sahası içinde baret kullanımı asgari şarttır.
- Ankraj çubuklarının paslı olması muhtemeldir. Bu nedenle çalışanların uygun tipte koruyucu eldiven kullanmaları zaruridir. Bunun yanında bütün çalışanların tetanos aşılarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. (*İşyeri Hekimi eğitimler esnasında paslı metallerin neden oldukları enfeksiyonlar ve tetanos hakkında çalışanları bilgilendirmelidir.*)
- Delik temizliğinde kullanılacak kompresörlerde yetkin makine mühendisleri tarafından kontrol edilmeli ve uygunlukları doğrulanmalıdır.
- Epoksi yapıştırıcıların MSDS 'leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (*uçucu özellik, göze temas vb.*).
- Toz ve kimyasal kullanımına karşın göz banyosunun gerekliliği konusu işyeri hekimi tarafından belirlenmelidir.
- Donatı demirlerini işleyecek personellerin, Betonarme Demircisi Seviye 3 (11UY0012-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.

5. Ankraj imalatları ile beraber güçlendirme elemanı donatısının döşenmesi işlerinin yapılması.

Dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir.

- Donatı metallerinin yerleşimi esnasında batma, kesme riskleri gözetilmeli, uçları tehlike yaratacak şekilde boşa bırakılmamalıdır.
- Batma riski taşıyan ve kot farkı vb. nedenlerle görülmesi zor olan donatı metallerinin uçları plastik takozlar kullanılarak kapatılmalı ve uyarı işaretleri ile belirgin hale getirilmelidir.
- Donatı demirlerinin paslı olması muhtemeldir. Bu nedenle çalışanların uygun tipte koruyucu eldiven kullanmaları zaruridir. Bunun yanında bütün çalışanların tetanos aşılarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. (İşyeri Hekimi eğitimler esnasında paslı metallerin neden oldukları enfeksiyonlar ve tetanos hakkında çalışanları bilgilendirmelidir.)
- Donatı demirlerinin şekillendirilmesinde demir bükme, kesme makinelerinin kullanılması halinde söz konusu makinelerin PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri


esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.)

- Donatı demirlerini işleyecek personellerin, Betonarme Demircisi Seviye 3 (11UY0012-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
6. Deneylerin ve donatı numunelerinin kontrol teşkilatı tarafından teslim alınmasından sonra Plywood kalıplar kapatılarak bir üst kat döşemesinden açılan delikten veya kuş ağızı da denilen kalıptan imal edilen huniler içerisinden kalıp içerisine “kendiliğinden yerleşen beton” (*ince agregalı, süper akışkanlaştırıcı katkılı beton*) dökülür. Beton dökülmesi işlemi transmikser ve beton pompası ile yapılır. Mevcut yapı içerisine pompanın ucunun ulaşamayacağı yerlere gerekirse seyyar borular (*koruge boru vs.*) veya el ile beton taşınabilir. Bir katın güçlendirme elemanının betonunun dökülmesi ve üzerinden en az 2 gün geçmesinin ardından bir üst katın betonu dökülmelidir. Beton dökümü sonrası mevcut elemanlar ile yeni güçlendirme elemanı arasına beton ulaşamaması nedeniyle oluşacak olası boşluklar yüksek dayanımlı, polimer lif katkılı tamir harçları ile doldurulur. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir.
- Elektrikli el aletlerinin tamamının (*mobil beton mikseri, vibratör, beton pompası vb.*) PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.)
  - Elektrik uzatma kablolarının tahrip olmaması ve söz konusu kabloların suya temas etmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Uzatma kabloları ve diğer elektrikli cihaz güç kabloları günlük kontrol edilecektir. Tahrip olmuş kabloların kullanımına izin verilmez.
  - Tamir harçları vb. malzemelerin MSDS ‘leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (*teneffüs, göze temas vb.*).
  - Transmikserlerin çalışma sahası erişimi esnasında trafik eylem planı kurallarına uygun hareket edilmelidir. Park halinde ve çalışma süresince ilgili olmayan çalışanların transmikser yakınlarına erişimi uyarı bantları ile engellenmelidir.
  - Kalıp işlerinde görev alacak personellerin, Ahşap Kalıpcısı Seviye 3 (11UY0011-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
  - Beton döküm işlerinde göre alacak personellerin, Betoncu Seviye 3 (12UY0049-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
7. Kaba inşaatın tamamlanmasının ardından onarım işlerine geçilir. Güçlendirme perdelerinin iç ve dış yüzeylerinin sıva, boya, yalıtım vb. uygulamaları, bozulan zeminlere tesviye betonu ve kaplama malzemesi düzenlemeleri, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat montajları ve gerekiyorsa kapı pencere imalatları yapılarak güçlendirme işleri tamamlanır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken major hususlar aşağıda listelenmiştir.

Gerekli hallerde kurulması gereken mobil ve sabit geçici iş iskelelerin TS EN 12811-1 ve TS EN 12810-2 standartlarına uygun, kazara hareket etmeyecek ve yıkılmayacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. İskele bileşenleri güvenli bir şekilde taşınacak, monte edilecek, kullanılacak, bakımı yapılacak, sökülecek ve istiflenecek şekilde tasarlanmalıdır. Kullanılan malzemeler, tasarım



verilerinin verildiği TS EN 12810-1 ve TS EN 12811-2 standartlarında verilen şartları karşılamalı ve normal çalışma koşullarına dayanabilecek kadar sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Bu iskelelerde çalışan tüm personelin yüksekte çalışma eğitimi almış olması, tam vücut emniyet kemeri ve düşme önleyici ekipman kullanması zorunludur.

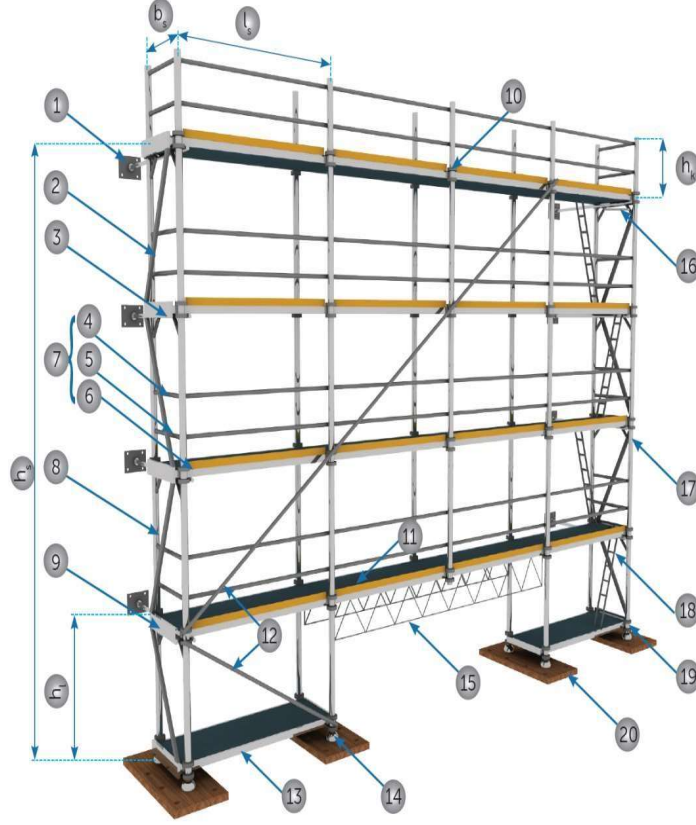

Şekil 21 Dış Cephe İskele Örnek Görseli

- İskele kurulumunu yapacak olan personellerin İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 (12UY0056- 3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrik tesisatında çalışacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 (15UY0241-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrik pano ve tablolarında montaj yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması gerekmektedir
- Elektrik pano/tablo montajı esnasında tork kontrollü tornavida, sıkma ekipmanları kullanılmalıdır. Uygun sıkma kuvvetleri şalt ekipmanı türü ya da vida somun boyutlarına göre önceden belirlenmeli ve sorumlu personellere bildirilmelidir.
- Mekanik tesisat sürecinde görev alacak personellerin asgari olarak; Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Duvar örececek personellerin, Duvarcı Seviye 3 (12UY0048-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Sıva işlemlerini yapacak personellerin, Sıvacı Seviye 3 (11UY0024-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Alçı işlemlerini yapacak personellerin, Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 (12UY0055-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Seramik karo işlerinde görev alacak personellerin, Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 (12UY0051-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.



- Boya işlerinde görev alacak personellerin, İnşaat Boyacısı Seviye 3 (11UY0023-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Sahada çalışacak personellerin asgari olarak, İnşaat İşçisi Seviye 2 (16UY0253-2) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Tamir harçları, boya vb. kimyasalların MSDS 'leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (*teneffüs, göze temas vb.*).
- Ağır yük taşıyacak elemanların tamamı, elle kaldırma ve taşıma eğitimi almalıdır.

Tablo 22 Güçlendirme & Altyapı İşleri Kontrol Tablosu

| Yapılacak İş:                                                                                                                                                                           | Bina Güçlendirme & Altyapı İşleri |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ÇALIŞMA YÖNTEMİ                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b>Teknik Açıklama ve Gereklilikler</b>                                                                                                                                                 |                                   |
| <b>Yapım Tekniği ve Teknolojisi</b>                                                                                                                                                     |                                   |
| — <a href="#">Bina Güçlendirme ve Altyapı İşleri</a> alt başlığı altında 7 maddede ve yan maddelerinde açıklanmıştır.                                                                   |                                   |
| <b>İş Ekipmanı Kullanımı</b>                                                                                                                                                            |                                   |
| — KAZICI YÜKLEYİCİ                                                                                                                                                                      |                                   |
| — TRANSMİKSER                                                                                                                                                                           |                                   |
| — KAMYON                                                                                                                                                                                |                                   |
| — KIRICI DELİCİ                                                                                                                                                                         |                                   |
| — SPRAL                                                                                                                                                                                 |                                   |
| — HARÇ KARIŞTIRICI                                                                                                                                                                      |                                   |
| — KOMPRESÖR                                                                                                                                                                             |                                   |
| — MOBİL BETON MİKSERİ                                                                                                                                                                   |                                   |
| — DEMİR BÜKME MAKİNESİ                                                                                                                                                                  |                                   |
| — DEMİR KESME MAKİNESİ                                                                                                                                                                  |                                   |
| — ŞARJLI / SABİT MATKAP                                                                                                                                                                 |                                   |
| — ŞARJLI VİDA/SOMUN SIKMA                                                                                                                                                               |                                   |
| — FAZ VOLTAJ DEDEKTÖRÜ                                                                                                                                                                  |                                   |
| — MULTİMETRE                                                                                                                                                                            |                                   |
| — TORK KONTROLLÜ TORNAVİDA                                                                                                                                                              |                                   |
| — TORK KONTROLLÜ SIKMA                                                                                                                                                                  |                                   |
| — BİNA İÇİ İSKELE (MOBİL / SABİT)                                                                                                                                                       |                                   |
| — ÇEKİÇ & MURÇ                                                                                                                                                                          |                                   |
| — ŞARJLI TORNAVİDA                                                                                                                                                                      |                                   |
| — UZATMA KABLOSU                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Kimyasal Madde Kullanımı</b>                                                                                                                                                         |                                   |
| — ÇİMENTO, ALÇI, EPOKSİ BAĞLAYICI, BOYA, BOYA ÇÖZÜCÜ                                                                                                                                    |                                   |
| <b>Çalışma Alanına Erişim</b>                                                                                                                                                           |                                   |
| — Erişim yolu <a href="#">İnşaat Öncesi Bilgiler &amp; Vaziyet Planları</a> başlığı altında plan şeklinde verilmiştir.                                                                  |                                   |
| • Kamyonlar için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır.                                                                                                                 |                                   |
| • Mobil vinç için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır.                                                                                                                |                                   |
| <b>Malzemelerin Taşınması &amp; Tedarik</b>                                                                                                                                             |                                   |
| — Sarf ve ilgili teknik malzemelerin kaldırılması taşınması ve indirilmesine ilişkin detaylar <a href="#">Genel Şantiye Kuralları</a> alt başlığı altında belirtilmiş ve açıklanmıştır. |                                   |

| KKD - GENEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eğitimli Personel İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>BARET<br/>TS EN 397+A1</li> <li>KULAK TIKACI<br/>TS EN 352-2</li> <li>KORUYUCU GÖZLÜK<br/>TS EN ISO 16321-3</li> <li>GENEL AMAÇLI İŞ ELDİVENİ<br/>TS EN ISO 21420</li> <li>İŞ AYAKKABISI<br/>TS EN ISO 20347</li> <li>YARIM YÜZ MASKESİ<br/>TS EN 140</li> <li>TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ EN 361</li> <li>HALAT FRENLEME SİSTEMİ<br/>EN 353</li> <li>EMNİYET KANCASI<br/>EN 362</li> <li>DÜŞME ENGELLEYİCİ</li> <li>EMNİYET HALATLARI<br/>EN 355</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>MAKİNE MÜHENDİSİ</li> <li>ELEKTRİK MÜHENDİSİ</li> <li>İNŞAAT MÜHENDİSİ</li> <li>MİMAR</li> <li>İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3 (12UY0056-3)</li> <li>ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 (15UY0241-3)</li> <li>ISITMA VE DOĞ.İÇ TES. YAP. PER. SEV. 3 (11UY0031-3)</li> <li>DUVARCI SEVİYE 3 (12UY0048-3)</li> <li>SIVACI SEVİYE 3 (11UY0024-3)</li> <li>ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 (12UY0055-3)</li> <li>SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3 (12UY0051-3)</li> <li>İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3 (11UY0023-3)</li> <li>İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 (16UY0253-2)</li> </ul> |

*Tablo 23 Risk Analizi*

| YAPILACAK İŞ                | TEHLİKE KAYNAĞI       | RİSKLER                                                                                                         | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doğalgaz hattı müdahaleleri | Gaz kaçağı ve patlama | <ul style="list-style-type: none"> <li>Travma</li> <li>Ciddi yanık</li> <li>Uzuv kaybı</li> <li>Ölüm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kazı çalışmaları öncesinde ilgili alanda doğalgaz borusunun olmadığı İGDAŞ üzerinden doğrulanmalıdır.</li> <li>Doğalgaz boru hatlarının müdahale öncesinde kapatılması ve EKED sistemi ile koruma altına alınması gerekmektedir.</li> <li>Mevcut boru hatlarına müdahale ya da yeni hat tesis çalışmaları Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 (12UY0042-4) gözetiminde gerçekleştirilecektir.</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> <li>Çalışma yapılacak alanlar güvenlik şeritleri ile ayrıştırılacaktır ve güvenlik levhaları ile riskler afişe edilecektir.</li> </ul> |

|              |                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duvar yıkımı | Ağır yük altında kalma<br><br>Elektrik çarpması | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ezilme</li><li>▪ Travma</li><li>▪ Elektrik çarpması</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Yıkılacak yapı elemanlarının elektrik hattı barındırması tehlikesi göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu alanın enerjisinin kesilmesi; kırıcı, delici vb. cihazların elektrik ihtiyaçlarının başka hatlardan karşılanmalıdır.</li><li>▪ Enerji kesintisinde EKED kuralları devreye sokulmalıdır.</li><li>▪ Çalışma öncesinde duvar üzerinde priz, anahtar, komütatör, buat vb. ekipmanların varlığı kontrol edilmeli ve yıkım öncesinde Elektrik mühendisi talimatlarına uygun biçimde ekipman, kablo demontajı gerçekleştirilmelidir.</li><li>▪ Yıkım öncesinde priz, buat ve anahtar üzerinden faz voltaj dedektörü kullanılarak enerji olmadığı doğrulanmalıdır.</li><li>▪ Kırırda kullanılacak kırıcı delici ekipmanların tamamının PAT testinden geçmesi ve elektriksel açıdan uygun olduğu doğrulanmalıdır.</li><li>▪ Elektrik uzatma kablolarının tahrip olmaması ve söz konusu kabloların suya temas etmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Uzatma kabloları ve diğer elektrikli cihaz güç kabloları günlük kontrol edilecektir. Tahrip olmuş kabloların kullanımına izin verilmez.</li><li>▪ Yıkımı gerçekleştirilecek duvarların diğer tarafları güvenlik bariyeri ile ayrılmalı ve uyarı levhaları tesis edilmelidir.</li><li>▪ Duvarlar bütün halinde değil, kontrollü şekilde parçalar halinde yıkılmalıdır.</li><li>▪ Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zaruridir.</li></ul> |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| YAPILACAK İŞ                               | TEHLİKE KAYNAĞI                                                                                                               | RİSKLER                                                                                                                                                                                       | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duvar yıkımı                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ağır cisimlerin yüksekten düşmesi.</li> <li>Çalışanların yüksekten düşmesi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baş ve vücut travmaları</li> <li>Ölüm</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bina çevresi güvenlik bariyerleri ve uyarı levhaları ile ayrılacaktır.</li> <li>Yıkımı gerçekleştirilecek duvarın parçalarının düşeceği yüksek riskli alanlar çalışma öncesinde belirlenecek ve sorumlu personeller tarafından gözetilecektir.</li> <li>Duvarı kırımında görev alan personeller tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici donanımları kullanacaktır. Söz konusu donanımlar sağlam yapılara sabitlenecek yaşam hatlarına bağlanacaktır. (Söz konusu personeller yüksekte çalışma eğitimi almalıdır.)</li> <li>Yıkımı gerçekleştirilen duvar bölümleri, yeni duvar tesis edilinceye kadar geçici korkuluklar ve uyarı bant/levhaları ile güvence altına alınacaktır. Gece çalışmalarının yapılması halinde söz konusu bantların ve levhaların reflektörlü özellikte olması gerekmektedir. <ul style="list-style-type: none"> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> </ul> </li> </ul> |
| Perde ve kolon mantosu çevresinin açılması | <ul style="list-style-type: none"> <li>İş makineleri(Beton kırıcı,ekskavatör)</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>İş makinesi manevrası esnasında çarpmaya bağlı yaralanma.</li> <li>İş makinesi ayar ve parça değişimi esnasında uzuvlarda sıkışma, kesilme.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Periyodik muayene raporu ile iş makinesi uygunluğu doğrulanmalıdır.</li> <li>İş makinesi çalıştırılmadan önce operatör tarafından gözle kontrol edilmeli, fiziksel bir kusurun mevcudiyeti değerlendirilmelidir.</li> <li>İş makineleri her bir çalışma öncesinde operatör tarafından fonksiyonel açıdan kontrol edilmelidir. (geri manevra ikaz sireni, uyarı/ikaz aydınlatmaları vb.)</li> <li>İş makinesi sadece yetkili Operatör tarafından kullanılabilir. Operatör mesleki uygunluk belgeleri kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır.</li> <li>İş makinesine yetkili personel ve uzmanların dışında (Operatör, Makine Müh. vb.) müdahale etmesine izin verilemez.</li> <li>İş makinesi çalışma sahası güvenlik şeritleri ile ayrıştırılacaktır ve güvenlik levhaları ile iş makinesine yaklaşmanın yasak olduğu bildirilmelidir.</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> </ul>                   |
| Perde ve kolon mantosu çevresinin açılması | Çukur                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çukura düşme sonucu yaralanma.</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kazılan bölgelerin çevresine uyarı bantları ve levhaları tesis edilmelidir. Gece çalışmalarının yapılması halinde söz konusu bantların ve levhaların reflektörlü özellikte olması gerekmektedir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| YAPILACAK İŞ                                                   | TEHLİKE KAYNAĞI                                              | RİSKLER                                                                                                                                                                                                        | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mevcut kolon, kiriş ve temellere ankraj çubuklarının çakılması | Paslı metal Keskin, sivri kısımlar Elektrikli alet kullanımı | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesilme, batmaya bağlı ciddi travma</li> <li>Tetanos</li> <li>Solunum yolu rahatsızlıkları</li> <li>Göze çapak/küçük parça kaçması.</li> </ul> <p>Elektrik çarpması</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delme ve donatı kesmede kullanılan Elektrikli ekipmanların tamamının PAT testine tabi tutulması ve elektriksel açıdan güvenli olduğunun doğrulanması zorunludur.</li> <li>Uzatma kablolarının ve cihaz besleme kablolarının fiziksel açıdan muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kabloların alelade şekilde yerde serili bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, el arabalarının ve çalışanların geçmelerine izin verilmemelidir. Kabloların su birikintisi içinde kalmasına izin verilememelidir.</li> <li>Kullanım öncesinde elektrikli ekipmanlar gözle kontrol edilmeli fiziksel kusur barındıran cihazlar kullanım dışı bırakılmalıdır.</li> <li>Ankraj çubuklarının tesisi edildiği alanlar uyarı bantları ve levhaları ile afişe edilmelidir. Gece çalışmalarının yapılması halinde söz konusu bantların ve levhaların reflektörlü özellikte olması gerekmektedir.</li> <li>Çalışanların tetanos aşılarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. (İşyeri Hekimi eğitimler esnasında paslı metallerin neden oldukları enfeksiyonlar ve tetanos hakkında çalışanları bilgilendirmelidir.) Çalışanların tamamının uygun tipte koruyucu eldiven kullanması gerekmektedir.</li> <li>Toz ve kimyasal kullanımına karşı göz banyosunun gerekliliği konusu işyeri hekimi tarafından belirlenmelidir.</li> <li>Donatı demirlerini işleyecek personellerin, Betonarme Demircisi Seviye 3 (11UY0012-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li> <li>Keskin, sivri uçlar uygun tipte kesici ya da spiral ile pahlanmalıdır. Düzeltilemeyen keskin, sivri uçlara kauçuk tampon tesis edilmelidir.</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> </ul> |
| Mevcut kolon, kiriş ve temellere ankraj çubuklarının çakılması | Epoksi yapıştırıcılar                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kimyasal temasına bağlı rahatsızlıklar.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Epoksi yapıştırıcıların MSDS 'leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (uçucu özellik, göze teması vb.). <ul style="list-style-type: none"> <li>Toz ve kimyasal kullanımına karşı göz banyosunun gerekliliği konusu işyeri hekimi tarafından belirlenmelidir.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| YAPILACAK İŞ                              | TEHLİKE KAYNAĞI                                                                           | RİSKLER                                                                                                                                                                                                                                | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güçlendirme elemanı donatısının döşenmesi | Metal, kesme, bükme<br>Paslı metal<br>Keskin, sivri kısımlar<br>Elektrikli alet kullanımı | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesilme, batmaya bağlı ciddi travma</li> <li>Uzuv sıkışması</li> <li>Tetanos</li> <li>Solunum yolu rahatsızlıkları</li> <li>Göze çapak/küçük parça kaçması.</li> </ul> <p>Elektrik çarpması</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Donatı demirlerini işleyecek personellerin, Betonarme Demircisi Seviye 3 (11UY0012-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li> <li>Donatı kesme ve bükme, elektrikli ekipmanların tamamının PAT testine tabi tutulması ve elektriksel açıdan güvenli olduğunun doğrulanması zorunludur.</li> <li>Uzatma kablolarının ve cihaz besleme kablolarının fiziksel açıdan muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kabloların alelade şekilde yerde serili bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, el arabalarının ve çalışanların geçmelerine izin verilmemelidir. Kabloların su birikintisi içinde kalmasına izin verilememelidir.</li> <li>Kullanım öncesinde elektrikli ekipmanlar gözle kontrol edilmeli fiziksel kusur barındıran cihazlar kullanım dışı bırakılmalıdır.</li> <li>Elektrikli donatı bükme cihazı kullanılırken, bükme başlıklarına yakın gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde koruyucu eldivenler çıkarılmalıdır.</li> <li>Keskin, sivri uçlar uygun tipte kesici ya da spiral ile pahlanmalıdır. Düzeltilemeyen keskin, sivri uçlara kauçuk tampon tesis edilmelidir.</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> </ul> |
| Güçlendirme elemanı donatısının döşenmesi | Geçici iş iskelesi.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksekten düşme</li> <li>Yüksekten düşen cisimlerin çarpmasına bağlı travmalar.</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurulacak iş iskelelerinin hangi büyüklükte olursa olsun, TS EN 12811-1 standart şartlarını karşılaması esastır. Söz konusu iş iskelelerinde çalışacak bütün personellerin yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanları kullanmaları zorunludur.</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| YAPILACAK İŞ   | TEHLİKE KAYNAĞI                               | RİSKLER                                                                                                                                                                                                 | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRP İmalatları | Taşıma tozu (beton/silika)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Solunum yolu rahatsızlıkları</li> <li>Göze çapak/küçük parça kaçması.</li> <li>Gürültü</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tozsuz taşıma(Islak sistem)</li> <li>Tozlu iş alanını sınırlandırma</li> <li>Gürültü maruziyet sınırlandırması                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, P3 sınıfı partikül toz maskesi veya tam yüz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| FRP İmalatları | Geçici iş iskelesi veya platformlar           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksekten düşme                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksekten düşen cisimlerin çarpmasına bağlı travmalar.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurulacak iş iskelelerinin hangi büyüklükte olursa olsun, TS EN 12811-1 standart şartlarını karşılaması esastır. Söz konusu iş iskelelerinde çalışacak bütün personellerin yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanları kullanmaları zorunludur.</li> <li>Malzemelerin emniyetli şekilde bağlanması, bordür yapılması                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> </ul> </li> </ul> |
| FRP İmalatları | Epoksi kimyasal maruziyeti                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cilt Yanığı</li> <li>Alerji</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>KKD Kullanımı(Tam yüz siperi, Nitril/elastomer eldiven, uzun kollu antistatik giysi.)</li> <li>Kimyasal dökülme müdahale kiti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FRP İmalatları | Ergonomik yük (elle taşıma, tekrarlı hareket) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kas-iskelet rahatsızlıkları</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mola ve rotasyon</li> <li>Ayarlanabilir Çalışma Platformları</li> <li>ISG Ergonomik yük taşıma eğitimi</li> <li>KKD Kullanımı(Eldiven, Çelik burunlu ayakkabı, baret)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FRP İmalatları | Kesici aletler ve FRP kumaş kesimi            | <ul style="list-style-type: none"> <li>El kesikleri</li> <li>Bilek zorlanmaları</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>KKD Kullanımı(Kesiye dayanıklı eldiven)</li> <li>Bilek Destekleyici Ekipman</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| YAPILACAK İŞ | TEHLİKE KAYNAĞI                                                                 | RİSKLER                                                                                                                                                                                                                   | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beton tesisi | Geçici iş iskelesi.<br>Elektrikli ekipman kullanımı<br>Kimyasal madde kullanımı | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksekten düşme</li> <li>Yüksekten düşen cisimlerin çarpmasına bağlı travmalar.</li> <li>Kimyasal temasına bağlı rahatsızlıklar.</li> <li>Elektrik çarpması</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kalıp işlerinde görev alacak personellerin, Ahşap Kalıpcısı Seviye 3 (11UY0011-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li> <li>Beton döküm işlerinde göre alacak personellerin, Betoncu Seviye 3 (12UY0049-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li> <li>Kurulacak iş iskelelerinin hangi büyüklükte olursa olsun, TS EN 12811-1 standart şartlarını karşılaması esastır. Söz konusu iş iskelelerinde çalışacak bütün personellerin yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanları kullanmaları zoruridir.</li> <li>Vibratör vb. elektrikli ekipmanların tamamının PAT testine tabi tutulması ve elektriksel açıdan güvenli olduğunun doğrulanması zoruridir.</li> <li>Uzatma kablolarının ve cihaz besleme kablolarının fiziksel açıdan muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kabloların alelade şekilde yerde serili bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, el arabalarının ve çalışanların geçmelerine izin verilmemelidir. Kabloların su birikintisi içinde kalmasına izin verilememelidir.</li> <li>Tamir harçları vb. malzemelerin MSDS 'leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze temas vb.).</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zoruridir.</li> </ul> |
| Duvar yapımı | Ağır yük taşıma<br>Kimyasal maddeler<br>Geçici iş iskelesi                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ortopedik rahatsızlıklar</li> <li>Kimyasal madde temasına bağlı rahatsızlıklar</li> <li>Yüksekten düşme</li> <li>Yüksekten düşen cisimlerin çarpmasına bağlı travmalar.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duvar örecek personellerin, Duvarcı Seviye 3 (12UY0048-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li> <li>Kurulacak iş iskelelerinin hangi büyüklükte olursa olsun, TS EN 12811-1 standart şartlarını karşılaması esastır. Söz konusu iş iskelelerinde çalışacak bütün personellerin yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanları kullanmaları zoruridir.</li> <li>Harç vb. malzemelerin MSDS 'leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze temas vb.).</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zoruridir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| YAPILACAK İŞ      | TEHLİKE KAYNAĞI                | RİSKLER                                                                                                                                                  | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrik tesisatı | Geçici iş iskelesi<br>Elektrik | <ul style="list-style-type: none"><li>Yüksekten düşme</li><li>Yüksekten düşen cisimlerin çarpmasına bağlı travmalar.</li><li>Elektrik çarpması</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektrik tesisatında çalışacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 (15UY0241-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li><li>Elektrik pano ve tablolarında montaj yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması gerekmektedir. Elektrik çalışmalarının tamamı sorumlu Elektrik ya da Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde gerçekleştirilecektir.</li><li>Elektrik pano/tablo montajı esnasında tork kontrollü tornavida, sıkma ekipmanları kullanılmalıdır. Uygun sıkma kuvvetleri şalt ekipmanı türü ya da vida somun boyutlarına göre önceden belirlenmeli ve sorumlu personellere bildirilmelidir.</li><li>Görevli personellerin tamamı Alçak gerilim güvenlik sınırlarına göre uygun tipte izole elektrik eldiveni ve iş ayakkabısı kullanmalıdır. Söz konusu KKD' lerin uygunluğu standartlar ve CE işaretlemeleri üzerinden İSG Uzmanı tarafından özel olarak gerçekleştirilmelidir.</li><li>Kurulacak iş iskelelerinin hangi büyüklükte olursa olsun, TS EN 12811-1 standart şartlarını karşılaması esastır. Söz konusu iş iskelelerinde çalışacak bütün personellerin yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanları kullanmaları zaruridir.</li></ul> |

| YAPILACAK İŞ              | TEHLİKE KAYNAĞI                | RİSKLER                                                                                                                                                  | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aydınlatma elemanı montaj | Geçici iş iskelesi<br>Elektrik | <ul style="list-style-type: none"><li>Yüksekten düşme</li><li>Yüksekten düşen cisimlerin çarpmasına bağlı travmalar.</li><li>Elektrik çarpması</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Çalışacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 (15UY0241-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li><li>Aydınlatma elemanı montajı öncesi söz konusu hat elektrik enerjisi şalt ekipmanı üzerinden kesilmeli ve EKED sistemi ile güvenlik altına alınmalıdır.</li><li>Demontaj öncesi elektrik enerjisinin kesildiği anahtar, komütatör vb. ekipman bağlantıları üzerinden faz voltaj dedektörü gibi kontrol cihazları ile kontrol edilmelidir.</li><li>Kurulacak iş iskelelerinin hangi büyüklükte olursa olsun, TS EN 12811-1 standart şartlarını karşılaması esastır. Söz konusu iş iskelelerinde çalışacak bütün personellerin yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanları kullanmaları zorunludur.</li><li>Görevli personellerin tamamı Alçak gerilim güvenlik sınırlarına göre uygun tipte izole elektrik eldiveni ve iş ayakkabısı kullanmalıdır. Söz konusu KKD'lerin uygunluğu standartlar ve CE işaretlemeleri üzerinden İSG Uzmanı tarafından özel olarak gerçekleştirilmelidir.</li></ul> |

| YAPILACAK İŞ       | TEHLİKE KAYNAĞI                                  | RİSKLER                                                                                                                                                                                                        | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alçı sıva uygulama | Geçici iş iskelesi<br>Kimyasal madde<br>Elektrik | <ul style="list-style-type: none"><li>Yüksekten düşme</li><li>Yüksekten düşen cisimlerin çarpmasına bağlı travmalar.</li><li>Elektrik çarpması.</li><li>Kimyasal madde temasına bağlı rahatsızlıklar</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Alçı/sıva işlemlerini yapacak personellerin, Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 (12UY0055-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li><li>Kurulacak iş iskelelerinin hangi büyüklükte olursa olsun, TS EN 12811-1 standart şartlarını karşılaması esastır. Söz konusu iş iskelelerinde çalışacak bütün personellerin yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanları kullanmaları zorunludur.</li><li>Kontrol aydınlatması, karıştırıcı vb. elektrikli ekipmanların tamamının PAT testine tabi tutulması ve elektriksel açıdan güvenli olduğunun doğrulanması zorunludur.</li><li>Uzatma kablolarının ve cihaz besleme kablolarının fiziksel açıdan muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kabloların alelade şekilde yerde serili bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, el arabalarının ve çalışanların geçmelerine izin verilmemelidir. Kabloların su birikintisi içinde kalmasına izin verilememelidir.</li><li>Tamir harçları, alçı, sıva vb. malzemelerin MSDS 'leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze temas vb.).</li><li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li></ul> |

| YAPILACAK İŞ                   | TEHLİKE KAYNAĞI                                  | RİSKLER                                                                                                                                                                                                        | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boya                           | Geçici iş iskelesi<br>Kimyasal madde<br>Elektrik | <ul style="list-style-type: none"><li>Yüksekten düşme</li><li>Yüksekten düşen cisimlerin çarpmasına bağlı travmalar.</li><li>Elektrik çarpması.</li><li>Kimyasal madde temasına bağlı rahatsızlıklar</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Boya işlerinde görev alacak personellerin, İnşaat Boyacısı Seviye 3 (11UY0023-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li><li>Kurulacak iş iskelelerinin hangi büyüklükte olursa olsun, TS EN 12811-1 standart şartlarını karşılaması esastır. Söz konusu iş iskelelerinde çalışacak bütün personellerin yüksekte çalışma eğitimi almış olmaları, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanları kullanmaları zorunludur.</li><li>Kontrol aydınlatması, karıştırıcı vb. elektrikli ekipmanların tamamının PAT testine tabi tutulması ve elektriksel açıdan güvenli olduğunun doğrulanması zorunludur.</li><li>Uzatma kablolarının ve cihaz besleme kablolarının fiziksel açıdan muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kabloların alelade şekilde yerde serili bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, el arabalarının ve çalışanların geçmelerine izin verilmemelidir. Kabloların su birikintisi içinde kalmasına izin verilememelidir.</li><li>Tamir harçları, boya, çözücü vb. malzemelerin MSDS 'leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze temas vb.).</li><li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li></ul> |
| Seramik karo vb. döşeme işleri | Kimyasal madde<br>Elektrik                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektrik çarpması.</li><li>Kimyasal madde temasına bağlı rahatsızlıklar</li></ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Seramik karo işlerinde görev alacak personellerin, Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3 (12UY0051-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li><li>Karıştırıcı, kırıcı/delici vb. elektrikli ekipmanların tamamının PAT testine tabi tutulması ve elektriksel açıdan güvenli olduğunun doğrulanması zorunludur.</li><li>Uzatma kablolarının ve cihaz besleme kablolarının fiziksel açıdan muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kabloların alelade şekilde yerde serili bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, el arabalarının ve çalışanların geçmelerine izin verilmemelidir. Kabloların su birikintisi içinde kalmasına izin verilememelidir.</li><li>Yapıştırma harçları vb. malzemelerin MSDS 'leri işyeri hekimleri tarafından kontrol edilmeli ve çalışanlar bilgilendirilmelidir (teneffüs, göze temas vb.).</li><li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| YAPILACAK İŞ    | TEHLİKE KAYNAĞI | RİSKLER                                                              | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik tesisat | Elektrik        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Elektrik çarpması.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mekanik tesisat sürecinde görev alacak personellerin asgari olarak; Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li><li>▪ Elektrikli ekipmanların tamamının PAT testine tabi tutulması ve elektriksel açıdan güvenli olduğunun doğrulanması zorunludur.</li><li>▪ Uzatma kablolarının ve cihaz besleme kablolarının fiziksel açıdan muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kabloların alelade şekilde yerde serili bırakılmaları, o esnada üzerlerinden, el arabalarının ve çalışanların geçmelerine izin verilmemelidir. Kabloların su birikintisi içinde kalmasına izin verilememelidir.</li><li>▪ Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li></ul> |



## 8.1.2 Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği odaklı renovasyon başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Kampüs içerisinde yapılan hesaplamalar sonucunda mevcut tüketim değerleri dikkate alınarak, kapsam dahilindeki 25 bina(Grup1, Grup2, Grup3 ve Grup 4 binaları) için toplamda 3.000 kWe PV kurulumunun yeterli olacağı hesaplanmıştır.

Kampüs içerisinde güneş enerjisi santrallerinin kurulacağı alanlar incelendiğinde uygulama ve gölgelendirme açısından en uygun yerin Şekil 39 alanı olacağı görülmektedir. GES'ler arazi tipi olmakla birlikte, çalışmalar sırasında insan veya malzeme düşme tehlikesine karşı inşaat güvenlik ağı veya inşaat güvenlik ağı kullanılacaktır. Şantiyelerde düşmelere karşı alınacak bu önlem, hammadde, üretim yöntemi ve uygulama açısından TSE 1263-1 ve TSE 1263-2 standartlarına uygun olmalıdır. Güvenlik ağları, pasif düşüş durdurma sistemleri arasında en etkili genel güvenlik önlemidir.

- **Arazi tipi PV sistemi ile elektrik üretimi**



Şekil 22 Fırat Üniversitesi PV Yerleşimi

- Çalışmaların tamamı yetkili bir Elektrik ya da Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
- Çalışacak personellerin tamamının yüksekte çalışma eğitimi almış olması zaruridir.
- Çalışacak personellerin tamamının, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanlar kullanması zaruridir.
- Düşme engelleyici ekipmanların bağlantısı için yatay güvenlik hattı tesisi gerekmektedir.
- Panellerin tamamının taşınmasında kullanılacak kamyon ve mobil vincin trafik eylem planına uygun hareket etmesi zaruridir.
- Mobil vinç kaldırma taşıma operasyonlarında taşıma hattının güvence altına alınması (düşme tehlikesi barındıran alanlara girişin engellenmesi).
- Mobil vinç, mapa ve sapan muayene raporları kontrol edilmeli ile uygunluğun doğrulanmalıdır.
- Mobil vinci kumanda edecek çalışanın operatör belgesi kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır.
- Yönlendirme halatlarını ve taşıyıcı sapanları tesis eden personellerin İşaretçi Seviye 2 (15UY0218-2) Sapanıcı Eğitim belgeli olması gerekmektedir.
- Elektrikli el aletlerinin tamamının (*mobil beton mikseri, vibratör, beton pompası vb.*) PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.)
- Elektrik tesisatında çalışacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 (15UY0241-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrik pano ve tablolarında montaj yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrik pano/tablo montajı esnasında tork kontrollü tornavida, sıkma ekipmanları kullanılmalıdır. Uygun sıkma kuvvetleri şalt ekipmanı türü ya da vida somun boyutlarına göre önceden belirlenmeli ve sorumlu personellere bildirilmelidir.
- Elektrik sistemi topraklama hattı yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik Mühendisleri tarafından raporlanmalıdır.
- Elektrik çarpmalarına karşı izole iş eldiveni (alçak gerilim şartlarına uygun) ve izole iş ayakkabısı kullanılmalıdır.

Tablo 24 Arazi Tipi GES Uygulaması Kontrol Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yapılacak İş:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fotovoltaik Enerji Tesisinin Kurulması                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ÇALIŞMA YÖNTEMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>Teknik Açıklama ve Gereklilikler</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yapım Tekniği ve Teknolojisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– PV paneller, solar invertörler ve taşıyıcı konstrüksiyon parçaları kamyonlarla sahaya taşınacaktır. Tüm ekipmanlar güvenli bir şekilde kamyona sabitlenecektir. Taşıyıcı konstrüksiyon ayakları yere monte edilerek sabitlendikten sonra üst konstrüksiyon monte edilecektir. Vinç marifeti ile taşınan paneller söz konusu konstrüksiyona projeye uygun biçimde sabitlenecek, enerji ve topraklama kabloları konnektör ile birleşerek ana panel üzerine monte edilen invertöre ve güneş paneline bağlanacaktır. Son olarak test, devreye alma ve kabul gerçekleştirilecektir.</li><li>– Kamyon</li><li>– Mobil Vinç</li><li>– Yük taşıma ekipmanları (Mapa, sapan, kanca, zincir)</li><li>– Tork anahtarı</li><li>– Şarjlı matkap</li><li>– Tornavida seti</li><li>– Multimetre</li><li>– Kablo kesme soyma el ekipmanları (keski, pense, karga burun vb.)</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kimyasal Madde Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Yoktur</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Çalışma Alanına Erişim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Erişim yolu Genel Yapım Tekniği başlığı altında plan şeklinde verilmiştir.<ul style="list-style-type: none"><li>• Kamyonlar için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır.</li><li>• Mobil vinç için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>KKD - GENEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Eğitimli Personel İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. EN 397 BARET</li><li>2. EN 420 İZOLE ELDİVEN</li><li>3. EN 345 İZOLE İŞ AYAKKIBISI 200J</li><li>4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ</li><li>5. TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ (EN 361)</li><li>6. HALAT FRENLEME SİSTEMİ (EN 353)</li><li>7. EMNİYET KANCASI (EN 362)</li><li>8. DÜŞME ENGELLEYİCİ (EN 355)</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Elektrik Elektronik Mühendisi</li><li>2. C SINIFI sürücü belgesine sahip kamyon şoförü</li><li>3. Mobil Vinç Operatörü (Yet. K.: 13UY0172-3   Seviye 3)</li><li>4. İşaretçi (Yet. K.: 15UY0218-2   Seviye 2)</li><li>5. Elektrik Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3   Seviye 3)</li></ol> |

Tablo 25 Arazi tipi GES Uygulaması Risk Analizi

| YAPILACAK İŞ                          | TEHLİKE                           | RİSK                                                                       | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzemelerin taşınması                | Kamyon                            | Trafik kazası sonucu yaralanma, ölüm                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Kamyon C sınıfı ehliyete sahip çalışanlar tarafından kullanılacaktır.</li><li>Şehir içi hız sınırı aşılmayacaktır. (50km/h)</li><li>Bina kampüs sahası hız sınırı 20 km/h ile sınırlandırılmıştır. Saha içi hareket ve manevralar İSG uzmanı tarafından gözlenecektir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Malzemelerin taşınması                | PV paneller ve montaj parçaları   | PV paneller ya da parçalarının devrilmesi sonucu yaralanma, ölüm           | <ul style="list-style-type: none"><li>Bütün malzemeler ağırlık merkezi dikkate alınarak kamyon kasası merkezine dengeli şekilde yerleştirilecektir.</li><li>Ünite sapanlar ile sabitlenecektir.</li><li>Montaj parçaları palet üzerinde paketli halde taşınacaktır.</li><li>Kamyon yan ve arka kapakları kapatılacak ve sabitlenecektir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Malzemelerin taşınması ve indirilmesi | Mobil Vinç & kaldırma ekipmanları | Kaldırma, taşıma ve indirme esnasında yükün düşmesi sonucu yaralanma, ölüm | <ul style="list-style-type: none"><li>Vinç Mobil Vinç Operatörü (Yet. K.: 13UY0172-3   Seviye 3) tarafından kullanılabilir.</li><li>Sapanlama ve yönlendirme yetki belgeli işaretçiler tarafından gerçekleştirilecektir.</li><li>Vinç periyodik muayene raporu çalışma öncesinde İSG uzmanı tarafından kontrol edilecek ve doğrulanacaktır. (azami 6 aylık süre dahilinde temin edilmesi talep edilecektir.)</li><li>Sapan, zincir, mapa, kanca periyodik muayene raporu çalışma öncesinde İSG uzmanı tarafından kontrol edilecek ve doğrulanacaktır. (azami 6 aylık süre dahilinde temin edilmesi talep edilecektir.)</li><li>Sapan, mapa ve kanca çalışma öncesinde görsel olarak kontrol edilecektir. Taşıma kapasitesi ve fiziksel kondisyonu doğrulanacaktır.</li><li>Mobil vinç hidrolik sabitleme ayakları zemine sabitlenecektir.</li><li>Kaldırma operasyonu öncesinde mobil vinç ana bom açısı ve söz konusu açığa ilişkin kaldırma kapasiteleri kontrol edilecektir.</li><li>Kontrol ipi üzerinden işaretçi tarafından yük yönlendirilecektir.</li><li>Kaldırma, taşıma operasyonu boyunca çalışma sahasına erişim kısıtlanacaktır. Yük altından geçilmesi yasaktır.</li><li>Uyarı levhaları tesis edilecektir.</li><li>Çalışmalar İŞ İZİN SİSTEMİNE tabi tutulacaktır.</li></ul> |

| YAPILACAK İŞ                                                                  | TEHLİKE                 | RİSK                                                                   | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PV Panel Montaj çalışmaları                                                   | Yüksekte çalışma        | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>İşçilerin işe başlamadan önce İple Erişim ile Yüksekte Çalışma Eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Bu eğitimler en az IRATA (Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği) Uluslararası Seviye 2 Sertifikasına sahip uzmanlar tarafından verilecektir</li> <li>Panel Montajın yapılacağı alana işçilerin ve üçüncü şahısların girişini engelleyecek şekilde güvenlik bantları ile işaretlenecektir.</li> <li>Yüksekte gerçekleştirilen çalışmalar esnasında özellikle düşme riskinin yüksek olduğu kenar hattında gerçekleştirilen çalışmalar esnasında (kenar hattından 1 m mesafede) hareket kısıtlayıcı sistemler kullanılacaktır. (yatay yaşam hatları)</li> <li>Montajı yapılacak malzemeler kenarlarda tutulmayacak ve çalışma olmadığı zamanlarda serbest malzeme sabitleme filesi ile sabitlenecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PV Panel ve konstrüksiyon Montajı                                             | Montaj işleri           | PV paneller ve konstrüksiyon monte edilirken uzuv kesilmesi, sıkışması | <ul style="list-style-type: none"> <li>PV paneller ve konstrüksiyon montajı Makine Montajcısı (Yet. K.: 12UY0105-3   Seviye 3) tarafından</li> <li>Montaj süresince kafa ve el yaralanmalarına karşı baret ve genel koruma iş eldiveni kullanılacaktır. gerçekleştirilecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrik panosu üzerinden hat enerjisinin kesilmesi, yeniden enerji verilmesi | Güç panosu, hat kablolu | Pano içinde gerçekleştirilen çalışma esnasında elektrik çarpması.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pano müdahalesi elektrik ya da Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde asgari Elektrik Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3   Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.</li> <li>Enerji kesildikten sonra nötr ve toprak hattında enerji olmadığı multimetre kullanılmak sureti ile doğrulanacaktır.</li> <li>Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve yeni bağlantı yapılması öncesi tekrar enerji olmadığı multimetre kullanılmak suretiyle doğrulanacaktır.</li> <li>Söz konusu pano Kilitlenecek ve etiketleneyecektir.</li> <li>Elektrik çalışmaları esnasında EN 60903 :2003 standardına uygun 1kV izole eldiven, EN 344 standardına uygun izole elektrikçi iş ayakkabısı kullanılacak zemine izole paspas (EN 60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1) konulacaktır.</li> <li>Çalışmalar asgari iki teknik çalışan tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışma esnasında bu kişiler birbirine temas etmeyecektir.</li> <li>Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek teknik personellere elektrik çarpmasının etkileri ve ilk müdahale konusunda eğitim verilecek ve tatbikat gerçekleştirilecektir.</li> </ul> |

|                                   |               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PV Panel ve konstrüksiyon montajı | Montaj işleri | PV paneller ve konstrüksiyon monte edilirken uzuv kesilmesi, sıkışması. | <ul style="list-style-type: none"><li>• PV paneller ve konstrüksiyon montajı Makine Montajcısı (Yet. K.: 12UY0105-3   Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.</li><li>• Montaj süresince kafa ve el yaralanmalarına karşı baret ve genel koruma iş eldiveni kullanılacaktır.</li></ul> |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| YAPILACAK İŞ         | TEHLİKE                   | RİSK                                 | ÖNLEM                                                                                               |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açık Alan Çalışması  | Aşırı Sıcak               | Isı Stresi                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gölge</li><li>• Mola</li><li>• Sıvı Tüketimi</li></ul>      |
| Açık Arazide Çalışma | Yıldırım                  | Elk. Çarpması                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fırtınalı havada çalışılmaması</li></ul>                    |
| Açık Arazide Çalışma | Rüzgar                    | Panel Savrulması sonucu yaralanma    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rüzgar hızı limitleri dahilinde çalışma yapılması</li></ul> |
| Açık Arazide Çalışma | Yılan, Akrep, Kene, Böcek | Alerjik Reaksiyonlar Sokma, Hastalık | <ul style="list-style-type: none"><li>• İlk Yardım Seti</li><li>• KKD Kullanımı</li></ul>           |

## ▪ Rooftop Tesis

- Çalışmaların tamamı yetkin Makine Mühendisi gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
- Rooftop ve tesisat elemanları nakil işleminde kullanılacak kamyon trafik eylem planına uygun hareket etmelidir.
- Mekanik tesisat sürecinde görev alacak personellerin asgari olarak; Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Rooftop cihazının kaldırılması ve taşınmasında kullanılacak mobil vincin uygunluğu periyodik muayene raporları üzerinden (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından düzenlemiş) doğrulanmalıdır.
- Vinç kullanıcılarının operatör belgeleri doğrulanmalıdır.
- Renovasyon sürecinde rooftop tesis alanı ve ısı merkezinin çevresi yetkisiz personel girişinin engellenmesi için işaret bantları ile çevrelenmelidir.
- Elektrik tesisatı ve pano montaj işlerini yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrik sistemi topraklama hattı yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik Mühendisleri tarafından raporlanmalıdır.
- Elektrik çarpmalarına karşı izole iş eldiveni (alçak gerilim şartlarına uygun) ve izole iş ayakkabısı kullanılmalıdır.
- Ağır yük taşıyacak elemanların tamamı, elle kaldırma ve taşıma eğitimi almalıdır.

*Tablo 26 Rooftop Tesis kontrol tablosu*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yapılacak İş:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rooftop Tesis                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ÇALIŞMA YÖNTEMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Teknik Açıklama ve Gereklilikler</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Yapım Tekniği ve Teknolojisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Mevcut motor enerjisi kesilecek, sıkma, uygun başlıklı tornavida marifeti ile önce elektrik bağlantıları daha sonra sabitleme bağlantıları çıkarılarak zemine istiflenecektir. Pompalar uygun el ekipmanları ile yerinden çıkarılacak ve zemine istiflenecektir. Motor pompa elemanları hat borusuna projeye uygun biçimde sabitlenecek ve üretici tarafından belirtilen elektrik bağlantıları gerçekleştirilecektir.</li><li>– Pano montajı esnasında uygun boyutlarda yüksük kullanılacak canlı uç açıkta bırakılmayacaktır.</li><li>– <b>İş Ekipmanı Kullanımı</b></li><li>– Kamyon, Mobil vinç</li><li>– Elektrikli El Aletleri(Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.)</li><li>– Kırıcı delici</li><li>– Sprial</li><li>– Tork Anahtarı</li><li>– Multimetre</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kimyasal Madde Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Mekanik Sistem Yağları</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Çalışma Alanına Erişim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Isı Merkezi bina içindedir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Malzemelerin Taşınması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Kamyonlar kampüs içinde azami 20 km hızla hareket edebilir. Trafik eylem planı oluşturuldu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>KKD - GENEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Eğitilmiş Personel İhtiyacı</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. EN 397 BARET<br>2. EN 420 İZOLE ELDİVEN<br>3. EN 345 İZOLE İŞ AYAKKABISI 200J<br>4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. C SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP KAMYON ŞOFÖRÜ<br>2. MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ (YET. K.: 13UY0172-3   SEVİYE 3)<br>3. İŞARETÇİ (YET. K.: 15UY0218-2   SEVİYE 2)<br>4. MAKİNE MONTAJCISI (YET. K.: 12UY0105-3   SEVİYE 3)<br>5. ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3   SEVİYE 3) |



*Tablo 27 Rooftop Tesisi risk analizi*

| YAPILACAK İŞ                                             | TEHLİKE                           | RİSK                                                                           | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rooftop Cihazının Taşınması                              | Kamyon                            | Trafik kazası sonucu yaralanma, ölüm                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamyon C sınıfı ehliyete sahip kişiler tarafından kullanılacaktır.</li> <li>Şehir içi hız sınırı aşılmayacaktır. (50km/h)</li> <li>Bina kampüs sahası hız sınırı 20 km/h ile sınırlandırılmıştır. Saha içi hareket ve manevralar İSG uzmanı tarafından gözlenecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rooftop Cihazının Taşınması                              | Rooftop Cihazının parçaları       | Taşınan Rooftop cihazının ya da parçalarının devrilmesi sonucu yaralanma, ölüm | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isı pompasının ağırlık merkezi dikkate alınarak kamyon kasası merkezine dengeli şekilde yerleştirilecektir.</li> <li>Ünite sapanlar ile sabitlenecektir.</li> <li>Montaj parçaları palet üzerinde paketli halde taşınacaktır.</li> <li>Kamyon yan ve arka kapakları kapatılacak ve sabitlenecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rooftop Cihazının kaldırılması, taşınması ve indirilmesi | Mobil Vinç & kaldırma ekipmanları | Kaldırma, taşıma ve indirme esnasında yükün düşmesi sonucu yaralanma, ölüm     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vinç Mobil Vinç Operatörü (Yet. K.: 13UY0172-3   Seviye 3) tarafından kullanılabilir.</li> <li>Sapanlama ve yönlendirme yetki belgeli işaretçiler tarafından gerçekleştirilecektir.</li> <li>Vinç periyodik muayene raporu çalışma öncesinde İSG uzmanı tarafından kontrol edilecek ve doğrulanacaktır. (azami 6 aylık süre dahilinde temin edilmesi talep edilecektir.) Sapan, zincir, mapa, kanca periyodik muayene raporu çalışma öncesinde İSG uzmanı tarafından kontrol edilecek ve doğrulanacaktır. (azami 6 aylık süre dahilinde temin edilmesi talep edilecektir.)</li> <li>Sapan, mapa ve kanca çalışma öncesinde görsel olarak kontrol edilecektir. Taşıma kapasitesi ve fiziksel kondisyonu doğrulanacaktır. Mobil vinç hidrolik sabitleme ayakları zemine sabitlenecektir.</li> <li>Kaldırma operasyonu öncesinde mobil vinç ana bom açısı ve söz konusu açığa ilişkin kaldırma kapasiteleri kontrol edilecektir.</li> <li>Kontrol ipi üzerinden işaretçi tarafından yük yönlendirilecektir.</li> <li>Kaldırma, taşıma operasyonu boyunca çalışma sahasına erişim kısıtlanacaktır. Yük altından geçilmesi yasaktır.</li> <li>Uyarı levhaları tesis edilecektir.</li> <li>Çalışmalar İŞ İZİN SİSTEMİNE tabi tutulacaktır.</li> </ul> |

|                                                          |                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rooftop Cihazının kaldırılması, taşınması ve indirilmesi | Mobil Vinç & kaldırma ekipmanları | Kaldırma, taşıma ve indirme esnasında yükün savrulması sonucu yaralanma, ölüm                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vinç Mobil Vinç Operatörü (Yet. K.: 13UY0172-3   Seviye 3) tarafından kullanılabilir.</li> <li>Sapanlama ve yönlendirme yetki belgeli işaretçiler tarafından gerçekleştirilecektir.</li> <li>Mobil vinç hidrolik sabitleme ayakları zemine sabitlenecektir.</li> <li>Kaldırma operasyonu öncesinde mobil vinç ana bom açısı ve söz konusu açığa ilişkin kaldırma kapasiteleri kontrol edilecektir.</li> <li>Kontrol ipi üzerinden işaretçi tarafından yük yönlendirilecektir.</li> <li>Kaldırma, taşıma operasyonu boyunca çalışma sahasına erişim kısıtlanacaktır. Yük altından geçilmesi yasaktır.</li> <li>Uyarı levhaları tesis edilecektir.</li> <li>Çalışmalar İŞ İZİN SİSTEMİNE tabi tutulacaktır</li> </ul>                                                                        |
| Elektrik panosu üzerinden hat enerjisinin kesilmesi      | Güç panosu, hat kablosu           | Enerjinin başka kişiler tarafından izinsiz açılması veya teknik problemler nedeniyle elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pano müdahalesi Elektrik Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3   Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.</li> <li>Elektrik çalışmaları esnasında EN 60903 :2003 standardına uygun 1kV izole eldiven, EN 344 standardına uygun izole elektrikçi iş ayakkabısı kullanılacak zemine izole paspas (EN 60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1) konulacaktır.</li> <li>Söz konusu pano EKED kurallarına uygun biçimde etiketlenecek ve kilitlenecektir.</li> <li>Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve yeni bağlantı yapılması öncesi tekrar enerji olmadığı multimetre kullanılmak suretiyle doğrulanacaktır.</li> <li>Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek teknik personellere elektrik çarpmasının etkileri ve ilk müdahale konusunda eğitim verilecek ve tatbikat gerçekleştirilecektir</li> </ul> |

▪ **Isı Merkezinde Bulunan ısıtma pompalarının verimli pompalar ile yenilenmesi (Sürücülü Pompalar) Mekanik Tesisatların Yenilenmesi**

• Motor hattı ve pano şalt ekipmanı bağlantılarını yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.

• Elektrik pano/tablo montajı esnasında tork kontrollü tornavida, sıkma ekipmanları kullanılmalıdır. Uygun sıkma kuvvetleri şalt ekipmanı türü ya da vida somun boyutlarına göre önceden belirlenmeli ve sorumlu personellere bildirilmelidir.

• Elektrik çarpmalarına karşı izole iş eldiveni (alçak gerilim şartlarına uygun) ve izole iş ayakkabısı kullanılmalıdır.

• Pano güvenliği için EKED sistemi kullanılmalıdır.

• Ağır yük taşıyacak elemanların tamamı, elle kaldırma ve taşıma eğitimi almalıdır.

Tablo 28 Bina sirkülasyon pompa değişim işleri kontrol tablosu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Yapılacak İş:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Isıtma Pompalarının Sürücülü olarak değişimi                |
| <b>ÇALIŞMA YÖNTEMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <b><u>Teknik Açıklama ve Gereklilikler</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| <b>Yapım Tekniği ve Teknolojisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Mevcut motor enerjisi kesilecek, sıkma, uygun başlıklı tornavida marifeti ile önce elektrik bağlantıları daha sonra sabitleme bağlantıları çıkarılarak zemine istiflenecektir. Pompalar uygun el ekipmanları ile yerinden çıkarılacak ve zemine istiflenecektir. Motor pompa elemanları hat borusuna projeye uygun biçimde sabitlenecek ve üretici tarafından belirtilen elektrik bağlantıları gerçekleştirilecektir.</li><li>– Pano montajı esnasında uygun boyutlarda yüksük kullanılacak canlı uç açıkta bırakılmayacaktır.</li><li>– <b>İş Ekipmanı Kullanımı</b></li><li>– Multimetre</li><li>– Elektrikli El Aletleri(Pense, kontrol kalem, tornavida vb.)</li></ul> |                                                             |
| <b>Kimyasal Madde Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Herhangi bir kimyasal kullanılması öngörülmez</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| <b>Çalışma Alanına Erişim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Isı Merkezi bina içindedir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <b>Malzemelerin Taşınması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Malzemeler el ile taşınacaktır.(Elle taşıma eğitimi verilmelidir.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| <b>KKD - GENEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Eğitimli Personel İhtiyacı</b>                           |
| 1. EN 397 BARET<br>2.EN 420 İZOLE ELDİVEN<br>3. EN 345 İZOLE İŞ AYAKKABISI 200J<br>4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3   SEVİYE 3) |

Tablo 29 Bina sirkülasyon pompa değişimi işleri risk analizi

| YAPILACAK İŞ                                        | TEHLİKE                | RİSK                                                                                                                | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrik panosu üzerinden hat enerjisinin kesilmesi | Güç panosu, Hat panosu | Enerjinin başka kişiler tarafından izinsiz açılması veya teknik problemlerden dolayı elektrik çarpmasına bağlı ölüm | <ul style="list-style-type: none"><li>Pano müdahalesi Elektrik Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3   Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.</li><li>Elektrik çalışmaları esnasında EN 60903 :2003 standardına uygun 1kV izole eldiven, EN 344 standardına uygun izole elektrikçi iş ayakkabısı kullanılacak zemine izole paspas (EN 60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1) konulacaktır.</li><li>Söz konusu pano EKED kurallarına uygun biçimde etiketlenecek ve kilitlenecektir.</li><li>Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve yeni bağlantı yapılması öncesi tekrar enerji olmadığı multimetre kullanılmak suretiyle doğrulanacaktır.</li><li>Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek teknik personellere elektrik çarpmasının etkileri ve ilk müdahale konusunda eğitim verilecek ve tatbikat gerçekleştirilecektir</li></ul> |
| Montaj yeniden enerji verilmesi                     | Güç panosu, Hat panosu | Motor ve pano bağlantısı esnasında elektrik çarpması                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Pano müdahalesi Elektrik ya da Elektrik Elektronik Müh. Gözetiminde asgari Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3   Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.</li><li>Elektrik çalışmaları esnasında EN 60903 :2003 standardına uygun 1kV izole eldiven, EN 344 standardına uygun izole elektrikçi iş ayakkabısı kullanılacak zemine izole paspas (EN 60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1) konulacaktır.</li><li>Çalışmalar asgari iki teknik çalışan tarafından gerçekleştirilecektir.Çalışma esnasında bu kişiler birbirine temas etmeyecektir</li><li>Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek teknik personellere elektrik çarpmasının etkileri ve ilk müdahale konusunda eğitim verilecek ve tatbikat gerçekleştirilecektir</li></ul>                                                   |

- **LED'e dönüştürülmemiş armatürlerin aynı boyuttaki yüksek verimli LED armatürlerle değiştirilmesi**
  - Armatür değişiminde çalışan personelin minimum Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 (15UY0241-3) sertifikasına sahip olması gerekir.
  - Elektrik çarpmasını önlemek için izolasyonlu eldiven (alçak gerilim koşullarına uygun) ve izolasyonlu iş ayakkabısı kullanılmalıdır.
  - Pano içi bağlantıları yapacak personelin Elektrik Panosu Montajcısına sahip olması gerekmektedir (sertifika: 12UY0075-3 | Seviye 3).
  - Pano güvenliği için EKED sistemi kullanımı.
  - Aydınlatma hattının koruma sigortası etiketlenmemişse etiketleme yapılacaktır.
  - Mobil iş iskeleleri TS EN 12811-1 standartlarına uygun olmalıdır. Bu iskelelerde çalışan tüm personelin yüksekte çalışma eğitimi almış olması ve tam vücut emniyet kemeri ve düşme önleyici ekipman kullanması gerekmektedir.
  - İskele kurulumundan sorumlu personelin İskele Kurulum Operatörü Seviye 3 (12UY0056-3) sertifikasına sahip olması gerekir.



Şekil 23 Mobil İskele Örnek Gösterim

Tablo 30 Mevcut Aydınlatma Elemanlarının LED Dönüşümünün Tamamlanması İşleri Kontrol Planı

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yapılacak İş:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mevcut Aydınlatma Elemanlarının LED Dönüşümlerinin Tamamlanması                                                                                             |
| <b>ÇALIŞMA YÖNTEMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| <b><u>Teknik Açıklama ve Gereklilikler</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| <b>Yapım Tekniği ve Teknolojisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Aydınlatma elemanı enerjisi kolon ve linye hattı üzerinden kesilecek ve multimetre ile kontrol edilecektir.</li><li>Mevcut aydınlatma elemanları sabitleme vidaları sökülecektir. Boşta kalan armatür çıkarılarak klemens bağlantıları açığa çıkarılacaktır.</li><li>Kablo enerji bağlantısı klemensler üzerinden uygun başlıklı vida kullanılarak sökülecektir. Kablo görsel olarak kontrol edilecek yeni armatür bağlantısı için uygun hale getirilecektir.</li><li>Yeni armatür bağlantısı klemens üzerinden gerçekleştirilecek, bağlantı sağlamlığı elle kontrol edilecek ve armatür tavana üretici tarafından iletilen bağlantı elemanları kullanılarak sabitlenecektir.</li></ul> |                                                                                                                                                             |
| <b>İş Ekipmanı Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Elektrik el aletleri (Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.), H ya da L tipi mobil iskele</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>Kimyasal Madde Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Herhangi bir kimyasal madde kullanılması öngörülmez.<ul style="list-style-type: none"><li>Yeni temin edilen LED armatür montajı yapılacaktır.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
| <b>Çalışma Alanına Erişim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Çalışma alanı bina içerisinde bulunan muhtelif noktalardadır. Bina içi ulaşım yolları kullanılacaktır.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| <b>Malzemelerin Taşınması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Malzemeler el ile taşınacaktır.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| <b>KKD – GENEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Eğitimli Personel İhtiyacı</b>                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>EN 397 BARET</li><li>EN 420 İZOLE ELEKTRİK ELDİVENİ</li><li>EN 345 İZOLE İŞ AYAKKABI</li><li>EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ</li><li>TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ (EN 361)</li><li>HALAT FRENLEME SİSTEMİ (EN 353)</li><li>EMNİYET KANCASI (EN 362)</li><li>DÜŞME ENGELLEYİCİ (EN 355)</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 (15UY0241-3)</li><li>ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3   SEVİYE 3)</li></ol> |

*Tablo 31 Aydınlatma Elemanlarının LED Dönüşümünün Tamamlanması İşleri Risk Analizi*

| YAPILACAK İŞ                                        | TEHLİKE                 | RİSKLER                                                                                                                        | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrik panosu üzerinden hat enerjisinin kesilmesi | Güç panosu, hat kablosu | Enerjinin başka kişiler tarafından izinsiz açılması veya teknik problemler nedeniyle elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pano müdahalesi elektrik ya da Elektrik Elektronik Müh. Gözetiminde asgari Elektrik Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3   Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.</li> <li>Enerji kesildikten sonra nötr ve toprak hattında enerji olmadığı multimetre kullanılmak sureti ile doğrulanacaktır.</li> <li>Söz konusu pano EKED kurallarına uygun biçimde kilitlenecek ve etiketlenecektir.</li> <li>Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve yeni bağlantı yapılması öncesi tekrar enerji olmadığı multimetre kullanılmak suretiyle doğrulanacaktır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Demontaj ve montaj                                  | iskele                  | Yüksekten düşme, Malzeme düşmesi                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>H ya da L tipi mobil iskele kurulacaktır. Söz konusu iskele TS EN 1004-19 standartlarına uygun olmalıdır. İskele kurulumu İskele Kurulum Elemanı belgesine sahip personeller tarafından gerçekleştirilecektir. (Yeterlilik Kodu: 12UY0056-3   Seviye 3)</li> <li>Kurulumu gerçekleştirilen mobil iskele çalışma öncesinde üretici tarafından tesisi edilen sabitleme elemanları ile sabitlenmelidir. Hareketli konumda çalışma yapılması kesinlikle yasaktır.</li> <li>Kurulumu tamamlanan iskeleler Saha İSG Uzmanı tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır. Onaylanmayan mobil iskelenin kullanılması yasaktır.</li> <li>İskele üzeri azami taşıma kapasitesi bilgisi ve uyarı levhaları üzerinde bulunacaktır.</li> <li>Malzeme düşmelerine karşı iskelede tekmelik bulunacaktır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Demontaj, Montaj, yeniden enerji verilmesi          | Güç panosu, hat kablosu | Pano içinde gerçekleştirilen çalışma esnasında elektrik çarpması.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Armatür demontaj ve montajı; ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 (15UY0241-3) yeterlilik belgesine sahip teknik personeller tarafından gerçekleştirilecektir.</li> <li>Demontaj öncesi elektrik akımının olmadığı multimetre üzerinden doğrulanacaktır. Bu esnada sadece faz linyeleri değil topraklama ve nötr hatları da kontrol edilecektir.</li> <li>Pano müdahalesi elektrik ya da Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde asgari Elektrik Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3   Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.</li> <li>Elektrik çalışmaları esnasında EN 60903 :2003 standardına uygun 1kV izole eldiven, EN 344 standardına uygun izole elektrikçi iş ayakkabısı kullanılacak zemine izole paspas (EN 60243-1) ya da sehpa (EN 60243-1) konulacaktır.</li> <li>Çalışmalar asgari iki teknik çalışan tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışma esnasında bu kişiler birbirine temas etmeyecektir.</li> <li>Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek teknik personellere elektrik çarpmasının etkileri ve ilk müdahale konusunda eğitim verilecek ve tatbikat gerçekleştirilecektir.</li> </ul> |



**Enerji izleme sistemi, otomasyon sisteminin EN ISO 50001 enerji Yönetim Sistem şartlarına uygun biçimde kurulması ve etkinliğinin sağlanması.**

- Enerji izleme sistemi ve otomasyon sistemlerinin tesisinde görev alacak personellerin asgari olarak, Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4 (12UY0076-4) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrik çarpmalarına karşı izole iş eldiveni (alçak gerilim şartlarına uygun) ve izole iş ayakkabısı kullanılmalıdır.
- Pano güvenliği için EKED sistemi kullanılmalıdır.

*Tablo 32 Elektronik Bina Yönetim Sistemi ve Otomasyon Sistemi İşleri Kontrol Planı*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yapılacak İş:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elektronik Bina Yönetim Sistemi & Otomasyon Sistemi Genel Yapım Tekniği                                                                                                        |
| <b>ÇALIŞMA YÖNTEMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Teknik Açıklama ve Gereklilikler</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
| <b>Yapım Tekniği ve Teknolojisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Kazan, rooftop gibi merkezi iklimlendirme sistemleri kumanda kabloları ile debimetre kabloları kat MCC &amp; DCC panosuna çekilecektir.</li><li>– Motor pompa kumanda kabloları kat MCC &amp; DCC panosuna çekilecek ve frekans invertör girişleri gerçekleştirilecektir.</li><li>– Hat basınç fark ve sıcaklık sensörleri projeye uygun biçimde tesisata bağlanacak ve sinyal kabloları kat MCC &amp; DCC panolarına çekilecektir.</li><li>– Kat MCC &amp; DCC kabloları merkezi panoya çekilecek ve switch vb. bağlantılar gerçekleştirilecektir.</li></ul> |                                                                                                                                                                                |
| <b>İş Ekipmanı Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Elektrik el aletleri (Pense, kontrol kalemi, tornavida vb.), Kablo kesme/soyma aksesuarları, multimetre</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| <b>Kimyasal Madde Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Herhangi bir kimyasal madde kullanılması öngörülmez.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| <b>Çalışma Alanına Erişim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Çalışmalar bina genelinde yapılacak olup mevcut ulaşım yolları kullanılacaktır.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| <b>Malzemelerin Taşınması</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Elle taşınacaktır.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
| <b>KKD - GENEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Eğitilmiş Personel İhtiyacı</b>                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. EN 397 BARET</li><li>2. EN 420 İZOLE İŞ ELDİVENİ</li><li>3. EN 345 İZOLE İŞ AYAKKIBISI 200J</li><li>4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ELEKTRİK PANO MONTAJCISI (YET. K.:12UY0075-3   SEVİYE 3)</li><li>2. OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI (12UY0076-4   SEVİYE 4)</li></ol> |

Tablo 33 Elektronik Bina Yönetim Sistemi ve Otomasyon Sistemi Risk Analiz

| YAPILACAK İŞ                                              | TEHLİKE                    | RİSK                 | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrik panosu<br>üzerinden hat<br>enerjisinin kesilmesi | Güç panosu,<br>hat kablosu | Elektrik<br>Çarpması | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pano müdahalesi Elektrik ya da Elektrik Elektronik Müh. gözetiminde asgari Elektrik Pano Montajcısı (Yet. K.:12UY0075-3   Seviye 3) tarafından gerçekleştirilecektir.</li><li>▪ Enerji kesildikten sonra nötr ve toprak hattında enerji olmadığı multimetre kullanılmak sureti ile doğrulanacaktır.</li><li>▪ Söz konusu pano Kilitlenecek ve etiketlenecektir. (EKED)</li><li>▪ Cihaz bağlantılarının sökülmesi ve yeni bağlantı yapılması öncesi tekrar enerji olmadığı multimetre kullanılmak suretiyle doğrulanacaktır.</li><li>▪ Çalışmalar asgari iki teknik çalışan tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışma esnasında bu kişiler birbirine temas etmeyecektir.</li><li>▪ Söz konusu çalışmayı gerçekleştirecek teknik personellere elektrik çarpmasının etkileri ve ilk müdahale konusunda eğitim verilecek ve tatbikat gerçekleştirilecektir.</li></ul> |

• **Mekanik Tesisat Ekipmanlarının Yalıtım Malzemesi ile İzolasyonunun Sağlanması**

- Mekanik tesisat sürecinde görev alacak personellerin asgari olarak; Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.

Tablo 34 Mekanik Tesisat Ekipmanlarının Uygun Yalıtım Malzemesi ile İzolasyon Sağlanması İşleri Kontrol Tablosu

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Yapılacak İş:                                                                                                                                                                                                             | Tesisat Yalıtımı                                               |
| <b>ÇALIŞMA YÖNTEMİ</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| <b>Teknik Açıklama ve Gereklilikler</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| <b>Yapım Tekniği ve Teknolojisi</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Uygun Boyutlarda tesis edilmiş yalıtım ceketleri, uygulanacağı tesisat elemanı üzerine giydirilecek ve ceket sabitleme ipleri/cırt cırtları kullanılarak sabitlenecektir.</li></ul> |                                                                |
| <b>İş Ekipmanı Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Herhangi bir ekipman kullanımı öngörülmez.</li></ul>                                                                                                                                |                                                                |
| <b>Kimyasal Madde Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Herhangi bir kimyasal madde kullanılması öngörülmez.</li></ul>                                                                                                                      |                                                                |
| <b>Çalışma Alanına Erişim</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Çalışma alanı bina içerisinde bodrum kattadır. Bina içi ulaşım yolları kullanılacaktır.</li></ul>                                                                                   |                                                                |
| <b>Malzemelerin Taşınması</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Malzemeler el ile taşınacaktır.</li></ul>                                                                                                                                           |                                                                |
| <b>KKD – GENEL</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Eğitimli Personel İhtiyacı</b>                              |
| 1. EN 397 BARET<br>2. EN 420 İZOLE ELEKTRİK ELDİVENİ<br>3. EN 345 GÜVENLİK İŞ AYAKKABISI<br>4. EN 340 GENEL İŞ ELBİSESİ                                                                                                   | 1. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Y. Per. Seviye 3 (11UY0031-3) |

- Bu konu özelinde risk listesi gerekli görülmemiştir. Genel risk analizi kuralları geçerlidir.

• **Prefabrik Hafif Çelik Bina Montajı**

- Çalışmaların tamamı yetkili bir İnşaat Mühendisi gözetiminde gerçekleştirilmelidir.
- Mekanik tesisat sürecinde görev alacak personellerin asgari olarak; Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 (11UY0031-3) belgesine sahip olması gerekmektedir
- Çalışacak personellerin tamamının yüksekte çalışma eğitimi almış olması zorunludur.
- Çalışacak personellerin tamamının, tam vücut emniyet kemeri ve düşme engelleyici ekipmanlar kullanması zorunludur.
- Çelik konstrüksiyon ve panellerin tamamının taşınmasında kullanılacak kamyon ve mobil vincin trafik eylem planına uygun hareket etmesi zorunludur.
- Mobil vinç kaldırma taşıma operasyonlarında taşıma hattının güvence altına alınması (düşme tehlikesi barındıran alanlara girişin engellenmesi).
- Mobil vinç, mapa ve sapan muayene raporları kontrol edilmeli ile uygunluğun doğrulanmalıdır.

- Mobil vinç kumanda edecek çalışanın operatör belgesi kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır.
- Yönlendirme halatlarını ve taşıyıcı sapanları tesis eden personellerin İşaretçi Seviye 2 (15UY0218-2) Sapanıcı Eğitim belgeli olması gerekmektedir.
- İskele kurulumunu yapacak olan personellerin İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 (12UY0056- 3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrikli el aletlerinin tamamının (*mobil beton mikseri, vibratör, beton pompası vb.*) PAT testleri yapılmış olmalıdır. PAT test raporları çalışma öncesinde talep ve kontrol edilecektir. Saha denetimleri esnasında elektrikli cihazların üzerlerinde PAT kontrol ve onay etiketinin varlığı kontrol edilecektir. Uygunluk etiketi barındırmayan cihaz, ekipmanların kullanımına izin verilmez. (Uzatma kabloları da bu kapsamdadır.)
- Elektrik tesisatında çalışacak personellerin asgari olarak; Elektrik Tesisatçısı Seviye 3 (15UY0241-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrik pano ve tablolarında montaj yapacak personellerin asgari olarak, Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3 (12UY0075-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Elektrik sistemi topraklama hattı yetkili Elektrik ya da Elektrik Elektronik Mühendisleri tarafından raporlanmalıdır.
- Elektrik çarpmalarına karşı izole iş eldiveni (alçak gerilim şartlarına uygun) ve izole iş ayakkabısı kullanılmalıdır.
- Alçı işlemlerini yapacak personellerin, Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 (12UY0055-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Sahada çalışacak personellerin asgari olarak, İnşaat İşçisi Seviye 2 (16UY0253-2) belgesine sahip olması gerekmektedir.

Tablo 35 Prefabrik Hafif Çelik Bina Montaj İşleri Kontrol Tablosu

| Yapılacak İş:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prefabrik Hafif Çelik Bina Montaj İşleri |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ÇALIŞMA YÖNTEMİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| <b>Teknik Açıklama ve Gereklilikler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| <b>Yapım Tekniği ve Teknolojisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| — Fabrika ortamında üretilerek sahaya getirilen profil ve taşıyıcı konstrüksiyon parçaları kamyonlarla sahaya taşınacaktır. Tüm ekipmanlar güvenli bir şekilde kamyonu sabitlenecektir. Zemin betonu döküldükten sonra, sahaya getirilen kolon, giriş ve döşeme, duvar sistemleri hafif çelik karkas üzerine elemanları sırasıyla birleşimleri cıvatalı ve vidalı montajı yapılarak, yalıtımlı levhalar ile kaplanır |                                          |
| <b>İş Ekipmanı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| — KAZICI YÜKLEYİCİ (Mini ekskavatör)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| — TRANSMİKSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| — KAMYON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| — VİNÇ (Mobil & Sabit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| — SPRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| — HARÇ KARIŞTIRICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| — KOMPRESÖR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| — MOBİL BETON MİKSERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| — DEMİR BÜKME MAKİNESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| — DEMİR KESME MAKİNESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| — ŞARJLI / SABİT MATKAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| — ŞARJLI VİDA/SOMUN SIKMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| — FAZ VOLTAJ DEDEKTÖRÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| — MULTİMETRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| — TORK KONTROLLÜ TORNAVİDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| — TORK KONTROLLÜ SIKMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| — BİNA İÇİ İSKELE (MOBİL / SABİT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| — ÇEKİÇ & MURÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| — ŞARJLI TORNAVİDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| — UZATMA KABLOSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| <b>Kimyasal Madde Kullanımı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |

- ÇİMENTO, ALÇI, EPOKSİ BAĞLAYICI, BOYA, BOYA ÇÖZÜCÜ

#### Çalışma Alanına Erişim

- Erişim yolu [İnşaat Öncesi Bilgiler & Vaziyet Planları](#) başlığı altında plan şeklinde verilmiştir.
  - Kamyonlar için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır.
  - Mobil vinç için kampüs içinde azami hız 20 km ile sınırlandırılmıştır.

#### Malzemelerin Taşınması & Tedarik

- Sarf ve ilgili teknik malzemelerin kaldırılması taşınması ve indirilmesine ilişkin detaylar [Genel Şantiye Kuralları](#) alt başlığı altında belirtilmiş ve açıklanmıştır.

| KKD - GENEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eğitimli Personel İhtiyacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• BARET<br/>TS EN 397+A1</li><li>• KULAK TIKACI<br/>TS EN 352-2</li><li>• KORUYUCU GÖZLÜK<br/>TS EN ISO 16321-3</li><li>• GENEL AMAÇLI İŞ ELDİVENİ<br/>TS EN ISO 21420</li><li>• İŞ AYAKKABISI<br/>TS EN ISO 20347</li><li>• YARIM YÜZ MASKESİ<br/>TS EN 140</li><li>• TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ EN 361</li><li>• HALAT FRENLEME SİSTEMİ<br/>EN 353</li><li>• EMNİYET KANCASI<br/>EN 362</li><li>• DÜŞME ENGELLEYİCİ</li><li>• EMNİYET HALATLARI<br/>EN 355</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• İNŞAAT MÜHENDİSİ/MİMAR</li><li>• MAKİNA MÜHENDİSİ</li><li>• ELEKTRİK MÜHENDİSİ</li><li>• HAFİF ÇELİK MONTAJ USTASI</li><li>• İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3 (12UY0056-3)</li><li>• MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ (Yet. K.: 13UY0172-3   Seviye 3)</li><li>• ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 (15UY0241-3)</li><li>• ISITMA VE DOĞ.İÇ TES. YAP. PER. SEV. 3 (11UY0031-3)</li><li>• DUVARCI SEVİYE 3 (12UY0048-3)</li><li>• ALÇI SIVA/ALÇIPAN UYGULAYICISI SEVİYE 3 (12UY0055-3)</li><li>• İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3 (11UY0023-3)</li><li>• İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 (16UY0253-2)</li></ul> |

*Tablo 36 Prefabrik Hafif Çelik Bina Montaj İşleri Risk Analizi*

| YAPILACAK İŞ                | TEHLİKE KAYNAĞI                 | RİSKLER                                                                                                         | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doğalgaz hattı müdahaleleri | Gaz kaçağı ve patlama           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Travma</li> <li>Ciddi yanık</li> <li>Uzuv kaybı</li> <li>Ölüm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kazı çalışmaları öncesinde ilgili alanda doğalgaz borusunun olmadığı İGDAŞ üzerinden doğrulanmalıdır.</li> <li>Doğalgaz boru hatlarının müdahale öncesinde kapatılması ve EKED sistemi ile koruma altına alınması gerekmektedir.</li> <li>Mevcut boru hatlarına müdahale ya da yeni hat tesis çalışmaları Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4 (12UY0042-4) gözetiminde gerçekleştirilecektir.</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> <li>Çalışma yapılacak alanlar güvenlik şeritleri ile ayrıştırılacaktır ve güvenlik levhaları ile riskler afişe edilecektir.</li> </ul> |
| Beton Tesisi                | Transmikser ve ekipman hareketi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ezilme</li> <li>Sıkışma</li> <li>Çarpma</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beton döküm işlerinde göre alacak personellerin, Betoncu Seviye 3 (12UY0049-3) belgesine sahip olması gerekmektedir.</li> <li>Transmikser alanı sınırlandırılacaktır.</li> <li>Yetkisiz personel alana alınmayacaktır.</li> <li>Görev alan personellerin iş ayakkabısı, koruyucu gözlük, baret, toz maskesi ve kulaklık kullanması zorunludur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beton Tesisi                | Islak beton teması              | Cilt yanığı, tahriş                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kimyasala dayanıklı KKD kullanılacaktır</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| YAPILACAK İŞ           | TEHLİKE                                  | RİSK                                                           | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzemelerin taşınması | Kamyon                                   | Trafik kazası sonucu yaralanma, ölüm                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kamyon C sınıfı ehliyete sahip çalışanlar tarafından kullanılacaktır.</li> <li>Şehir içi hız sınırı aşılmayacaktır. (50km/h)</li> <li>Bina kampüs sahası hız sınırı 20 km/h ile sınırlandırılmıştır. Saha içi hareket ve manevralar İSG uzmanı tarafından gözlenecektir.</li> </ul>                              |
| Malzemelerin taşınması | Prefabrik malzemeler ve montaj parçaları | Prefabrik malz düşmesi ya da devrilmesi sonucu yaralanma, ölüm | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bütün malzemeler ağırlık merkezi dikkate alınarak kamyon kasası merkezine dengeli şekilde yerleştirilecektir.</li> <li>Ünite sapanlar ile sabitlenecektir.</li> <li>Montaj parçaları palet üzerinde paketli halde taşınacaktır.</li> <li>Kamyon yan ve arka kapakları kapatılacak ve sabitlenecektir.</li> </ul> |

|                                       |                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzemelerin taşınması ve indirilmesi | Mobil Vinç & kaldırma ekipmanları | Kaldırma, taşıma ve indirme esnasında yükün düşmesi sonucu yaralanma, ölüm | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vinç Mobil Vinç Operatörü (Yet. K.: 13UY0172-3   Seviye 3) tarafından kullanılabilir.</li> <li>Sapanlama ve yönlendirme yetki belgeli işaretçiler tarafından gerçekleştirilecektir.</li> <li>Vinç periyodik muayene raporu çalışma öncesinde İSG uzmanı tarafından kontrol edilecek ve doğrulanacaktır. (azami 6 aylık süre dahilinde temin edilmesi talep edilecektir.)</li> <li>Sapan, zincir, mapa, kanca periyodik muayene raporu çalışma öncesinde İSG uzmanı tarafından kontrol edilecek ve doğrulanacaktır. (azami 6 aylık süre dahilinde temin edilmesi talep edilecektir.)</li> <li>Sapan, mapa ve kanca çalışma öncesinde görsel olarak kontrol edilecektir. Taşıma kapasitesi ve fiziksel kondisyonu doğrulanacaktır.</li> <li>Mobil vinç hidrolik sabitleme ayakları zemine sabitlenecektir.</li> <li>Kaldırma operasyonu öncesinde mobil vinç ana bom açısı ve söz konusu açığa ilişkin kaldırma kapasiteleri kontrol edilecektir.</li> <li>Kontrol ipi üzerinden işaretçi tarafından yük yönlendirilecektir.</li> <li>Kaldırma, taşıma operasyonu boyunca çalışma sahasına erişim kısıtlanacaktır. Yük altından geçilmesi yasaktır.</li> <li>Uyarı levhaları tesis edilecektir.</li> <li>Çalışmalar İŞ İZİN SİSTEMİNE tabi tutulacaktır.</li> </ul> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| YAPILACAK İŞ               | TEHLİKE         | RİSK                     | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafif çelik eleman montajı | Yüksekten düşme | Ölüm<br>Yaralanma        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tam vücut emniyet kemeri, yaşam hattı ve düşme durdurucu sistemler kullanılacaktır.</li> <li>İskeleler TS EN 1004-19 standartlarına uygun olmalıdır. İskele kurulumu iskele kurulum belgesine sahip personeller tarafından gerçekleştirilecektir. (Yeterlilik Kodu: 12UY0056-3   Seviye 3)</li> <li>Kurulumu tamamlanan iskeleler Saha İSG Uzmanı tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır. Onaylanmayan mobil iskelenin kullanılması yasaktır.</li> <li>İskele üzeri azami taşıma kapasitesi bilgisi ve uyarı levhaları üzerinde bulunacaktır.</li> <li>Malzeme düşmelerine karşı iskelede tekmelik bulunacaktır.</li> <li>Mobil iskelelerde fren sistemi bulunacaktır.</li> </ul> |
| Hafif çelik eleman montajı | Malzeme düşmesi | Ezilme,<br>Kafa travması | <ul style="list-style-type: none"> <li>Güvenli istifleme yapılacaktır.</li> <li>Yük altında çalışma yasaklanacaktır.</li> <li>Baret kullanımı zorunludur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                  |                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrik tesisat işleri          | Enerji altında çalışma | Elektrik çarpması, Ölüm            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enerji kesilerek EKED sistemi uygulanacaktır.</li><li>• Faz voltaj dedektörü ile enerji kontrolü yapılacaktır.</li><li>• Çalışmalar elektrik tesisatçısı tarafından yürütülecektir.</li></ul>        |
| Elektrikli el aletleri kullanımı | Elektrik kaçağı        | Elektrik çarpması                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaçak akım rölesi kullanılacaktır.</li><li>• Uzatma kabloları günlük kontrol edilecektir.</li><li>• Hasarlı ekipman kullanılmayacaktır.</li></ul>                                                    |
| Demir Kesme Makinesi             | Kesici bıçaklar        | Kesik,                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eğitimli personel çalışacaktır.</li><li>• Koruyucu kapaklar aktif olacaktır.</li><li>• Eldiven, gözlük, iş ayakkabısı zorunludur.</li><li>• Acil durdurma butonu çalışır durumda olacaktır</li></ul> |
| Demir Bükme Makinesi             | Sıkışma                | Ezilme, Parmak kopması             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Makine sabitlenecektir.</li><li>• Yetkisiz kullanım engellenecektir</li><li>• El ve vücut mesafesi korunacaktır.</li></ul>                                                                           |
| Elle Taşıma                      | Ağır yük kaldırma      | Bel ve kas iskelet rahatsızlıkları | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mekanik kaldırma ekipmanları kullanılacaktır.</li><li>• Yük kaldırma eğitimi verilmiş personel çalışacaktır.</li><li>• Kaldırma limitlerine uyulacaktır.</li></ul>                                   |

Risk analizi listeleri örnek amaçlı olarak hazırlanır. Yüklenici sorumluluğundaki her iş için bu listeleri dikkate alarak detaylı risk analizleri yapılmalıdır. Risk analizleri İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine (Resmi Gazete: 29.12.2012/28512) uygun olarak hazırlanmalı ve gerektiğinde revize edilmelidir.

## 9. Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

### 9.1. Genel İnşaat Sahasını Etkileyen Risklerin ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi

Yapı sahalarının tamamı incelenmiş saha riskleri belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu inceleme neticesinde belirlenen riskler aşağıda madde madde verilmiştir. Söz konusu maddelere ilişkin objektif kanıtlar bu raporun “[İnşaat Öncesi Bilgiler & Vaziyet Planları](#)” başlığı altında verilmiştir.

- Aşağıda belirtilen alanların Yüklenici İSG Uzmanı tarafından kontrol edilmesi ve gerekli hallerde ek güvenlik tedbirleri konusunda çalışanları bilgilendirmesi gerekmektedir.
- Sahalara ilişkin riskler bu tespitler ile sınırlı olmayabilir, Yüklenici tespit edilenlerin dışında riskli alanlar ile karşılaşırsa bu durumu derhal Müşavir İSG Uzmanına bildirmelidir.

a.1 Düşme ve Yüksekten Düşme Riski: Kot farkı olan bir bina tadilatında, özellikle merdivenler, platformlar, geçişler ve açılarda güvenlik önlemleri yeterli değilse, düşme riski artar. Yüksek katlarda yapılan tadilatlar, özellikle koruyucu bariyerler ve korkuluklar eksikse, ciddi düşme kazalarına neden olabilir.

a.2 Erişim ve Taşıma Zorlukları: Farklı kotlarda yapılacak çalışmalar, malzeme taşıma ve işçi hareketliliğini zorlaştırabilir. Yüksekten malzeme indirme veya taşıma sırasında işçilerin dengesiz bir şekilde hareket etmeleri, kazalara yol açabilir.

a.3 Yaralanma Riski: Kot farkları nedeniyle işçilerin çalışma alanlarına erişim sağlayabilmesi için geçici merdiven veya iskele kullanmaları gerekebilir. Bu tür geçici yapılar güvenli inşa edilmediğinde, işçilerin düşme, kayma veya yaralanma riski artar.

a.4 Zemin Kaymaları ve Dengesizlik: Eğer kot farkı olan alanlarda düzgün zemin hazırlığı yapılmazsa veya inşaat malzemeleri düzgün yerleştirilmezse, zeminde kayma, devrilme veya dengesizlik riski oluşur. Bu durum, özellikle zorlu koşullar altında çalışan işçiler için tehlikeli olabilir.

Önlemler:

- Koruyucu Önlemler: Kot farkı olan alanlarda çalışacak kişilere uygun güvenlik ekipmanları (kask, emniyet kemeri, düşme durdurma sistemi vb.) sağlanmalıdır.
- İşaretleme ve Uyarılar: Kot farkı olan alanlar iyi şekilde işaretlenmeli ve geçiş yolları net olmalıdır. Ayrıca, zemin düzgünlüğü kontrol edilmelidir.
- Geçici Yapılar: Merdivenler, iskeler veya rampalar gibi geçici yapılar güvenli bir şekilde kurulmalı ve uygun denetimlerle kullanıma sunulmalıdır.
- Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanlara kot farkı ve ilgili riskler hakkında eğitim verilmeli, güvenli çalışma yöntemleri öğretilmelidir.

Sonuç olarak, kot farkı olan binalarda tadilat yapılırken, bu farkların oluşturduğu riskleri belirlemek ve uygun güvenlik önlemleri almak kritik öneme sahiptir.

## 9.2. İşle Alakalı Muhtemel Riskler ve Kontrol Tedbirlerinin Belirlenmesi ve Üçüncü Taraflara Olan Etkinin Değerlendirilmesi

Proje kapsamında yapısal fizibilite sürecine ilişkin riskler bu dokümanın “[Genel Şantiye Kuralları](#) ve [İşlerin Yönetimi](#)” başlığı altında tablo halinde verilmiştir. Söz konusu riskler haricinde;

- Çalışanların, proje kapsamında ki binalara erişimi esnasında yaşanabilecek trafik kazaları dikkate alınmalıdır.
- Bu çerçevede;
  - Rapor içinde belirtilen trafik eylem planlarına uygun hareket edilmelidir.
  - Arka koltuklarda dahil olmak üzere, araç içinde bulunan bütün bireyler emniyet kemeri takmak zorundadır.
  - Araç şoförlerinin trafik kurallarına ve hız kısıtlarına harfiyen uymaları gerekmektedir.
  - Araç kullanımı öncesinde yakıt, yağ sızıntısı, tekerlek dişleri ve basınç durumları gibi görsel kontroller şoför tarafından gerçekleştirilmelidir. Arızalı, kusurlu araç kullanımı yasaktır. Tespit edilen kusurlar derhal Alt Yüklenici İSG Uzmanlarına bildirilecektir.
  - Yolcular, şoförlerin trafik kurallarına aykırı davranışları ile karşılaştıklarında ikaz etmekten imtina etmemeli ve bu durumu derhal Alt Yüklenici İSG Uzmanlarına bildirilecektir.
- Kamyon, Sondaj makinesi ve diğer iş makinelerinin özellikle yapı çevresindeki manevraları doğası gereği risk barındırmaktadır. Saha erişimi öncesi bina katı modellerine internet üzerinden erişim sağlanmalı ve çalışma yapılacak alanlar, yol kotları ve eğimleri, yol genişliği ve yaklaşım sınırları değerlendirilmelidir. Yapı katı modellerine erişim linkleri ana yükleniciden telefon ya da mail yoluyla talep edilecektir.
- Yapı çevresinde araba, kamyonet, kamyon, iş makinesi kullanımı esnasında yaya hareketleri dikkate alınmalıdır. Yaya geçişlerine her durumda öncelik tanınmalıdır. Kamyon, kamyonetlerin, iş makinelerinin geri manevra ikaz sirenlerinin çalışır durumda olduğu her araç kullanımı öncesinde kontrol edilecektir.
- Gece saatlerinde zaruri durumlar haricinde kamyon, iş makinesi kullanımına izin verilmez. Zaruri hallerde iş izin sistemi devreye alınarak İSG uzmanından gerekçe belirtilmek sureti ile izin talep

edilecektir.

- Sondaj çalışmalarına ve iş makinesi operasyonlarına; 3. Tarafların, paydaşların 20m' den fazla yaklaşmalarına izin verilmemelidir. Bunun için çalışma yapılacak saha çevresi emniyet şeritleri ile ayrılmalı ve uyarı ikaz levhaları tesis edilecektir.
- İnşaat faaliyeti yürütülen binaların çevresi, üçüncü şahısların giriş çıkışını engelleyecek şekilde (şantiye alanına görevli olmayanların girmesine izin vermeyecek şekilde) fiziki bariyerle (demir saçlarla) kapatılacak ve çalışma günü sonunda alan tümüyle kilitli hale getirilecektir.

### 9.3. Zaman ve Mekan Açısından Çakışan Görevlerden Kaynaklanan Riskler

Planlar incelenmiş ve çakışan işler kaynaklı herhangi bir risk gözlenmemiştir. Yapım işleri başladığında zaman ve mekan açısından çakışan işlerle karşılaşılması durumunda iş planı ve risk analizlerinde bu durum yüklenici tarafından değerlendirilecek ve müşavire bildirilecektir. Risklere uygun önlemler alındıktan sonra, Müşavirin onayının ardından çalışmaya başlanacaktır.

## 10. İş Ekipmanları İhtiyacının ve Niteliklerinin Belirlenmesi

- Yüklenici firma çalışmalar esnasında kullanacağı her türlü cihaz ve ekipmanı; emniyet direktiflerini<sup>7</sup> (CE işaret Yönetmeliği), ilgili standartlarını<sup>8</sup> belirlemeli, periyodik muayene raporları ile birlikte listelemeli ve Müşavire iletmelidir.
- Elektrikli cihaz ve ekipmanların tamamı PAT testine tabi tutulmalı ve elektriksel açıdan uygun olduğu PAT onay etiketleri ile gösterilmelidir.

---

– <sup>7</sup> MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT)  
– BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/35/AB)  
– BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB)  
– GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB)

– <sup>8</sup> TS EN ISO 12100 Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması  
– TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar  
– TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar  
– TS 1203 EN 286-1 Tanklar – Basit – Alev almayan – Basınçlı  
– TS 10116 Vinçler (Krenler) – Deney ve muayene yöntemleri  
– TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel

## 10.1 Koruyucu Donanım İhtiyacının Belirlenmesi

### 10.1.1. Toplu Koruma Sistemleri

Tablo 37 Toplu Koruma Sistemleri Listesi

| KORUYUCU TÜRÜ                       | KULLANIM YERİ                                                                                                            | KULLANIM SÜRESİ                     | STANDARTLAR    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| EMNİYET ŞERİDİ                      | RİSKLİ ÇALIŞMA SAHALARI (YÜKSEKTEN PARÇA DÜŞME, İŞ MAKİNESİ KULLANIMI, DÜŞME RİSKİ, ELEKTRİKLE ÇALIŞMA, AĞIR YÜK TAŞIMA) | Lokal çalışma tamamlanıncaya kadar. | -              |
| ERİŞİM / DÜŞME KISITLAYICI KORKULUK | SONDAJ ÇALIŞMA SAHALARI, YIKILAN DIŞ DUVAR KENARLARI.                                                                    | Lokal çalışma tamamlanıncaya kadar. | TS EN 13374+A1 |
| YAŞAM HATTI                         | İSKELE ÜZERİ ÇALIŞMALAR, ÇATI ÜZERİ ÇALIŞMALAR, YIKILAN CEPHE DUVARLARINA YAKIN ÇALIŞMALAR.                              | Lokal çalışma tamamlanıncaya kadar. | TS EN 795      |
| GÜVENLİK AĞI                        | KORKULUK(BARİYER) VB. KULLANILAMAYAN veya TERCİH EDİLMEYEN YERLERDE(Otopark üzeri PV montajı)                            | Lokal çalışma tamamlanıncaya kadar. | TS EN 1263-2   |

## 10.1.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar

Tablo 38 KKD Tablosu

| TANIM                                                  | KATEGORİ | BAKIM/YENİLEME SÜRESİ | MAK. KUL. SÜRESİ                                                                                | STANDART             | RENK KODU                                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BARET                                                  | II       | 1 YIL                 | SÜREKLİ                                                                                         | TS EN 397+A1         | Beyaz: Mühendis<br>Sarı: Çalışan<br>Kırmızı: İSG Uz.<br>Yeşil: ADME <sup>12</sup> |
| KULAK TIKACI                                           | I        | GÜNLÜK                | GÜRÜLTÜLÜ<br>ÇALIŞMA<br>SÜRESİNCE<br>( <sup>3</sup> 80dB)                                       | TS EN 352-2          | -                                                                                 |
| KORUYUCU<br>GÖZLÜK                                     | I        | 3 AY                  | RİSK ANALİZİNDE<br>BELİRTİLEN GÖZE<br>CİZİM KAÇMA<br>RİSKİ DOĞRUAN<br>HER TÜRLÜ İŞ<br>SÜRESİNCE | TS EN ISO<br>16321-3 | -                                                                                 |
| GENEL AMAÇLI<br>İŞ ELDİVENİ                            | I        | 3 AY                  | SÜREKLİ                                                                                         | TS EN ISO<br>21420   | -                                                                                 |
| İŞ AYAKKABISI                                          | II       | 1 YIL                 | SÜREKLİ                                                                                         | TS EN ISO<br>20347   | -                                                                                 |
| YARIM YÜZ<br>MASKESİ                                   | I        | GÜNLÜK                | TOZLU İŞLER                                                                                     | TS EN 140            | -                                                                                 |
| TAM VÜCUT<br>EMNİYET<br>KEMERİ                         | II       | 1 YIL                 | HER TÜRLÜ<br>YÜKSEKTE<br>ÇALIŞMA                                                                | TS EN 361            | -                                                                                 |
| DÜŞME<br>ENGELLEYİCİ<br>DONANIMLAR ve<br>HAYAT HATLARI | II       | 1 YIL                 | HER TÜRLÜ<br>YÜKSEKTE<br>ÇALIŞMA                                                                | EN 355               | -                                                                                 |
| İZOLE ELDİVEN<br>VE İŞ<br>AYAKKABISI                   | I        | 3 AY                  | ELEKTRİKLİ<br>İŞLER                                                                             | TS EN ISO 21420      | -                                                                                 |

## 11.İş İzin Sistemi

İş izin sistemine tabi eylemler aşağıda sıralanmıştır.

- Her türlü gece çalışmaları.  
İSG Uzmanı tarafından onay verilmeden çalışma yapılamaz. Gece çalışmaları için kontrol edilecek unsurlar aşağıda sıralanmıştır;
  - Bina idaresi ve teknik birimlerin onayı,
  - Dış ortam çalışmaları için uygun aydınlatma ve aydınlatma seviyesi kontrolü,
  - Bina teknik ekiplerinin eşlik edip edemeyeceği,
  - Çalışanların mesai süresi,
  - Çalışma yapılacak ortam bilgisi (Fotoğraf),
  - Çalışanların mesleki yeterlilikleri,
- Yüksekte çalışma,
  - İş İskelesinin TS EN 12811-1 standartına uygun şekilde kurulması
  - İş İskelesinin zemine ve cepheye uygun noktalardan sabitlenmesi
  - Yatay ve dikey hayat hatlarının tesis edilmesi,
  - İş iskelesi ve hayat hatlarının kapasitelerinin belirtilmesi (toplam kullanıcı sayısı – ağırlık)
  - Yüksekte çalışacak personellerin eğitimleri (Yüksekte Çalışma Eğitimi), sağlık muayene raporlarında yüksekte çalışmaya uygun ibaresi
- Bu proje kapsamında; kapalı alanda çalışma, kaynak, plazma kesim vb çalışmalar öngörülmemektedir. Bunun yanında kısmi ve basit işlemlerde dahi olsa bu tür çalışmalara ihtiyaç duyulması halinde, iş izin sistemi devreye sokulacaktır.

İş izin sisteminde süreç aşağıda tarif edilmiştir;

1. İş iznine tabi işler kısmında belirtilen faaliyetler için İŞ İZNİ formunun hazırlanması ve onay talep edilmesi zorunludur. Ancak söz konusu formun onay verilmesi halinde çalışmalara başlanabilir. Onay verilmeden çalışmalara başlanması yasaktır.
  - a) Gerekli kişisel koruyucu donanımlar eksiksiz şekilde temin edilmeli ve disiplinli şekilde kullanılmalıdır.
    - Çalışma öncesinde kullanılacak KKD' ler gözle kontrol edilmeli fiziksel kusur, kullanım ömrünü tamamlama vb. durumların tespiti halinde derhal yenileri ile değiştirilmelidir. Hiçbir şart ve koşul altında uygun olmayan KKD' ler kullanılmayacaktır.
  - b) Mesleki yeterliliği olmayanlar iş izni gerektiren çalışmalarda yer alamazlar. Bu nedenle söz konusu çalışmaya ilişkin mesleki yeterlilik belgeleri çalışanların özlük dosyalarında muhafaza edilmeli ya da dijital forma yüklenmelidir.
    - Çalışma öncesinde mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik durumu mutlaka doğrulanmalıdır. Süresi dolan, yenilenmesi gereken belge/sertifikalara sahip bireylerin saha çalışmalarına onay verilmez.

İş izin sistemine göre işi yaptıran kişi proje müdürü olup, onun onayı alınmadan işe başlanamaz. Çalışma izni gerektiren işlerin sürekli olarak takip ve kontrol edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerin azaltılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi amacıyla bu sistem uygulanacaktır. Proje süresince kullanılacak çalışma izin formu Ek-2'de sunulmaktadır

## 12.EKED Sistemi

Enerjili sistem ve cihazlar ile doğalgaz hatlarının kontrol, bakım ve değişim çalışmaları esnasında beklenmedik şekilde enerji/gaz verilmesi, çalışma, elektrik çarpması/yangın, patlama vb. risklerin bertarafı için fiziki engellerin ve bilgilendirme etiketlerinin bir arada kullanılmasına EKED<sup>9</sup> adı verilmektedir.

Çalışmalar sırasında:

- Görev alacak personellerin tamamının kilitleme/etiketleme eğitimi alması zorunludur.
- Kilitleme/etiketleme için gerekli ekipmanlar yüklenici firma tarafından temin edilmeli/hazır bulundurulmalıdır.
- Cihazların Nötr ve toprak hattı da bara/bağlantı noktası üzerinden sökülmalıdır. Bu suretle başka bir sistem/cihaz kaynaklı elektrik çarpmalarının önüne geçilmiş olacaktır.
- Cihazlarda basınçtan kaynaklı enerjinin giderilmesi için müdahale edilecek bölümü besleyen vanalar kapatılmalı, kilitlenmelidir. Mevcut basınç ventil veya tahliye ile boşaltılmalıdır.



Şekil 24 Kilitleme Etiketleme Eğitimi Örnekleri

<sup>9</sup> Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene



### 13. Gözlem ve Denetim

Rutin saha kontrollerinde asgari olarak aşağıda sunulan kontrol listesi kullanılacaktır. Denetim formları yapılacak işin niteliğine uygun olarak ayrıca yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

Tablo 39 İSG Kontrol Listesi

| NO | KONTROL KONUSU                                                                                                                                             | PUAN | TERMİN | SORUMLU | EYLEM |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------|
| 01 | Çalışanlara gerekli İSG eğitimleri verilmiş mi?                                                                                                            |      |        |         |       |
| 02 | İSG ile ilgili alınan tedbirlerin sürekliliği gözlemleniyor mu?                                                                                            |      |        |         |       |
| 03 | İşyeri hakkında çalışan temsilcisi ve destek elemanlarından düzenli bilgi alınıyor mu?                                                                     |      |        |         |       |
| 04 | Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneleri düzenli olarak yapılıyor mu?                                                                   |      |        |         |       |
| 05 | Sağlık kayıtları gizlilik ilkesine uygun şekilde saklanıyor mu?                                                                                            |      |        |         |       |
| 06 | İş ile çalışanın uyumu sağlanıyor ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için rehberlik yapılıyor mu?                                     |      |        |         |       |
| 07 | Sektörde görülmesi muhtemel meslek hastalıkları belirlenerek bunlarla ilgili işyeri gözlemleri yapılıyor mu?                                               |      |        |         |       |
| 08 | İşyerine giriş çıkışların kontrollü yapılması için tedbirler tespit edilerek işveren bilgilendiriliyor mu?                                                 |      |        |         |       |
| 09 | Ramak kaza kayıtları değerlendiriliyor mu?                                                                                                                 |      |        |         |       |
| 10 | İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları değerlendiriliyor mu?                                                                                           |      |        |         |       |
| 11 | İSG Kuruluna düzenli katılım sağlanarak kurul kararları izleniyor mu?                                                                                      |      |        |         |       |
| 12 | İş sağlığı ve güvenliği talimatları hazırlanarak işverenin onayına sunulup uygulanması kontrol ediliyor mu?                                                |      |        |         |       |
| 13 | Çalışma izin prosedürleri hazırlanarak işverenin onayına sunulup uygulanması kontrol ediliyor mu?                                                          |      |        |         |       |
| 14 | Mevzuat gereklerini sağlayacak uygun yaşam alanları (yemekhane, yatakhane, duş, WC, vb....) için gerekli hijyen ve güvenlik şartları değerlendiriliyor mu? |      |        |         |       |
| 15 | Çevresel kaynaklı fiziksel-kimyasal-biyolojik etmenler göz önünde bulunduruluyor mu?                                                                       |      |        |         |       |
| 16 | İlk yardım, yangınla mücadele ve arama-kurtarma-tahliye ekiplerinin belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin alınması ile ilgili işveren bilgilendiriliyor mu?  |      |        |         |       |
| 17 | Acil durum planı sahaya uygun hazırlanmış mı?                                                                                                              |      |        |         |       |
| 18 | Acil durumlar için kaçış yolları, toplanma yerleri belirlenmiş ve işaretlenmiş mi?                                                                         |      |        |         |       |
| 19 | Yangına karşı alınacak tedbirler hakkında çalışma yapılmış mı?                                                                                             |      |        |         |       |
| 20 | Acil durum tatbikatlarının yapılması sağlanıyor, izleniyor ve değerlendiriliyor mu?                                                                        |      |        |         |       |
| 21 | Risk değerlendirmesi sahaya uygun olarak hazırlanıyor mu?                                                                                                  |      |        |         |       |
| 22 | Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen ekip ile gerçekleştiriliyor mu?                                                                                  |      |        |         |       |
| 23 | Risk değerlendirme sonrası kontrol adımları takip ediliyor mu?                                                                                             |      |        |         |       |
| 24 | Risk değerlendirmesi mevzuatta belirtilen durumlarda yenileniyor mu?                                                                                       |      |        |         |       |
| 25 | Özel politika gerektiren gruplar için çalışma yapılıyor mu?                                                                                                |      |        |         |       |

| NO | KONTROL KONUSU                                                                                                              | PUAN | TERMİN | SORUMLU | EYLEM |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------|
| 26 | Çalışanlara uygun KKD seçimi yapılıyor ve kullanımı hakkında sahada eğitim veriliyor mu?                                    |      |        |         |       |
| 27 | İşyerinde yapılması gereken ortam ölçümleri belirlenerek işverene bilgilendirme yapılıyor mu?                               |      |        |         |       |
| 28 | İşyerinde kullanılan ekipmanların standartlara uygunluğu hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?                               |      |        |         |       |
| 29 | İşyeri içerisinde yaya yolları ve araç kullanımı söz konusuysa araç yolları uygun şekilde belirlenmiş mi?                   |      |        |         |       |
| 30 | Depolanacak ürün ya da ekipman için uygun istifleme alanı veya iş makineleri için park alanları belirlenmiş mi?             |      |        |         |       |
| 31 | İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri takip ediliyor mu?                                                                  |      |        |         |       |
| 32 | İş ekipmanlarını kullanan çalışanların yetkinlikleri kontrol ediliyor mu?                                                   |      |        |         |       |
| 33 | Onaylı defter suretleri her işyeri ziyaretinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından düzenli olarak tutuluyor mu? |      |        |         |       |
| 34 | İşyerine dair gerçeğe uygun yıllık çalışma planı hazırlanmış mı?                                                            |      |        |         |       |
| 35 | Hazırlanan yıllık çalışma planındaki iş takvimine uyuluyor mu?                                                              |      |        |         |       |
| 36 | İşyerine dair gerçeğe uygun yıllık değerlendirme raporu mevcut mu?                                                          |      |        |         |       |

Müşavir ve Yüklenici tarafından Tablo 39 'da kilere benzer veya geliştirilmiş İSG Kontrol Listeleri ile gerçekleştirilen denetimler, Tablo 40 'da belirtilen aralıklarla Proje Uygulama Birimi'ne rapor edilecektir. Yüklenici, raporları belirtilen formatta Müşavir'e sunacak ve Danışman, raporların son halini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Uluslararası Finans Kaynaklı Deprem Güçlendirme Dairesi Başkanlığı'na sunacaktır. İzlemeler Tablo 40 da verilen plana göre yapılacaktır.

Tablo 40 İSG İzleme Planı

| Ne parametre izlenecek?                                                                     | Nerede parametre izlenecek?                      | Nasıl parametre izlenecek?                                                                                                  | Ne zaman parametre izlenecek (ölçüm sıklığı)?                                                 | Neden parametre izlenecek?                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raporlama  | Sorumluluk               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Yenileme ve Güçlendirme İşleri Saha Hazırlık Faaliyetleri</b>                            |                                                  |                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
| Toplum sağlığı ve güvenliği yönetimi ve uygulanan koruma önlemleri                          | Proje sahası çevresinde                          | Görsel kontroller<br>Saha Kontrolü<br>Aktif Toplum<br>Güvenliği ve Trafik<br>Yönetim Planının<br>mevcudiyeti ve uygulanması | Yenilenme/güçlendirme işlerinin başında (ilk gün)<br>Proje faaliyetleri süresince her iş günü | Sağlık ve güvenlik risklerinin, yerel sakinlerin mekanik yaralanmalarının en aza indirilmesini sağlamak                                                                                                                                                                                          | • Haftalık | • Müşavir<br>• Yüklenici |
| Şantiyelerdeki işçiler için uygulanan İSG koruma önlemleri                                  | Proje sahası ve proje sahası yakınındaki binalar | Görsel kontroller<br>Saha Kontrolü<br>İSG planının mevcudiyeti ve uygulanması                                               | Proje faaliyetleri süresince her iş günü                                                      | Asbest içeren çatı örtülerini sökecek işçiler için özellikle koruyucu ekipman ve giysiler başta olmak üzere işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirmek<br>İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ve diğer düzenlemelere uygunluk | • Haftalık | • Müşavir<br>• Yüklenici |
| Projeden Etkilenen Kişiler için güvenlik ve sağlık risklerinden kaçınmak ve en aza indirmek | Binada ve proje sahasında                        | Görsel kontroller                                                                                                           | Yenilenme/Güçlendirme işinin başında ve sürekli olarak her iş günü                            | Asbest liflerinin veya diğer inşaat tozlarının solunması nedeniyle Post Aktivasyon Potansiyeli (PAP) yaralanmasını önlemek                                                                                                                                                                       | • Haftalık | • Müşavir<br>• Yüklenici |

| Ne parametre izlenecek?                                                                                                                                                   | Nerede parametre izlenecek?                      | Nasıl parametre izlenecek?                                                                                                                                                                                                                                                           | Ne zaman parametre izlenecek (ölçüm sıklığı)?                                | Neden parametre izlenecek?                                                                                                                                                     | Raporlama  | Sorumluluk                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yenileme/güçlendirme çalışmalarının ve özellikle asbest içeren mevcut parçaların sökülmesinin başlama ve bitiş zamanı                                                     | Proje sahasında                                  | Saha denetimi<br>Belge kayıtlarının incelenmesi<br>Görsel kontroller                                                                                                                                                                                                                 | Her gün<br>(Asbest tespit edilmesi durumunda)                                | Çevre, sağlık ve güvenlik risklerinden kaçınmak<br>Asbestle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe Uyum                                                   | • Haftalık | <ul style="list-style-type: none"> <li>Müşavir</li> <li>Yüklenici</li> <li>Asbest Temizleme Uzmanı</li> </ul> |
| <b>Yenileme/Güçlendirme İşleri İşletme Süreci</b>                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                               |
| Sahada çalışanlara yönelik uygulanan İSG koruma önlemleri (yüksekte çalışma, tehlikeli maddelerle çalışma, dönen ekipmanlarla çalışma, elektrikli cihazlarla çalışma vb.) | Proje sahası<br><br>Proje sahasına yakın binalar | İlgili İSG Sertifikaları ve eğitilmiş çalışanlara ilişkin dokümanların kontrol edilmesi<br>Koruyucu ekipmanın kullanımına ilişkin görsel kontroller<br><br>İSG Planının ve sahaya özel Sağlık ve Güvenlik talimatlarının uygulanması<br><br>Saha denetimi<br><br>Kayıtların kontrolü | Yıkım çalışmalarına başlamadan önce Proje faaliyetleri sırasında her iş günü | İşçilerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risklerin en aza indirilmesi<br><br>İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenlemelere uyum | • Aylık    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Müşavir</li> <li>Yüklenici</li> </ul>                                  |

| Ne parametre izlenecek?                                     | Nerede parametre izlenecek?  | Nasıl parametre izlenecek?                                                                                               | Ne zaman parametre izlenecek (ölçüm sıklığı)? | Neden parametre izlenecek?                                                                                                                                           | Raporlama   | Sorumluluk                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İş ve çalışma koşulları                                     | Proje sahası                 | Nihai İSG Planı kontrolü<br>Saha denetimi<br>Şikayet mekanizması (geri bildirimler)                                      | Proje faaliyetleri sırasında her iş günü      | İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenlemelere uyum                                                                       | • Aylık     | • Müşavir<br>• Yüklenici                                                                           |
| İmalat, İşletme ve Teslimat (boru hattı imalatı ve inşaatı) | İmalat ve İnşaat Alanlarında | Görsel kontroller<br>Saha Kontrol Kayıtları<br>Gerekli Testler<br>İlgili otorite tarafından Personel Yeterlilik Kontrolü | İlgili imalat ve proses tamamlandığında.      | Boru hattı inşaatının teslim edilmeden önce tamamlandığını teyit etmek. Üretimden ve son kullanıcıya teslim edildikten sonra olası bir felaketin önlenmesi amacıyla. | • Raporlama | • Faydalanıcı Kurum<br>• Hizmet Sağlayıcı Kuruluş İSG Daire Başkanlığı<br>• Müşavir<br>• Yüklenici |
| Sağlık ve Güvenlik kayıtları                                | Proje alanı                  | Sağlık ve Güvenlik şantiye dokümantasyon kontrolü                                                                        | Aylık                                         | Şantiyelerde gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği kayıtlarının tutulmasını sağlamak                                                                                       | • Aylık     | • Müşavir<br>• Yüklenici                                                                           |

| Ne<br>parametre<br>izlenecek?                                                                         | Nerede<br>parametre<br>izlenecek?                                     | Nasıl<br>parametre<br>izlenecek?                                                                                                                    | Ne zaman<br>parametre izlenecek<br>(ölçüm sıklığı)?       | Neden<br>parametre izlenecek?                                                                                                             | Raporlama                                                                                | Sorumluluk                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Asbest içeren atıkların belirlenmesi, uygun şekilde paketlenmesi, tehlikeli atık olarak etiketlenmesi | Proje şantiyelerinde<br><br>Sökme/sökme çalışmalarına başlamadan önce | Atık listesine göre asbest içeren atıkların tanımlanması<br><br>Saha denetimi<br><br>Belge kayıtlarının incelenmesi                                 | Proje yaşam döngüsü boyunca/Günlük<br><br>Tespit edilirse | Asbestle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hemen (Tespit edilirse)</li> <li>Aylık</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Müşavir</li> <li>Yüklenici</li> </ul> |
| Araç ve Yaya Güvenliği                                                                                | Proje sahası ve erişim yolları                                        | Görsel inceleme<br><br>Uygun işaret ve sinyallerin kullanılması<br><br>Saha denetimi<br><br>Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planının Uygulanması | Günlük                                                    | İnşaat işçilerini, onların yararlanıcılarının çalışanlarını ve yerel toplulukları trafik kazalarına bağlı yaralanma ve ölümlerden korumak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Haftalık</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Müşavir</li> <li>Yüklenici</li> </ul> |

| Yenileme/Güçlendirme İşleri İşletme Süreci                                                     |                                              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sağlık ve güvenlik                                                                             | Yenilenmiş/Güçlendirilmiş binalar            | Çatıyı, pencereleri, kapıları, sızıntıları vb. kontrol edilmesi. Düzenli kontroller ve bakımların yapılması | Düzenli olarak (projenin ömrü boyunca)                                                               | Bina sakinlerinin/kullanıcılarının sağlık ve güvenliğinin sağlanması                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tespitten sonraki 1 hafta içinde</li> </ul> | Fırat Üniversitesi Teknik Kadrosu                                            |
| Yenileme ve Güçlendirme İşleri Saha Hazırlık Faaliyetleri                                      |                                              |                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                              |
| Toplum sağlığı ve güvenliği yönetimi ve uygulanan koruma önlemleri                             | Proje alanı çevresinde                       | Görsel kontroller Saha Kontrolü                                                                             | Yenileme/güçlendirme çalışmalarının başlangıcında (ilk gün) Proje faaliyetleri sırasında her iş günü | Yerel sakinlere yönelik sağlık ve güvenlik risklerinin ve mekanik sporların en az indirilmesini sağlamak                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aylık</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Müşavir</li> <li>Yüklenici</li> </ul> |
| Şantiyelerde işçilere uygulanan İSG koruma tedbirleri                                          | Proje sahası ve proje sahasına yakın binalar | Görsel kontroller                                                                                           | Proje faaliyetleri sırasında her iş günü                                                             | Asbest içeren çatı kaplamalarını kaldıracak işçiler için koruyucu ekipman ve kıyafet başta olmak üzere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin riskleri en aza indirmek | <ul style="list-style-type: none"> <li>Haftalık</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Müşavir</li> <li>Yüklenici</li> </ul> |
| Projeden Etkilenen Kişiler için güvenlik ve sağlık risklerinin önlenmesi ve en aza indirilmesi | Binada ve proje sahasında                    | Saha Kontrolü                                                                                               | Yenileme/güçlendirme çalışmalarının başlangıcında ve sürekli olarak her iş gününde                   | İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenlemelere uyum                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Haftalık</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Müşavir</li> <li>Yüklenici</li> </ul> |



## 14.Çalışan Eğitimleri

- Çalışanların tamamının; ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28648) ve HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ (Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28698) içinde belirtilen asgari şartları karşılar seviyede eğitime tabi tutulmuş olması zaruridir. Bu çerçevede Alt Yüklenici personellerinin eğitim kayıtları ve sertifikaları talep ve kontrol edilecektir.

İSG eğitimleri; personel adı, görevi, işe giriş tarihi, eğitim adları ve tarihlerini içerecek şekilde listelenmeli ve müşavir İSG Uzmanına iletilmelidir.

- Bu proje özelinde bütün çalışanlar; iş bu doküman ve risk analizleri çerçevesinde asgari 2 birey.gün eğitime tabi tutulacaktır. Söz konusu eğitim Yüklenici ve alt yüklenici İSG Uzmanları tarafından verilecek, eğitim kayıtları Müşavire iletilecektir.
- Çalışanların işe başlamadan önce Yüksekte Çalışmalarda İple Erişim Eğitimlerini almış olmaları zorunludur. Söz konusu eğitimler asgari olarak IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Uluslararası Seviye 2 Belgesine sahip uzmanlar tarafından verilecektir.

### 14.1.Personel Sağlık Durumlarının Takibi

- Çalışanların periyodik sağlık raporları kontrol edilecek, görevleri çerçevesinde sağlık durumlarının uygun olup olmadığı bu raporlar üzerinden doğrulanacaktır.
- Sağlık Raporları; personel adı, görevi, işe giriş tarihi, iş sağlığı eğitim adları ve tarihlerini içerecek şekilde listelenmeli ve Müşavir İş Yeri Hekimine iletilmelidir.

### 14.2.Personel Mesleki Yeterliliği

- Bu doküman içinde öngörülen mesleki yeterlilik şartları belirtilmiştir. Yüklenici firma bütün çalışanlarını; personel adı, görevi, işe giriş tarihi, mesleki yeterlilik belgesi, belge tarihi, belge geçerlilik tarihini içerecek şekilde listelemeli ve Müşavir İSG Uzmanına iletmelidir.

## 15.Acil Durumlara Hazırlık

Acil eylem planı, 6331 İSG Kanunu 11. Maddesi gereğince planlanan işe özgü haritalandırılmış ve krokilendirilmiş gerekli parametre ve yönlendirmelerin bulunduğu bir rapor halinde Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanan Acil eylem planı öngörülen acil durumlara göre değişiklik gösterebilir veya uygulanabilir olacaktır.

Yapısal güçlendirme ve renovasyon çalışmaları esnasında karşılaşılma ihtimali öngörülen acil durumlar ve acil durumlara ilişkin önleyici tedbirler aşağıda tablo olarak verilmiştir.

Tablo 41 Acil Durumlar ve Acil Durumlara İlişkin Önleyici Tedbirler

| ACİL DURUM                                         | ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yangın ve Patlama                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elektrik ve topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, jeneratör, yangın söndürme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri, portatif yangın söndürücüler ve havalandırma tesisatının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması, olası arıza durumunun derhal yetkili kişilerce giderilmesi</li><li>• Sigara içilebilen alanların sınırlandırılması ve bu alanların işaretlerle belirtilmesi</li><li>• Tutuşabilecek kuru ot ve ağaç dallarının uzaklaştırılması</li><li>• Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin (alarm, gaz, duman dedektörü v.b.) bulundurulması ve sürekli çalışır durumda tutulması</li><li>• Isıtma sistemi periyodik kontrollerinin yapılması, kazan dairesine yetkili kişiler dışında girişlerin önlenmesi</li><li>• Kullanılan kimyasal maddelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması</li><li>• Kimyasal atıkların düzenli depolanması</li><li>• Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin ısı kaynaklarından uzak tutulması</li><li>• Enerji kesilmesi gereken durumlarda gaz vanaları, elektrik panoları gibi ulaşılması gereken tesisatın yerlerinin belirlenerek yetkili kişilerce müdahale edilmesi için görevlendirme yapılması</li><li>• Ortam ölçümlerinin yapılması</li></ul> |
| Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Yayılım | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kimyasalların özellik ve tehlikelerine uygun depolanması, sızıntıya yol açacak durumların engellenmesi, havalandırmanın uygun olması</li><li>• Yetkili olmayan kişilerin kimyasal depolarına girmesinin engellenmesi</li><li>• Kimyasallar için çalışanlara standartlara uygun kişisel koruyucu donanım temini ve doğru şekilde kullanılmasının sağlanması</li><li>• Kimyasal Güvenlik Bilgi Formlarının kimyasalların bulunduğu çalışma alanında uygun ve görünür şekilde asılması</li><li>• Tehlikeli maddeye müdahale kartı bulundurulması</li><li>• Ortam ölçümlerinin yapılması</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zehirlenme                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerinin kontrolünün yapılması</li><li>• Yemeklerin hijyenik koşullarda hazırlanması</li><li>• Yemek servisi yapılan tabak, çatal, tepsi vs. gibi malzemelerin temiz tutulması</li><li>• Yemeklerden şahit numune alınması</li><li>• Yemek servisi yapan personele eğitim verilmesi</li><li>• Tüm personele genel hijyen eğitimi verilmesi</li><li>• Yemek servisi yapan kişilerin uygun eldiven, bone, iş kıyafeti vb. kullanması</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Salgın Hastalık                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aşılama</li><li>• Koruyucu ilaçlar</li><li>• Zararlı haşerelerle mücadele ve ilaçlama yapılması</li><li>• Hijyen sağlanması</li><li>• İlk Yardım Ekibi oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi</li><li>• İçme suyu ve su sebili kontrollerinin düzenli olarak yapılması</li><li>• Yemeklerden şahit numune alınması</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sabotaj           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Güvenlik biriminin kurulması.</li><li>• Sürekli izleme amacıyla gerekli yerlere güvenlik kameralarının yerleştirilmesi.</li><li>• Kontrollü giriş ve çıkış.</li><li>• Dışarıdan gelen kişilerin kayıtlarının tutulması, girişte kimlik kontrolü yapılması ve ziyaretçi kartlarının verilmesi.</li><li>• Gelen sevkiyatların kontrollü açılması.</li><li>• Nakliye araçlarının kontrol edilmesi.</li><li>• Yüksek güvenlikli alanlara yetkisiz erişimin kısıtlanması.</li><li>• Yeterli iç ve dış aydınlatma.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doğal afetler     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zeminin güçlendirilmesi.</li><li>• Dolapların ve rafların sabitlenmesi, büyük alet ve ekipmanların güvenli konumlara yerleştirilmesi.</li><li>• Binaların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi.</li><li>• Tüm çalışanlara deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda eğitim verilmesi.</li><li>• İlk yardım malzemeleri, el feneri, pil, radyo vb. eşyaların bulunduğu deprem çantasının hazır bulundurulması.</li><li>• Yağmur suyu kanallarının kontrol edilmesi ve bakımı.</li><li>• Ağaçlandırmaya öncelik verilmesi.</li><li>• Kapalı işyerlerinde pencere ve kapılara yönelik taşınabilir engeller.</li><li>• Elektrik (elektrik, gaz vb.) hızlı ve güvenli bir şekilde kesilmesi için acil durum vanalarının kullanılması ve yetkin kişilerin görevlendirilmesi.</li><li>• Ekipmanların afet sırasında ve sonrasında kullanıma hazır bulundurulması.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İş Kazaları       | <ul style="list-style-type: none"><li>• İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi.</li><li>• Sağlık gözetiminin yapılması (periyodik muayene ve testler vb.).</li><li>• Yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma vb. özel beceri gerektiren görevler için ek eğitim verilmesi ve bu işlere uygunluğu gösteren raporların bulundurulması.</li><li>• Risk Değerlendirmesini güncel tutmak ve alınan tedbirleri sürekli takip etmek.</li><li>• Ramak kala olaylarını araştırmak ve tekrarını önlemek için gerekli tedbirleri almak.</li><li>• Kaza araştırması ve kök neden analizinin yapılması.</li><li>• Personeli yeterli olmadığı görevlere atamamak.</li><li>• İş sağlığı ve güvenliğine yönelik teşvik/uyarı sisteminin uygulanması ve işyeri güvenliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.</li><li>• Etkin bir denetim mekanizmasının uygulanması.</li><li>• Kişisel Koruyucu Donanımların doğru ve etkin kullanımının takibi.</li><li>• Yalnız çalışmaktan kaçınmak.</li><li>• Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak istihdam edilmesini sağlamak.</li><li>• İlk Yardım Ekibinin kurulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi.</li></ul> |
| Siber Saldırıları | <ul style="list-style-type: none"><li>• Çalışanlara siber riskler ve güvenlik konusunda eğitim verilmesi.</li><li>• Antivirüs ve casus yazılım önleme yazılımlarının kurulması ve güncel tutulması.</li><li>• İnternet bağlantıları için güvenlik duvarı kullanmak.</li><li>• İşletim sistemlerini ve uygulamaları güncellemek.</li><li>• Veri ve bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi.</li><li>• Bilgisayarlara ve sunuculara fiziksel erişimi kontrol etmek.</li><li>• Wi-Fi ve LAN ağlarının güvenliğini ve gizliliğini sağlamak.</li><li>• Her çalışana bireysel kullanıcı adı ve şifre atamak.</li><li>• Ağ içindeki bilgilere erişim için yetki seviyelerinin oluşturulması.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tahliye planlarının, işyeri binalarının ve eklentilerinin giriş ve çıkışlarının, katlarının ve tahliye yollarının çalışanların görebileceği yüksekliklere asılması.</li><li>• Tahliye planında yangın söndürme ekipmanlarının ve ilk yardım malzemelerinin yerlerinin ve tahliye yollarının belirtilmesi.</li><li>• Tahliye sonrası buluşma yerinin belirlenerek planda gösterilmesi.</li><li>• Uygun acil durum kaçış yollarına ve uygun işaretlere sahip acil çıkış kaplarına sahip olmak.</li><li>• Görünür yerlere kaçış yollarını gösteren uygun işaretlerin yerleştirilmesi.</li><li>• Acil durum müdahale ekiplerinin oluşturulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi.</li><li>• Acil durumlar için görünür iletişim numaraları asmak.</li><li>• Araçların ileri hareket etmesine olanak sağlayacak şekilde park edilmesi.</li><li>• Çalışanları olası acil durumlar ve acil durum planları konusunda bilgilendirmek.</li><li>• Düzenli acil durum tatbikatları yapmak ve tüm çalışanların katılımını sağlamak.</li><li>• Müşterileri, ziyaretçileri ve işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar ve acil durum planları konusunda bilgilendirmek.</li><li>• Acil durum planlarını güncel tutmak.</li><li>• Acil durum ekiplerinin kullanacağı ekipmanları her zaman kullanıma hazır tutmak.</li><li>• Acil durumlarda çalışanları uyarmak için sesli ve/veya ışıklı alarm sisteminin kullanılması.</li><li>• İlk Yardım çantasının yerini işaretlemek, tüm çalışanların erişimine açık olmasını sağlamak, gerekli sayıda ve yeterlilikte malzeme içermesini sağlamak ve son kullanma tarihlerini sürekli kontrol etmek.</li><li>• Yaşlı, engelli veya hamile bireylerin tahliyesinde refakatçilik sağlamak.</li></ul> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Yüklenici firma asgari olarak yukarıda belirtilen hususlara ilişkin acil durum eylem planlarını detaylı şekilde hazırlamalı ve Müşavir İSG Uzmanına ve İşyeri Hekimine iletmelidir.

### 15.1.Acil Durum Toplanma Yerleri

- Her bir yapı özelinde acil durum toplanma yerleri belirlenmiş ve katı model planlarına işlenmiştir. Acil durum toplanma alanları deprem riski ve bina boyutları dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu konumlar “[İnşaat Öncesi Bilgiler & Vaziyet Planları](#)” başlığı altında ACİL TOPLANMA ALANI LEVHA GÖRSELİ kullanılarak belirtilmiştir.

### 15.2.ADME ve İlk Yardımcı Ekipleri

Yüklenici ve Alt Yükleniciler çalışma sahalarında mevzuat şartlarını gözeterek belirledikleri ADME (Acil Durum Ekipleri) ve ilk yardımcıları isimleri, görevleri, işe giriş tarihleri, acil durumlara hazırlık eğitim tarihleri, ilk yardımcı belge tarihi ve geçerlilik tarihlerini listelemeli ve Müşavir İSG Uzmanına iletmelidir.

- Söz konusu ekiplerin tamamı en az bir kez acil durum tatbikatlarına katılmalı ve katılım raporları Müşavir İSG Uzmanına, İşyeri Hekimine iletilmelidir.

## 16.Kaza ve Olay Araştırması

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında iş kazası yaşanması durumunda yasal düzenlemelere uyulacaktır. Kazanın meydana geldiği gün Ek-3'teki form aracılığıyla Müşavir ve İdareye bildirim yapılacaktır. Kaza tarihinden itibaren bir ay içerisinde kazanın kök neden analizi yapılarak İdareye sunulacaktır. Yasal olarak aşağıdaki süreler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılacaktır

- Sahada oluşabilecek kaza, olay ve rama kala olayların araştırılması ve raporlaması için kullanılacak olan rapor formu EK'3 tedir.
- İnşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek büyük çaptaki çevresel kazalar ve işyeri kazaları (yaralanma, ölümle sonuçlanan kazalar, çevresel dökülmeler gibi çevre kazaları, vb.) aynı gün Müşavir ve ÇŞİDB ile paylaşılacak; 3 iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilecektir. ÇŞİDB 48 saat içinde Dünya Bankası'nı kaza ile ilgili bilgilendirecektir. Yüklenici, 30 işgünü içinde kök neden analiziyle birlikte kaza raporunu ÇŞİDB'ye gönderecektir. ÇŞİDB de bu bilgileri eşzamanlı olarak DB ile paylaşacaktır.

Kaza tutanağı aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak tamamlanacaktır.

- Kaza raporunun bütün bölümlerinin eksiksiz bir biçimde doldurulmasına itina gösterilmelidir.
- Kazazedenin yaralandığı bölümler, yaralanmaya ilişkin bilgiler raporda belirtilen usule uygun biçimde tanımlanmalıdır.
- Kaza Raporun da kaza tarifi ve kazaya neden olan kök nedenler belirtilirken çok dikkatli hareket edilmeli, kaza iyi soruşturulmalı, yanlış anlaşılabilir ifadelerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
- Kazaya tanık olan personel sayısının 2' den fazla olması halinde, kazayı uygun biçimde tarif edebilecek, tarafsız personellerin seçimine çalışılmalıdır.
- Olay yeri fotoğrafları, yaralıların fotoğrafları, kazaya neden olan cihaz, ekipman fotoğrafları vb. objektif deliller sunularak tutanağa eklenmelidir.
- Kaza esnasında, personelin kullandığı KKD'lere ilişkin teslim tutanakları Kaza Raporunun ekinde verilecektir.
- Kaza tutanağının mümkünse, bizzat kazaya uğrayan personel tarafından doldurulması sağlanacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, rapor içinde belirtilen tanıklar içinden seçilen bir personel, kaza tanığının olmaması halinde ise işveren, işveren vekillerinin bu bölümü kendi el yazıları ile doldurmaları talep edilecektir.
- Hazırlanan rapor İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşveren/İşveren vekili tarafından imzalanmalıdır.
- Hazırlanan Kaza Raporunun ekinde aşağıda belirtilen evrakların bulunması sağlanacaktır;
  - KKD teslim tutanağı,
  - Kaza tarihine kadar verilen eğitime ilişkin katılım formları ve sertifikalar,
  - Oryantasyon eğitim formu,
  - Mesleki yeterliliğe ilişkin sertifika, diplomalar,
  - İşe uygunluğu gösterir sağlık raporu,
  - Fazla çalışma onay formu (kazanın mesai saatleri dışında gerçekleşmesi halinde),
  - Olması halinde kaza öncesi hazırlanmış ihtar yazıları (kazaya neden olan hususla ilgili ise),
  - İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenmiş tutanaklar,
  - SGK iş kazası bildirim tutanağı,
  - Kaza sonrası temin edilen sağlık raporu,

- Hekim tarafından düzenlenmiş iş göremezlik raporu,
- Sigortalı işe giriş bildirgesi,

İş kazalarının ne kadar önlem alınıralsa alınsın yaşanabileceği unutulmamalıdır. Kaza esnasında ve sonrasında soğukkanlı hareket edilmesi hem kazazede hem de işletme için önemlidir. Bu nedenle İŞ KAZALARI/YARALI KURTARMA tatbikatlarının saha çalışmaları öncesinde ciddiyle gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Kaza sonrası önlemler; acil olarak gerçekleştirilmesi gereken düzeltmeler ve kazaya neden olan KÖK nedenin ortadan kaldırılmasına yönelik düzeltmeler şeklinde iki ayrı kategoride değerlendirilmelidir. İş kazası sonrası kazaya neden olan unsurların, tekrarlanmayacak şekilde ortadan kaldırılması esastır.

#### **Kaza sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar;**

- Teftiş aşamasında, olay yerine gelen müfettişlere kolaylık sağlanması için sahada gereken düzenlemeler yapılacak, kazazedeye ilişkin her türlü bilgi ve belge hazırda bulundurulacaktır. Müfettiş tarafından talep edilen bilgi ve belgelere erişim süresinin önem arz ettiği unutulmamalıdır.
- SGK kaza bildiriminin kaza tarihi itibarı ile azami 3 gün içinde yapılacaktır. (Vizite kâğıdı ile birlikte)
- Olması halinde kazaya neden olan makina ve ekipmanın kontrol raporları ile düzenli bakım kartları da incelemeler için kaza raporu ekinde tutulacaktır.
- Kaza Raporu ekinde tutulan evrakların tamamı kopya olacaktır. Ancak müfettişlerin talep etmesi halinde orijinal evraklara kısa sürede erişim sağlanması için gereken hazırlık yapılacaktır.

## 17.İSG Bütçesi

Aşağıda sunulan İSG Bütçesi genel bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur. Yüklenicinin sunacağı ihale teklifinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması için gerekli olan bütçeyi de içerecek şekilde hazırlandığı kabul edilir.

Tablo 42 Tahmini ISG Bütçesi

|                                                                  | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR       |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| KATEGORİ II BARET (TS EN 397+A1)                                 | 150    | AD.   | ₺200,00     | ₺30.000,00  |
| KATEGORİ I KULAK TIKACI (TS EN 352-2)                            | 3050   | AD.   | ₺25,00      | ₺76.250,00  |
| KATEGORİ I KORUYUCU GÖZLÜK (TS EN ISO 16321-3)                   | 150    | AD.   | ₺60,00      | ₺9.000,00   |
| GENEL AMAÇLI İŞ ELDİVENİ (TS EN ISO 21420)                       | 150    | AD.   | ₺30,00      | ₺4.500,00   |
| ELEKTRİKLE ÇALIŞMA İŞ ELDİVENİ (ALÇAK GERİLİM) (TS EN ISO 21420) | 50     | AD.   | ₺750,00     | ₺37.500,00  |
| İŞ AYAKKABISI (TS EN ISO 20347)                                  | 150    | AD.   | ₺450,00     | ₺67.500,00  |
| İZOLE İŞ AYAKKABISI (ALÇAK GERİLİM) (TS EN ISO 20347)            | 50     | AD.   | ₺1.100,00   | ₺55.000,00  |
| TOZ MASKESİ                                                      | 3050   | AD.   | ₺10,00      | ₺30.500,00  |
| YARIM YÜZ MASKESİ (TS EN 140)                                    | 35     | AD.   | ₺500,00     | ₺17.500,00  |
| KATEGORİ II TAM VÜCUT EMNİYET KEMERİ (TS EN 361)                 | 150    | AD.   | ₺450,00     | ₺67.500,00  |
| DÜŞME ENGELLEYİCİ DONANIMLAR (EN 355)                            | 100    | AD.   | ₺250,00     | ₺25.000,00  |
| HAYAT HALATLARI (EN 355)                                         | 100    | m.    | ₺450,00     | ₺45.000,00  |
| EMNİYET ŞERİDİ                                                   | 750    | m.    | ₺5,00       | ₺3.750,00   |
| GÜVENLİK AĞI (EN 355)                                            | 750    | m²    | ₺350,00     | ₺262.500,00 |

TOPLAM: **₺731.500,00**

KDV: **₺58.520,00**

YEKÜN: **₺790.020,00**

## 18.Ekler

Ek-1 Trafik Planı, Acil Toplanma Alanı, Riskli Alanlar

Ek- 2 İş İzin Formu

Ek- 3 Kaza Bildirim Formu



### Ek-1 Trafik Planı, Acil Toplanma Alanı,

Elazığ Fırat Üniversitesi proje kapsamındaki yapılara ilişkin olarak; Şantiye trafik planı aşağıda yer almaktadır. Araç giriş ve güvenlik noktasında trafik uyarı levhası bulundurulacak, , girişler hem yaya hem araç için kontrol edilecektir. Giriş çıkış yapılmadığında kapı kapalı olacak ve bir görevli bulundurulacaktır. Bina çevrelerinde izinsiz girişleri engelleyecek şekilde çevre çitleri ile kaptama yapılacaktır.




Şekil 25 Atatürk Kültür Merkezi ve Öğrenci İşleri(Eski Kütüphane) Şantiye Trafik Planı






Şekil 26 Bilgisayar Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Şantiye Trafik Planı



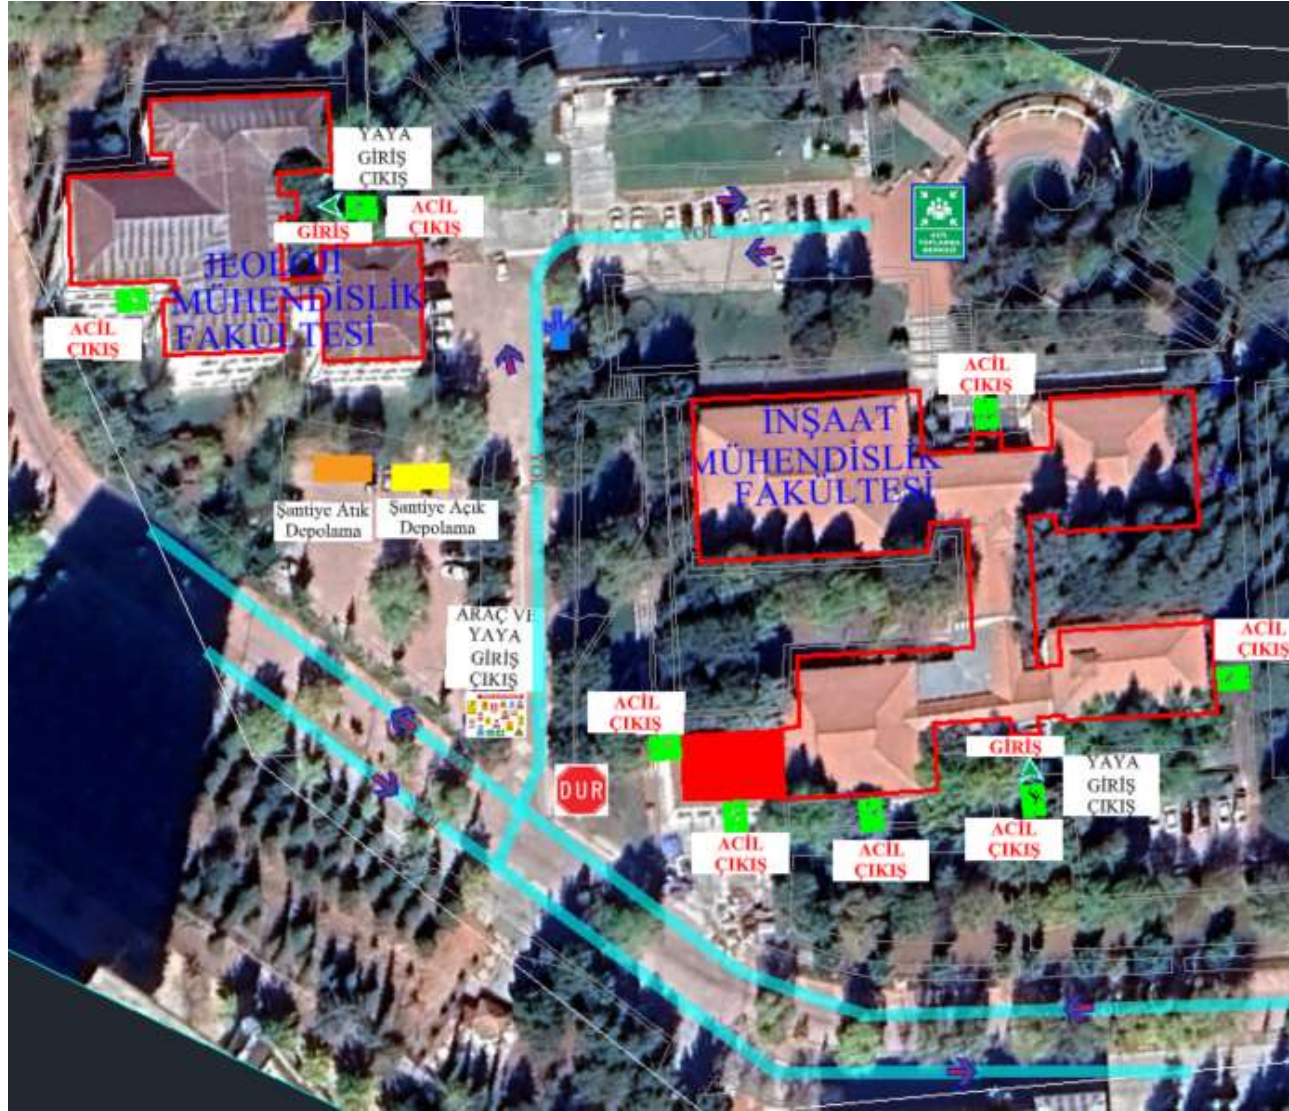

Şekil 27 İnşaat Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislik Fakültesi, Şantiye Trafik Planı



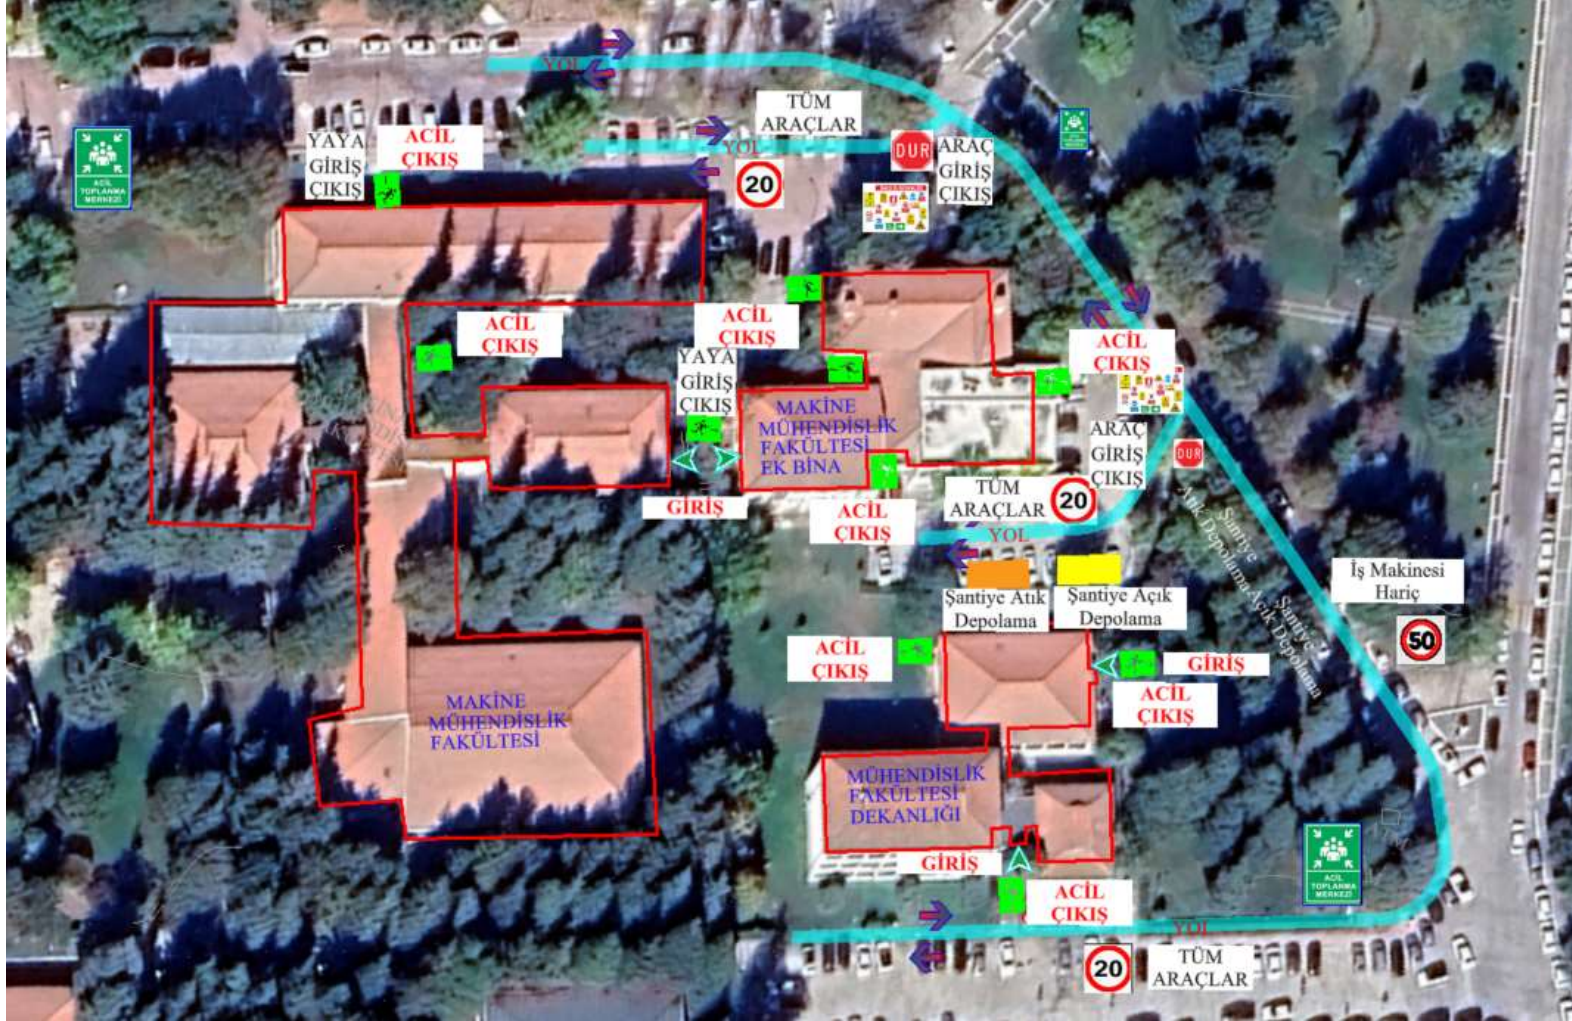

Şekil 28 Makine Mühendisliği Fakültesi, Makine Mühendislik Fakültesi Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Şantiye Trafik Planı





Şekil 29 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Binası Trafik Planı





Şekil 30 Misafirhane Şantiye Trafik Planı






Şekil 31 Elektrik Mühendisliği Fakültesi Şantiye Trafik Planı





Şekil 32 Rektörlük Binası Trafik Planı



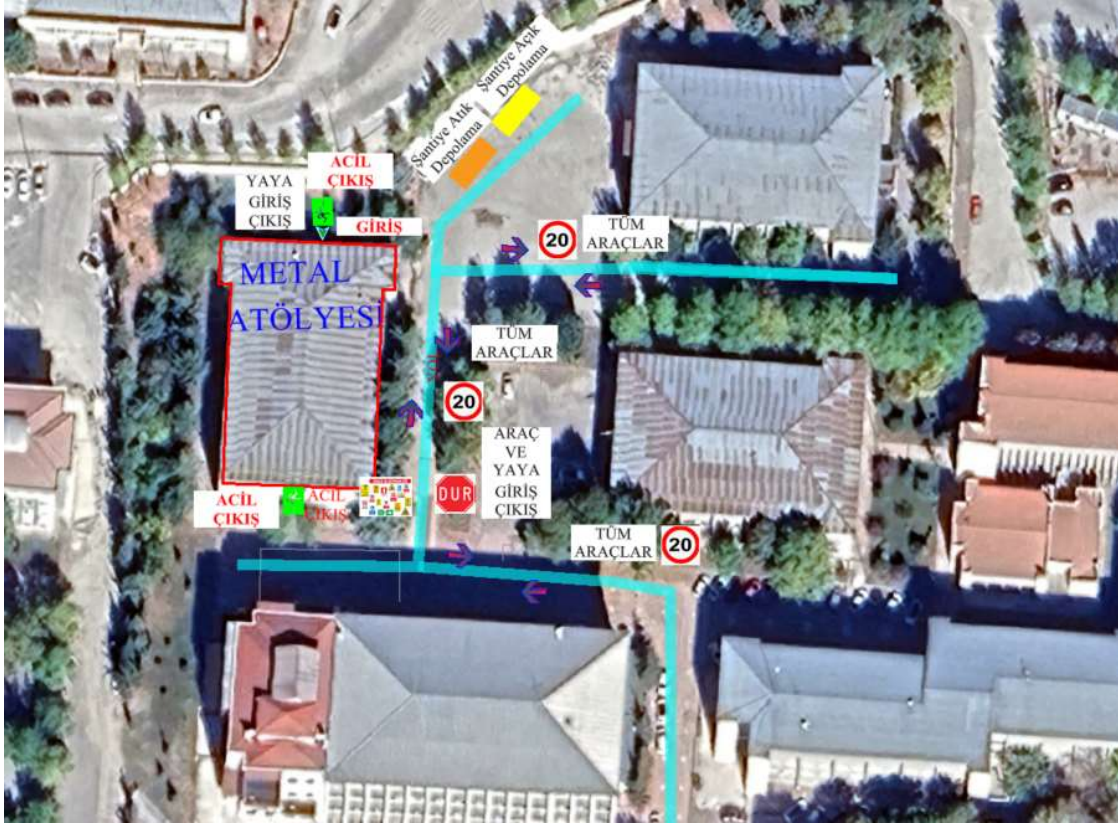

Şekil 33 Metal Atölyesi Trafik Planı



Şekil 34 Yeni Prefabrik Laboratuvar Binası Trafik Planı





Şekil 35 Arazi Tipi GES Trafik Planı





Şekil 36 Vaziyet Planı

## Ek- 2 İş İzin Formu

|                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Firma Adı                                           | İzin No.                                      | Talep Tarihi                                                                                                                                                                      | Başlama Tarihi<br>Saati                    | Bitiş Tarihi<br>Saati |
| Çalışılacak Lokasyon                                |                                               | İş İznine Tabi Faaliyet Türü                                                                                                                                                      |                                            |                       |
|                                                     |                                               | <input type="checkbox"/> Gece Çalışması <input type="checkbox"/> Yüksekte Çalışma <input type="checkbox"/> Sıcak İşler<br><input type="checkbox"/> Devreye Alma/Test/Kabul İşleri |                                            |                       |
| <b>FAALİYET AÇIKLAMASI</b>                          |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                       |
|                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                       |
| <b>ÇALIŞANLARIN LİSTESİ</b>                         |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                       |
| Adı Soyadı                                          | T.C. Kimlik No.                               |                                                                                                                                                                                   | Mesleği                                    |                       |
|                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                       |
|                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                       |
|                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                       |
| Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımlar            |                                               |                                                                                                                                                                                   | İş Makinesi, Diğer Teçhizat ve El aletleri |                       |
| <input type="checkbox"/> İş Ayakkabısı              | <input type="checkbox"/> Şok Emicili Lanyard  | 1.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> İş Ayakkabısı (Elektrikçi) | <input type="checkbox"/> Toz Maskesi          | 2.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> Baret                      | <input type="checkbox"/> Gaz Maskesi          | 3.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> Montaj eldiveni            | <input type="checkbox"/> Kulak Tıkacı         | 4.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> Kaynakçı Eldiveni          | <input type="checkbox"/> Kulaklık             | 5.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> Eldiven (alçak gerilim)    | <input type="checkbox"/> Yağmurluk            | 6.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> Eldiven (yüksek gerilim)   | <input type="checkbox"/> Çizme                | 7.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> Yüz siperliği              | <input type="checkbox"/> Kaynakçı baş maskesi | 8.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> Koruyucu Gözlük            | <input type="checkbox"/> Kaynakçı el maskesi  | 9.                                                                                                                                                                                |                                            |                       |
| <input type="checkbox"/> Emniyet Kemer              |                                               |                                                                                                                                                                                   |                                            |                       |

|                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |                                            |                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>BEYANLAR</b>                                                                                                                                                                                      |                                       |      |                                            |                                               |                            |
| Yukarıda açıklanan faaliyetin güvenli bir şekilde yürütülmesinin sorumluluğunu anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.                                                                            |                                       |      |                                            |                                               |                            |
| Çalışma alanının kapsamlı bir incelemesi yapıldı ve potansiyel tehlikeler tespit edildi.                                                                                                             |                                       |      |                                            | <input type="checkbox"/> E                    | <input type="checkbox"/> H |
| Faaliyet ile ilgili risklerin azaltılması için gereken tüm önlemlerin alınması sağlandı                                                                                                              |                                       |      |                                            | <input type="checkbox"/> E                    | <input type="checkbox"/> H |
| Tüm personel, faaliyete ilişkin uygun eğitimi almış ve gerekli becerilere sahiptir                                                                                                                   |                                       |      |                                            | <input type="checkbox"/> E                    | <input type="checkbox"/> H |
| Personelin, Mesleki Yeterlilik Belgeleri Özlük Dosyalarında mevcuttur                                                                                                                                |                                       |      |                                            | <input type="checkbox"/> E                    | <input type="checkbox"/> H |
| Çalışma alanı, yetkisi olmayan personelden uygun şekilde izole edildi                                                                                                                                |                                       |      |                                            | <input type="checkbox"/> E                    | <input type="checkbox"/> H |
| Bu faaliyet ile ilgili acil bir durumda ne yapılacağı (kurtarma, ilk yardım vb.) biliniyor                                                                                                           |                                       |      |                                            | <input type="checkbox"/> E                    | <input type="checkbox"/> H |
| Ek(ler): İş izni talebi ile birlikte, Müşavire iletilmesi gereken doküman ve kayıtlar varsa (Mesleki Yeterlilik sertifikası, Risk Değerlendirmesi, Saha Kontrol Formları vb.) bu forma eklenecektir. |                                       |      |                                            |                                               |                            |
| İş İzni Talebi Yapan                                                                                                                                                                                 |                                       |      | İş İzni Onayı Veren                        |                                               |                            |
| Adı Soyadı                                                                                                                                                                                           | Tarih                                 | İmza | Adı Soyadı                                 | Tarih                                         | İmza                       |
|                                                                                                                                                                                                      |                                       |      |                                            |                                               |                            |
| Notlar:                                                                                                                                                                                              |                                       |      |                                            |                                               |                            |
| <b>İŞ İZNİ KAPATMA</b>                                                                                                                                                                               |                                       |      |                                            |                                               |                            |
| Talep Yapan                                                                                                                                                                                          |                                       |      | Onay Veren                                 |                                               |                            |
| <input type="checkbox"/> Faaliyet Tamamlandı                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Tamamlanmadı |      | <input type="checkbox"/> İş İzni Kapatıldı | <input type="checkbox"/> İş İzni İptal Edildi |                            |
| Tarih, Saat:                                                                                                                                                                                         |                                       |      | Tarih, Saat:                               |                                               |                            |
| İmza:                                                                                                                                                                                                |                                       |      | İmza:                                      |                                               |                            |

Ek- 3 Kaza Bildirim Formu

|                                                              |                                                 | KAZA BİLDİRİM FORMU                                             |                                                   | Bildirim Tarihi:            |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                                                              |                                                 |                                                                 |                                                   | Bildirim No:                |  |
|                                                              |                                                 | KAZAYA MARUZ KALANIN                                            |                                                   |                             |  |
| Adı Soyadı                                                   |                                                 | Kaza/Olay Tarihi                                                |                                                   |                             |  |
| TC Kimlik No                                                 |                                                 | Kaza/Olay Saati                                                 |                                                   |                             |  |
| Çalıştığı Şirket                                             |                                                 | Kaza/Olay Sırasında Yürütülen Faaliyet                          |                                                   |                             |  |
| Bölüm/Proje                                                  |                                                 | Kullanılan El Aleti, Ekipman                                    |                                                   |                             |  |
| Mesleği                                                      |                                                 | Tanık (1) Adı Soyadı                                            |                                                   |                             |  |
| İşyerinde Çalıştığı Süre                                     |                                                 | Tanık (2) Adı Soyadı                                            |                                                   |                             |  |
| KAZANIN GERÇEKLEŞME ZAMANI                                   |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Mesai                               | <input type="checkbox"/> Fazla Mesai            | <input type="checkbox"/> Dinlenme Süresi                        | <input type="checkbox"/> Geçici Görev / Ziyaret   |                             |  |
| KAZANIN SONUÇLARI                                            |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Ölüm                                | <input type="checkbox"/> İşgünü Kayıplı (İşgünü | <input type="checkbox"/> Revirde Müdahale Gerektiren            |                                                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Uzun Kaybı                          | <input type="checkbox"/> İşgünü Kayıpsız        | <input type="checkbox"/> Tıbbi Müdahale Gerektiren              |                                                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Mal Kaybı                           | <input type="checkbox"/> Çevre Kazası           | <input type="checkbox"/> Meslek Hastalığı (İşgünü kaybı: _____) |                                                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Diğer(belirtiniz)                   |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ                                           |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Kayma                               | <input type="checkbox"/> Takılma, Düşme         | <input type="checkbox"/> Yüksekten Düşme                        | <input type="checkbox"/> Sıkışma/Ezilme           |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Kesilme/Batma                       | <input type="checkbox"/> Çarpma, Sıçrama        | <input type="checkbox"/> Göze Yabancı Cisim Kaçması             | <input type="checkbox"/> Vücudu Zorlama           |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Malzeme, alet düşmesi               | <input type="checkbox"/> Elektrik Çarpması      | <input type="checkbox"/> Yangın                                 | <input type="checkbox"/> Soğuk/Sıcığa Maruz Kalma |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Hayvan ısırması                     | <input type="checkbox"/> Böcek vb. Sokması      | <input type="checkbox"/> Patlama                                | <input type="checkbox"/> Radyasyona Maruz Kalma   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Kimyasal Madde Teması               | <input type="checkbox"/> Göçük                  | <input type="checkbox"/> Trafik Kazası                          | <input type="checkbox"/> Doğal Afet (Deprem, sel) |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Bulaşıcı Hastalık                   | <input type="checkbox"/> Zehirlenme             | <input type="checkbox"/> Boğulma                                | <input type="checkbox"/> Diğer:                   |                             |  |
| YARALANMA TÜRÜ                                               |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Yüzeysel Yara, Çizik                | <input type="checkbox"/> Kanamalı Yaralanma     | <input type="checkbox"/> Derin ve Açık Yara                     | <input type="checkbox"/> Uzun Kayıplı Yaralanma   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Burkulma, İncinme                   | <input type="checkbox"/> Çıkık                  | <input type="checkbox"/> Çatlak                                 | <input type="checkbox"/> Kırık                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Geçici Bilinç Kaybı                 | <input type="checkbox"/> Elektrik Yanığı        | <input type="checkbox"/> Termal Yanıklar                        | <input type="checkbox"/> Kimyasal Yanıklar        |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Bayılma, Şok                        | <input type="checkbox"/> İç Kanama              | <input type="checkbox"/> Güneş Çarpması                         | <input type="checkbox"/> Vücutta Donma            |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Kaslarda Zedelenme                  | <input type="checkbox"/> Nefes Kesilmesi        | <input type="checkbox"/> Akut Enfeksiyon                        | <input type="checkbox"/> Akut Zehirlenme          |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Diğer:                              |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| KAZADAN ETKİLENEN VÜCUT BÖLGESİ                              |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Kafatası                            | <input type="checkbox"/> Yüz                    | <input type="checkbox"/> Kulaklar                               | <input type="checkbox"/> Gözler                   |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Ağız                                | <input type="checkbox"/> Boyun                  | <input type="checkbox"/> Kollar                                 | <input type="checkbox"/> Eller                    |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Bacaklar                            | <input type="checkbox"/> Dizler                 | <input type="checkbox"/> Ayaklar                                | <input type="checkbox"/> Bilekler                 |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Parmaklar                           | <input type="checkbox"/> Göğüs                  | <input type="checkbox"/> Karın Boşluğu                          | <input type="checkbox"/> Sırt                     |                             |  |
| <input type="checkbox"/> Diğer:                              |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| KAZANIN NASIL OLDUĞU? (Detaylı ve anlaşılır biçimde yazınız) |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
|                                                              |                                                 |                                                                 |                                                   |                             |  |
| Bildirimi Yapan                                              |                                                 | Üst Amiri                                                       |                                                   | İşveren Vekili/Proje Müdürü |  |
| Adı Soyadı - İmzası                                          |                                                 | Adı Soyadı - İmzası                                             |                                                   | Adı Soyadı - İmzası         |  |



Ek- 4 Güçlendirme Elemanları Tablosu

| KADEV DESSUP-05 GRUP-01 |                                                 |                               |                         |            |                   |                               |                         |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| SIRA NO                 | BİNA ADI                                        | PERDE GÜÇLENDİRME (BETONARME) | PERDE GÜÇLENDİRME (FRP) | YENİ PERDE | KOLON GÜÇLENDİRME | KİRİŞ GÜÇLENDİRME (BETONARME) | KİRİŞ GÜÇLENDİRME (FRP) | YENİ KİRİŞ |
| 1                       | FÜ Atatürk Kültür Merkezi                       | 4                             | 0                       | 43         | 135               | 0                             | 3                       | 0          |
| 2                       | Kütüphane Binası                                | 24                            | 0                       | 12         | 75                | 0                             | 8                       | 0          |
| 3                       | FÜ Bilgisayar Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 0                             | 84                      | 14         | 28                | 0                             | 246                     | 0          |
| 4                       | FÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü                 | 6                             | 0                       | 109        | 302               | 0                             | 71                      | 0          |
| 5                       | FÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü                   | 11                            | 0                       | 57         | 304               | 0                             | 24                      | 0          |
| 6                       | FÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü                  | 3                             | 0                       | 73         | 401               | 0                             | 182                     | 0          |
| 7                       | FÜ Kimya Mühendisliği Laboratuvarı              | 0                             | 1                       | 15         | 45                | 0                             | 0                       | 0          |
| 8                       | FÜ Makine Mühendisliği Bölümü                   | 16                            | 0                       | 47         | 307               | 0                             | 23                      | 0          |
| 9                       | FÜ Makine Mühendisliği Bölümü Ek Bina           | 6                             | 14                      | 29         | 138               | 0                             | 29                      | 1          |
| 10                      | FÜ Misafirhane                                  | TÜM YIĞMA YAPI                | 0                       | 0          | 9                 | 10                            | 0                       | 5          |
| 11                      | FÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı              | 2                             | 0                       | 35         | 168               | 0                             | 44                      | 0          |
| 12                      | FÜ Rektörlük Binası                             | 2                             | 20                      | 64         | 138               | 0                             | 72                      | 0          |
| 13                      | FÜ Teknoloji Fakültesi Metal Atölyesi           | 0                             | 12                      | 16         | 20                | 0                             | 76                      | 0          |
