


Orta Asya ve Kafkaslardaki Dağlık Su Havzalarının Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi

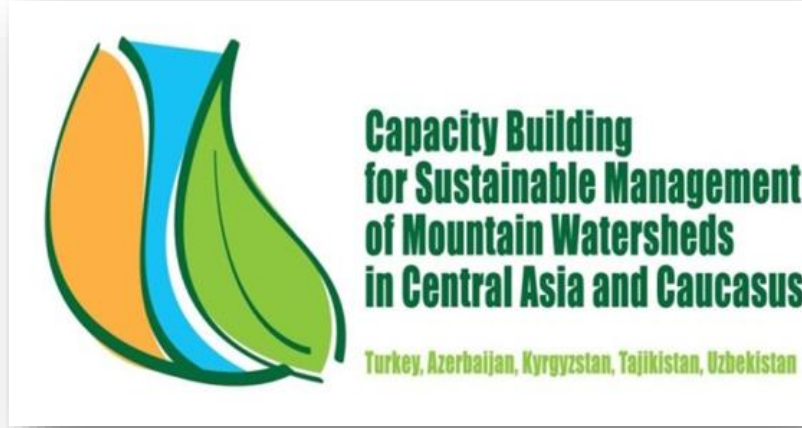

İÇİNDEKİLER

1. PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER	1
2. PROJE ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ.....	2
3. PROJE ÇIKTILARI-FAALİYETLERİ VE İŞ PLANI	2
3.1. Proje Çıktıları	2
3.2. Proje Çıktılarına Göre Faaliyetler ve İş Planı.....	2
Çıktı 1 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme:	2
Çıktı 2 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme:	3
Çıktı 3 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme:	3
Çıktı 4 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme:	4
Çıktı 5 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme:	4

1. PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Projede yer alan ülkeler; Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye'dir.

Proje uygulama süresi: 36 aydır.

Projede yer alan Devlet Uygulama Kurumları:

- Türkiye: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
- Azerbaycan: Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
- Kırgızistan: Çevre Koruma ve Ormancılık Kurumu
- Tacikistan: Çevre Koruma Komitesi
- Özbekistan: Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Orman Bölümü

Proje ortakları; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), TİKA ve FAO' dur.

Proje bütçesi

KURUM	MİKTAR (USD)
FAO/FTPP	300 000
GDCDE/Orman ve Su İşleri Bakanlığı	130 000
TİKA	200 000
ÜLKELER	79 775
TOPLAM	709,775

Projenin amacı:

- Kamu oyunun, politikacıların ve karar vericilerin Dağlık havza uygulamaları, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimine yönelik katılımcı ve entegre yaklaşımlar konusunda farkındalıklarının artırılması
- Ormancılık ve diğer ilgili kuruluşların bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesi amacıyla proje hayata geçirilmektedir.

2. PROJE ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- **ÇEM Genel Müdürlüğü;** Bölgesel proje koordinatörü atayacak ve projenin genel koordinasyonu, Türkiye'deki eğitimlerin organizasyonu ve masraflarından sorumlu olacaktır.
- **TİKA;** Türkiye'de yapılacak eğitimlere diğer ülkelerden katılacakların yol masrafı ile bu eğitimlerdeki çeviri masraflarını karşılayacak, ayrıca bir proje ülkesinde yapılacak pilot uygulama çalışmasının masraflarını karşılayacaktır.
- **FAO;** Uzmanların masrafları, belli seyahat ve toplantıların masrafları, eğitimlere katılacakların cep harçlıkları, yayın ve eğitim malzemeleri ve diğer masraflarını karşılayacaktır.

3. PROJE ÇIKTILARI-FAALİYETLERİ VE İŞ PLANI

3.1. Proje Çıktıları

Proje sonunda aşağıdaki çıktıların elde edilmesi beklenmektedir. Proje İş Planı (EK-1)'nda bu çıktılar ve alt faaliyetlerine yer verilmiş olup aşağıda detaylı olarak açıklanacaktır.

Çıktı 1: Mevcut su yönetimi tecrübelerinin gözden geçirilmesi, teknik ve kurumsal talimatnamelerin proje ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması.

Çıktı 2: Dağlık havzaların bütünsel ve katılımcı biçimde rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin planlanması ve uygulanmasında yaklaşım ve metodolojilerle ilgili olarak karar vericiler ve ormancılık departmanlarından ve ilgili diğer kurumlardan seçilmiş uzmanların farkındalık, bilgi, tecrübe, kapasite ve sorumluluklarının artırılması.

Çıktı3: Bütünsel-katılımcı su havzası rehabilitasyon planının hazırlanması ve proje ülkelerinin bir tanesinde örnek bir mirohavzada pilot uygulama olarak bu planın uygulanması.

Çıktı 4. Bilinç artırmanın geliştirilmesi, kapasite oluşturma ve eğitim materyali.

3.2. Proje Çıktılarına Göre Faaliyetler ve İş Planı

Çıktı 1 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu çıktı altında yer alan ülke deneyimlerinin, mevcut plan ve dokümanlarının gözden geçirilmesi işleri, projede çalışacak olan

Ulusal Proje Koordinatörü (NPC), Bölgesel Proje Koordinatörü (RPC) ve Ulusal Danışman (NC) tarafından derlenerek bir araya getirilecektir.

Çıktı 2 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu kapsamda **2.1.** no'lu faaliyet için 5-9 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya'da Katılımcı Entegre Havza Yönetimi ve Rehabilitasyonu Eğitimi ve Çalıştayı düzenlenmiştir (Havza Dairesi Hizmet İçi Eğitimi ile çalıştayı ilk 2 günü birleştirilmiş, sonra yabancı katılımcılarla çalıştaya devam edilmiştir).

- Çalıştaya her ülkeden 4 üst düzey yönetici katılmıştır
- Çalıştayı ilk 2 günü büro olarak ilerlemiştir (HİE ile birlikte)
- 3. Gün "1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı- 1st Steering Committee Meeting" yapılmış ve katılımcılarla faaliyetler ve iş planı üzerinde görüşülmüştür.
- 4. ve 5. Gün Burdur ve Antalya illerindeki ağaçlandırma çalışmaları ile fidanlıklar ziyaret edilerek havza planlama çalışmaları görülmüştür.

Faaliyet 2.2.1 ve 2.2.2 birleştirilerek 26 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihleri arasında Mersin ve Kahramanmaraş illerinde "Katılımcı Entegre Havza Yönetimi: Planlama, Rehabilitasyon ve Gelir Getirici Faaliyetler Eğitimi" gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime proje yabancı ortağı ülkelerden, uygulamada çalışan 8'er katılımcı (bu katılımcılardan 1'er tanesi Ulusal Proje Koordinatörüdür) gelmiştir.

- Eğitimin ilk 2 günü büroda gerçekleştirilmiştir. Büro çalışmalarında katılımcı havza planlama konularına ağırlık verilmiş, çalışma grupları oluşturularak bu gruplardan dağıtılan dokümanların yardımı ile havza planı hazırlamaları ve sunmaları istenmiştir.
- Eğitimin sonraki günlerinde Mersin ve Kahramanmaraş illerinde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş:
 - Tarımsal faaliyetler ve seracılık
 - Fidanlık
 - Kumul ağaçlandırmaları
 - Toprak muhafaza ve sel kontrol çalışmaları yerinde görülmüştür
- Ulusal Proje Koordinatörleri (NPC) ile bir toplantı gerçekleştirilerek proje ilerlemesi, planlanan faaliyetler ve sorumluluklar üzerinde görüşülmüştür.

Faaliyet 2.2.3. "Tohum, fidan, kuru alan ağaçlandırma teknikleri üzerine eğitim" in 7-11 Nisan 2014 tarihleri arasında Eskişehir'de proje ülkelerinden 18 yabancı uzmanı da kapsayan yaklaşık 50 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim süresince Eskişehir Orman Fidanlığı'nda incelemelerde bulunulmuş, uygulamalar yapılmış ve fidanlık tekniği konusu detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca Proje ulusal koordinatörleri ile bir kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 2.4. proje ortağı ülkelerde gerçekleştirilecek eğitimlerle ilgilidir. –İptal edilmiştir-

Çıktı 3 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu çıktı pilot Mikrohavzada MH planının hazırlanmasına ilişkin olup, **3.1. no'lu** faaliyet için 29 Eylül-07 Ekim 2013 tarihleri arasında

Kırgızistan ve Tacikistan'a Genel Müdürümüz Sn. Hanifi Avcı, Daire Başkanı Behlül Şenyürek ve Proje Koordinatörü Erdoğan Özevren tarafından bir misyon ziyareti gerçekleştirilmiştir.

3-22 Mayıs tarihleri arasında Kırgızistan/ Bişkek'te seçilen Cholok Kaiyndyn mikrohavzasında, ÇEM Genel Müdürlüğü uzmanları ve FAO danışmanlarından oluşan bir ekip tarafından katılımcı entegre mikrohavza planı hazırlanmıştır.

Çıktı 4 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu faaliyetler iş tanımları hazırlanan uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek, bu ülkeler için bir teknik rehber hazırlanacaktır. Bu teknik rehberin son taslağı Proje Danışmanı Sn. Muzaffer DOĞRU tarafından gönderilmiştir.

Çıktı 5 ve altındaki faaliyetlere ilişkin değerlendirme: Bu çıktı Proje Yönetimi, Raporlama, İzleme, Değerlendirme, Destekleme faaliyetlerini içermekte olup, Ulusal Proje Koordinatörleri, Proje Bölgesel Koordinatörü ve danışmanlarca gerçekleştirilecektir.

Projenin kapanış toplantısı 2015 yılında ülkemizin ev sahipliği yaptığı UNCCD COP12'de yapılmıştır.

