



Bu proje Avrupa Birliđi ve Trkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse
edilmektedir.

STRATEJİK ÇEVRESEL DEĐERLENDİRME YÖNETMELİĐİ'NİN UYGULANMASININ DESTEKLENMESİ

Sözleşme N° TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

ARA İLERLEME RAPORU NO. 3 **-NİHAİ-**

ŞUBAT 2020



TRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĐI



Çevre ve İklim
Eylemi Sektör
Operasyonel Programı



eptisa
mühendislik

Bu rapor Avrupa Birlięi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansal desteęi ile hazırlanmıştır. İçerięi yalnızca Eptisa Mühendislik sorumluluęundadır. Hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Avrupa Birlięi'nin görüşlerini yansıtmaz.

BELGE KONTROL ÇİZELGESİ

Sözleşme Makamı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birlięi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Faydalanıcı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Deęerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Proje	Stratejik Çevresel Deęerlendirme Yönetmelięi'nin Uygulanmasının Desteklenmesi
EuropeAid No	TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03
Başlık	Ara İlerleme Raporu No. 3
Rapor Durumu	Taslak – 22.01.2020 Revize edilmiş versiyon – 05.02.2020 Nihai versiyon – 18.02.2020
Teslim	18.02.2020
Hazırlayanlar	Martin SMUTNY – Takım Lideri Mojca HRABAR – Eęitim Uzmanı Michal MUSIL – Kıdemli Uluslararası SÇD Uzmanı Gonca KAYNAK – Kıdemli Yerel SÇD Uzmanı Pınar Süren YILMAZ – Kıdemli Yerel SÇD Uzmanı
İnceleyen	C. Serdar HAKKAÇIRMAZ – Proje Direktörü

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	IV
KISALTMALAR DİZİNİ	1
1. GİRİŞ	2
1.1 ARKA PLAN BİLGİSİ.....	2
1.2 ARA İLERLEME RAPORUNUN AMACI	2
2. RAPORLAMA SÜRECİNDE UYGULANAN FAALİYETLER	3
2.1 FAALİYET 1.2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ	3
2.2 FAALİYET 1.4. BELİRLENMİŞ İKİ PLANLAMA SÜRECİNİN HAZIRLANMASI	3
2.3 FAALİYET 2.1. EĞİTİM İHTİYAÇLARININ ANALİZİNİN YAPILMASI.....	3
2.4 FAALİYET 2.2. EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI.....	3
2.5 FAALİYET 2.3. EĞİTİMLERİN VERİLMESİ	3
2.6 FAALİYET 2.4. ÜNİVERSİTELER, STK'LAR, ODA'LAR VE HALK İÇİN FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞTAYLARI	3
2.7 FAALİYET 2.5. AB ÜLKELERİNE ÇALIŞMA ZİYARETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	4
2.8 FAALİYET 2.6. WEBSİTESİNİN PROJE ÇIKTILARIYLA GÜNCELLENMESİ	4
2.9 RAPORLAMA	4
2.10 OPERASYON KOORDİNASYON BİRİMİ TOPLANTISI	4
2.11 RAPORLAMA SÜRECİNDE UYGULANAN FAALİYETLERE GENEL BAKIŞ	5
3. SIRADAKİ RAPORLAMA SÜRECİNİN PLANLANMASI	9
3.1 ÇALIŞMA PLANINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER	9
3.2 FAALİYET 1.4. BELİRLENMİŞ İKİ PLANLAMA SÜRECİNİN HAZIRLANMASI	9
3.3 FAALİYET 2.2. EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI.....	9
3.4 FAALİYET 2.3. EĞİTİMLERİN VERİLMESİ	9
3.5 FAALİYET 2.4. ÜNİVERSİTELERİN, STK'LARIN, ODA'LARIN VE HALKIN FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI ÇALIŞTAYLARI	9
3.6 FAALİYET 2.5. AB ÜLKELERİNE ÇALIŞMA ZİYARETLERİNİN DÜZENLENMESİ.....	9
3.7 FAALİYET 2.6. MEVCUT WEBSİTESİNİN PROJE ÇIKTILARIYLA GÜNCELLENMESİ	10
4. GÖSTERGELER	11
5. VARSAYIMLAR VE RİSKLER	22
5.1 SÇD PİLOTLARI	22
5.2 FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞTAYLARI	22
EK-I NEP KAPSAM BELİRLEME RAPORU	24
EK-II BKAY KAPSAM BELİRLEME RAPORU	25
EK-III FAALİYET 2.3 VE FAALİYET 2.4 İÇİN EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU.....	26
EK-IV OPERASYON KOORDİNASYON BİRİMİ TOPLANTISI NO.1	27
EK-V GÜNCELLENMİŞ ÇALIŞMA PLANI	28

KISALTMALAR DİZİNİ

AB	Avrupa Birlięi
AK	Avrupa Komisyonu
BKAY	Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi
ÇED	Çevresel Etki Deęerlendirme
ÇŞB	Çevre ve Şehircilik Bakanlıęı
EİA	Eęitim İhtiyacı Analizi
GM	Genel Müdürlük
İT	İş Tanımı
NEP	Nitrat Eylem Planı
OTB	Operasyon Tanımlama Belgesi
PYK	Proje Yönlendirme Komitesi
SÇD	Stratejik Çevresel Deęerlendirme
SM	Sözleşme Makamı
STK	Sivil Toplum Kuruluşları
TOB	Tarım ve Orman Bakanlıęı
YKT	Yönlendirme Komitesi Toplantısı
Yüklenici	EPTISA Mühendislik – EPTISA Servicios ve Integra Danışmanlık Konsorsiyumu

1. GİRİŞ

1.1 ARKA PLAN BİLGİSİ

Avrupa Birlięi (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Stratejik Çevresel Deęerlendirme (SÇD) Yönetmelięi'nin Uygulanmasının Desteklenmesi" projesi (bundan böyle 'SÇD Projesi' olarak anılacaktır) 18 Nisan 2019 tarihinde (1 Numaralı İdari Emir ile) başlatılmıştır. SÇD Projesi'nin (Eylül 2020'ye kadar) uygulanması çevresel hususların, çevre üzerinde önemli etkileri olması muhtemel plan ve programların hazırlığına ve uygulanmasına entegrasyonu yoluyla üst düzey çevre korumasına katkıda bulunacaktır. Bunun sonucu olarak SÇD'nin kurumsal kapasitesi artmalı ve SÇD Yönetmelięi'nin etkili uygulanması desteklenmelidir.

Türkiye'nin çevresel konulardan sorumlu esas devlet kurumu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) bu projenin kilit mevkidaşdır (Nihai Faydalanıcı).

SÇD Projesi, Eptisa Mühendislik Ltd. ve Integra Consulting Ltd. Konsorsiyumu (bundan böyle 'Yüklenici' olarak anılacaktır) tarafından uygulanmaktadır.

1.2 ARA İLERLEME RAPORUNUN AMACI

Ara İlerleme Raporu No. 3'ün amacı, projenin uygulanmasının 7. – 9. ayları arasında yapılan ilerlemeyi belirtmek ve sıradaki raporlama süreci için, yani 10. – 12. aylar için, eylemler planının ana hatlarının belirlenmesidir. Bu taslak versiyon, 23 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı'nda sunulacak ve tartışılacaktır.

2. RAPORLAMA SÜRECİNDE UYGULANAN FAALİYETLER

Bu bölüm 20 Ekim 2019 tarihinden 20 Ocak 2020 tarihine kadar (yani projenin uygulanmasının 7.-9. ayları) uygulanan faaliyetlerin genel hatlarını belirtmektedir.

2.1 FAALİYET 1.2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ

Tüm bulgular ve sonuçları özetleyen taslak rapor 4 Ekim 2019 tarihinde sunulmuş ve 24 Ekim 2019 tarihinde de revize edilmiş hali sunulmuştur. Nihai rapor 4 Kasım 2019 tarihinde onaylanmıştır.

2.2 FAALİYET 1.4. BELİRLENMİŞ İKİ PLANLAMA SÜRECİNİN HAZIRLANMASI

1.3.faliyetin sonuçlarını takiben iki pilot SÇD süreci Temmuz 2019'da başlatılmıştır.

Raporlama sürecinde **Nitrat Eylem Planı (NEP) SÇD Pilotu** için kapsam belirleme raporu çalışmaları devam etmiştir. Kapsam Belirleme Raporunun ilk taslağı 24 Aralık 2019 tarihinde, Nihai Faydalanıcı'nın görüşlerini dahil eden revize edilmiş hali 15 Ocak 2019 tarihinde sunulmuştur. 3. Sektör Toplantısı 21 Ekim 2019 tarihinde ve 4. Sektör Toplantısı 13 Aralık 2019 tarihinde, NEP hazırlığının ve kapsam belirleme raporunun mevcut durumu hakkında tartışılmak üzere gerçekleştirilmiştir (Ek I'e bakınız).

NEP SÇD Pilotuna benzer şekilde, **Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY9 SÇD Pilotunda** da raporlama sürecinde kapsam belirleme raporu çalışmaları devam etmiştir ve ilk taslak Kapsam Belirleme Raporu 27 Aralık 2019 tarihinde sunulmuştur. Revize edilmiş taslak, Nihai Faydalanıcı'nın görüşleri de dahil edilerek 14 Ocak 2020 tarihinde sunulmuştur. Kapsam belirleme aşamasının ilerleyişini tartışmak üzere 3. Sektör Toplantısı 12 Aralık 2019 tarihinde düzenlenmiştir (Ek II'ye bakınız).

2.3 FAALİYET 2.1. EĞİTİM İHTİYAÇLARININ ANALİZİNİN YAPILMASI

Tüm bulgu ve sonuçları içeren, tamamlanmış taslak rapor 7 Ekim 2019 tarihinde sunulmuştur ve revize edilmiş versiyonu 24 Ekim 2019 tarihinde sunulmuştur. Nihai rapor 5 Kasım 2019 tarihinde onaylanmıştır.

2.4 FAALİYET 2.2. EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

Eğitim programlarının hazırlanmasına 2019 yılının Ekim ayı başlarında başlanmış ve eğitim materyallerinin genel taslağı (eğitim materyallerinin kendisi değil) 2. Yönelendirme Komitesi Toplantısı'nda (YKT), 23 Ekim 2019 tarihinde sunulmuştur. Eğitim materyallerinin tam seti Kasım 2019'da geliştirilmiş ve 2.2. Faaliyet'in raporu 25 Kasım 2019 tarihinde sunulmuştur. Nihai Faydalanıcı'dan görüşler alındıktan sonra raporun revize edilmiş versiyonu 27 Kasım 2019 tarihinde sunulmuştur. Rapor, 5 Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır.

2.5 FAALİYET 2.3. EĞİTİMLERİN VERİLMESİ

Nihai Faydalanıcı ile yapılan sözleşme uyarınca, 1. Eğitim modülü 4-5 Aralık 2019 tarihlerinde organize edilmiştir. Etkinliğin gündemi 29 Kasım 2019 tarihinde sunulmuş ve 29 Kasım 2019 tarihinde onaylanmıştır. 1. Eğitim modülü hakkında detaylı bilgi, 22 Ocak 2020 tarihinde sunulan eğitim raporunda sağlanmıştır (Ek III'e bakınız). Katılımcı listesi ve görünürlük materyalleri teslim listesi 9 Aralık 2019 tarihinde sunulmuştur.

2.6 FAALİYET 2.4. ÜNİVERSİTELER, STK'LAR, ODA'LAR VE HALK İÇİN FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞTAYLARI

Taslak çalıştay gündemi ile birlikte, 1. Farkındalık artırma etkinliğinin tarihi de 2. YKT'de sunulmuş ve tartışılmıştır. Nihai Faydalanıcı ile yapılan sözleşme uyarınca çalıştay, 3 Aralık 2019 tarihinde, 1. Eğitim modülü ile arka arkaya olacak şekilde düzenlenmiştir. Etkinliğin gündemi 29 Kasım 2019 tarihinde sunulmuş ve 29 Kasım 2019 tarihinde onaylanmıştır. 1. Çalıştay hakkında detaylı bilgi 22 Ocak 2020 tarihinde sunulan

çalıştay raporunda verilmiştir (Ek III'e bakınız). Katılımcı listesi ve görünürlük materyalleri teslim listesi 9 Aralık 2019 tarihinde sunulmuştur.

2.7 FAALİYET 2.5. AB ÜLKELERİNE ÇALIŞMA ZİYARETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı'ndaki tartışmaları takiben Nihai Faydalanıcı ile birlikte İspanya'da gerçekleştirilecek olan çalışma ziyaretinin öngörülen tarihinin 29 Mart 2020 ile 3 Nisan 2020 tarihleri arasında olacağına karar verilmiştir. Ancak öngörülen tarih sunulacak gündeme göre değişiklik gösterebilir (Çalışma Ziyaretinin süresi, İş Tanımı'nda (İT) yolculuk günü dışında 5 gün olarak belirlenmiştir). 2020 yılı Ocak ayının başlarında çalışma ziyareti gündemi üzerinde çalışmalara başlanmıştır.

2.8 FAALİYET 2.6. WEBSİTESİNİN PROJE ÇIKTILARIYLA GÜNCELLENMESİ

2. Ara İlerleme Raporu (İngilizce versiyonu), raporlama sürecinde siteye yüklenmeye hazır hale getirilmiştir.

2.9 RAPORLAMA

Taslak 2. Ara İlerleme Raporu 18 Ekim 2019 tarihinde, daha sonra revize edilmiş taslak raporlar (Nihai Faydalanıcı ve Sözleşme Makamı'nın görüşlerini entegre ederek) 8 Kasım 2019 tarihinde, The draft 2nd Interim Progress Report was submitted on 18 October 2019, 20 Kasım 2019 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde sunulmuştur. Nihai versiyonu 5 Aralık 2019 tarihinde sunulmuş ve onaylanmıştır.

2.10 OPERASYON KOORDİNASYON BİRİMİ TOPLANTISI

İlk Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) Toplantısı 17 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı Tutanağı 17 Ocak 2020 tarihinde sunulmuştur (Ek IV'e bakınız).

2.11 RAPORLAMA SÜRECİNDE UYGULANAN FAALİYETLERE GENEL BAKIŞ

Tablo 1 :Raporlama sürecinde onaylanan faaliyetler ve ilgili çıktılara genel bakış

Faaliyet	Çıktılar	Sunulduğu Tarih	Onaylandığı Tarih	Yorum ve notlar
FAALİYET 1.2. MEVCUT DURUM TESPİTİ	ÇŞB ve diğer yetkili makamların SÇD kurumsal kapasitesinin mevcut durumuna dair boşluk analizini kapsayan bir rapor, açılış ve kapanış toplantılarının tutanakları, anketler	4 Ekim 2019 (taslak rapor) 24 Ekim 2019 (revize edilmiş rapor)	4 Kasım 2019	Rapor anketlerin sonucunu kapsamaktadır. Açılış toplantısının tutanağı Ara İlerleme Raporu No. 1'de sunulmuştur.
FAALİYET 1.4. BELİRLENMİŞ İKİ PLANLAMA SÜRECİNİN HAZIRLANMASI	SÇD Kapsam Belirleme Raporu, SÇD Raporu ve İzleme Raporu, Kapsam Belirleme Toplantılarının ve İstişare Toplantılarının tutanakları, masa başı araştırma toplantılarının tutanakları	14 Ocak 2020 (BKAY SÇD Pilotu için taslak kapsam belirleme raporu) 15 Ocak 2020 (NEP SÇD Pilotu için taslak kapsam belirleme raporu)	Mevcut Değil	Faaliyet 17. ayın sonuna kadar uygulanmış olacaktır. Şimdiye dek, aşağıdaki ara çıktılar elde edilmiştir: <ul style="list-style-type: none">Her iki SÇD pilotu için de çalışma planıTaslak kapsam belirleme raporları

Faaliyet	Çıktılar	Sunulduğu Tarih	Onaylandığı Tarih	Yorum ve notlar
Faaliyet 1.4.1. Kapsam Belirleme Toplantılarının Yapılması	Kapsam Belirleme Toplantılarının tutanakları, basılan materyaller (broşürler, kataloglar, tanıtım materyaller), masa başı araştırma toplantılarının tutanakları	Mevcut Değil	Mevcut Değil	
Faaliyet 1.4.2. İstişare Toplantılarının Yapılması	Çıktılar: İstişare Toplantılarının Tutanakları, basılan materyaller (broşürler, kataloglar, tanıtım materyalleri), masa başı araştırma toplantılarının tutanakları	Mevcut Değil	Mevcut Değil	
Faaliyet 1.4.3. Saha Ziyaretlerinin Yapılması	Çıktılar: Saha ziyaretlerine dair Görev Raporları, basılan materyaller (broşürler, kataloglar, tanıtım materyalleri) masa başı araştırma toplantılarının tutanakları	Mevcut Değil	Mevcut Değil	
Faaliyet 1.4.4. Bir Değerlendirme Toplantısının Yapılması	Çıktılar: Değerlendirme Toplantısının Tutanağı, basılan materyaller (broşürler, kataloglar, tanıtım materyalleri)	Mevcut Değil	Mevcut Değil	

Faaliyet	Çıktılar	Sunulduğu Tarih	Onaylandığı Tarih	Yorum ve notlar
FAALİYET 2.1. EĞİTİM İHTİYAÇLARI ANALİZİ'NİN YAPILMASI	Eğitim İhtiyaçları Analizi (EİA) Raporu ve yüzyüze görüşmelerin ve ilgili anketlerin sonuçları	7 Ekim 2019 (taslak rapor) 24 Ekim 2019 (revize edilmiş rapor)	5 Kasım 2019	EİA raporu tüm sonuçları ve görüşmelerin ve online anketlerin tutanaklarını içermektedir.
FAALİYET 2.2. EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI	Eğitim programı ve materyallerine dair bir rapor	25 Kasım 2019 (taslak rapor) 27 Kasım 2019 (revize edilmiş rapor)	5 Aralık 2019	Eğitim materyallerinin genel taslağı (eğitim materyallerinin kendileri değil) Faydalanıcı'ya sunulmuştur ve 23 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2. YKT'de sunulmuştur.
FAALİYET 2.3 EĞİTİMLERİN VERİLMESİ	Eğitim değerlendirme raporu, eğitim oturumlarının değerlendirilmesine yönelik anketler, eğitimlerin tutanağı	22 Ocak 2020		
FAALİYET 2.4 ÜNİVERSİTELERE, STK'LARA, ODA'LARA VE HALKA YÖNELİK FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞTAYI	Çalıştay raporları, çalıştayların değerlendirilmesine yönelik anketler, Çalıştayların tutanağı, basılan materyaller (broşür, kitapçık, tanıtım materyalleri)	22 Ocak 2020		

Faaliyet	Çıktılar	Sunulduğu Tarih	Onaylandığı Tarih	Yorum ve notlar
FAALİYET 2.6. MEVCUT WEBSİTESİNİN PROJE ÇIKTILARIYLA GÜNCELLENMESİ	Güncellenmiş websitesi	Mevcut Değil	Mevcut Değil	• 2. Ara İlerleme Raporu (İngilizce versiyonu)
RAPORLAMA	1. Ara İlerleme Raporu	31 Temmuz 2019	4 Eylül 2019	
	2. Ara İlerleme Raporu	18 Ekim 2019 (ilk taslak) 8 Kasım 2019, 20 Kasım 2019, and 25 Kasım 2019 (revize edilmiş raporlar) 5 Aralık 2019 (nihai versiyonu)	5 Aralık 2019	
Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) Toplantısı	Toplantı Tutanağı	21 Ocak 2020		

3. SIRADAKİ RAPORLAMA SÜRECİNİN PLANLANMASI

Bu bölüm 21 Ocak'tan 21 Nisan 2020 tarihine kadar (yani projenin uygulanmasının 10.-12. ayları) atılacak adımların ve uygulanacak faaliyetleri genel hatlarını sunmaktadır.

3.1 ÇALIŞMA PLANINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER

Güncellenen çalışma planı Ek V'te sunulmuştur. 2. Ara İlerleme Raporu'nun bir parçası olarak sunulan çalışma planında bir sapma olmuştur:

1. İlgili planlama süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle kapsam belirleme toplantılarının ve saha ziyaretlerinin (Faaliyet 1.4.1. ve 1.4.3.) tarihleri ertelenmiştir..
2. Faaliyet 2.3 Eğitimlerin Verilmesi ve Faaliyet 2.4 Üniversitelerin, STK'ların, Oda'ların ve Halkın Farkındalığının Artırılması Çalıştayı, 2. Eğitim Modülü ve 2. Farkındalık Artırma Çalıştayı 11-13 Şubat 2020 tarihlerinde, yani planlanandan daha geç tarihte, gerçekleştirilecektir.

3.2 FAALİYET 1.4. BELİRLENMİŞ İKİ PLANLAMA SÜRECİNİN HAZIRLANMASI

Raporlama sürecinde kaydedilen ilerleme göz önünde bulundurularak, gelecek üç ay içerisinde aşağıdaki faaliyetler yürütülmelidir:

- Kapsam belirleme toplantılarının ve saha ziyaretlerinin hazırlanmasının koordinasyonu için ÇŞB ve TOB ekipleri ile çalışma toplantıları düzenlenmesi;
- Şubat ve Mart 2020'de kapsam belirleme toplantılarının (Faaliyet 1.4.1.) düzenlenmesi
- Şubat ve Mart 2020'de saha ziyaretlerinin (Faaliyet 1.4.3.) gerçekleştirilmesi
- Kapsam belirleme istişaresi toplantılarının çıktıları göz önünde bulundurularak kapsam belirleme raporlarının güncellenmesi (Mart – Nisan 2020).

3.3 FAALİYET 2.2. EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

1. eğitim modülünden kazanılan deneyim ile 2. eğitim modülünün eğitim materyalleri revize edilmeli ve güncellenmeli, ilgili örnekler sağlanmalıdır (2020 Ocak ayı sonuna kadar)

3.4 FAALİYET 2.3. EĞİTİMLERİN VERİLMESİ

2. eğitim modülü 12-13 Şubat 2020'de gerçekleşecektir. Lojistik ayarlamalar (yer, katılımcı listesi, davetiyeler vb.) uygun olarak Nihai Faydalanıcı ile koordinasyon içerisinde yapılacaktır.

3.5 FAALİYET 2.4. ÜNİVERSİTELERİN, STK'LARIN, ODA'LARIN VE HALKIN FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI ÇALIŞTAYLARI

2. farkındalık artırma çalıştayı 11 Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır. Eğitim materyalleri etkinlikten önce hazırlanacak ve 1. Farkındalık artırma çalıştayıdan elde edilen tecrübeleri yansıtacaktır. Lojistik ayarlamalar (yer, katılımcı listesi, davetiyeler vb.) uygun olarak Nihai Faydalanıcı ile koordinasyon içerisinde yapılacaktır.

3.6 FAALİYET 2.5. AB ÜLKELERİNE ÇALIŞMA ZİYARETLERİNİN DÜZENLENMESİ

Çalışma turu gündemi 2020 Şubat sonuna kadar hazırlanacak ve Nihai Faydalanıcı ile görüşülecektir. Lojistik ayarlamalar (uçuşlar, konaklama, katılımcı listesi vb.) uygun olarak Nihai Faydalanıcı ile koordinasyon içerisinde yapılacaktır. İspanya'ya çalışma ziyareti 29 Mart 2020 tarihi ile 3 Nisan 2020 tarihi arasında gerçekleşecektir.

3.7 FAALİYET 2.6. MEVCUT WEBSİTESİNİN PROJE ÇIKTILARIYLA GÜNCELLENMESİ

Aşağıdaki belgeler sıradaki raporlama sürecinde yüklenmeye hazır hale getirilecektir:

1. 2. Eğitim modülü hakkında ilgili bilgi notu
2. 2. Farkındalık artırma çalıştayı hakkında bilgi notu
3. Her iki SÇD Pilotu için de Kapsam belirleme istişare toplantıları hakkında bilgi
4. Kapsam Belirleme Raporları.

4. GÖSTERGELER

Aşağıdaki listede İT'den ve projenin Operasyon Tanımlama Belgesi'nden (OTB) göstergeler verilmiştir. Liste aynı zamanda söz konusu göstergelere ulaşmak için kaydedilen ilerleme hakkında da bilgi vermektedir.

Tablo 4.1: Uygulama süreci boyunca göstergelere ulaşılma durumu

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
Personelin Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği hakkında bilgisi %50 düzeyinde artırılacaktır.	İT	%50	Henüz değil	Eğitim raporları, eğitimlerin değerlendirilmesine yönelik anketler, eğitimlerin tutanağı, basılan materyaller	%55,6	İlk eğitim modülü Aralık 2019 tarihinde vuku bulmuştur. Bu eğitim modülünün öncesinde ve sonrasında katılımcıların doldurduğu anketler aracılığıyla bir bilgi artışı olduğu ölçülmüştür. Yüzde oranı, 1. Eğitimin katılımcılarının bilgi artışını göstermektedir.
Farkındalık oranı belirlenecek ve %50 oranında artırılacaktır.	İT	%50	Henüz değil	Çalıştay raporları, çalıştayların değerlendirilmesine yönelik anketler, çalıştayların tutanakları, basılan materyaller	%72,4	İlk farkındalık artırma çalıştayı Aralık 2019 tarihinde yapılmıştır. Bu çalıştayı öncesinde ve sonrasında katılımcıların doldurduğu anketler aracılığıyla bir bilgi artışı olduğu ölçülmüştür. Yüzde oranı, 1. Çalıştayı katılımcılarının bilgi artışını göstermektedir.

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
5 öncelikli sektörde (kıyı yönetimi, arazi kullanım planlaması, su yönetimi, tarım ve turizm sektörü) SÇD Yönetmeliği'nin uygulanması konusunda iyi eğitilmiş ve deneyimli personel sayısı, mevcut duruma oranla %50 artırılabilecektir.	İT	%50 ¹	Henüz değil	Eğitim raporları, eğitimlerin katılımcı listeleri, eğitimlerin tutanakları	%80	Durum, ilgili kurumlardan elde edilen bağlantılar ve Aralık 2019 tarihinde yapılan ilk eğitim modülü ve çalışmaya katılımdan yola çıkılarak tahmini değerlendirilmiş olup verilen oran, katılım sağlayan kurumlarda ulaşılan sayıyı yansıtmaktadır.
SÇD bulgularının ve istişarelerinin SÇD süreci ile entegre edildiği onaylanmış/kabul edilmiş planların sayısı	İT	-2	Henüz değil	Kapsam Belirleme raporları, SÇD raporları, İzleme Raporları, BKAY ve NEP, kabul/onay konusunda ilgili planlama yetkililerinin kararları	%0	Şimdiye dek, iki seçilmiş stratejik belge (NEP ve BKAY) için SÇD süreci başlatılmış, taslak kapsam belirleme raporları hazırlanmış ve planlama yetkilileri ile birkaç sektör toplantısı düzenlenmiştir. Hedef projenin sounda değerlendirilebilir.
Eğitim/Çalıştaylara katılan ve eğitilen personel sayısı, mevcut duruma göre	İT	%30 ³	Henüz değil	Eğitim raporları, eğitimlerin katılımcı	%30	Durum, ilgili kurumların organizasyonlarından elde edilen

¹ Mevcut durum (yani SÇD Yönetmeliği'nin uygulamasında deneyimli ve iyi eğitilmiş personelin güncel sayısı) belirlenmemiştir, sadece EİA ve Boşluk Analizlerinin bulgularına dayanarak tahmin edilebilmektedir.

² Bu gösterge için nicel bir hedef tanımlanmamıştır.

³ Mevcut durum (yani eğitilmiş personelin sayısı) belirlenmemiştir, sadece EİA ve Boşluk Analizlerinin bulgularına dayanarak tahmin edilebilmektedir

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
%30 artırılabacaktır.				listeleri, eğitimlerin tutanakları		bağlantılar ve Aralık 2019 tarihinde yapılan ilk eğitim modülü ve çalışmaya katılımdan yola çıkılarak tahmini değerlendirilmiştir. Bu oran katılan kurumlarda ulaşılan sayıyı yansıtmaktadır.
Üniversitelerden, STK'lardan, Oda'lardan ve halktan katılımcıların farkındalık seviyesi mevcut duruma oranla %30 artırılabacaktır.	İT	%30	Henüz değil	Çalıştay raporları, çalıştayların değerlendirilmesine yönelik anketler, çalıştayların tutanakları, başışan materyaller	%72,4	İlk farkındalık artırma çalışmayı Aralık 2019 tarihinde yapılmıştır. Bu çalışmanın öncesinde ve sonrasında katılımcıların doldurduğu anketler aracılığıyla bir bilgi artışı olduğu ölçülmüştür. Yüzde oranı, 1. Çalışmanın katılımcılarının bilgi artışı göstermektedir.
Proje uygulama sürecinde çevresel değerlendirme, yönetim ve belirli analizler hakkında geliştirilen rapor sayısı	İT	- ⁴	Henüz değil	Faaliyet raporları, ilerleme raporları, Yönlendirme Komitesi Toplantılarının Tutanakları	10	Şimdiye dek aşağıdaki raporlar sunulmuştur (17 Ocak 2020 tarihine kadar): <ul style="list-style-type: none">• Başlangıç Raporu;• 1. İlerleme Raporu;• 2. İlerleme Raporu;

⁴ Bu gösterge için nicel bir hedef tanımlanmamıştır.

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
						<ul style="list-style-type: none">• Açılış Toplantısının Tutanağı (Faaliyet 1.1);• Faaliyet 1.2 hakkında rapor;• Faaliyet 1.3 hakkında rapor;• Faaliyet 2.1 hakkında rapor.• Faaliyet 2.2 hakkında rapor.• Taslak NEP ve BKAY SÇD Pilotları için SÇD kapsam belirleme raporları
SÇD Yönetmeliği'nin uygulanmasıyla çevre dostu plan ve programlar hazırlanmaktadır	OTB	No2	Henüz değil	SÇD Raporları	%0	
Avrupa Komisyonu'nun (AK) 2020 yılına kadar SÇD Direktifi konusunda kayda değer ilerleme gösterildiğini tanınması	OTB	No2	Henüz değil	Avrupa Komisyonu'nun 2017 – 2020 yıllarına ait İlerleme Raporları	%0	
SÇD Yönetmeliği'nin uygulanması için gerekli olan artırılmış kurumsal kapasite	OTB	No	Henüz değil	Hazırlanan eğitim sertifikaları	%0,8	İki pilot kurumunun; ÇŞB Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve TOB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün kurumsal kapasitesi yetkililerle sektör

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
						toplantıları düzenlenerek artırılmaya başlanmıştır ve bu yetkililer aynı zamanda 1. eğitim modülüne de katılmıştır (ancak kurumsal kapasitede değişiklikler ölçülemez – yukarıda verilen İT'nin 1. göstergesindeki orana kısmen yansıtılmıştır)
SÇD bulgularının ve istişarelerin SÇD süreciyle entegre edildiği (pilot olarak seçilen) iki onaylanmış/kabul edilmiş plan	OTB	2 plan	Henüz değil	İlerleme Raporları ve projenin nihai raporu Yetkili makamların başvurularına ilişkin ÇŞB'nin raporu SÇD Raporları	%0	Şimdiye dek, iki seçilmiş stratejik belge (NEP ve BKAY) için SÇD süreci başlatılmış, taslak kapsam belirleme raporları hazırlanmış ve planlama yetkilileri ile birkaç sektör toplantısı düzenlenmiştir. Hedef projenin sounda değerlendirilebilir.
Öncelikli 5 sektörden (kıyı yönetimi, arazi kullanım planlaması, su yönetimi, tarım ve turizm sektörleri) her birinde en az 5 ilgili personel SÇD Yönetmeliği'nin uygulanması konusunda iyi eğitilmiş ve deneyimli olacaktır.	OTB	25 kişi	Henüz değil	Kurumsal kapasitede boşluklar ve eğitim ihtiyaçları üzerine raporlar İlgili bakanlıkların beyanları ve proje raporları	%25	İlk eğitim modülü Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir ve turizm sektöründe yetkili kurumlardan yeterli sayıda katılımcı sağlanmıştır. Bu sayı yalnızca 1. eğitime katılan kurumların eğitimli personel sayısındaki artışı göstermektedir.

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşıma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
				Çalışma ziyareti materyalleri, değerlendirme raporu ve katılımcı listesi Eğitim materyalleri, değerlendirme raporu ve katılımcı listesi Eğitim değerlendirme formları Sertifika sayıları Proje Başlangıç Raporu Proje İlerleme Raporları İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısı Tutanağı Proje Nihai Raporu		

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
Yetkili makamlar ve ÇŞB'de en az 70 SÇD Odak Noktası belirlenmesi.	OTB	70 Odak Noktası	Evet	Kurumsal kapasite boşlukları ve eğitim ihtiyaçları hakkındaki raporlar İlgili bakanlıkların beyanları ve proje raporları Çalışma ziyareti materyalleri, değerlendirme raporu ve katılımcı listesi Eğitim materyalleri, değerlendirme raporu ve katılımcı listesi Eğitim değerlendirme formları Sertifika sayısı Projenin Başlangıç Raporu	%100	ÇŞB odak noktalarını belirlemiştir. Liste EİA ve Boşluk Raporlarına eklenmiştir.

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
				Projenin İlerleme Raporları İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısı Tutanakları Projenin Nihai Raporu		
Yetkili makamlarda SÇD Yönetmeliğinin uygulanması üzerine eğitilmiş en az 120 personelin çalışması	OTB	120 kişi	Henüz değil	Kurumsal kapasite boşlukları ve eğitim ihtiyaçları hakkındaki raporlar İlgili bakanlıkların beyanları ve proje raporları Çalışma ziyareti materyalleri, değerlendirme raporu ve katılımcı listesi Eğitim materyalleri, değerlendirme raporu ve katılımcı	48	Bu sayı 1. eğitim modülüne katılan katılımcı sayısını göstermektedir.

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
				listesi Eğitim değerlendirme formları Sertifika sayısı Projenin Başlangıç Raporu Projenin İlerleme Raporları İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısı Tutanakları Projenin Nihai Raporu		
SÇD farkındalık artırma çalıştaylarına, seminerlerine ve diğer etkinliklere Üniversitelerden, STK'lerden ve meslek odalarından en az 160 kişi katılmıştır.	OTB	160 katılımcı	Henüz değil	Kurumsal kapasite boşlukları ve eğitim ihtiyaçları hakkındaki raporlar İlgili bakanlıkların beyanları ve proje raporları	37	Açılış Toplantısına üniversitelerden, STK'lardan ve meslek odalarından toplam 11 katılımcı ve 1. Farkındalık artırma çalıştayına 26 katılımcı iştirak etmiştir

Gösterge	Kaynak	Hedef	Ulaşılma Durumu	Onaylayan Kaynaklar	Durum (%)	Yorum ve Notlar
				Çalışma ziyareti materyalleri, değerlendirme raporu ve katılımcı listesi Eğitim materyalleri, değerlendirme raporu ve katılımcı listesi Eğitim değerlendirme formları Sertifika sayısı Projenin Başlangıç Raporu Projenin İlerleme Raporları İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısı Tutanakları Projenin Nihai Raporu		

5. VARSAYIMLAR VE RİSKLER

5.1 SÇD PİLOTLARI

1. ve 2. Ara İlerleme Raporlarında da bahsedildiği ve 1.3. Faaliyette görüşüldüğü üzere, NEP ve BKAY hazırlığının zaman çizelgesi SÇD Projesinin uygulanacağı zaman dilimi içerisinde tüm SÇD adımlarının yürütülmesini sağlamalıdır. Ne var ki, bu konuda planlama sürecinde bir gecikme yaşanmayacağı ve planlama dokümanlarının tamamlanmış taslaklarının en geç 13.-14. ayların sonuna doğru (yani 2020 yılı Mayıs sonu / Haziran başı) Yüklenici'nin kullanımına sunulacağı varsayılmaktadır. Aksi takdirde İT'in gerektirdiği şekilde 17. ayın sonuna kadar SÇD pilotlarının tamamlanması (Faaliyet 1.4) mümkün olmayacaktır.

Ne var ki, BKAY planlama ekibi ile yapılan toplantıda (3 Ekim 2019) taslak BKAY'ın Mayıs 2020'ye kadar hazır olmama olasılığı belirtilmiştir. Bu gerçek, önemli bir risk olan BKAY SÇD pilotunun proje uygulama döneminde sonuçlandırılmaması ihtimalini yansıtmaktadır.

5.2 FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞTAYLARI

İT, SÇD farkındalık artırma çalıştaylarına, seminer ve diğer faaliyetlere üniversitelerden, STK'lardan ve Oda'lardan en az 160 katılımcı sağlanmasını şart koşmaktadır. Ancak 1. farkındalık artırma çalıştayında bu paydaş gruplarından sağlanan katılımcı sayısının azlığı (toplam 26) göz önünde bulundurulacak olursa, İT'de belirtilen sayıya ulaşamama riski bulunmaktadır. Bu nedenle bir sonraki çalıştaya üniversitelerden, STK'lardan, Oda'lardan ve halktan yüksek sayıda katılımcı davet edilmelidir ve bu da Nihai Faydalanıcı ile yakın işbirliği gerektirmektedir.

EKLER	
EK I :	NEP KAPSAM BELİRLEME RAPORU
EK II :	BKAY KAPSAM BELİRLEME RAPORU
EK III :	FAALİYET 2.3 VE FAALİYET 2.4 İÇİN EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
EK IV :	OPERASYON KOORDİNASYON BİRİMİ TOPLANTISI NO.1
EK V :	GÜNCELLENMİŞ ÇALIŞMA PLANI

EK-I NEP KAPSAM BELİRLEME RAPORU

Raporun taslak hali 15 Ocak 2020 tarihinde bir resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıęına sunulmuştur.

EK-II BKAY KAPSAM BELİRLEME RAPORU

Raporun taslak hali 14 Ocak 2020 tarihinde bir resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıęına sunulmuştur.

EK-III FAALİYET 2.3 VE FAALİYET 2.4 İÇİN EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

Raporun taslak hali 22 Ocak 2020 tarihinde bir resmi yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıęına sunulmuştur.

EK-IV OPERASYON KOORDİNASYON BİRİMİ TOPLANTISI NO.1





This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI NO.3

Sözleşme Konusu	:	Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi (SÇD)
Sözleşme No/ Türü	:	TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03
Sözleşme Makamı	:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Nihai Faydalanıcı	:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Yüklenici	:	Eptisa Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Bilgisayar İnşaat Tic. Ltd.Şti ve Integra Consulting s.r.o. Konsorsiyumu
Toplantı'nın Konusu	:	Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı No:1
Tarih/ Saat	:	17.01.2020 – 14.30
Yer	:	ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Büyük Toplantı Salonu
Katılımcı	:	Katılımcı Listesi Ek l'dedir
Ekler	:	I- Katılımcı Listesi (1 sayfa) II- Teknik Sunum (21 sayfa) III- Yönlendirme Komitesi Toplantısı No:2'nin fotoğrafları (2 sayfa)

Not: "Bu Tutanak, eylem ve tavsiyeleri içeren olayların kaydından ibarettir. Yükleniciye aksi bilgilendirilmedikçe, kabul edildiği varsayılmaktadır."





This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

No	KATILANLARIN İSİMLERİ	GÖREVLERİ	KURUM/ŞİRKET
1	Güven Seydioğlu	Görev Yöneticisi	ÇŞB-IPA
2	Nihan Şahin Hamamcı	Şube Müdürü	ÇŞB- ÇED Genel Müdürlüğü
3	Özge Erdem	Uzman	ÇŞB- ÇED Genel Müdürlüğü
4	Hakan Acar	Uzman	ÇŞB- ÇED Genel Müdürlüğü
5	Gonca Kaynak	SÇD Yerel Uzmanı	Eptisa
6	Pınar Yılmaz	SÇD Yerel Uzmanı	Eptisa
7	Gizem Ceren Kadılar	Proje Asistanı	Eptisa



This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

Gündem mad.No.	AÇIKLAMA	UYGULAYICILAR	DURUM
1.0	Toplantıya giriş		
	Toplantı Sözleşme Makamı (SM) öncülüğünde başlatılmış ve aşağıdaki gündem maddeleri Yüklenici sunumunun kapsamında sunulmuştur.	-	-
2.0	3. Çeyrekte Uygulanan Faaliyetler		
	<p>Yüklenici 3. Çeyrekteki gelişmeleri aşağıdaki gibi özetlemiştir;</p> <p>Faaliyet 1.2: Mevcut Durum Tespiti Yüklenici faaliyetin tüm bulgu ve sonuçlarını özetleyen taslak raporunun 4 Ekim 2019 tarihinde sunulduğunu belirtmiştir. Raporun nihai hali 4 Kasım 2019 tarihinde onaylanmıştır.</p> <p>Faaliyet 1.4: NEP SÇD Pilotu Yüklenici 4. sektör toplantısının 13 Aralık'ta düzenlendiğini, 24 Aralık'ta taslak kapsam belirleme raporunun sunulduğunu ve kapsam belirleme raporunun temelini oluşturan NEP taslak raporunun 27 Aralık 2019 tarihinde TUBITAK tarafından sunulduğunu dile getirmiştir. Yüklenici, ÇŞB ve TOB tarafından yapılan yorumları göz önünde bulundurarak taslak versiyonu revize etmiş ve nihai versiyonu 15 Ocak 2020 tarihinde teslim etmiştir. Tartışmalar ardından Yüklenici saha toplantısı için (ÇŞB ve TOB tarafından) yer ve zamanın atanması gerektiğini ifade etmiştir. SÇD Pilot sektörlerinin bir sonraki toplantılarının, TOB'un da tarihi onaylaması durumunda, muhtemel olarak Şubat 2020 tarihinde (24-28 Şubat haftası içinde) yapılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte toplantı yeri ve saha ziyareti ÇŞB ve TOB ile birlikte kararlaştırılmalı ve bu doğrultuda Yüklenici konaklama ayarlamalarını yapmalıdır.</p> <p>Faaliyet 1.4: BKAY SÇD Pilotu Yüklenici şimdiye dek 17 Temmuz, 22 Ekim ve 12 Aralık 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam üç sektör toplantısı düzenlendiğini belirtmiştir. Taslak Kapsam Belirleme Raporunun ilk hali Planlama Makamı ve ÇŞB ile 20 Aralık tarihinde e-posta yolu ile paylaşılıp resmi olarak 27 Aralık 2019 tarihinde sunulmuştur. ÇŞB ve Planlama Makamının yorumları üzerine revize edilen taslak versiyonu 15 Ocak 2020 tarihinde sunulmuştur. Temmuz 2020 tarihinde Planlama Makamı tarafından sunulan BKAY planını takiben SÇD sürecinin (Taslak SÇD Raporunun hazırlanması, halk ile istişare toplantıları, Nihai SÇD Raporu) tamamlanmasında katı zaman çizelgesinden bahsedilmiş ve Planlama Makamının iş planında oluşabilecek gecikmelerden</p>	-	-



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI



Çevre ve İklim
Eylemi Sektör
Operasyonel Programı



eptisa
mühendislik



This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

Gündem mad.No.	AÇIKLAMA	UYGULAYICILAR	DURUM
	<p>kaynaklanması muhtemel olası gecikme riski Yüklenici tarafından vurgulanmıştır. Sözleşme Makamı BKAY planlama sürecinden dolayı olası bir gecikme durumunda bir Addendum ile süre uzatımı yapılabileceğinden ve konunun ileride yeniden tartışılabilceğinden bahsetmiştir.</p> <p>Nihai Faydalanıcı, BKAY planının akademisyenlerden oluşan uzman planlama ekibinin hazırladığı, teknik olarak kapsamlı bir plan olduğunun ve SÇD uygulamasının oluşturacağı farkın ve sağlayacağı katkının anlaşılmasının önemini vurgulamıştır. Yüklenici tarafından SÇD raporu için şehir plancısı, biyolojik çeşitlilik uzmanı vb. gibi uzmanların kısa süreli olarak dâhil edileceği belirtilmiştir.</p> <p>İki günlük saha ziyareti ve Kapsam Belirleme Toplantısının hâlihazırda Mart 2020 tarihinde (9-13 Mart haftasında) gerçekleşmesine karar verildiği not edilmiştir. Tarihlerin doğrulaması ÇŞB tarafından yapılacak, saha ziyaretleri için sunulan gündem Planlama Makamı ile istişare ardından Yüklenici tarafından gönderilecektir.</p> <p>Faaliyet 2.1 Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA) Yüklenici gerçekleştirilen faaliyetleri tarihleriyle birlikte sunmuştur; tüm bulgu ve sonuçları özetleyen nihai taslak raporu 7 Ekim 2019 tarihinde teslim edilmiştir. Raporun revize edilmiş hali 24 Ekim 2019 tarihinde sunulmuştur. Nihai rapor ise 5 Kasım 2019 tarihinde onaylanmıştır.</p> <p>Faaliyet 2.2 Eğitim Programlarının Hazırlanması Yüklenici gerçekleştirilen faaliyetleri tarihleriyle birlikte sunmuştur; 2019 yılı Ekim ayının başında başlamıştır (EİA sonuçlarını kastederek). Eğitim materyallerinin kendileri değil ancak ana hatları ikinci Yönetim Komitesi Toplantısında sunulmuştur. Eğitim materyalleri eksiksiz olarak Kasım 2019 tarihinde geliştirilmiştir. 2.2 numaralı faaliyetin raporu 25 Kasım 2019 tarihinde sunulmuş ve rapor 06 Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır.</p> <p>Faaliyet 2.3 Eğitimlerin Verilmesi; Yüklenici 2. eğitim modülü ve 2. Farkındalık artırma çalışmayı arka arkaya sırasıyla 12-13 Şubat 2020 ve 11 Şubat 2020 tarihlerinde düzenleneceğinin altını çizmiştir.</p> <p>Faaliyet 2.5 Çalışma Gezisi Yüklenici çalışma gezisi gündeminin 2020 yılının Şubat ayı ortalarında hazırlanıp Nihai Faydalanıcı ile görüşüleceğini</p>		



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI



Çevre ve İklim
Eylemi Sektör
Operasyonel Programı



eptisa
mühendislik



This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği'nin Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

Gündem mad.No.	AÇIKLAMA	UYGULAYICILAR	DURUM
	<p>vurgulamıştır. Lojistik ayarlamalar (uçuş, konaklama, katılımcı listesi vb.) Nihai Faydalanıcı ile koordinasyon halinde yapılacaktır. İspanya'da düzenlenecek olan çalışma gezisinin tarihleri 29 Mart 2020 – 3 Nisan 2020 olacaktır.</p> <p>Faaliyet 2.6; Mevcut Web Sitesinin Proje Çıktılarıyla Güncellenmesi</p> <p>Yüklenici aşağıdaki belgelerin bir sonraki rapor süreci web sitesine yüklenmeye hazır olacağı bilgisini vermiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">• 2. İlerleme Raporu (Türkçe)• 2. eğitim modülü hakkında bilgilendirme notu• 2. farkındalık geliştirme çalıştay üzerine bilgilendirme notu• İki SÇD Pilotunun da Kapsam belirleme istişare toplantıları hakkında bilgi• Kapsam Belirleme raporları		
4.0	<p>4. çeyrekte yürütülmesi planlanan faaliyetler</p> <p>Takip eden üç ay boyunca aşağıdaki eylemler gerçekleştirilmelidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• SÇD Pilotu için Kapsam Belirleme istişarelerinin planlanması (Ocak 2020).• Eğitim materyallerinin 2019 Kasım ayının sonuna kadar tamamlanmalıdır.• 2. eğitim modülü ve 2. farkındalık geliştirme çalıştay 2020 Şubat ayı ortasına kadar (geçici olarak Şubat ayının ilk haftasında) peş peşe düzenlenecektir. <p>Bir sonraki rapor sürecinde aşağıdaki belgeler web-sitesine yüklenmek üzere hazır edileceklerdir:</p> <ul style="list-style-type: none">• EİA raporunun nihai hali (Türkçe versiyonunun)• İkinci Ara İlerleme Raporunun nihai hali (Türkçe versiyonunun)• Üçüncü Ara İlerleme Raporunun nihali hali (Türkçe versiyonunun)• Eğitim modülleri hakkında bilgilendirme notu• İlk farkındalık geliştirme çalıştay hakkında bilgilendirme notu	Yüklenici & ÇŞB	4. Süreç



This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin (SÇD) Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

EK – I: Katılımcı Listesi



This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin (SÇD) Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

EK – II: Teknik Sunum



This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin (SÇD) Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03

EK -III: OKB Toplantısı No: 1 Fotoğrafları



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI



Çevre ve İklim
Eylemi Sektör
Operasyonel Programı



eptisa
mühendislik



This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin (SÇD) Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI



Çevre ve İklim
Eylem Sektör
Operasyonel Programı



eptisa
mühendislik



This project is co-financed by the European Union
and the Republic of Turkey.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin (SÇD) Uygulanmasının Desteklenmesi

TR2018 ESOP MI A3 12/CNP/03



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI




Çevre ve İklim
Eylemi Sektör
Operasyonel Programı



eptisa
mühendislik

EK-V GÜNCELLENMİŞ ÇALIŞMA PLANI

Work Plan

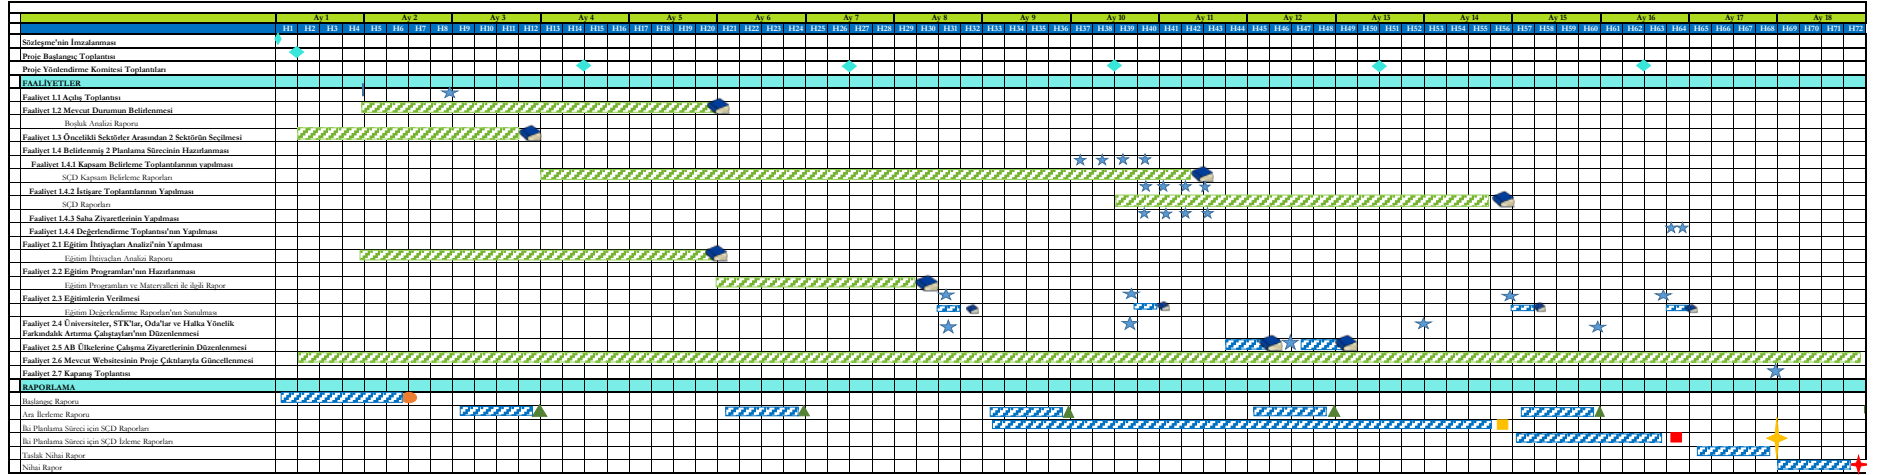

LEJAND	
	Faaliyetlerin Uygulanması
	Raporların Hazırlanması Süreci
	Faaliyetlerin Raporları
	Açılış ve Kapanış Toplantıları, Eğitimler ve Çalışmaların Saha Ziyaretleri
	Başlangıç Raporu
	Orta Dönem Raporu
	İki Planlama Strajisi için SCD Raporları
	İki Planlama Strajisi için SCD İhtisarı Raporları
	Tadilat Nihai Rapor
	Nihai Rapor



Bu rapor Avrupa Birliđi ve Trkiye Cumhuriyeti tarafından finansal desteđi ile hazırlanmıřtır. İeriđi yalnızca Eptisa Mhendislik sorumluluđundadır. Hibir řekilde Trkiye Cumhuriyeti'nin veya Avrupa Birliđi'nin grřlerini yansıtmaz.
